



**Akt nr:**  
**R-E1a-1525**

**\*AU\$R-E1a-1525\***

4824-2

R 2\*1525

LANTBRUKSSTYRELSEN  
16 DEC. 1953  
DIARIE Nr  
SAK Nr



Statligt stöd beviljat av  
LANTBRUKS- Bidr. den 2/11 1953  
NÄMNDEN Län  
LANTBRUKS- Bidr. den / 19....  
STYRELSEN Län  
Arbetets utförande godkänt  
den 2/11 1953 { utan  
med  
ändring av arbetsplan.  
(ändring har införts å berörda ritningar  
med ..... färgbeteckning)



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 20 juni 1952 avslutad syneförrättning rörande "Lars Persgårdens dikningsföretag av år 1952" i Grästorps kommun, f.d. Grästorps köping och Särestads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 oktober 1952.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara.

LANDBRUKSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN  
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att Lars Persgårdens dikningsföretag av år 1952  
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning  
å fastigheten i Särestads s:n, Grästorps kommun  
lånegaranti nr                      å                      kronor  
avskrivningslån nr                      å                      kronor  
statsbidrag nr 4100 å 2.860:-- kronor  
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-  
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela  
företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:                     

Avs. ningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:                     

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: Inga

arbetets kvalitet: Inga

Brandförsäkring:                     

Skara den 2/11 19 53.

Erik Petersson  
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien                      kronor

å avskrivningslånet                      kronor

å statsbidraget                      kronor

På grund av ovan intygade arbeten kurna  
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien                      kronor

å avskrivningslånet                      kronor

å statsbidraget 2.860:-- kronor

| Kamerala avdelningens anteckning |           |
|----------------------------------|-----------|
| Utanordnat den                   | Signatur  |
| / 19 nr                          |           |
| / 19                             |           |
| 29/12 19 53                      | <u>MU</u> |

Skara den 2 nov. 19 53.

Mittelman  
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.  
Protokoll vid Ögne-  
förrättning enligt vatten-  
lagen för fördelning  
av mark, tillhörande  
Charlarna nr 2 i Färs och  
Röcken, Skaraborgs län.

Den 19 maj 1952 i Charlarna

Ärevarande: Undertecknad statens land-  
bruksingenjör och förrättningsman samt  
Curt Nilsson, Stenungs<sup>Närby</sup>, och Gustaf Olsson,  
Brattgården, Tun, ävensom följande sak-  
ägare:

Pehrander Andersson af Charlarna den Persg. 2<sup>9</sup>. 2<sup>10</sup>  
av övriga sakägare:

Yngve Larsson af Lars Persg. 2<sup>19</sup>

Yngve Pettersons döds bo af Lars Persg. 2<sup>7</sup>  
genom delägaren Per Pettersson (övriga del-  
ägare Sigurd och Anders Pettersson samt  
Turegård och Helene Pettersson, de båda  
sitt nämnda ommyndiga; förmyndare är modern  
Masmi Pettersson)

C. M. Landén af Charlarna den Thunberg. (Thunberg)

§ 1  
Upplästes det för förrättningsmannen ut-  
skrivade förordnandet, som hade lydelse  
enligt bil. A.

§ 2  
 Något järn enligt Sequenceannen kunde  
 ej utvinas.

§ 3  
 Frälades den vid sin undersökning en  
 uppnådd nivå kändan över det vatten-  
 besvärade området samt profil över  
 uoloppen därifrån.

§ 4  
 Sälkander yrkade på ifrågasättande av-  
 lopps fördjupning och igenläggning med rör,  
 på att hans därav beläende mark må  
 kunna på ändamålsenligt sätt fortläggas  
 och brukas samt att andra jordägare, som  
 därav kunna på nytt, åläggas delaktig-  
 het i kostnaderna enligt vatten lagens  
 bestämmelser.

§ 5  
 C. W. Landén yrkade att aoloppet  
 över hans mark utföras som fast  
 ledning.

§ 6  
 Thad Larsson meddelade, att hans svär-  
 Anders Anderssons ägar belägen mark, är på  
 sin freds ställande att fastidhad till ett öppet  
 aolopp, i gående i Thad Larsson m. fl. hemmans för-  
 läggning förslag av år 1933. Han hade inget

uppkände om bättre avlopp och hade inte heller något erinran att ytvattnet genom skyddsvall kändes ut i avloppet genom och från Johanders mark.

Ordbudet för Efraim Peterssons dödsbo meddelade, att någon täckdiktning av dödsboets mark för närvarande ej vore aktuell. Han gillade där för en bättre avlopp för denna mark, som han ansåg lämpligen kunna ordnas över egen mark till vägen.

## § 7

Efter syngång på marken meddelade om budet för Peterssons dödsbo att dödsboet vore villigt utan ersättning rensa avloppssträckan D-D<sup>+</sup>, så att vattnet från deras mark avledes utan överrensning roder ut, ävensom att i ordning ställa befintlig vägtunnel vid D<sup>+</sup>.

## § 8

Neder syngången konstaterades, att befintlig täckdiktning och dam i Håns Lars Persgård 2<sup>19</sup> lag på c:a 1.0 m:s djup vid punkt E och att ägat vid F lag med botten c:a 0.04 m. under dagvattenytan. Larsson förklarade sig belåten med de

varande förhållandena och hade rätt  
att invända mot, att ytvattnet ständ-  
fades rinna in på Anderssons mark  
genom en skyddsvall på Anderssons  
sida om gräns ditet.

§ 9

Som rätt vidare farer att  
hitt protokollet anteckna, fastslås  
samma träd utstött med till-  
räkna givande, att sedan förslag  
hitt utvisningen utarbetats, nytt  
samma träd kommer att kallas  
å samma ställe som dagens  
fredagen den 20 juni 1952 klockan  
14.00, och komma inga ytterligare  
intervjuer härmed att tillställas  
saksägarna.

Okt och led som om

Hjärtan:  
Mettallin

Förträdande gode män:

Emil Oksanen

Karl-Einar Nilsson

Den 20 juni 1952 i Malmå.

Närvarande: Förestående Symbian  
och följande Säljare:  
Anders Andersson

§ 10  
Förelades det sedan för Symbian-  
Anders upprättade förslaget till  
de vattenbaserade maskinerna till  
konstruktör med där tillhörande hand-  
lingar.

§ 11  
Uppställes Symbians utlåtande,  
som hade lydelse enligt bil. G

§ 12  
Att motaga och förvara till för-  
slaget hörande handlingar och rit-  
ningar utgå Symbian  
Anders Andersson, Hans Persgård.

§ 13  
I fråga om för ättnings kostnaderna  
Närvarandes till andres räkning, varav  
ett exemplar skulle överlämnas till  
arkivisten.

§ 14  
Dess intet vidare fanns att till

protokollet utskickas, förklarades  
förrättningen avslutad och  
sammanträdet upplöst.

Ark och tid övernatt

2 tjänster

Red Hallin

På förhand godkännt:

Carl Oskar Nilsson

Emil Oskar Nilsson

243/46

7

E. D. 37-49

19 45

Bil. A.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/3 mtl Karlanna n:r 2 i Särestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Anders Andersson,

adress Karlanna, Grästorp.

pr Grästorp.

Telefon: Särestad 28 260 28

Grästorp den 9 april

1945

Anders Andersson

## FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lars-Persgården

Ester Johansson

## FÖRORDNANDE

Lanbruksingenjören

~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa  
ifrågavarande fördelning; och infärvänlas bevis  
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18/4 1945.

*Carl Mannerfelt*  
Carl Mannerfelt.

*J. Sunnerholm*  
J. Sunnerholm.

Bil. B.Föreläsning

övar underrättelser ang. sammanträde hos  
Anders Andersson, Karlanna, måndagen  
den 19 maj 1952 kl. 14.00, vilka denna dag  
avsänts till:



1. Anders Andersson, Karlanna, Is-Karaby
2. Karl Larsson, " "
3. Efraim Petterssons storbhus, " "
4. C. M. Lendén, " "
5. Högstadsodemannen

- Einar Nilsson, Itomman, Bjärbeg, Grästorp  
6. " Gustaf Olsson, Prästgården, Tun.  
Hera den 24 april 1952.

I tjänsten:

Wettstallin

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                      |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                      |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Särestads socken.</u>                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karlanna Lars Persg:n 2<sup>9</sup>, 2<sup>15</sup></u>                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Anders Andersson</u>                                                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på lera                                                                  | 1                    | 1,48            |        | 1400        | 2000   | 600    | 888:--      |
| " - " -                                                                              | 2                    | 1,40            |        | 1200        | "      | 800    | 1120:--     |
| " - " -                                                                              | 2 a                  | 0,86            |        | "           | "      | "      | 688:--      |
| " - " -                                                                              | 3                    | 2,32            |        | "           | "      | "      | 1856:--     |
| " - " -                                                                              | 4                    | 2,52            |        | "           | "      | "      | 2016:--     |
| " - " -                                                                              | 5                    | 1,65            |        | "           | "      | "      | 1320:--     |
| " - " -                                                                              | 6                    | 0,95            |        | "           | "      | "      | 760:--      |
| " - " -                                                                              | 7                    | 0,86            |        | "           | "      | "      | 688:--      |
| " - " -                                                                              | 8                    | 1,30            |        | "           | "      | "      | 1040:--     |
| " - " -                                                                              | 9                    | 1,99            |        | 1000        | "      | 1000   | 1990:--     |
| " - " -                                                                              | 10                   | 1,24            |        | 1600        | "      | 400    | 496:--      |
| " - " -                                                                              | 11                   | 1,10            |        | "           | "      | "      | 440:--      |
| " - " -                                                                              | 12                   | 0,68            |        | "           | "      | "      | 272:--      |
| " - " -                                                                              | 13                   | 0,50            |        | "           | "      | "      | 200:--      |
| " - " -                                                                              | 14                   | 0,11            |        | 600         | "      | 1400   | 154:--      |
| tomt, - " -                                                                          | 15                   | 0,10            |        | "           | "      | "      | 140:--      |
| <u>Summa alstringsbåtnad</u>                                                         |                      | 19,06           |        |             |        |        | 14068:--    |
| <u>" brukningsbåtnad</u>                                                             |                      |                 |        |             |        |        | 4412:50     |
| <u>Total båtnad</u>                                                                  |                      |                 |        |             |        |        | 18480:50    |
| Lars Persgård den 20 juni 1952.                                                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| I tjänsten:                                                                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
|  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Biträdande gode män:                                                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
|   |                      |                 |        |             |        |        |             |
|   |                      |                 |        |             |        |        |             |

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs utredningar.

| <u>Fastighet o. ägare</u>    | <u>Läge</u>                          | <u>Avloppets<br/>längd<br/>m.</u> | <u>Brukningbåtnad<br/>pr meter<br/>kr</u> | <u>Summa<br/>kr</u> |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <u>Karlanna Lars Persg:n</u> | <u>2<sup>9</sup>, 2<sup>15</sup></u> |                                   |                                           |                     |
| Anders Andersson             | 0+16-1+98                            | 182                               | 3:50                                      | 637:--              |
|                              | 2+4-3+69                             | 165                               | 5:50                                      | 907:50              |
|                              | 3+69-4+89                            | 120                               | 5:50                                      | 660:--              |
|                              | 4+89-5+80                            | 91                                | 5:50                                      | 500:50              |
|                              | 5+80-6+94                            | 114                               | 5:--                                      | 570:--              |
|                              | 6+94-7+90                            | 96                                | 5:--                                      | 480:--              |
|                              | 6+94- C <sup>I</sup>                 | 65                                | 5:50                                      | 357:50              |
|                              | B - B <sup>III</sup>                 | 200                               | 1:50                                      | <u>300:--</u>       |
|                              |                                      | <u>Summa</u>                      |                                           | <u>4412:50</u>      |

Lars Persgården den 20 juni 1952.

I tjänsten:

*Muttanen*

Biträdande gode män:

*Karl Einar Nilsson*  
*Emil Petter Olsson*

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                               | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                               | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                                    |            |                                                      |       |               | kronor  | kronor  |
|                                    |            | <u>Diket A - B - B<sup>I</sup> - B<sup>II</sup>.</u> |       |               |         |         |
| 0-0+16                             | 16         | 250 mm rör                                           | m     | 16            | 3:85    | 61:60   |
| 0+16-3+89                          | 373        | 225 " "                                              | "     | 373           | 3:50    | 1305:50 |
| 3+89-5+34                          | 145        | 200 " "                                              | "     | 145           | 3:--    | 435:--  |
| 5+34-6+94                          | 160        | 150 " "                                              | "     | 160           | 2:40    | 384:--  |
| 6+94-7+90                          | 96         | 125 " "                                              | "     | 96            | 1:80    | 172:80  |
| 7+90-8+58                          | 68         | 100 " "                                              | "     | 68            | 1:30    | 88:40   |
| 0-0+16                             |            | Grävning, lägg. o. återfylln.                        | "     | 16            | 1:30    | 20:80   |
| -3+89                              |            | - " -                                                | "     | 373           | 2:30    | 857:90  |
| -5+34                              |            | - " -                                                | "     | 145           | 2:--    | 290:--  |
| -6+94                              |            | - " -                                                | "     | 160           | 1:70    | 272:--  |
| -7+90                              |            | - " -                                                | "     | 96            | 1:60    | 153:60  |
| -8+58                              |            | - " -                                                | "     | 68            | 1:80    | 122:40  |
| 2+4                                |            | Rörets främragning gm väg                            | st    | 1             | 20:--   | 20:--   |
| 3+53,5+30,<br>6+86 }               |            | - " -                                                | "     | 3             | 10:--   | 30:--   |
| 0                                  |            | Rörledningsöga typ B                                 | "     | 1             | 60:--   | 60:--   |
| 0+16,2+4,<br>3+89, 3 }             |            | Brunn typ A, d=600 mm                                | "     | 4             | 90:--   | 270:--  |
| 4+89,5+34,<br>6+94,7+90,<br>8+58 } |            | " " A, d=450 mm                                      | "     | 5             | 60:--   | 300:--  |
|                                    |            | Arbetsledning och oförutsett                         |       |               | 606:--  | 5450:-- |
|                                    |            | <u>Diket B - B<sup>III</sup>.</u>                    |       |               |         |         |
| 30-30+44                           | 44         | 125 mm rör                                           | m     | 44            | 1:80    | 79:20   |
| 30+44-32+56                        | 212        | 100 " "                                              | "     | 212           | 1:30    | 275:60  |
| 30-30+44                           |            | Grävning,läggning o.återfylln.                       | "     | 44            | 2:20    | 96:80   |
| -32+56                             |            | - " -                                                | "     | 212           | 1:80    | 381:60  |
| 30+44                              |            | Brunn typ C, d=450 mm                                | st    | 1             | 28:--   | 28:--   |

| Läge                                                                                               | Längd<br>m | Arbete, material e. d.           | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad             | Summa          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                    |            |                                  |       |               | kronor              | kronor         |
| 31+47, 32+56                                                                                       |            | Brunn typ A, d=450 mm            | st 2  | 60:--         | 120:--              |                |
|                                                                                                    |            | Arbetsledning o. oförutsett      |       |               | <u>118:80</u>       | 1100:--        |
|                                                                                                    |            | <u>Vallen C - C<sup>I</sup>.</u> |       |               |                     |                |
| 20-22                                                                                              | 200        | Uppläggning till vall            | m 200 | 0:50          | 100:--              |                |
| 22-22+20                                                                                           |            | - " -                            | " 20  | 2:--          | 40:--               |                |
|                                                                                                    |            | Arbetsledning o. oförutsett      |       |               | <u>10:--</u>        | <u>150:--</u>  |
|                                                                                                    |            |                                  |       |               | <u>Summa kronor</u> | <u>6700:--</u> |
| Lars Persgård den 20 juni 1952.                                                                    |            |                                  |       |               |                     |                |
| I tjänsten:<br> |            |                                  |       |               |                     |                |

A r b e t s b e s k r i v n i n g .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är på järndubb i jordfast sten å höjden + 8,98 m. omkring 80 m. öster punkt 6+94 å huvudavloppet.

Lars Persgård den 20 juni 1952.

I tjänsten:





Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karlanna Lars Persgården i Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i västlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. ostsydost Karaby kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - B<sup>I</sup> för huvudavloppet samt B<sup>I</sup> - B<sup>II</sup> och B - B<sup>III</sup> för grendiken härtill. Dessutom skall en låg jordvall uppläggas på sträckan C - C<sup>I</sup> till skydd mot tillrinning av ytvatten från Lars Persgården 2<sup>19</sup>. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött och vallens med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av

all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning uppkommande bruksbåtnad.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skola bekostas av sökanden ensam. Dock skall ägaren till Lars Kämpesgården 1 till sökanden erlägga kr. 60:-- , motsvarande merkostnaden för igenläggning av avloppssträckan O - O+16 med rör. Beloppet är förfallet till betalning, så snart denna del av företaget färdigställts.

Det skall åligga ägaren till Lars Persgården 2<sup>7</sup> att enligt eget åtagande iordningställa (dikessträckan D - D<sup>I</sup> samt ägovägstrumman vid D<sup>I</sup>, så att dikesbotten vid D kommer att ligga högst 8,90 m. och vid D<sup>I</sup> högst 8,70 m. Över det för företaget valda jämförelseplanet med minst 200 mm rör genom vägen. Arbetet bör så bedrivas, att det är färdigt inom ett år efter det detta utlåtande vunnit laga kraft. Det skall även åligga ägaren till Lars Persgården 2<sup>7</sup> att för framtiden underhålla nu ifrågavarande dikessträcka och vägtrumma.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av sökanden erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 27 kronor 72 öre.

---

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Lars Persgårdens dikningsföretag av år 1952".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lars Persgården den 20 juni 1952.

I tjänsten:

*Wentzell*


Biträdande gode män:

*Karl Einar Nilsson*  
*Emil Petter Olsson*

# Typritningar


## Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning  
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A

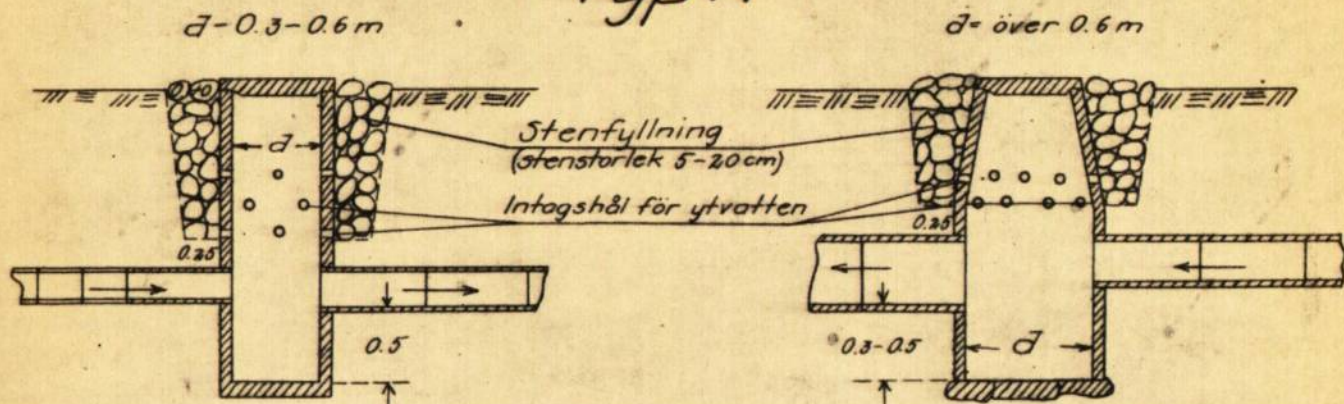


typ B

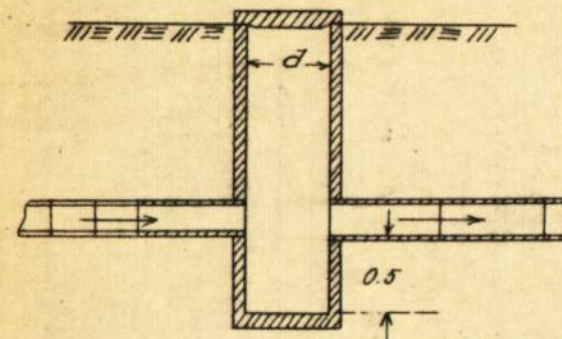


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

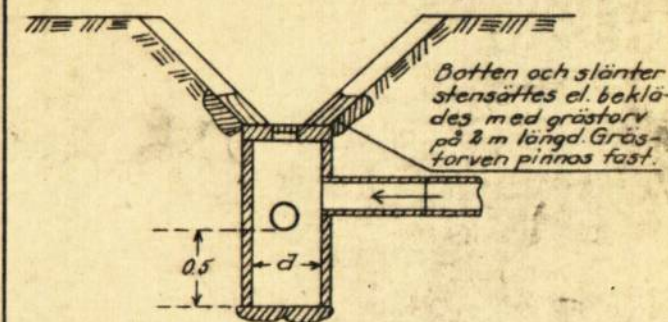


typ C

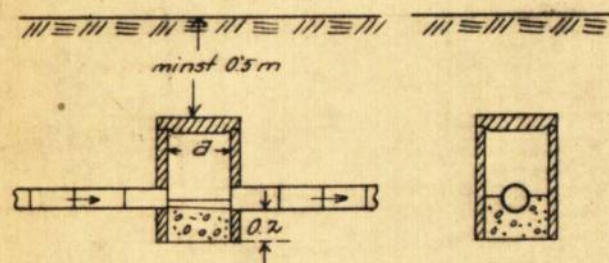


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E

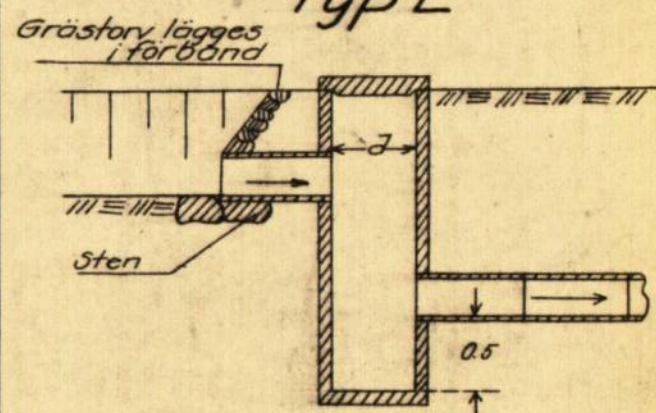

typ F

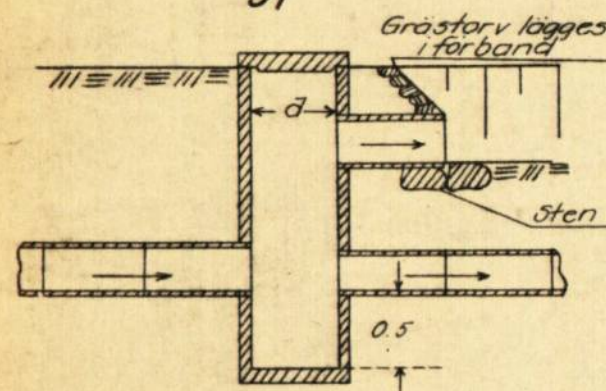

Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$  för 0.45 m brunn  
 $d = 0.3 \text{ m}$  " 0.60 " "  
 $d = 0.5 \text{ m}$  " 0.90 " "

## Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

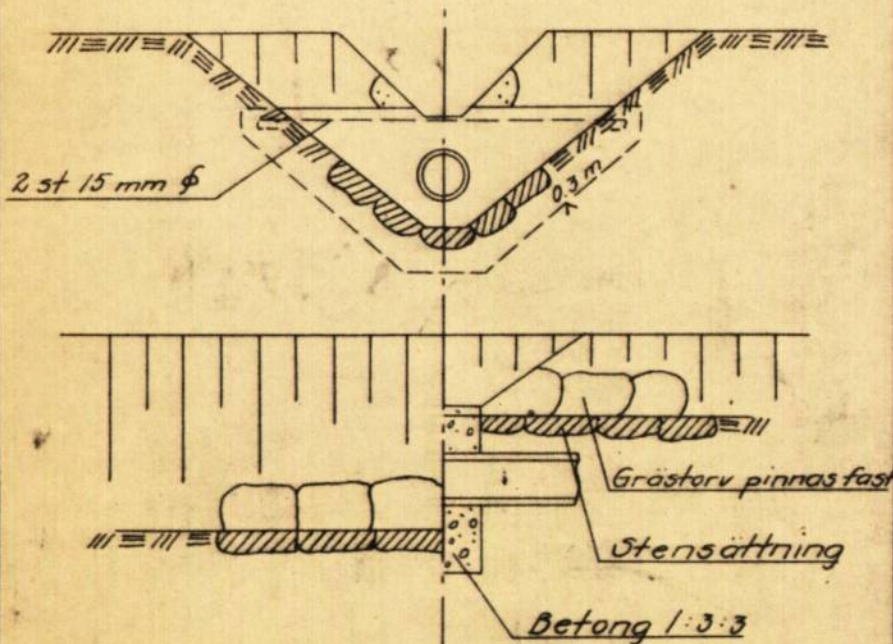

typ A Rörledningsöga typ B

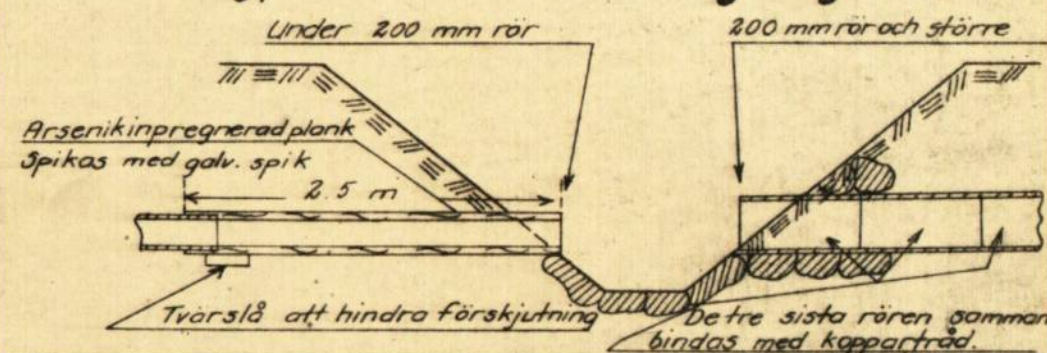

FÖRSLAG TILL

Lars Persgöns dikningsföretag av år 1952

Särestads och Grästorps kommun  
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952  
SOCKEN (NAMN) AV Skaraborgs LÄN  
SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

Kopia

*Lars Persgö*  
(NAMN)  
Lantbruksingenjör  
(TITEL)

LANTBRUKSSTYRELSEN  
17 DEC. 1953

DIARIE Nr  
SÄK Nr


ANTAL RITN ST. 3

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr

# Typritningar

## Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning  
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör



Blad


typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

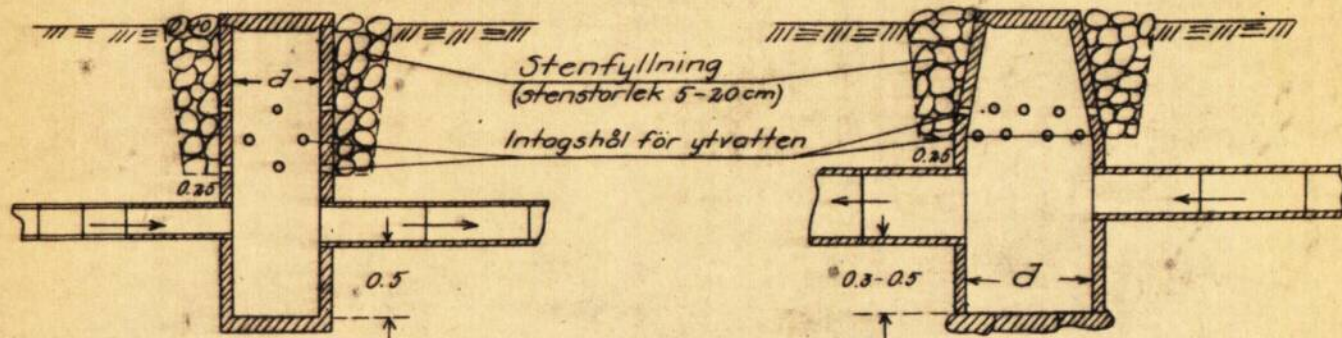


$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$

typ B

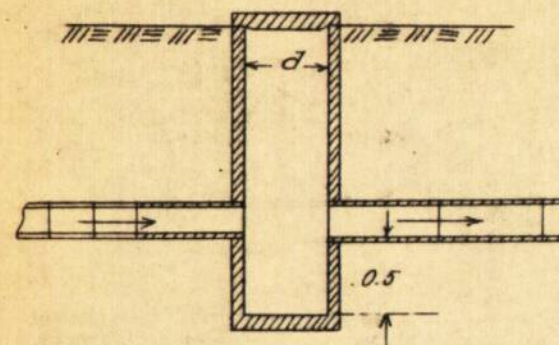


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

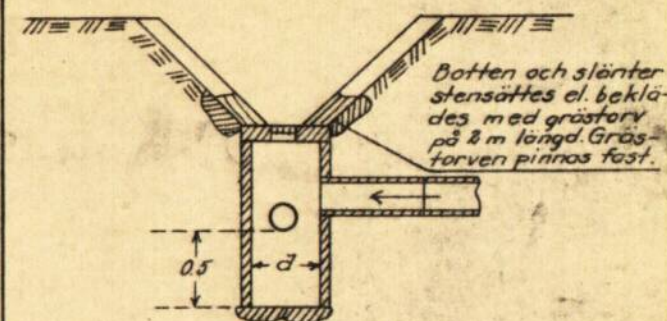


typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E

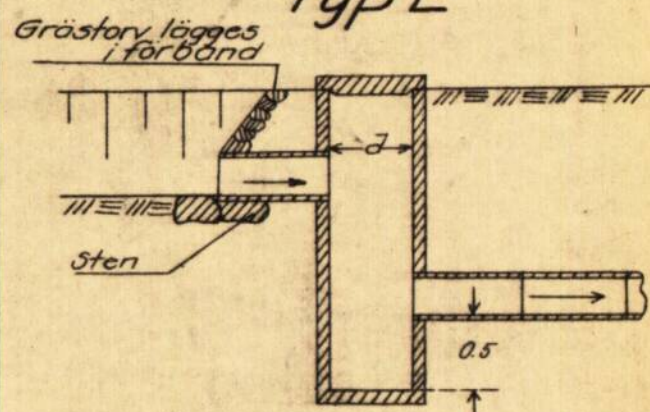

typ F

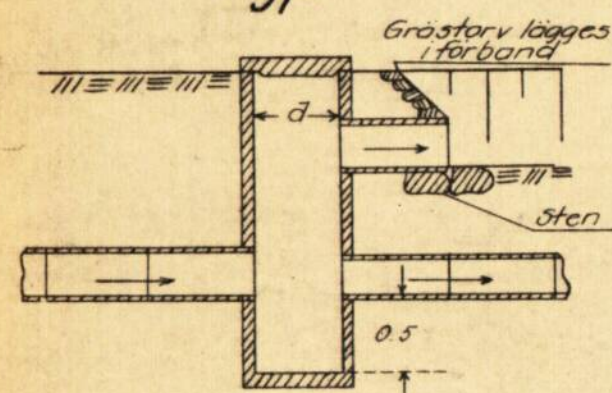

Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$  för  $0.45 \text{ m}$  brunn  
 $d = 0.3 \text{ m}$  "  $0.60$  " "  
 $d = 0.5 \text{ m}$  "  $0.90$  " "

## Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

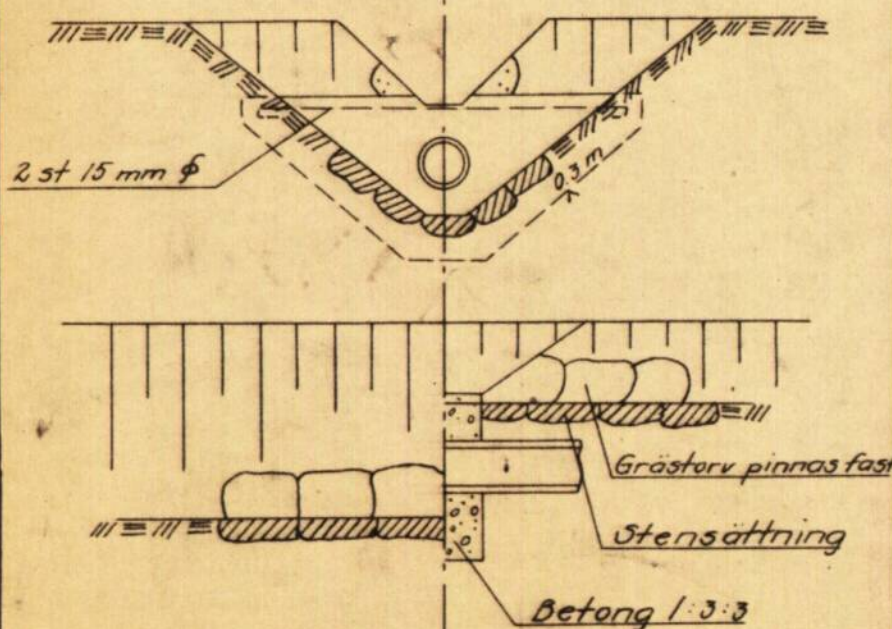

## typ A Rörledningsöga typ B

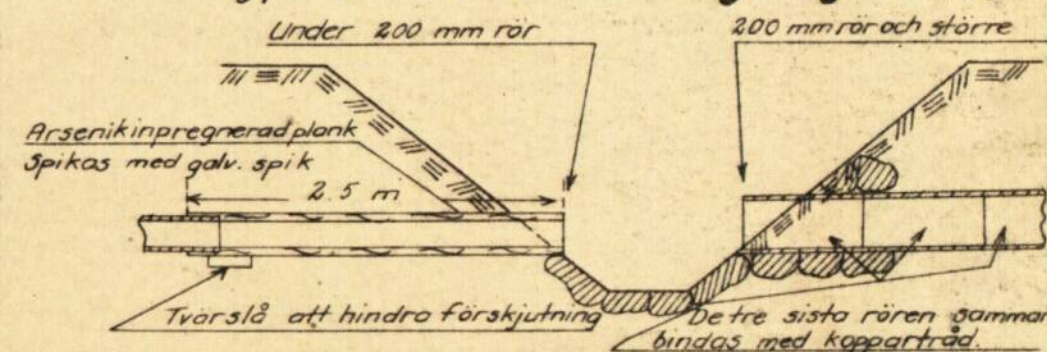

FÖRSLAG TILL

Lars Persgöns dikningsföretag av år 1952

Särestads och Grästorps kommun SOCKEN(NAR) AV Skaraborgs LÄN  
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952 {UTAN} SAMBAND MED SYNERIÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL  
KOPIA

*M. Hallen*  
(NAMN)  
Lantbruksingenjör  
(TITEL)

LANTBRUKSSTYRELSEN  
17 DEC. 1953

DIARIE NR  
SÄK NR

ANTAL RITN ST... 3

KUNGL. LANTBRUKS-  
STYRELSENS ARKIV Nr
