


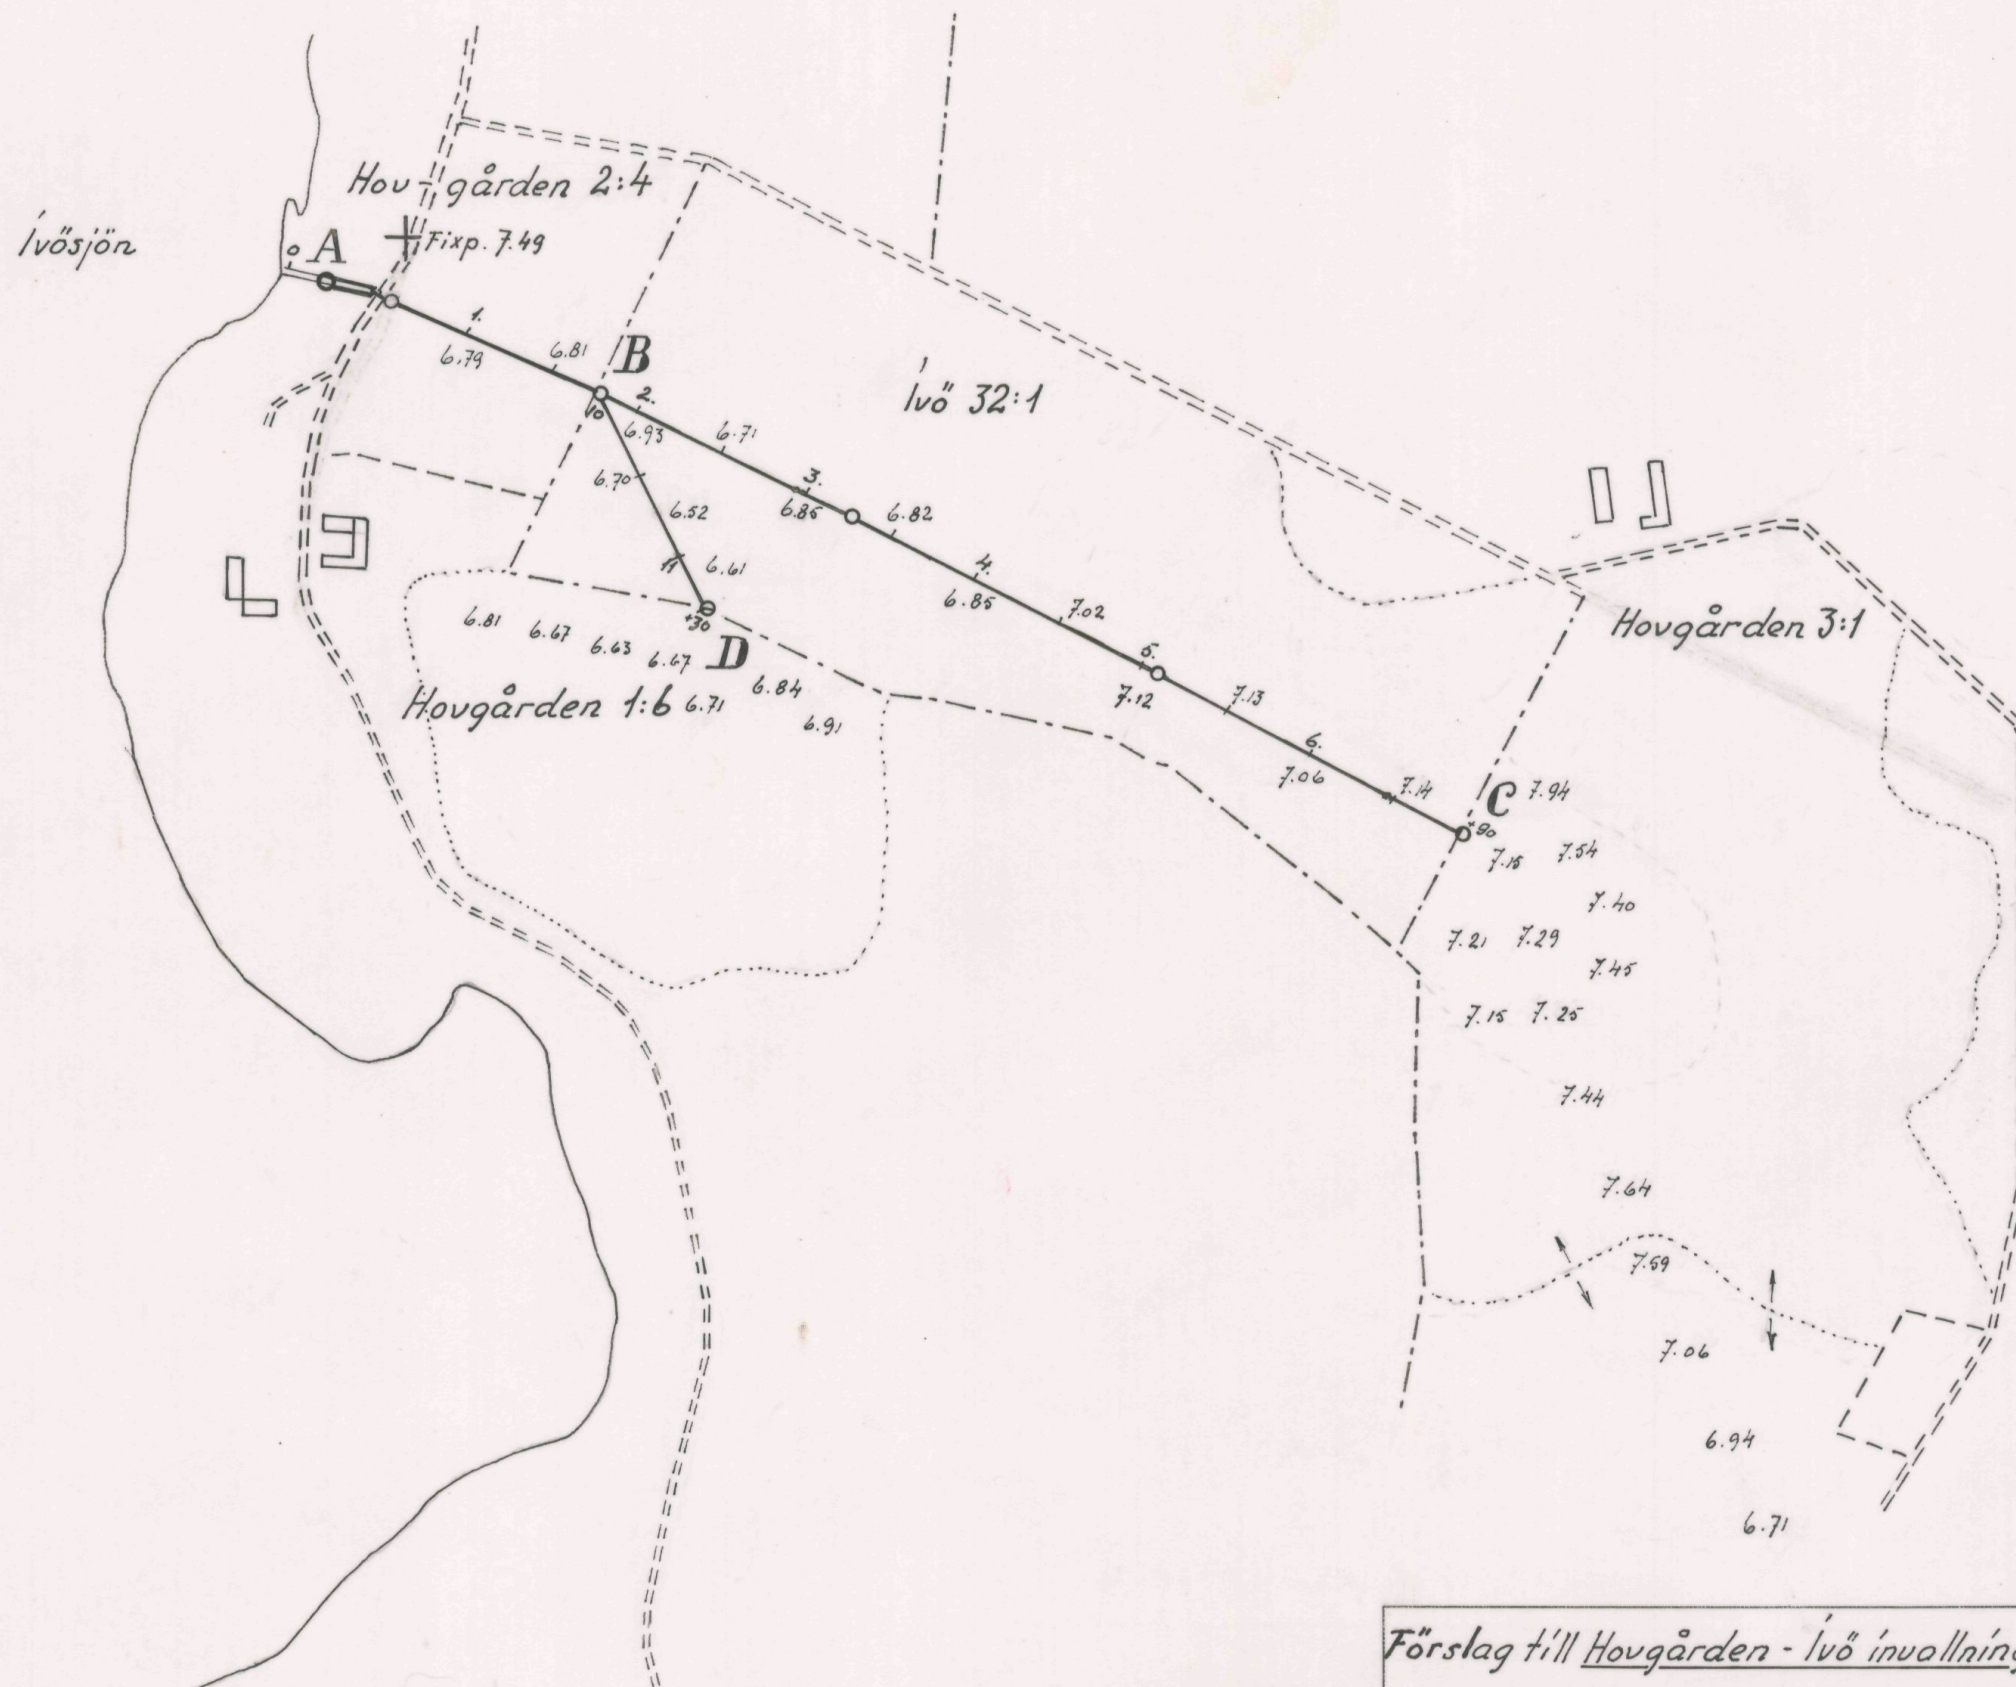



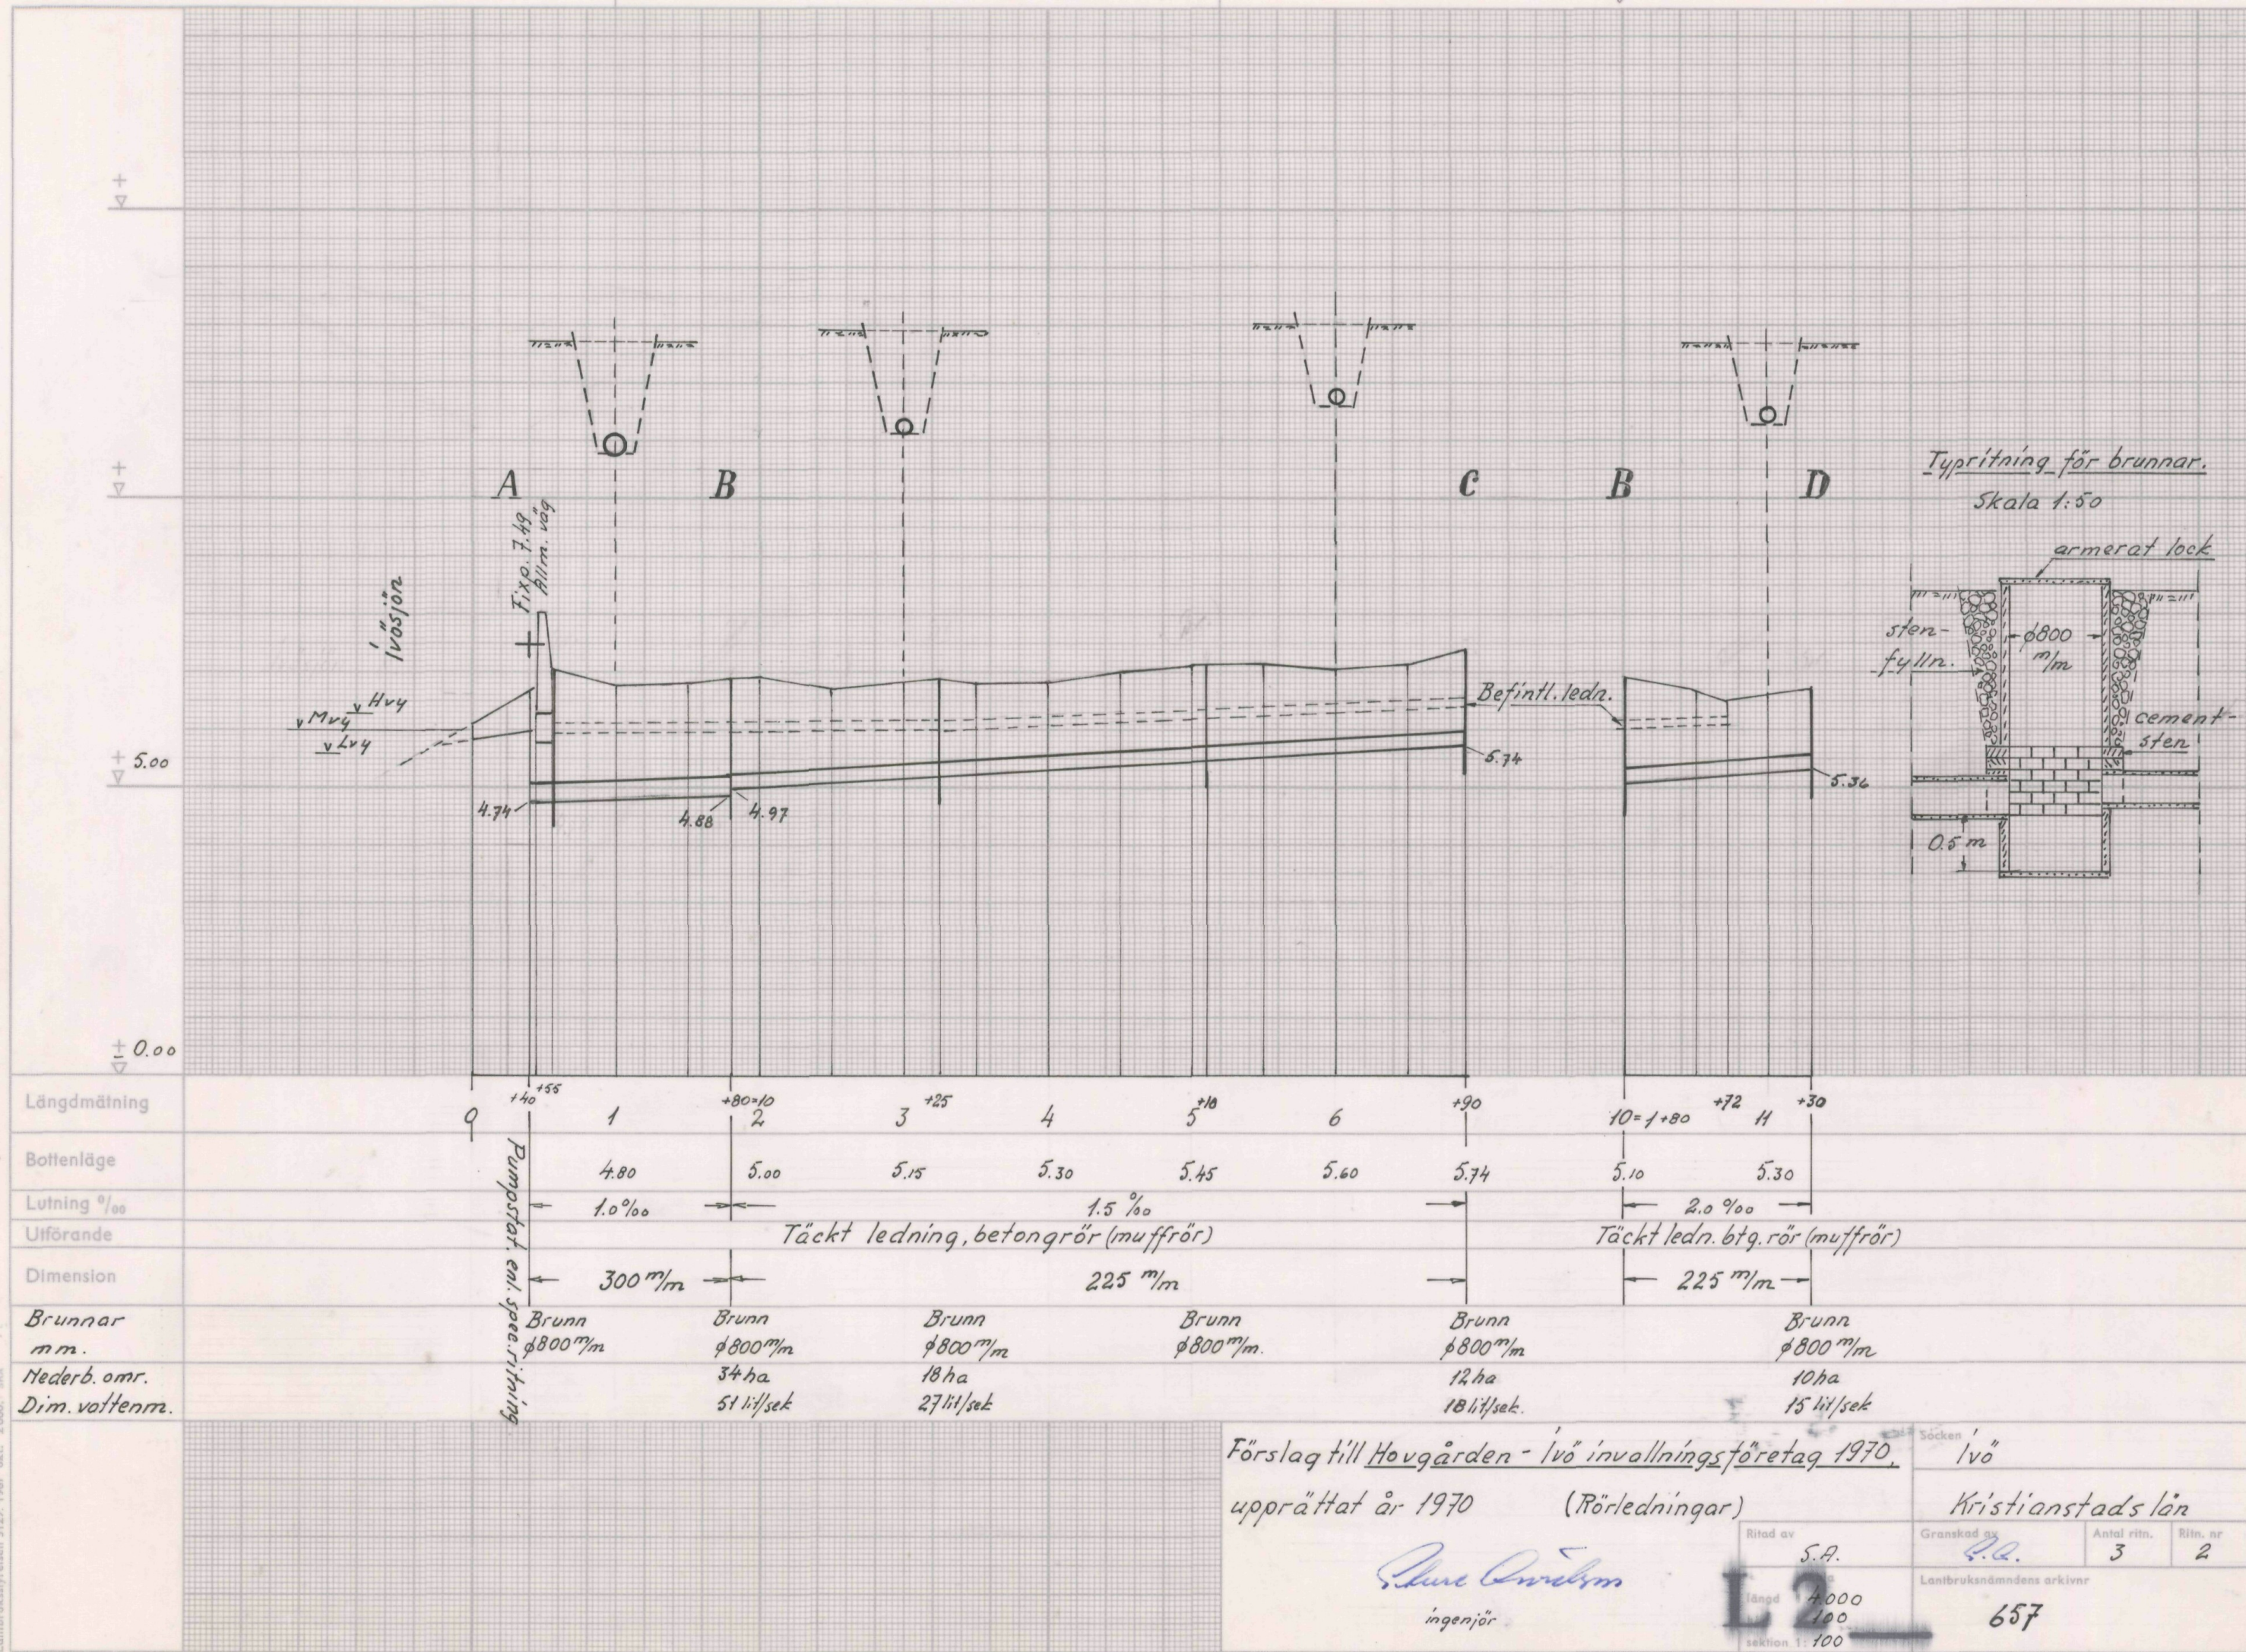


Förslag till Hovgården - Ivö invollningsföretag 1970		Socken Ivö	
upprättat år 1970 (Plankarta)		Län Kristianstads	
Ritad av S. A.	Granskad av S. A.	Antal ritn. 3	Ritn. nr 1
ingenjör		Lantbruksnämndens arkivnr 657	

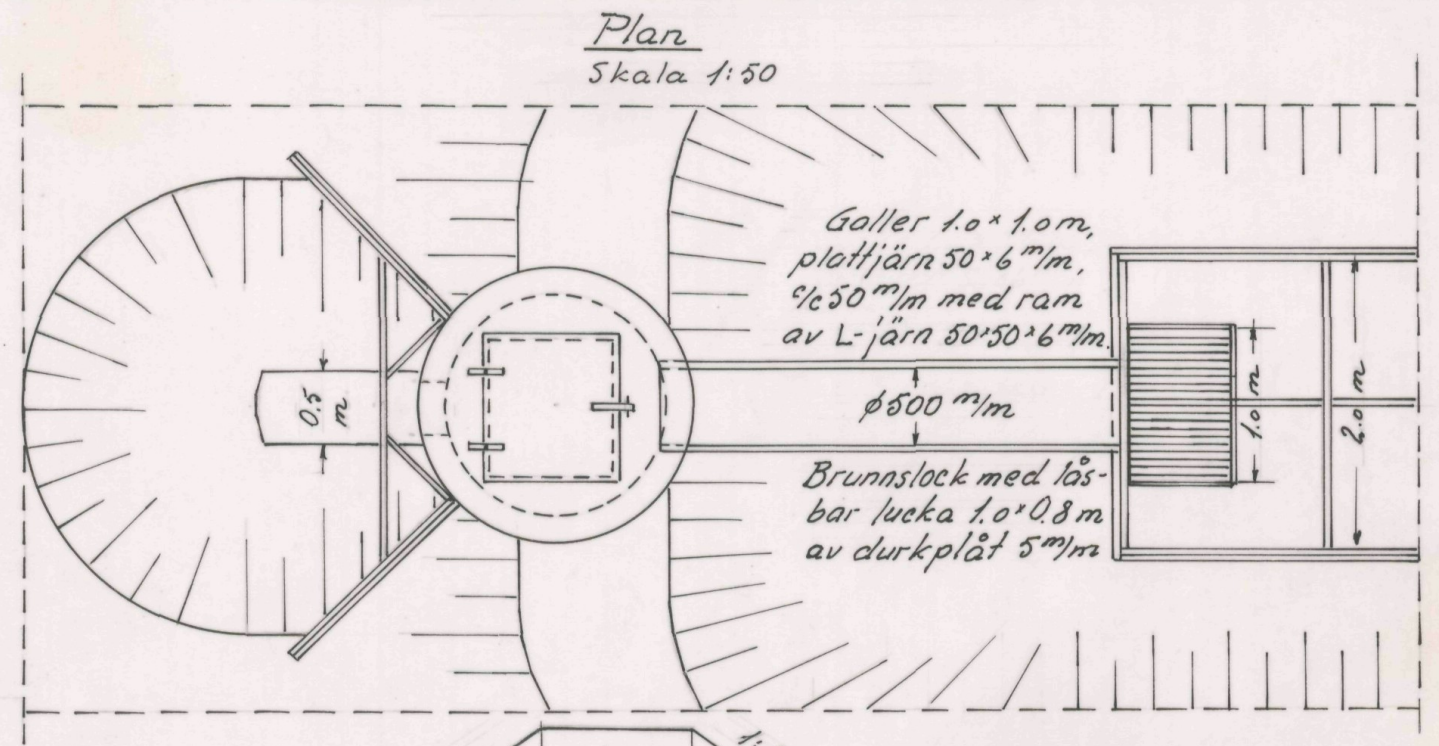

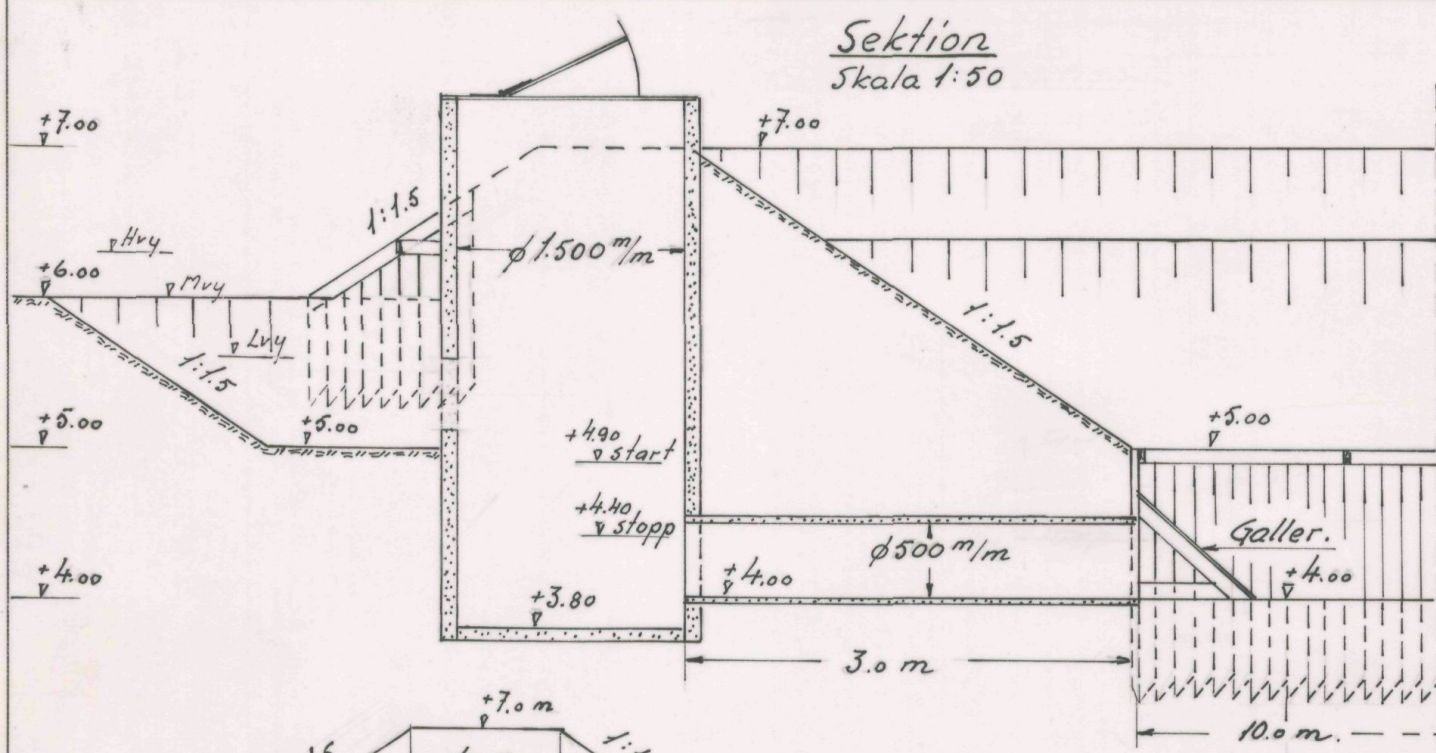

Spontvirke, slag och strövor
av tryckimpregnerad
plank 2" x 5".
Bult och spik galvaniserade.

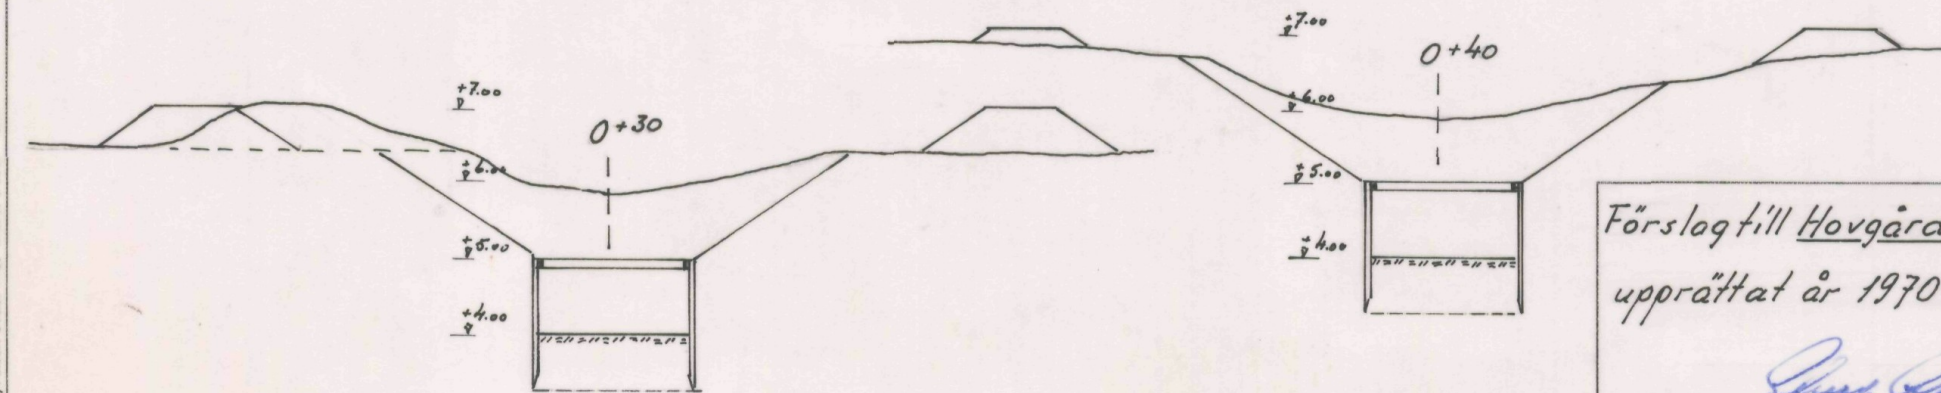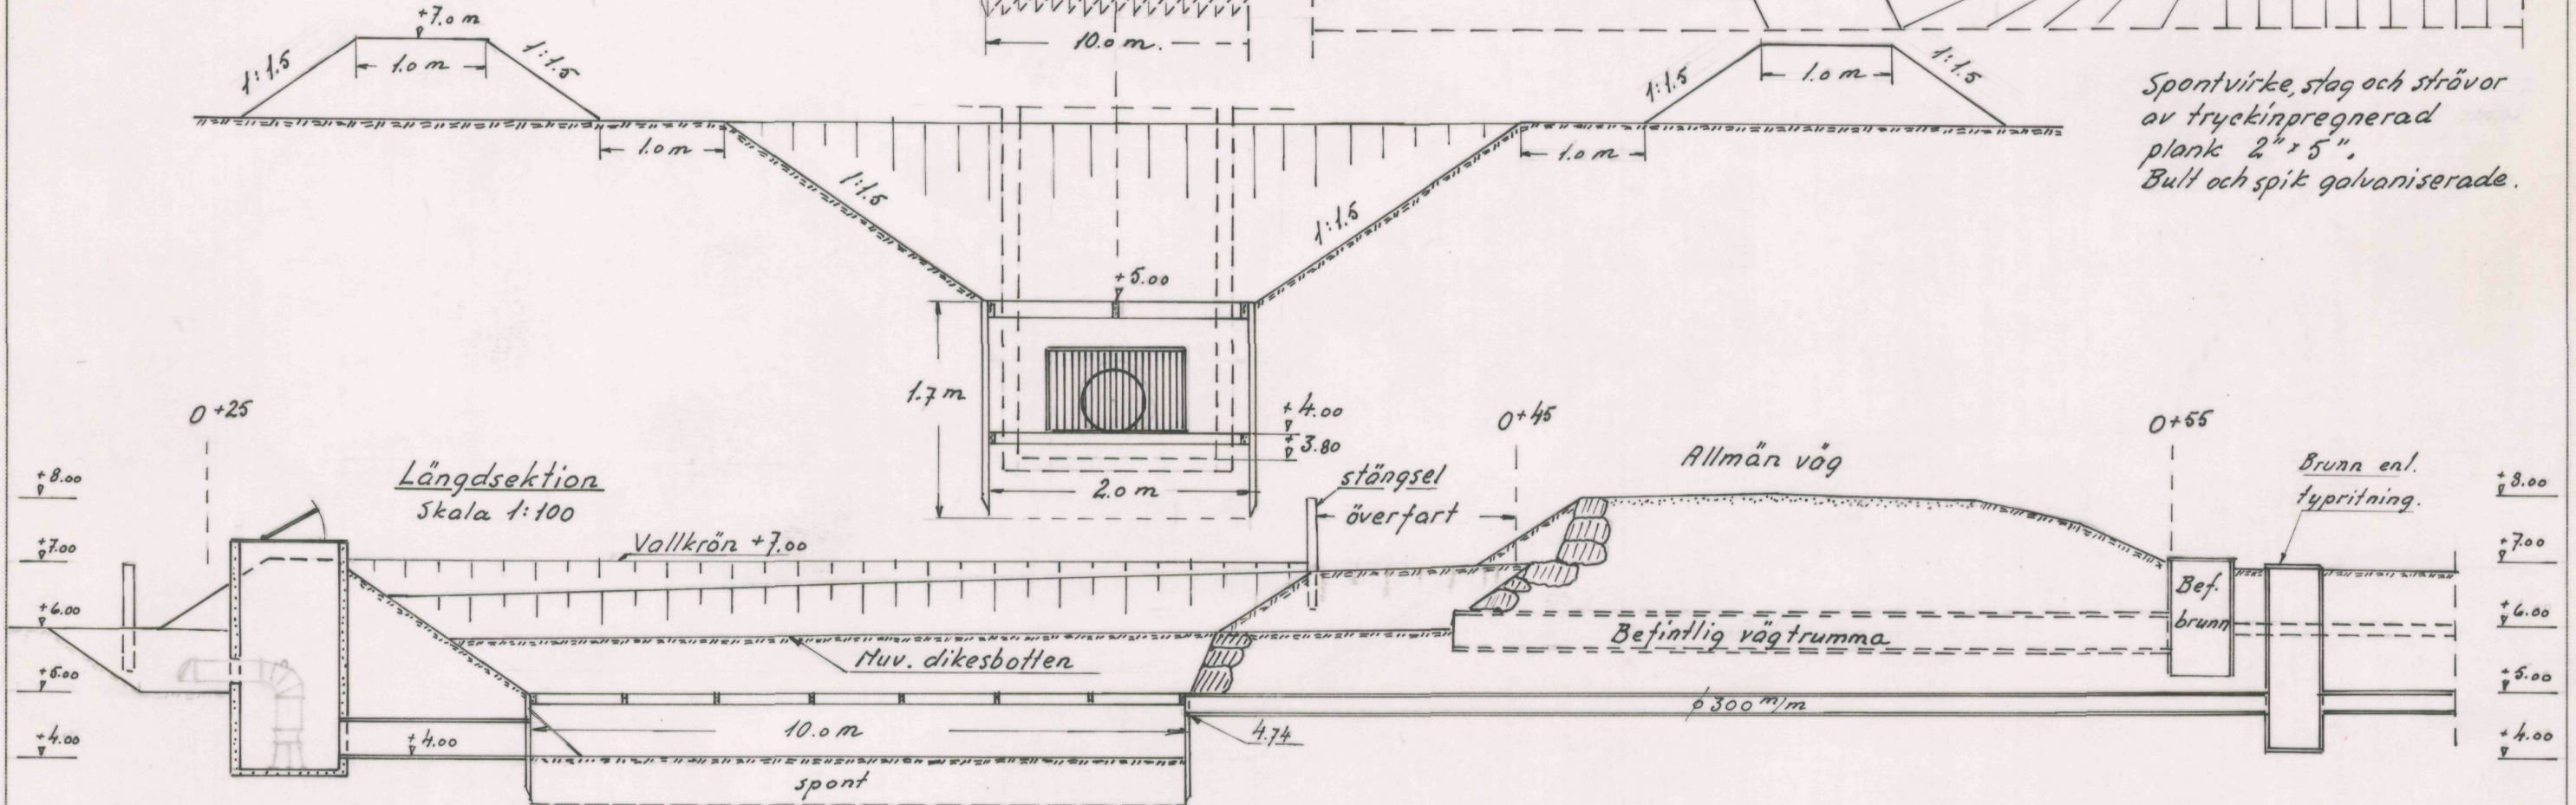

Förslag till Hovgården - Ivö invallningsföretag 1970.
upprättat år 1970 (Pumpstation)

Per Andersson
ingenjör

Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
S.A.	P.O.	3	3
Skala	Lantbruksnämndens arkivnr		
längd 1:			
höjd 1:			
sektion 1:			



Akt nr:

11-L2-657

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

Hovgården - Ivö invallningsföretag 1970

i Ivö socken av Kristianstads län.

Innehåller 5 st skrivna och paginerade sidor
samt åtföljes av 3 st ritningar.

Arkivnr. 657

L 2* 3 * 657

Protokoll fört vid sammanträde med
intressenterna i Hovgården-Ivö in-
vallningsföretag 1970 hos lantbru-
karen Bertil Månsson, Hovgården,
Ivö den 4.7.1970.

Närvarande markägare:

Adjunkt Sune Månsson för Bertil Månsson, Hovgården 2:4,
Lantbrukare Ebbe Malmberg för Hovgården 1:6,
Lantbrukare Bengt Abrahamsson för Ivö 32:1 och
Civ.ing. Arne Wehtje för Hovgården 3:1.

Dessutom närvaro:

Lantbrukare Karl Erik Nilsson, Mossagården, Fjälkinge,
Lantmästare Iwan Bertheau, Mellangården, Ivö samt
undertecknad Sture Arvidson, lantbruksnämnden, Kristianstad.

§ 1.

Arrendatorn av Hovgården 3:1, Karl Erik Nilsson hade hos lantbruks-
nämnden i länet anhållit om upprättande av förslag till torrlägg-
ning av vattenskadad åkermark på nämnda fastighet.

§ 2.

Med anledning härav hade förundersökning gjorts av undertecknad
varvid framkommit, att jämväl nedströms belägna fastigheter skulle
komma att beröras av ifrågasatt dikning samt erhålla nytta av den-
samma.

§ 3.

Framlades förslag till ifrågasatt dikning innebärande utförande
av pumpstation på fast. Hovgården 2:4 samt rörledningar över denna
fastighet och fast. Ivö 32:1 till fast. Hovgården 3:1 och 1:6.
(Dikessträckorna A-B-C och B-D enligt bifogade ritning)

§ 4.

Redogjordes för den beräknade kostnaden för företagets utförande
enligt bifogade kostnadsförslag samt framlades förslag till
kostnadernas fördelning.

§ 5.

Beslöts att företaget skulle komma till utförande samt ingicks
överenskommelse härom genom undertecknande av bifogade förenings-
handling.

§ 6.

Beslöts att styrelse skulle utses för företaget varvid valdes:
Lantbrukarna Karl Erik Nilsson, Ebbe Malmberg och Bengt
Abrahamsson med förstnämnde Karl Erik Nilsson som ordförande.


§ 7.

Undertecknad Arvidson föreslog att originalhandlingarna till före-
taget skulle förvaras på lantbruksnämnden i Kristianstad samt att
sakägarna skulle erhålla avskrift av desamma. Förslaget bifölls av
de närvarande.

§ 8.

Då intet vidare förekom att föra till protokollet avslutades
sammanträdet.

Hovgården pr Ivö den 4.7.1970


Sture Arvidson

F ö r e n i n g

ingången mellan delägarna i Hovgården-Ivö invallningsföretag 1970 i Ivö socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma härmed att utföra ovannämnda torr-lägningsföretag i överensstämmelse med av ingenjör Sture Arvidson, lantbruksnämnden, Kristianstad upprättat förslag och i enlighet med härtill bifogade ritningar samt att härför skola gälla följande bestämmelser:

1. Kostnaden för pumpstationens uppförande med därtill hörande samlingsbassäng, mekanisk och elektrisk utrustning samt framtida underhålls- och driftskostnader för densamma skola fördelas enligt nedanstående andelstal:

21/100 mtl. Hovgården 2:4	
Äg. Bertil Månsson	6,0 %
9/40 mtl. Hovgården 1:6	
Äg. Ebbe Malmberg	20,0 %
19/64 mtl. Hovgården 3:1	
Äg. Arne, Frans, Henrik och Andreas Wethje	35,0 %
19505/36096 mtl. Ivö 32:1	
Äg. Bengt Abrahamsson	39,0 %
Summa:	100,0 %

2. Kostnaden för i företaget ingående dikning och brunnar samt framtida underhåll härav skola fördelas enligt nedanstående andelstal:

21/100 mtl. Hovgården 2:4	
Äg. Bertil Månsson	2,5 %
9/40 mtl. Hovgården 1:6	
Äg. Ebbe Malmberg	20,5 %
19/64 mtl. Hovgården 3:1	
Äg. Arne, Frans, Henrik och Andreas Wethje	36,5 %
19505/36096 mtl. Ivö 32:1	
Äg. Bengt Abrahamsson	40,5 %
Summa:	100,0 %

3. Inga ersättningar av något slag till berörda markägare skola utgå i samband med företagets utförande,
4. För tillsyn och underhållsarbeten skola företagets delägare eller deras ombud hava tillträde till pumpstationen med därtill hörande anläggningar.
5. Företagets angelägenheter skola handhas av en av delägarna i företaget utsedd syssloman.
6. Sysslomannen åligger bl.a. att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utlämna dikningsarbetet till utförande på förmånligaste sätt till kvalificerad entreprenör.

att själv och med biträde av sakkunning person från lantbruksnämnden övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna.

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa härför inför delägarna.

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla dessa till sammanträde.

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast fjorton dagar därefter skall vara tillgängligt för delägarna.

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

7. Kostnaderna för upprättande av förslag till företagets utförande jämte de utgifter som föranledes av kontroll av arbetet skola utdebiteras enligt pkt. 1 ovan.

~~Hovgården pr Ivö den 4/7 1970~~

8. Att vid en event. framtida försäljning av berörda fastigheter skall oavstående överenskommelse intagas i köpekontraktet att gälla för ny ägare.

Hovgården pr Ivö den 4/7 1970

Anne Wenj
för egen del och för omyndiga
Frens, Huvik & Andreas Wenj

Beugt Abeliansson
Ebbe Malmberg
Berit Hånsen
m. Ellen Hånsen

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		till Hovgården-Ivö invallningsföretag 1970					
		i Ivö socken av Kristianstads län.					
		<u>Avloppet A-B-C.</u>					
		<u>Dikessträckan A-B.</u>					
		<u>Pumpstat. vid A.</u>					
0+25-0+40	15	Schaktning för pumpstation och samlingsbassäng.	m ³	100	3:-	300:-	
		Spontning för pumpstation, material, lönshållning jämte arbetskostnad här- för.				750:-	
		Permanent spontning av samlingsbassäng 2" tryck- impregnerad plank, material och arbetskostnad.	m ²	50	30:-	1.500:-	
		Pumpbrunn av arm. betong- rör (brunnringar) med ingjuten arm. botten enl. ritn. inre diam. 1.500 mm jämte tilloppsrör ø 500 mm, samt permanent spont vid utlopp, material och arbetskostnad.	st	1	1600:-	1.600:-	
		Låsbart lock till brunn av 5 mm durkplåt.	st	1	150:-	150:-	
		Rensgaller enl. ritn. 1,0 x 1,0 m	st	2	100:-	200:-	4.500:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges.					500:-
							<u>Summa kronor: 5.000:-</u>
		<u>Pumputrustning.</u>					
		Anslutningsavgift för elektr. kraft.	st	1	500:-	500:-	
		Pump av propellertyp med en kap. av 60 lit/sek vid 1,5 m. lyfthöjd jämte st avloppsrör och klaffventil.	st	1	6000:-	6.000:-	
		Elektrorelä för automatisk drift.	st	1	250:-	250:-	
		Instrumentering, motor skydd, strömbrytare samt instrumentskåp.			500:-	500:-	
		Emballage, frakt, montering			500:-	500:-	7.750:-
		Överföres:					7.750:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Överfört:					7.750:-
		För oförutsedda fall tillägges.					750:-
					Summa	kronor	8.500:-
		<u>Dikning.</u>					
0+40-6+90	650	<u>Avloppet A-B-C.</u>					
0+40-1+80	140	<u>Dikessträckan A-B.</u>					
		Täckt ledning, betongrör, inre diam. 300 mm.					
		Inköp & frakt av rör.	m	140	13:-	1.820:-	
		Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning.	m	140	7:50	1.050:-	
0+45-0+55		Tillägg för genomgång av allm. väg samt vägbanans återställande.	m	10	25:-	250:-	
0+55, 1+80		Intagsbrunnar enl. typ- ritning, inre diam. 800 mm.	st	2	300:-	600:-	3.720:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges.					280:-
					Summa	kronor:	4.000:-
1+80-6+90	510	<u>Dikessträckan B-C.</u>					
		Täckt ledning, betongrör, inre diam. 225 mm.					
		Inköp & frakt av rör.	m	510	9:-	4.590:-	
		Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	m	145	6:-	870:-	
1+80-3+25	145						
3+25-6+90	365	Do	m	365	5:-	1.825:-	
3+28, 5+10		Intagsbrunnar enl. typ- ritning, inre diam. 800 mm.	st	3	275:-	825:-	8.110:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges.					890:-
		Överföres:			Summa	kronor:	9.000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
10-11+30	130	Överfört:					9.000:-
		<u>Avloppet B-D.</u>					
		Täckt ledning, betongrör, inre diam. 225 mm.					
		Inköp & frakt av rör.	m	130	9:-	1.170:-	
		Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikes- jordens återfyllning	m	180	5:-	650:-	
		Intagningsbrunn enl. typ- ritning inre diam. 800 mm.	st	1	275:-	275:-	2.095:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges.					205:-
						Summa kronor:	2.300:-
		<u>Sammandrag.</u>					
		Pumpstation				5.000:-	
		Pumputrustning				8.500:-	13.500:-
		Dikning A-B				4.000:-	
		-"- B-C				9.000:-	
		-"- B-D				2.300:-	15.300:-
						Summa kronor:	28.800:-
		<u>Driftskostnader.</u>					
		Nederbördsområde c:a 40 ha. Årsnederbörd m:tal 650 mm varav 40 % beräknas få pumpas. Lyfthöjd 1,5 m. Verkningsgrad 60 % Energibehov: $400.000 \times 0,65 \times 40 \times 1,5$ $100 \times 367 \times 0,60$	kwt	750	0,10	75:-	
		Abonnemangavgift, årlig underhåll, smörjmedel, tillsyn m.m.				325:-	
						Summa kronor:	400:-
		Kapitaliserat efter 7 % motsvarar årliga drifts- kostnader ett kapital av 400×100 7,0					5.700:-
						Summa kronor:	5.700:-
Kristianstad den 4/7 1970							

[illegible]
