



Akt nr:
R-E1a-1444

AU\$R-E1a-1444

3939-5

R 5-1444

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR 1952
DIARIÉ Nr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Sjöbonäs-Backens dikningsföretag av år 1951"

i Hjo lands socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

5 x 1444

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Sjöbonäs-Backens dikningsföretag av år 1951"

Socken

Hjo stad

Län

Skaraborgs

~~XXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXX~~

Godsägare Kurt Ahlström, Sjöbonäs, Hjo

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr	(Avskrivningslån nr I 802 a, b, c/3018)	
28/3 1952	5.590:--		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	170:--	-	-
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1956	-	1/9 1955	-

Vid besiktning, som verkstälts av undertecknad

den 21/12 1955


, har befunnits att samfälligheten F - G var utförd

enligt fastställd plan.

Då samfälligheterna A - C och M - O tidigare avsynats, är företaget i sin helhet utfört, vilket härmed till bevis bestyrkes.

Skara den 4 januari 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Anm. Av det beviljade avskrivningslånet har kr 5.420:-- utanordnats den 12/7 1952.

1.
Protokoll vid Öpmu-
förättning enligt vatten-
lagen för kortläggning
av område till Årander
Backen och Hjörbonäs
i Hjo lands socken av
Åranderborgs län.

Den 9 november 1944 i Hjörbonäs.

Närvarande: Undersekr. statens
lantbruksingenjör och förättningsman,
samt sökandena:

P. G. Sahlström äg. 1/2 del Backen 1' och
Edert Ahlström " 3 " Hjörbonäs 2'

§ 1
Upplästes det för förättningsmannen
utskrivet förordnandet, som hade be-
ställt enligt län. A.

§ 2
Något för emot förättningsmannen
kunde inte utvisas.

§ 3
Sökande yrkade på upprättande av
nödiga utlopp för ändamålsenlig
kortläggning av deras marker, som
i fråga om Hjörbonäs skulle beaktas
i samband med överensstämmelse med
upprättad stäckdikningsplan, som
föreligger.

De ingen annan än sökandena
gjorda beordras av företaget, öm-
skade dessa, att förättningen hand-
togs utan förbehåll av gade man.

24.
§ 4
Som vidt vidare fanns att den
protokollat anbedna, förklarades
sammanträdets upplöst med till-
räkna givande att sedan undersök-
ningen samfällighets och förslag
till dikningen för dig ställdes, nytt
sammanträde hölls och att hållas
i ort och tid, som förklarades samman
att för sakägarna tillräkna givas.
Ort och tid som ovan.

Y Hjärtan:

Stenfallin

Den 12 april 1951 i Göteborg.

Närvarande: Måttedsmän för rättning
man samt förklarades saksträn och
allsträn.

§ 5
Förklarades det upprättade förslaget
till ordnande av adolfsprågen plan
i präga varande marken med därtill
förklarade handlingen.

§ 6
Upplästes förordningens
utlåtande, som hade lydelse en-
ligt l. 4.

§ 7
Heltäckande riktiga förordning om
förslaget utlåtande och under-
kastad enligt det upprättade för-
slaget, l. 5.

§ 8.

att mätta och förvara till förtäring
 förädlade handlingen och ritningar
 ut till förädlingsmannen godnjare
 Thors Alström, Gjöbornas.

§ 9

7 pruga 1 an. förädlings kost-
 naderna. När visades till avodes-
 saken, varao ett exemplar
 skulle överlämnas till odel-
 förvararen.

§ 10

Som ritat vidare finns att
 till protokollet utseckna, för-
 klardes förädlningen avslutad
 och ockmanträdets upplöst.

Ost och till som oren

Stjärten:

Wenthallin

E. D. 77-49
19 44

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Backen mfl i Hjo lands socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Hjo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

R. G. Lahlström

adress

Backen

pr

Hjo

Telefon:

Hjo 92

Skara

den

17 juli

19 44

R. G. Lahlström

E. D. Lahlström (tel. 208)

5.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ljööns
Backen

Ägarens namn:

Runt Ahlsbom
R. G. Ahlsbom

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och inf. väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1/8 1944.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Undertecknade förena oss härmed om utförandet och framtida underhållet av "Sjöbonäs-Backens dikningsföretag av år 1951" enligt det av lantbruksingenjör S.Hallin upprättade och denna dag framlagda förslaget.

Sjöbonäs den 11 april 1951.

Rudolf Ahlström R. G. Lohström

*Beaktas:
S. Hallin*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hjo Landskommun</u>							
<u>3 mtl Sjöbonäs 2¹</u>							
Kurt Ahlström							
åker, mullrik sand på sandbl. lera	1	3,50		1280	1600	320	1120:-
" - " -	2	3,74		880	"	720	2693:-
" - " -	3	0,83		960	"	640	531:-
" - " -	4	1,83		1120	"	480	878:-
" - " -	4a	0,45		1280	"	320	144:-
" - " -	5	0,47		1120	"	480	226:-
" - " -	6	0,39		"	"	"	187:-
" - " -	7	0,41		"	"	"	197:-
" - " -	8	0,59		"	"	"	283:-
" - " -	9	0,64		640	"	960	614:-
" - " -	10	0,34		"	"	"	326:-
" - " -	11	0,27		1040	"	560	151:-
" - " -	12	0,24		"	"	"	134:-
" - " -	13	0,38		1120	"	480	182:-
" - " -	14	0,37		"	"	"	178:-
" - " -	15	0,54		640	"	960	518:-
" - " -	16	0,46		"	"	"	442:-
" - " -	17	0,28		1040	"	560	157:-
" - " -	18	0,35		"	"	"	196:-
" - " -	19	1,42		1120	"	480	682:-
Äng, - " -	20	-	0,75	700	1400	700	525:-
åker, - " -	21	1,13		640	1600	960	1085:-
	Summa	18,63	0,75				11449:-
<u>1/2 mtl Backen 1¹</u>							
R.G. Sahlström							
åker, mullrik sand på sandbl. lera	22	1,40		960	1600	640	896:-

Sjöboms den 11 april 1951

Beräkning av brukningsbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av Fält-arronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m	Å-pris kronor	Båtnad kronor	Summa kr.
<u>Samfälligheten A - C</u>					
<u>3 mtl Sjöbonäs 2¹</u>					
Kurt Ahlström	B - B ²	298	7:-	2086:-	
	B - C	310	-	<u>95:-</u>	2181:-
	Summa samf.				<u>2181:-</u>

<u>Samfälligheten M - O</u>					
<u>3 mtl Sjöbonäs 2¹</u>					
Kurt Ahlström	M - N	150	-	95:-	95:-
	{ 40+28-42+50	222	5:-	1110:-	
	{ 42+50-43+88	138	4:50	<u>621:-</u>	1731:-
	{ 45-45+50	50	7:50	375:-	
	{ 45+50-47+20	170	-	<u>47:-</u>	422:-
	{ 55+64-53+50	214	-	47:-	
	{ 53+50-	152	4:-	608:-	
	{ -Krök				
	{ Krök-R	85	4:-	<u>340:-</u>	995:-
	{ 64-83-63+7	176	2:50	440:-	
	{ 63+7-62+30	77	-	-	
	{ 62+30-60+74	166	4:-	664:-	
	{ 60-60+74	74	-	<u>47:-</u>	1151:-
	Summa samf				<u>4394:-</u>

Skara den 11 april 1951

Meddelande


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - C.</u>						
<u>Diket A - B - C.</u>						
0-0+75	75	Lera med något sand m ³	48	1,80	86:40	
0+75-3+85	310	10" rör med frakt	310	2:50	775:-	
		Grävning,läggning o. återfylln.m	310	1:20	372:-	
2+60,3+85		Brunn typ Ad=0,6 m st	2	75:-	150:-	
0+75		Rörledningsöga st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			146:60	1570:-
<u>Diket B - B².</u>						
11+24-14+22	298	250 mm:s rör med frakt m	298	2:50	745:-	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	298	1:20	357:60	
14+22		Brunn Ad=0,6 m st	1	75:-	75:-	
11+24		Rörledningsöga st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			122:40	1340:-
Summa kronor						2910:-
<u>Samfälligheten F - G</u>						
22+50-20+50	200	100 mm:s rör med frakt m	200	1:-	200:-	
		Grävning,läggning o. återfylln. "	200	0,60	120:-	
20+50		Brunn typ Ad=0,37 m st	1	40:-	40:-	
22+50		Täckdikesöga st	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			45:-	430:-
Summa kronor						430:-
<u>Samfälligheten M - O.</u>						
<u>Rördiket M - M^I.</u>						
30-31+4	104	250 mm:s rör med frakt m	104	2:50	260:-	
		Grävning läggning o. återfylln."	104	2,05	213:20	
31+4		Brunn typ Ad=0,6 m st	1	75:-	75:-	
Överföres					548:20	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			548:20	
30		Rörledningsöga st	1	40:-	40:-	
		Genomgrävning av väg		10:-	10:-	
		Arbetsledning och oförutsett			61:80	660:-
		<u>Rördiket M - N.</u>				
25-26+50	150	150 mm:s rör med frakt m	150	1:60	240:-	
		Grävning,läggning o. återfylln. "	150	1:60	240:-	
26+50		Brunn typ Ad=0,45 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			60:-	590:-
		<u>Rördiket M - O.</u>				
35-38+70	370	225 mm:s rör med frakt m	370	2:30	851:-	
		Grävning,läggning o. återfylln.m	370	2:00	740:-	
38+70-39+65	95	150 mm:s rör med frakt m	95	1:60	152:-	
		Grävning,läggning o. återfylln."	95	1:60	152:-	
38+70		Brunn typ Ad=0,6 m st	1	75:-	75:-	
39+65		" " Ad=0,45 m "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			180:-	2200:-
		<u>Rördiket K - L.</u>				
40-40+28	28	150 mm:s rör med frakt m	28	1:60	44:80	
		Grävning,läggning o. återfylln."	28	1:60	44:80	
40+28-41+40	112	125 mm:s rör med frakt m	112	1:25	140:-	
		Grävning,läggning o. återfylln."	112	1:40	156:80	
41+40-44+70	330	100 mm:s rör med frakt m	330	1:-	330:-	
		Grävning,läggning o. återfylln."	330	1:30	429:-	
40		Täckdikesöga st	1	30:-	30:-	
44+70		Brunn typ Ad=0,45 m "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			124:60	1350:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket H - I.</u>						
45-45+50	50	150 mm:s rör med frakt	m	50	1:60	80:-
		Grävning,läggning o. återfylln.	m	50	1:60	80:-
45+50-47+20	170	100 mm:s rör med frakt	"	170	1:00	170:-
		Grävning,läggning o. återfylln."	170	1:30	221:-	
45+50,47+20		Brunn typ Ad=0,37 m.	st	2	40:-	80:-
		Arbetsledning och oförutsett			69:-	700:-
<u>Rördiket R - P.</u>						
53+50-55+86	236	225 mm:s rör med frakt	m	236	2:30	542:80
		Grävning,läggning o. återfylln."	236	1:60	377:60	
51+17-53+50	233	200 mm:s rör med frakt	m	233	2:-	466:-
		Grävning,läggning o. återfylln."	233	1:45	337:85	
50-51+17	117	150 mm:s rör med frakt	m	117	1:60	187:20
	117	Grävning,läggning o. återfylln."	117	1:20	140:40	
52+36,55+13		Brunn typ C	2	30:-	60:-	
53+50,51+17 50		Brunn typ Ad=0,45	st	3	50:-	150:-
55+86		Rörledningsöga	"	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			238:15	2540:-
<u>Rördiket E - D.</u>						
65+27-65+35	8	225 mm:s rör med frakt	m	8	2:30	18:40
		Grävning,läggning o. återfylln." genom väg	8	3:-	24:-	
62+30-65+27	297	200 mm:s rör med frakt	m	297	2:-	594:-
		Grävning,läggning o. återfylln."	297	1:50	445:50	
60-62+30	230	150 mm:s rör med frakt	"	230	1:60	368:-
		Grävning,läggning o. återfylln."	230	1:40	322:-	
65+27,62+30 60+74,60	4	Brunn typ Ad=0,45	st	4	50:-	200:-
65+35		Rörledningsöga	"	1	40:-	40:-
		Arbetsledning och oförutsett			208:10	2220:-
Summa kronor						10260:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - C				2910:-
		" F - G				430:-
		" M - O				10260:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>13600:-</u>

Sjöbonäs den 11 april 1951.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesrännor skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdiknesstammar, som berättigas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att förtroendemannen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat

virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är;

För samfälligheten A - C

Höjdläge + 20,47, fix—|— = format märke inhugget i jordfast sten vid pkt 65 + 35 (D) vid vägkanten å vägens norra sida och omkring 68 m N.N.V.
B^{II}.

För samfälligheten F - G

Samma fixpunkt gäller, som för samf. A-C, omkring.

För samfälligheten M - O.


Höjdläge +25,60, fix—|— =format märke inhugget i jordfast sten omkring 196 m väst nordväst K å norra sidan ägoväg och 50 m söder pkt 52+8.

Sjöbodäs den 11 april 1951.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - C</u>						
<u>3 mtl Sjöbonäs 2¹</u>			<i>äker areal + små mark</i>			
Kurt Ahlström	55.200.-	s	4473:-	350 - 151	2457:35	84,445
<u>1/2 mtl. Backen 1¹</u>						
R.G. Sahlström		s	967:-	77 - 33	452:65 ^{x)}	15,555
Summa			5440:-		2910:-	100,000 21.40
<u>Samfälligheten F - G</u>						
<u>1/2 mtl Backen 1¹</u>						
R.G. Sahlström		s	735:-		430:-	100,000 3.16
<u>Samfälligheten M - O.</u>						
<u>3 mtl Sjöbonäs 2¹</u>						
Kurt Ahlström	55.200.-	s	13551:-		10260:-	100,000 75.44
^{x)} Begränsad						
Sjöbonäs den 11 april 1951.						
<i>[Signature]</i>						

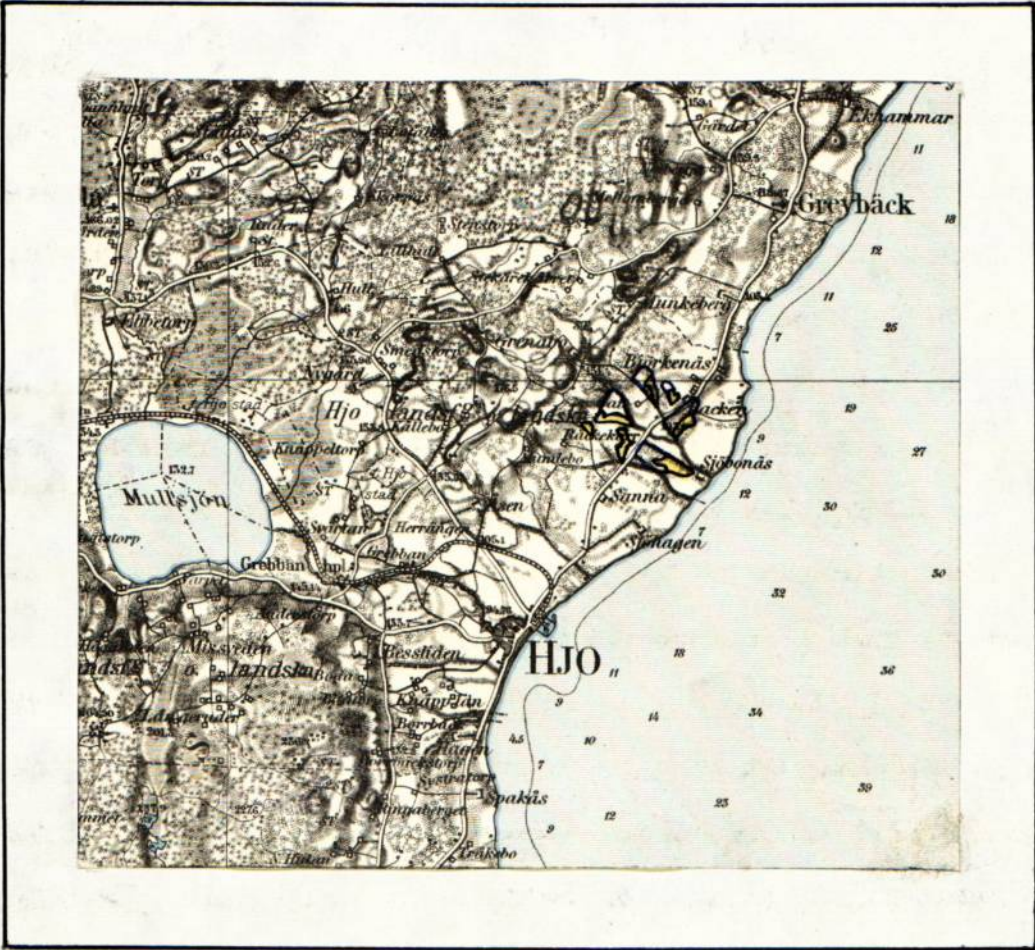

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Sjöbonäs o. Backen
i Hjo lands- socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km nordost Hjo inom Vätterns nederbördsområde, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. På sökandenas begäran har förrättningen handlagts utan biträde av gode män. Andra än sökandena beröres ej av företaget.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med del dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C, B - B^{II}, D - E, F - G, H - I, K - L, M^I - M - N, M - O och P - R. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvärne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meter djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningens medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom företaget uppkommande bruksbåtnad.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på sökandena i kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon ersättning för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ej utgå.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten under- A-C , F-G stiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten M - O skall sådan avgift så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 20 kronor 30 öre,

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas:

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slutt före utgången av år 1956,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sjöbonäs-Backens dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Sjöbonäs den 11 april 1951

W. H. H. H.
