



**Akt nr:**

**R-F4b-LS233 / 57**

**\*AU\$R-F4b-LS233/57\***

Handlingar angående

"Låstads invallningsföretag av år 1957"  
i Låstads socken, Ullervads kommun av

Skaraborgs län;

upprättade år 1957 vid syneförrättning  
enligt vattenlagen  
av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Låstads invallningsföretag av år 1957

Socken

Låstad

Län

Skaraborgs

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ — Ende intressent

Bengt Eliasson, Stommen, Låstad.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12-1962

Nu tillstyrkes  
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

~~XXXXXXXX~~ verkställd den

Avs.

9/9-1959

~~XXXXXXXX~~ verkställd av

Avs.

undertecknad

Vid avsyningen konstaterades att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med följande undantag:

Sträckan 12+12-12+25 av diket A-B-C var till förhindrande av ras försedd med en 500 mm rörledning.

Brunnen vid G var ej utförd.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 23 december 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren  
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid Synes-  
församling enligt  
rättslagen för förs-  
amling av Mark  
Allmogets Lästid 15:1  
i Lästids Orden och  
Mervads Sammen av  
Skaraborg län.

Den 25 februari 1957 i Långed Stammen.  
Närvarande: Understechnad landbruks-  
ingenjör och förädlingsman samt  
gode män: Verner Blomkvist, Böja,  
och ~~H. J. Carlsson~~ <sup>O. J. Carlsson</sup> ~~W. J. Carlsson~~ <sup>O. J. Carlsson</sup>, Berg,  
ävenom följande sakägare:  
Sönderska Bengt Olsson äg. Långed 15:1  
och Wälfred Karlsson äg. Sven Olofsgården 1:10  
Och övriga sakägare:  
Skogsbefälsman vid Skogsbefälsman- och Skogsbefälsman-  
Karlsson som visar upp.  
Furst. Olsson äg. Långed 13:1  
Eric Carlsson äg. Hattinck, som har meddelat och full-  
makt till C.

§ 1  
Upplästes det för försättningsmannen  
utgjorde förordandet, som hade lydelse  
såligt bl. A.

Nägel für mit dyne männen Kunde z.  
utrohas

Förelades det på grund av under hand

gjorde yrhauden upprättade förslaget  
till de rättskräddade snarkernas bättre  
förläggning med där till hörande  
Mandlingar.

§ 4  
Welfrid Karlsson återtog sin anseende  
om samförståttning, bil. D, och med-  
författaren Olsson förklarade sig intet  
ha att svärda härenut.

§ 5  
Upplästes synemännens utlåtande,  
som hade lydelse sålyt bil. G.

§ 6  
att mottaga och förvara till förslaget  
hörande Mandlingar och skrifter att  
utgå Synemännens Bengt Olsson  
därmed skänker.

§ 7  
som rätt vidare fanns att till  
protokollet utse en, förklarades  
för rättsningen avslutad och  
sammanträdet upplöst.

ort och tid som ovan  
i Hästen  
Welfrid Karlsson

sitföredande gode män:  
Werner Blomkvist  
Olof Carlsson

Fr 2027

3.

Bil. A



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Låstads

socken(-par) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Komplettering av "Vattenavlednings-företaget Lången - Kräftån-Tidan 1926-1928"  
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Bengt Eliasson  
Stommen Låstad Tel. Låstadby 58  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stommen Låstad

den

4/8

19 56

Sökandes namn:

Fastighet:

Bengt Eliasson  
Wälfred Karlsson

för fastigheten

» »

» »

Stommen 6 45  
Loen-Clough 110

4.  
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 30 augusti 19 56

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 66 56

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införeväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g


Över underrättelser ang. sammanträde hos Bengt Eliasson, Stommen, Låstad, måndagen  
den 25 febr. 1957 kl. 15.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Styrelsen för "vf Lången-Kraftån-Tidan"

|                                           |                   |                    |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ordf. Bengt Eliasson,                     | Stommen,          | <u>Låstad</u>      |
| Bengt Eliasson,                           | "                 | "                  |
| Gustav Svensson,                          | Sven Olofsgården, | "                  |
| Walfrid Karlsson,                         | " "               | "                  |
| Kronan,                                   |                   |                    |
| Domänintendenten Eric Wiberg,             |                   | <u>Vänersborg</u>  |
| Arr. Eric o. Lennart Elmstrand,           | Katrineberg,      | <u>Låstad</u>      |
| Trollhätte Kraftverk,                     |                   | <u>Trollhättan</u> |
| Skiftesgodemannen Werner Blomkvist, Böja, |                   | <u>Låstad</u>      |
| " Olle Carlsson,                          | Tolsgården, Berg, | <u>Lerdala.</u>    |

Skara den 9 febr. 1957.

I tjänsten:

  
 Sven Hallin

Lantbruksingenjör.


## DOMÄNVERKET

Domänintendenten i  
Västra Domänområdet  
Vänersborg, Tel. 13370

## Fullmakt

för arrendator Eric Elmstrand, Katrineberg, Mariestad  
att vid sammanträde enl. vattenlagen ang. Låstad 15:1  
hos Bengt Eliasson, Låstad 15:1 måndagen den 25/2 1957  
kl. 15.00, min talan föra.

Vänersborg den 12 februari 1957

  
Eric Wiberg  
Domänintendent

Sakord:

Undertecknad återkallar härmed min ansökan av den 4/8 1956 om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mig tillhöriga Låstad Sven Olofsgården 1:10.

Låstad den 25 febr.1957.


*Walfrid Karlsson*  
(Walfrid Karlsson)

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge              | Längd<br>m  | Arbete, material e. d.                                                                                                                          | Antal       | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa        |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|--------------|
|                   |             |                                                                                                                                                 |             |               | kronor  | kronor       |
|                   |             | <u>Vallen A - B - C - D</u>                                                                                                                     |             |               |         |              |
| 0-2+56            | 256         | Uppläggning av vall med gräv-<br>maskin enl. profilritningar.<br>Vallmaterialet erhålles innan-<br>för vallen m <sup>3</sup>                    | 143         | 2:--          | 286     |              |
| 2+56-15+28        | 1272        | Uppläggning av vall med gräv-<br>maskin enl. profilritningar.<br>Vallmaterialet erhålles från<br>avloppskanalen. (Se avlopps-<br>kanalen B - C) |             |               |         |              |
| 15+28-18+00       | 272         | Uppläggning av vall med gräv-<br>maskin enl. profilritningar.<br>Vallmaterialet erhålles innan-<br>för vallen m <sup>3</sup>                    | 264         | 2:--          | 528     | 814          |
|                   |             | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent                                                                                        |             |               |         | 86           |
| <u>Summa</u>      | <u>1800</u> | m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | <u>407</u>  |               |         | <u>900</u>   |
|                   |             | <u>Avloppskanalen B - C</u>                                                                                                                     |             |               |         |              |
| 2+56-7+40         | 484         | Bortschaktande av torvjord,<br>mulljord och gyttjig lera med<br>grävmaskin. Jorden upplägges<br>till vall enligt profilritn. m <sup>3</sup>     | 4293        | 2:--          | 8586    |              |
| 7+40-11+50        | 410         | - " - "                                                                                                                                         | 2413        | 2:--          | 4826    |              |
| 11+50-15+28       | 378         | - " - "                                                                                                                                         | 2802        | 2:--          | 5604    |              |
| Nedanför<br>11+84 |             | Övergång enligt typritning                                                                                                                      |             |               | 300     | 19316        |
|                   |             | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent                                                                                        |             |               |         | 1924         |
| <u>Summa</u>      | <u>1272</u> | m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | <u>9508</u> |               |         | <u>21240</u> |

| Läge                        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                      | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Trumma C - E</u>         |            |                                                                             |       |               |                   |                 |
| 20-20+10                    | 10         | Grävning, läggning, återfyllning<br>och förstärkningar enligt<br>typritning |       |               | 150               |                 |
|                             |            | 1200 mm rör med frakt m                                                     | 10    | 65:--         | 650               | 800             |
|                             |            | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent                    |       |               |                   | 80              |
| <u>Summa</u>                | <u>10</u>  |                                                                             |       |               |                   | <u>880</u>      |
| <u>Rörledning F - G</u>     |            |                                                                             |       |               |                   |                 |
| 30-32+60                    | 260        | Grävning, läggning och<br>återfyllning m                                    | 260   | 1:--          | 260               |                 |
| 32+60-33+88                 | 128        | - " - "                                                                     | 128   | 0:80          | 102               |                 |
| 30-32+60                    |            | 150 mm lantbruksrör med frakt "                                             | 260   | 2:50          | 650               |                 |
| 32+60-33+88                 |            | 75 " tegelrör " " "                                                         | 128   | 1:--          | 128               |                 |
| 32+60,33+88                 |            | Brunnar typ B-1 med 450 mm<br>inre diameter st                              | 2     | 85:--         | 170               |                 |
| 30                          |            | Utlopp typ U-1 "                                                            | 1     | 40:--         | 40                | 1350            |
|                             |            | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent                    |       |               |                   | 140             |
| <u>Summa</u>                | <u>388</u> |                                                                             |       |               |                   | <u>1490</u>     |
| <u>Pumpanläggning vid B</u> |            |                                                                             |       |               |                   |                 |
|                             |            | Finshyttans traktordrivna<br>invalningspump                                 |       |               | 1800              |                 |
|                             |            | Självrinningsanordning; d=300 mm                                            |       |               | 400               |                 |
|                             |            | Brunn; d=1500 mm                                                            |       |               | 400               |                 |
|                             |            | Bärbjälkar UNP 12, plattjärn,<br>skruvar m.m.                               |       |               | 80                |                 |
|                             |            | Tillopp och montering å inval-<br>ningspump                                 |       |               | 250               |                 |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                               | Antal               | å-pris<br>kr.       | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|      |            | Träöverbyggnad                                                                                       |                     |                     | 300               |                 |
|      |            | Förstärkningar å kanalen                                                                             |                     |                     | 200               | 3430            |
|      |            | Oförutsedda utgifter                                                                                 |                     |                     |                   | 340             |
|      |            |                                                                                                      |                     | <u>Summa kronor</u> |                   | <u>3770</u>     |
|      |            | <u>S a m m a n d r a g</u>                                                                           |                     |                     |                   |                 |
|      | 1800       | Vallen A - B - C - D                                                                                 | m <sup>3</sup> 407  |                     |                   | 900             |
|      | 1272       | Avloppskanalen                                                                                       | " 9508              |                     |                   | 21240           |
|      | 10         | Trumma C - E                                                                                         |                     |                     |                   | 880             |
|      | 388        | Rörledning F - G                                                                                     |                     |                     |                   | 1490            |
|      |            | Pumpanläggning vid B                                                                                 |                     |                     |                   | 3770            |
|      |            |                                                                                                      | m <sup>3</sup> 9915 |                     |                   | 28280           |
|      |            | Avgår för rensning åvilande<br>"Vattenavledningsföretag Lången-<br>-Kräftån-Tidan av åren 1926-1928" |                     |                     |                   | - 750           |
|      |            | <u>Summa anläggningskostnader kronor</u>                                                             |                     |                     |                   | <u>27530</u>    |
|      |            | Iåstad den 25 febr. 1957.                                                                            |                     |                     |                   |                 |
|      |            | I tjänsten:                                                                                          |                     |                     |                   |                 |
|      |            |                  |                     |                     |                   |                 |
|      |            | Sven Hallin                                                                                          |                     |                     |                   |                 |

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-nämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;


- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att ende intressenten under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- Kors inhugget i högspänningsledningens sockel c:a 40 m. V om trumman C - E å höjden + 9,23 m över jämförelseplanet.

Låstad den 25 febr. 1957.

I tjänsten:

Sven Hallin

## Översiktskarta.

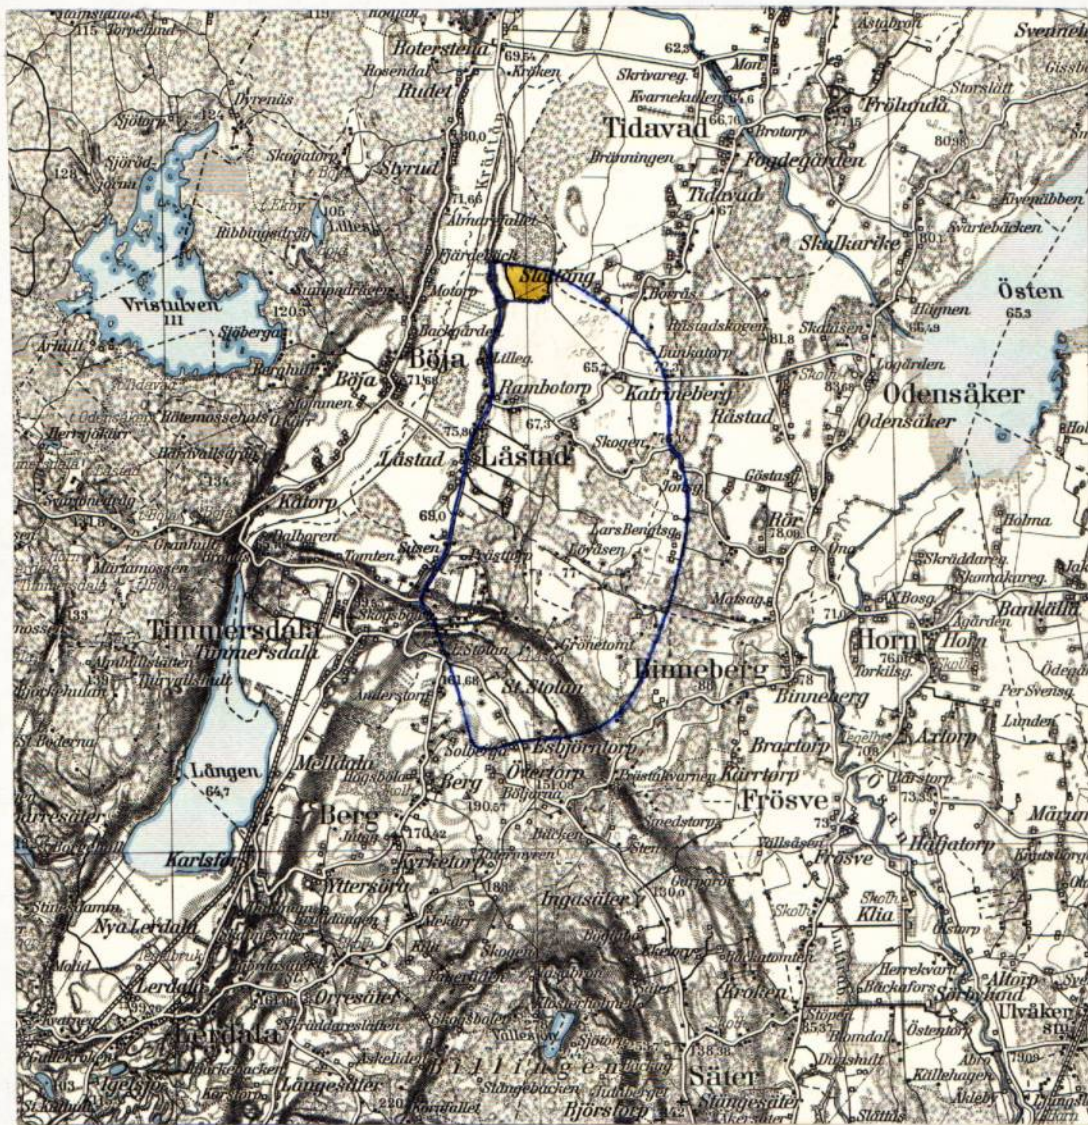

Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Låstad 15:1 i Låstads socken och Ullervads kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels invallning mot flöden i den s.k. Katrinebergskanalen, ingående i "Vattenavledningsföretaget Lången-Kräftån-Tidan" samt vattnets bortledande genom pumpning och dels igenläggning med rör av öppet avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km NNO Låstads kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot bäck. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava, genom kopiering och komplettering av till vattenavledningsföretaget hörande ritningar, profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varvid dock originalets röda bokstäver och avlopp ritats med svart.

Å nivåkartan äro de till uppförande avsedda vallsträckorna utmärkta med gröna linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D. Förslaget innefattar dessutom flyttning av den i vattenavledningsföretaget ingående avloppssträckan M - H - F (svart beteckning) till den med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna E <sup>G-I</sup> - E <sup>II</sup> angivna sträckningen, samt sträckan I - H (svart beteckning) till den med svarta bokstäverna I - L - F angivna sträckningen. För att försämrad torrläggning för Katrineberg 1:1 + 2:1 ej skall uppkomma, skall dessutom sträckan E <sup>II</sup> - I breddas. I företaget ingår jämväl igenläggning med rör av avloppssträckan G - ~~H~~ samt uppförande av en pumpstation vid B.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga

om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen och pumpstationen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Samtliga i företaget ingående marker torrlades tillfredsställande genom utförandet av Vattenavledningsföretaget Lången-Kräftån-Tidan. På grund av dels torvjordens sjunkning med 0,3 å 0,4 m., dels och framför allt högvattenmängdens kraftiga ökning efter nämnda företags utförande, blir ifrågavarande område numera översvämmat vid normalt högsta vattenstånd, vilket vållar avsevärda skador.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, utvisande gränslinjen för normalt högsta vattenstånd.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning enligt följande.

Man kan räkna med att grödan blir översvämningskadad ungefär vart annat år, varvid skördens bruttovärde i medeltal blir nedsatt till hälften. Skördens värde kan ett skadefritt år beräknas uppgå till 800 kr/ha och omkostnaderna till 600 kr/ha, d.v.s. nettot blir då 200 kr/ha. Ett skadeår blir skördevärdet 400 kr/ha och omkostnaderna oförändrade, varför nettot då förvandlas till en förlust av 200 kr/ha. Medelavkastningen kan sålunda för närvarande beräknas till noll för hela invallningsområdet för att efter företagets utförande stiga till 200 kr/ha och år. Då den skadade arealen uppgår till 25,55 ha uppgår alltså den årliga vinsten till  $25,55 \times 200 = 5110$ :- kr. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta en värdeökning av 127.750 kr. För att vara på säkra sidan och med hänsyn till att hela denna värdeökning ej kan väntas helt fortplanta sig till saluvärdet, anser synemännen att ifrågavarande alstringsbåtnad bör reduceras till i runt tal 65.000:-- kronor. Härtill kommer bruksbåtnad för igerläggning av 388 m öppet dike å 3:-- kr/m eller i runt tal 1000 kr. Den genom företaget uppkommande sam-

manlagda båtnaden kan sålunda beräknas uppgå till minst 66.000:-- kr.

Genom företagets utförande blir en rensning av de nedersta 500 m av det i vattenavledningsföretaget ingående avloppet H - I - K överflödig. Denna rensning kan antas kosta minst kr 1:50 pr meter avlopp eller sammanlagt 750:-- kr. Detta belopp skall därför vattenavledningsföretaget Lången-Kräftån-Tidan erlægga till det nu ifrågavarande företaget, så snart detta avsynats och godkänts.

Genom utförande av avloppssträckan E<sup>I</sup> - E<sup>II</sup> avskäres ett markområde på 0,20 ha av kronoegendomen Katrineberg från de övriga ägorna. Området ifråga användes för närvarande endast till bete. I enlighet med domänintendentens yrkanden skall över ifrågavarande avloppssträcka anordnas en underhållsfri övergång, varjämte all jord från samtliga öppna avlopp skall uppläggas på antingen det sålunda avskurna området eller på sökandens egen mark.

Genom företaget blir en del övergångar över öppna avlopp för inspektion av tvänne elektriska högspänningsledningar, tillhörande Kungl. Vattenfallsstyrelsen oanvändbara. Enligt eget åtagande skall <sup>pro-</sup>ägaren i den mån de fortfarande anses behövlige, iordningställa nya övergångar på egen bekostnad. Det åligger företaget att, innan de nuvarande övergångarna borttagas, underätta Kungl. Vattenfallsstyrelsens personal i Trollhättan härom.

Det åligger företaget att bygga ny ägotrumma över avloppssträckan C - E enligt upprättad ritning.

~~Desseutom uppkommer viss brukningsbåtnad, som beräknas uppgå till 388 x 3 = 1164:-- kr.~~

Kostnaderna för företagets utförande, drift och underhåll skola gäldas av sökanden. Dock skall underhållet av öppna avloppet utanför vallsträckan B - C, sedan tre år förflutit efter företagets färdigställande, övertagas av Vattenavledningsföretaget Lången-Kräftån-Tidan.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och

därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 99:-- kronor.

---

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten i första hand skall användas till uppförande av skyddsvall och i övrigt uppläggas endast på avloppets vänstra mot invallningen vettande sida;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Låstads invallningsföretag av år 1957".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Låstad den 25 febr. 1957.

I tjänsten:


*Sven Hallin*  
Sven Hallin

Biträdande gode män:

*Werner Blomkvist*  
*Ola Carlsson*

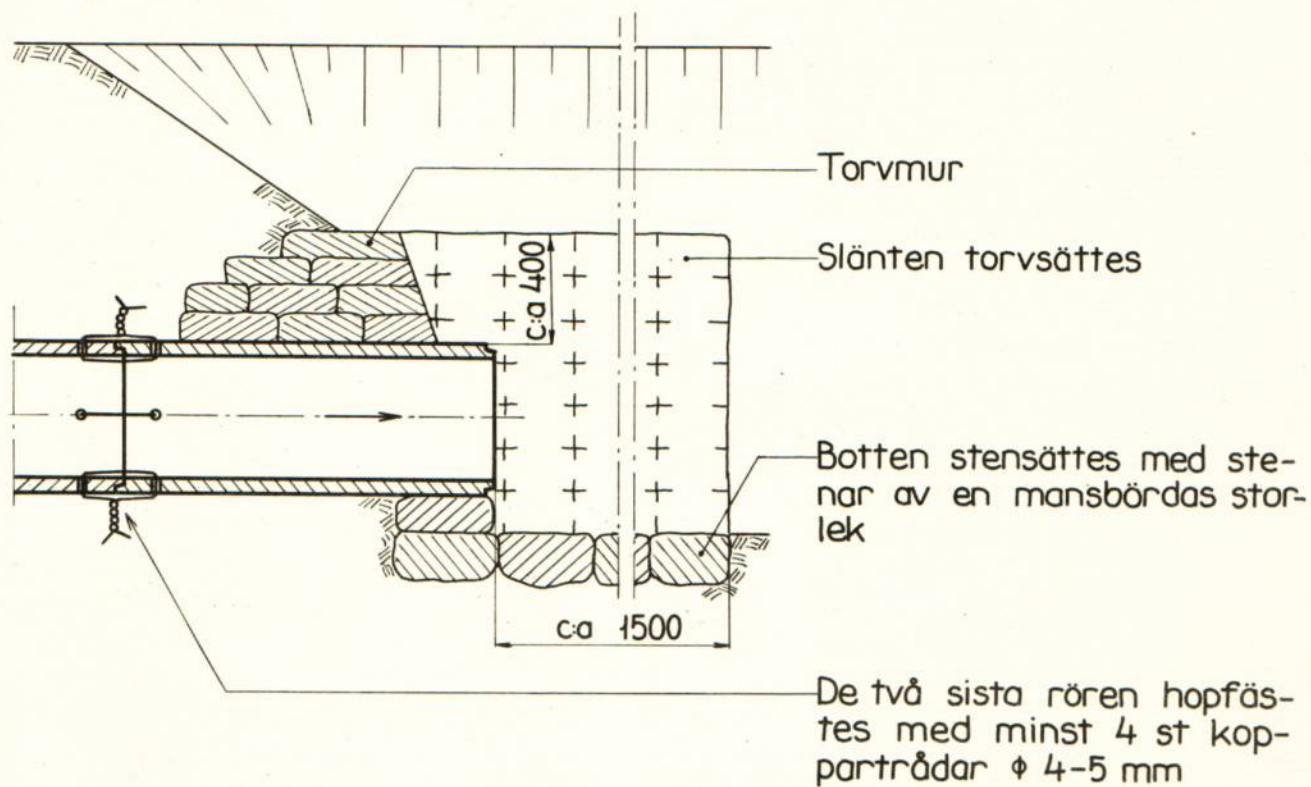

Mått i mm

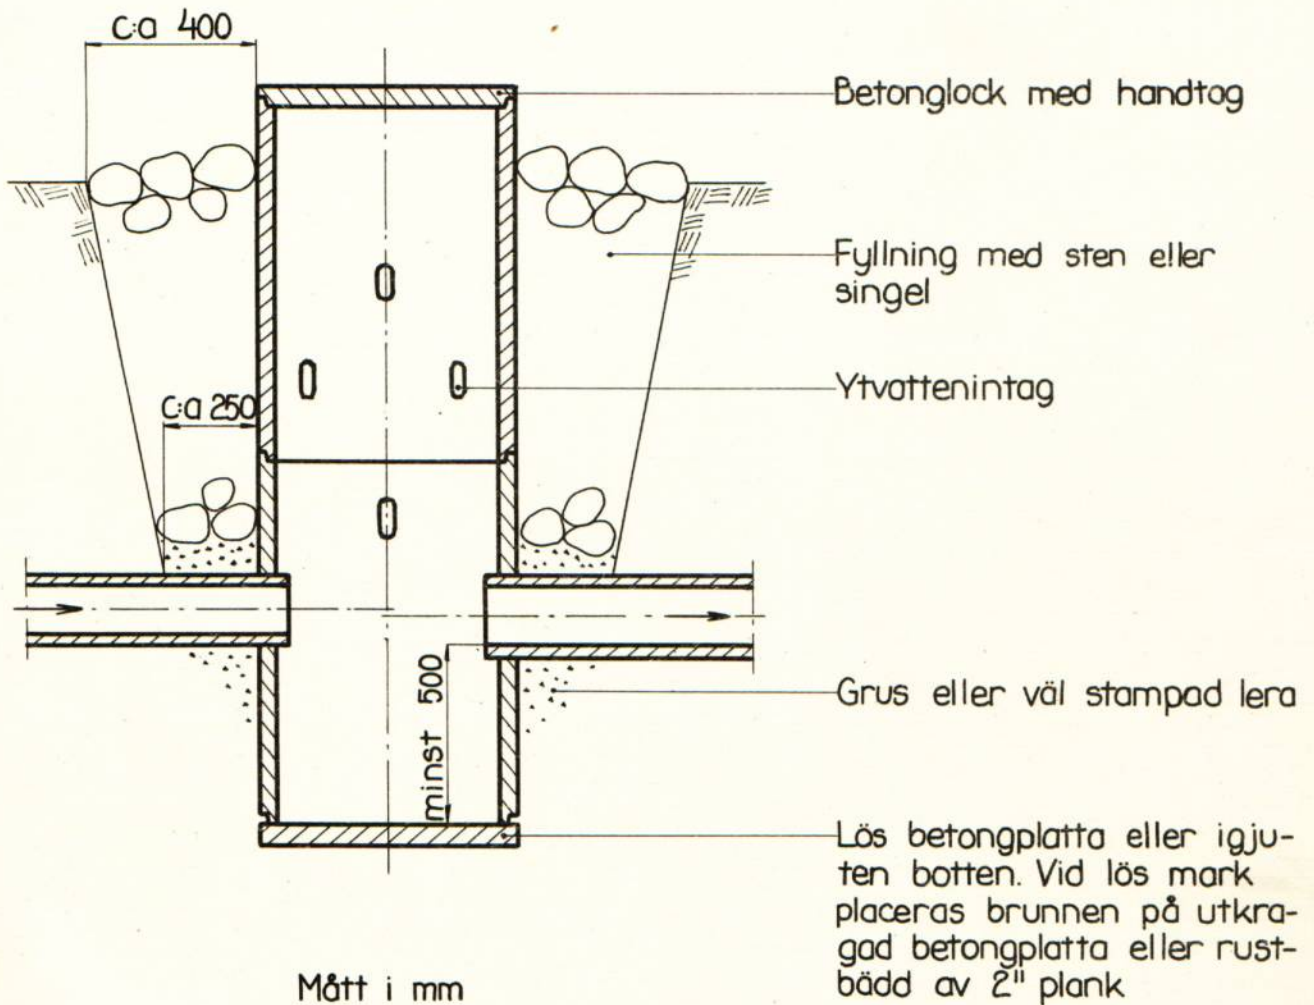

## Trumma typ A

