



Akt nr:

R-F4b-LS258/60

AU\$R-F4b-LS258/60

Handlingar angående
HÖGA DIKNINGSPÖRETAG AV ÅR 1960
i Malma s:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

258-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Höga dikningsföretag av år 1960"

Socken

Malma

Län

Skaraborg

~~Övervakare~~ — Förtroendeman — ~~Ekonom~~

Lantbrukare Axel Andersson, Höga, Viste-Askjum

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 16 maj 1961	Bidrag till utförandet, kr 7 600:--		-
Arbetsid jml. V. L. 10:62. den 31 dec. 1970	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetsid den 1 sept. 1965	Kontrakterad arbetsid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1 460:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~Övervakare~~ verkställd den	~~Övervakare~~ verkställd av		
Avsyning 3 nov. 1964	Avsyning undertecknad		

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 9 nov. 1964.

I tjänsten:


J. Lippert
B.o. lantbruksingenjör.

Handlingar angående
HÖGA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960
i Malma s:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		<u>sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	5-
Förening	" B	7-
Förteckning	" C	9-
Fullmakt	" D	11-
Skrivelse till vägförvaltningen	" E ¹	13-
Svar från vägförvaltningen	" E ²	15-
Värderingslängd	" F	17-
Kostnadsförslag	" G	23-
Arbetsbeskrivning	" H	31-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" I	33-
Kostnadsfördelningslängd	" K	35-
Översiktskarta		38
Utlåtande	bil. L	39-
Typritningar		45-50.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Höga m. fl. fastigheter i Malma socken och Essunga kommun av Skaraborgs län.

Den 7. dec. 1959 hos Axel Andersson, Höga, Malma, Viste-Rakjum.
Närvarande: Undertecknad o. lantbruksingenjör och förrättningsman, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Axel Andersson	-	äg. Höga 1:18
Carl Edvinsson	-	" Höga 1:9

Av övriga sakägare:

Herman, Anton, Einar och Hilda Andersson - äg. Malma söteri 1:4
genom Anton Andersson enligt muntligt uppdrag,
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom överväg-
mästare L. A. Larsson, Mariestad, enligt fullmakt
bilaga D. och vägmästare Gustav Hallberg, Vara.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke uttrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

2.

§4.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågasvarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§5.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom allmänna vägen 551, Årrentorp-Malma säteri, vid sekt. 30+9, 35+9, 20+9 och 8+56 har tillkommit efter år 1880.-

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till dikningen färdigställt nytt sammanträde komma att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

J. Hjörsten
J. Lippert.
c.o. lantbrukingenjör.

Den 20 dec 1960 hos Axel Andersson, Höga, Malma, Viste-Årkjüm.

Närvarande: Förestående förnättningsman, ävensom följande sakägare:

Axel Andersson	-	äg. Höga 1:18
Carl Edvinsson	-	- Höga 1:9

§7.

Förelades det sedan förra sammanträdet uppräta de förslaget till de vattenbevägrade markernas bättre torrläggning och brukning med häntill hörande

handlingen.

§ 8.

Upplästas förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 9

Vägförvaltningen i Skaraborgs län har medgivit att bidraga till företaget med 2500:- kronor och att utföra nytt genomlopp genom allmänna vägen nr. 551, Årentorp-Malma vid sekt. 8+56, 35+9 och 20+9 jämte brunnar nedströms genomloppet samt verkställa rensning av genomloppet vid sekt. 3c, bilaga E².

§ 10.

Båda delägarna i företaget förenade sig om utförandet och framtida underhållet av samtliga ifrågakommande avlopp enligt det vid syneförrättningen upprättade företaget, bilaga B.

§ 11

Till företagets förtroendemän valdes Axel Andersson, Höga, Malma, Viste-Åskjenn.

Till revision att granska företagets räkenskaper utsågs Carl Edvinsson, Höga, Malma, Viste-Åskjenn.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen ^{för} gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av detta slag.

Förtroendemannen erhöll uppdrag och befullmäktigades: att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar under teckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras, och att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bliva beviljade.


§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar
och handlingar utsåg förrättningsmannen Axel Andersson,
Höga, Malma, Viste-Åskjåm.

§ 15

som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet
upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.
Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Löppert
o. o. lantbruksingenjör.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig-} tillhörig mark inom

Malma socken(-ner) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser upptagande av avlopp för läckdikning för ca 20 ha, längd omkring 2000 m.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Allmänna vägen Malma säteri - Årentorp beröres på en sträcka av ca 500 m.

Närmaste järnvägsstation Nossebro

Meddelanden om förrättningen ställas till

Axel Andersson
Lantmäst. Häga Viste-Raskj. rum
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Viste-Raskj. rum

den 9 juni 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

Axel Andersson för fastigheten Häga 1.6.
Eure Johansson » » Häga 1.9 9512/81140
» »

Ute av Axel Andersson

d. 20 juni 1958.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Carl Sandbergs stb.</i>	ägare av fastigheten	<i>Häga</i>
<i>Naidera Andersson</i>	» » »	<i>Malma säteri</i>
	» » »	

*Carl Sandbergs stb. vill ha
bestämdsförslag över den del av
företaget som berör dem.*

ineras möjligt

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 16 juni 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM 57 58

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 juli 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Undertecknade förena oss om att utföra och
för framtiden underhålla Höga dikningsföretag av
år 1960 enligt det av o.o. lantbrukningsingenjören f. Lippert
år 1960 vid synförräktning enligt vattenlagens upprättade
förslaget.

Höga, Viste Askjum den 20. dec. 1960.

Aril Andersson - äg. Höga 1:18.

Erl. Robinson - - Höga 1:9.

Förestående förening utsordas.

I tjänsten
f. Lippert
o.o. lantbrukningsingenjör.


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Axel Andersson, Höga, Malma, Viste-Askjum måndagen den 7 december 1959 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till följande:

g. ✓ Bröderna Andersson,	Malma Säteri,	<u>Ulvstorp</u>
✓ Karl Edvinsson,	Höga,	<u>Viste-Askjum</u>
✓ Axel Andersson,	Höga,	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 30 november 1959.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 20 december 1960 klockan 13.00 har kallelser sänts till förestående med undantag av bröderna Andersson, Malma Säteri, Ulvstorp.

Skara den 17 december 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr...5270-43/59

11.


Bil. D

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Höga m.fl. hemman inom Malma socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 2 december 1959

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Läger. Gustav Hallberg.

JL/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed kopia av förslaget och utdrag ur utlåtande till "Höga dikningsföretag av år 1960" i Malma socken, Essunga kommun. Företaget berör allmänna vägen 551, Arentorp - Malma, vid Höga 1:9 och 1:18.


Väging. B. André med vägmästarna L. A. Larsson och Gustav Hallberg ha tagit del av förslaget vid förberedande sammanträden.

Erforderliga åtgärder torde framgå av det bifogade förslaget.

Två ex. av kopian bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 12 november 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"
Postgirokonta 18 29 16

15.

Bil. E²

Datum
23.11.60

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning
5117-43/60 LAL/MR

Ärende

Angående "Höga dikningsföretag av år 1960".


Vägförvaltningen har granskat översänt utlåtande för rubr. företag utan erinringar.


Vägförvaltningen kommer att utföra nytt genomlopp genom allmänna vägen nr 551 Arentorp - Malma vid sekt. 8 + 56, 35 + 9 och 20 + 9 jämte brunnar nedströms genomloppen samt utföra rensning av genomloppet vid punkt Bc i enlighet med Edert förslag.

Arbetena kommer att utföras genom försorg av vägmästaren i vmo R:12, telefon Vara 10557, som bör underrättas i god tid före arbetets påbörjande.

Dessutom är vägförvaltningen villig bidra till igenläggningen av öppna diket utmed vägen å sträckorna 3 + 28 - 5 + 11 och 7 + 30 - 8 + 47 med 2.500:- kronor, vilket belopp kommer att utbetalas till företaget så snart arbetet blivit färdigställt och godkänt samt av lantbruksingenjören utfärdat bevis härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L. A. Larsson


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Höga 1:9</u>							
Karl Edvinsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, mylla på lera	1	0,10		230	~~2300~~ 920	690	69
Åker, - " -	2	0,12		750	~~2500~~ 2000	1250	150
" - " -	3	0,12		2370	2500	130	16
" - " -	4	0,15		1250	~~2500~~ 2400	1150	173
" - " -	5	0,18		2000	2500	500	90
" - " -	6	0,07		2160	2400	240	17
" - " -	7	0,13		1980	~~2200~~ 1980	-	-
" - " -	8	0,08		1800	~~2400~~ 1800	-	-
" - " -	9	0,11		1380	2500	1120	123
" - " -	10	0,06		1250	"	1250	75
" - " -	11	0,14		1380	"	1120	157
" - " -	12	0,10		1630	"	870	87
" - " -	13	0,17		2440	"	60	10
" - " -	14	0,24		1500	"	1000	240
" - " -	15	0,39		2130	"	370	144
" - " -	16	0,20		1500	"	1000	200
" - " -	17	0,63		1630	"	870	548
" - " -	18	0,40		2130	"	370	148
" - " -	19	0,23		1250	"	1250	288
" - " -	20	0,55		2250	"	250	138
" - " -	21	0,29		2400	"	100	29
" - " -	22	0,39		1380	"	1120	437
" - " -	23	0,43		2250	"	250	108
" - " -	24	0,17		1540	2200	660	112
" - " -	25	0,11		440	"	1760	194
" - " -	26	0,19		1320	"	880	167

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	26a	0,01		1320	2200	880	9
Summa		5,76					3729
<u>Brukningsbåtnad</u>							
2+88 - 3+20 = 32 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						8:50	272
3+20 - 4+84 = 164 m	- "	-			"	3:--	492
4+84 - 5+11 = 27 m	- "	-			"	3:--	81
5+11 - 5+63 = 52 m	- "	-			"	11:--	572
5+63 - 7+6 = 143 m	- "	-			"	16:--	2288
7+6 - 7+30 = 24 m	- "	-			"	3:--	72
35+9 - 37 = 191 m	- "	-			"	13:--	2483
37 - - 38 = 100 m	- "	-			"	9:--	900
Summa							7160
Totalsumma		5,76					10889
<u>Höga 1:18</u>							
Axel Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lera	27	0,19		1210	2200	990	188
" - " -	28	0,43		2090	"	110	47
" - " -	29	0,14		2200	"	0	0
" - " -	30	0,28		1130	2500	1370	384
" - " -	31	0,21		1380	"	1120	235
" - " -	32	0,32		2250	"	250	80
Trädgård och tomtmark	33	0,13		4500	5000	500	65
Åker, mylla på lera	34	0,12		1750	2500	750	90
" - " -	35	0,42		"	"	"	315
" - " -	36	0,29		"	"	"	218
" - " -	37	0,30		"	"	"	225
" - " -	38	0,49		"	"	"	368

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	39	0,56		1130	2500	1370	767
" - " -	40	0,40		1000	"	1500	600
" - " -	41	0,47		750	"	1750	823
" - " -	42	0,54		2000	"	500	270
" - " -	43	0,59		2480	"	20	12
" - " -	44	0,18		2250	"	250	45
" - " -	45	0,16		500	"	2000	320
" - " -	46	0,46		380	"	2120	975
" - " -	47	0,20		880	"	1620	324
" - " -	48	0,12		750	"	1750	210
" - " -	49	0,27		1000	"	1500	405
" - " -	50	0,37		750	"	1750	648
Trädgård, tomtmark	51	0,08		2260	5000	2740	219
Åker, mylla på lera	52	0,48		880	2200	1320	634
" - " -	53	0,24		550	"	1650	396
" - " -	54	0,34		660	"	1540	524
" - " -	55	0,19		1320	"	880	167
" - " -	56	0,18		2110	"	90	16
" - " -	57	0,22		1320	"	880	194
" - " -	58	0,29		2180	"	20	6
" - " -	59	0,37		770	"	1430	529
" - " -	60	0,39		1320	"	880	343
" - " -	61	0,47		550	"	1650	776
" - " -	62	0,31		1210	"	990	307
" - " -	63	0,13		2150	"	50	7
" - " -	64	0,05		1650	"	550	28
Summa		11,38					11760

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
7+6 - 7+30 = 24 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å-kr	3:--	72
7+30 - 8+4 = 74 m	- "	-			"	3:--	222
8+9 - 8+47 = 38 m	- "	-			"	3:--	114
8+56 - 9+12 = 75 m	- "	-			"	3:--	225
9+12 - 9+95 = 83 m	- "	-			"	12:--	996
10+24 - 10+94 = 70 m	- "	-			"	6:--	420
10+94 - 11+12 = 18 m	- "	-			"	13:--	234
41+11 - 42+50 = 139 m	- "	-			"	5:--	695
13+26 - 13+83 = 57 m	- "	-			"	8:--	456
13+83 - 14+53 = 70 m	- "	-			"	5:--	350
14+53 - 15+38 = 85 m	- "	-			"	8:--	680
15+38 - 16+9 = 71 m	- "	-			"	8:--	568
50 - 51+26 = 126 m	- "	-			"	5:--	630
13+45-ägoväg = 75 m	- "	-			"	5:--	375
Summa							6037
Totalsumma		11,38					17797
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Höga 1:9</u>							
Karl Edvinsson	1-26a ab	5,76				3729	
	brb					7160	10889
<u>Höga 1:18</u>							
Axel Andersson	27-51 ab	7,72				7833	
	brb					2978	10811
Summa		13,48					21700

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten G</u>							
<u>Höga 1:18</u>							
Axel Andersson	52-64 ab	3,66				3927	
	brb					3059	6986
Summa		3,66					6986
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		13,48					21700
" G		3,66					6986
Summa		17,14					28686
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad — = med rött överstruken siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning. Höga, Viste-Askjum den 20 december 1960. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Öppna diket A - B .</u>	-			
2-2+82	82	Schaktning av lera m ³	25	2:25	56:25	
2+82-2+88	6	Nuvarande rörbro bibehålles oförändrad	-	-	-	
		Arbetsledning och oförutsett			3:75	60:--
		<u>Rördiket B - Ba - C .</u>				
2+88-4+84	196	500 mm:s rör med frakt m	196	16:10	3155:60	
2+88-4+78	190	Grävn., lägn. o. återfylln. "	190	2:70	513:--	
4+78-4+84	6	- " - "	6	8:--	48:--	
3+15-3+22	7	Sprängning av berg "	7	30:--	210:--	
		Grusning för rörledning på berg m	7	2:--	14:--	
2+88		500 mm:s rörledning inskjutes i bef. 1000 mm:s rörbro och kringmuras med sten och cement- bruk	-		30:--	
3+8		Brunn typ B-1S; d=0,50 m vid norra sidan om rörledning, an- slutning av brunnen till rör- ledning med 0,30 m långt 150 mm:s rör st	1		80:--	
3+68		Brunn typ B-1S; d=0,50 m vid norra sidan av rörledning, an- slutning av brunnen till rör- ledning med 0,30 m långt 150 mm:s rör samt inkoppling av bef. rörledning "	1		85:--	
4+44		Inkoppling av bef. 100 mm:s rörledning "	1		7:--	
		Arbetsledning och oförutsett			417:40	4560:--
		<u>Rördiket C - D .</u>				
4+84-7+6	222	375 mm:s rör med frakt m	222	9:50	2109:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	222	2:--	444:--	
5+59-5+73	14	Sprängning av berg "	14	30:--	420:--	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
6		Grusn. för rörledning på berg m 14	14	1:75	24:50	
7+6		Brunn typ B-1S; d=0,50 m vid södra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörledningen med 0,30 m långt 150 mm:s rör st 1	1	80:--	80:--	
5+2, 6+21, 6+84		Brunn typ B-1; d=1,00 m med konisk överdel samt inkoppling av bef. 100 mm:s rörledning i brunnen " 1	1		215:--	
		Inkoppling av befintliga rörledningar " 3	3	7:--	21:--	
		Arbetsledning och oförutsett			336:50	3650:--
		<u>Rörledningen D - E - F .</u>				
7+6 - 8+47	141	300 mm:s rör med frakt m 141	141	6:60	930:60	
7+6 - 8+4	98	Grävn., lägg. o. återfylln. " 98	98	1:75	171:50	
8+4 - 8+9	5	- " - " 5	5	6:--	30:--	
8+9 - 8+47	38	- " - " 38	38	1:75	66:50	
7+66, 8+9, 8+15		Inkoppl. av bef. rörledningar st 3	3	7:--	21:--	
		Arbetsledning och oförutsett			120:40	1340:--
		<u>Rörledningen F - G .</u>				
8+47 - 8+56	9	300 mm:s vägrör, grävning genom allm. väg, rörensläggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,80 m vid sekt. 8+47 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
8+56 - 12+47	391	300 mm:s rör med frakt m 391	391	6:60	2580:60	
8+56 - 9+12	56	Grävn., lägg. o. återfylln. " 56	56	2:80	156:80	
9+12 - 10+27	115	- " - " 115	115	2:40	276:--	
10+27-10+32	5	- " - " 5	5	3:50	17:50	
10+32-10+94	62	- " - " 62	62	3:20	198:40	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10+94-11+12	18	Grävn., lägg. o. återfylln. m	18	3:50	63:--	
11+12-11+57	45	- " - "	45	3:20	144:--	
11+57-11+62	5	- " - "	5	5:--	25:--	
11+62-12+47	85	- " - "	85	2:40	204:--	
10+18-10+22	4	Sprängning av berg "	4	30:--	120:--	
		Grusning för rörledn. på berg "	4	1:50	6:--	
8+56, 9+12		Brunn typ B-1; d=0,80 m samt inkoppling av bef. rörledning st	2	155:--	310:--	
11+36		Brunn typ B-1; d=0,80 m "	1	150:--	150:--	
10+20		" " B-1S; d=0,50 m, vid norra sidan av rörledning, an- slutning av brunnen till rör- ledning med 0,30 m långt 150 mm rör samt inkoppling av bef. rörledning i brunnen "	1		85:--	
11+62		Brunn typ B-1S; d=0,50 m vid norra sidan av rörledning, an- slutning av brunnen till rör- ledningen med 0,30 m långt 150 mm:s rör "	1		85:--	
12+47		Brunn typ B-3; d=0,80 m "	1		85:--	
		Arbetsledning och oförutsett			453:70	4960:--
		<u>Sträckan Ba - Bc .</u>				
30 - 30+9	9	Rensning av vägtrumman från slam utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län				
		<u>Rördiket C - Ca .</u>				
35 - 35+9	9	400 mm:s vägrör, grävning genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=1,00 m med konisk överdel vid sekt. 35, utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
35+9-38+20	311	375 mm:s rör med frakt m	311	9:50	2954:50	
35+9-36	91	Grävn., lägg. o. återfylln. "	91	1:90	172:90	
36 - 38+20	220	- " - "	220	3:--	660:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
35+9		Brunn typ B-1; d=1,00 m med konisk överdel samt 2 m:s för- längning och inkoppling av bef. 75 mm:s rörledning i brunnen st	1		225:--	
35+9		Förlängning av bef. 75 mm:s rör- ledning i vägdiket från bef. - stentrumma till brunnen m	7	2:--	14:--	
36+80		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörledningen, anslutning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 150 mm:s rör st	1	85:--	85:--	
38+20		Brunn typ B-5; d=1,00 m med 375 mm:s intagsrör "	1		210:--	
35+30, 35+99, 36+41		Inkoppl. av bef. rörledningar "	3	7:--	21:--	
		Arbetsledning och oförutsett			407:60	4750:--
		<u>Rördiket E - Ea .</u>				
20-20+9	9	225 mm:s vägrör, grävning genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,80 m vid sekt. 20 utföres och bekostas av Vägförvalt- ningen i Skaraborgs län				
20+9		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	1		100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			10:--	110:--
		<u>Rördiket F - Fa .</u>				
40 - 41+11	111	125 mm:s rör med frakt m	111	2:30	255:30	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	111	1:80	199:80	
41+11 - 43	189	100 mm:s rör med frakt "	189	1:90	359:10	
41+11-41+16	5	Grävn., lägn. o. återfylln. "	5	1:70	8:50	
41+16-42+50	134	- " - "	134	1:20	160:80	
42+50 - 43	50	- " - "	50	1:70	85:--	
41+11, 43		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			121:50	1350:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket G - Ga .</u>				
45 - 45+25	25	200 mm:s rör med frakt m	25	3:50	87:50	-
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	25	1:75	43:75	
45+25		Brunn typ B-5; d=0,50 m med 200 mm:s intagsrör st	1		80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			18:75	230:--
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				21010:--
		<u>Samfälligheten G .</u>				
		<u>Rördiket G - H - I - L .</u>				
12+47-14+94	247	225 mm:s rör med frakt m	247	4:15	1025:05	
12+47-14+90	243	Grävn., lägn. o. återfylln. "	243	1:90	461:70	
14+90-14+94	4	- " - "	4	4:--	16:--	
14+94-16+9	115	200 mm:s rör med frakt "	115	3:50	402:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	115	1:75	201:25	
13+26, 14+94		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
16+9		" " B-5; d=0,50 m med 200 mm:s intagsrör "	1	80:--	80:--	-
15+24		Koppling "	1	7:--	7:--	
		Arbetsledning och oförutsett			226:50	2580:--
		<u>Rördiket H - Ha .</u>				
55-56+7	107	75 mm:s rör med frakt m	107	1:20	128:40	
55-55+91	91	Grävn., lägn. o. återfylln. "	91	1:55	141:05	
55+91-56+7	16	- " - "	16	3:--	48:--	
56+7		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			42:55	420:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket I - Ia .</u>				
25 - 25+19	19	75 mm:s rör med frakt m	19	1:20	22:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	19	1:55	29:45	
25+19		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			7:75	120:--
		<u>Rördiket K - Ka .</u>				
50 - 51+26	126	75 mm:s rör med frakt m	126	1:20	151:20	
50 - 50+8	8	Grävn., lägg. o. återfylln. "	8	1:55	12:40	
50+8-51+26	118	- " - "	118	1:--	118:--	
51+26		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			38:40	380:--
		<u>Samfälligheten G summa kronor</u>				3500:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A .</u>				
2-2+82	82	Öppna diket A - B				60:--
2+88-4+84	196	Rördiket B - Ba - C				4560:--
4+84-7+6	222	" C - D				3650:--
7+6-8+47	141	" D - E - F				1340:--
8+47-12+47	400	" F - G				4960:--
30-30+9	9	Rörtrumman Ba - Bc				-
35-38+20	320	Rördiket C - Ca				4750:--
20-20+9	9	" E - Ea				110:--
40-43	300	" F - Fa				1350:--
45-45+25	25	" G - Ga				230:--
	<u>1704 m</u>			<u>Summa kronor</u>		21010:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten G .</u>				
12+47-16+9	362	Rördiket G - H - I - L				2580:--
55-56+7	107	" H - Ha				420:--
25 - 25+19	19	" I - Ia				120:--
50 - 51+26	126	" K - Ka				380:--
	<u>614 m</u>			Summa kronor		3500:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	1704	Samfälligheten A				21010:--
	<u>614</u>	" G				3500:--
	<u>2318 m</u>			Summa kronor		24510:--
Höga, Viste-Askjum den 20 december 1961.						
I tjänsten:						
 J. Lippert						
E.O. lantbruksingenjör.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta; att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A, inhugget kors (+) i berg c:a 13 m sydväst om sekt. 2+38
å höjden + 7,32 m eller enl. Sveriges normalnollplan + 87,32 m och för
samfälligheten G, inhugget kors (+) i jordfast sten c:a 30 m väster om sekt.
15+50 å höjden + 15,03 m eller enl. Sveriges normalnollplan + 95,03 m.

Höga, Viste-Askjum den 20 december 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

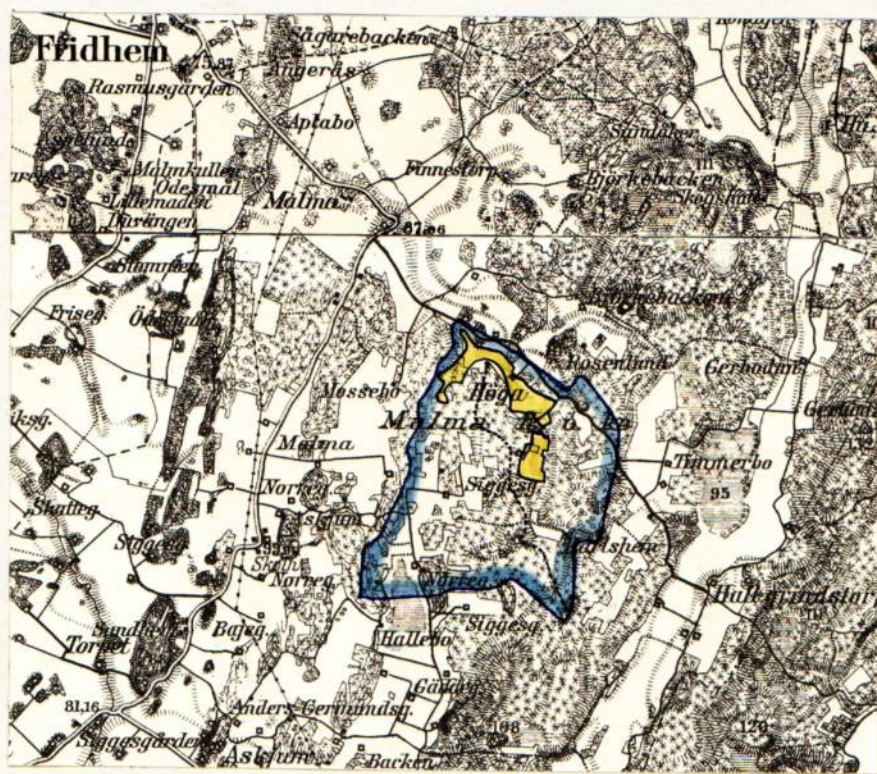
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B, B - Ba - C, C - Ca, Ba - Bc	C - D	D - E - F - G, E - Ea, F - Fa, G - Ga	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	k r o n o r											
1	1-8, 17-29, brb	7066	9370-1750= =7620	Samfälligheten A.								7620	1,07840	
2	9-16, brb	3977	290	3650-180= =3470								3760	0,94544	
3	26a, 30-51, brb	10657		7990-570= =7420								<u>8040</u>	<u>0,75443</u>	
1+2		11043										<u>10470</u>	<u>0,94811</u>	
1+2+3		21700										11090	1,00426	
2+3		14634										18510	0,85300	
												11180	0,76397	
													0,94811	
													0,75443	

Bil. I

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Malma socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Höga 1:9</u>						
Karl Edvinsson	avd. 1+2 S	10808	10247			
"	3	81	61	10308	55,689	
<u>Höga 1:18</u>						
Axel Andersson	avd. 1+2 S	235	223			
"	3	10576	7979	8202	44,311	
Summa		21700		18510	100,000	85,720
<u>Vägförvaltningen i Skaraborgs</u>						
<u>län betalar enl. utlåtnad: avd. 1+2</u>						
"	3		1930			
"			570	2500		
Summa				21010		
<u>Samfälligheten G</u>						
<u>Höga 1:18</u>						
Axel Andersson	S	6986		3500	100,000	
Summa		6986		3500	100,000	14,280
<u>S a m m a n d r a g</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
"	G	21700		21010	100,000	85,720
"		6986		3500	100,000	14,280
Summa		28686		24510		100,000
Höga, Viste-Askjum den 20 december 1960.						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert</i>						
J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Höga m.fl. fastigheter i Malma socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser igenläggning med rör av ett i nordnordvästlig huvudriktning flytande avlopp med åtta sidogrenar för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 3,0 km NO Fridhems kyrka inom nederbördsområde 143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

Då båda av företaget berörda fastighetsägarna förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. B, och de i 10. kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A: Öppna diket A - B och rörledningarna B - Ba - C - D - E - F - G ,
Ba - Bc , C - Ca , E - Ea , F - Fa och G - Ga .

Samfälligheten G: Rörledningarna G - H - I - L , H - Ha , I - Ia och K - Ka .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medel-

vattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning och fördjupning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning, omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A och G. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utredning om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten A särskild utredning verkställts. Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuter det i mom. 8 nedan angivna bidraget från Vägförvaltningen i Skaraborgs län, skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Rörledningarna F - G , C - Ca och E - Ea kommer att korsa allmänna vägen 551, Arentorp - Malma, vid sektionerna 8+56, 35+9 och 20+9. Nu befintliga vattengenomlopp vid ovannämnda sektioner ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter den 1 januari 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunn typ B-1 vid sektionerna 8+47, 35 och 20. Vattengenomloppet genom allmänna vägen 551 vid sekt. Bc ligger tillräckligt djupt men är igenslammat. Det skall därför åligga Vägförvaltningen att även bekosta genomloppets rensning.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetenas utförande. Dessa arbeten bör så bedrivas att de nya genomloppen liksom det igenslammade kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetenas utförande skall av vägdirektören lämnade

föreskrifter noggrant iakttagas.

Avloppet B - Ba - C - D - E - F - G följer allmänna vägen 551, Arentorp-Malma, å sträckorna 3+28 - 5+11 och 7+30 - 8+47, såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall dessa dikessträckor igenläggas med rör, vilket innebär en betydande minskning av framtida underhållskostnaderna för de ovannämnda avloppssträckorna och att skyddsräcke mot vägen icke behöver utföras. Därför anser förrättningsmannen skäligt att Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall bidra till företagets utförande med ett belopp av kr 2500:--. Detta belopp skall erläggas till företaget så snart avloppet B - Ba - C - D - E - F - G är utfört och avsynat av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar.

Någon ersättning skall ej utgå.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för båda samfälligheterna understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes å arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan ligger 80,00 m högre än Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Höga dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

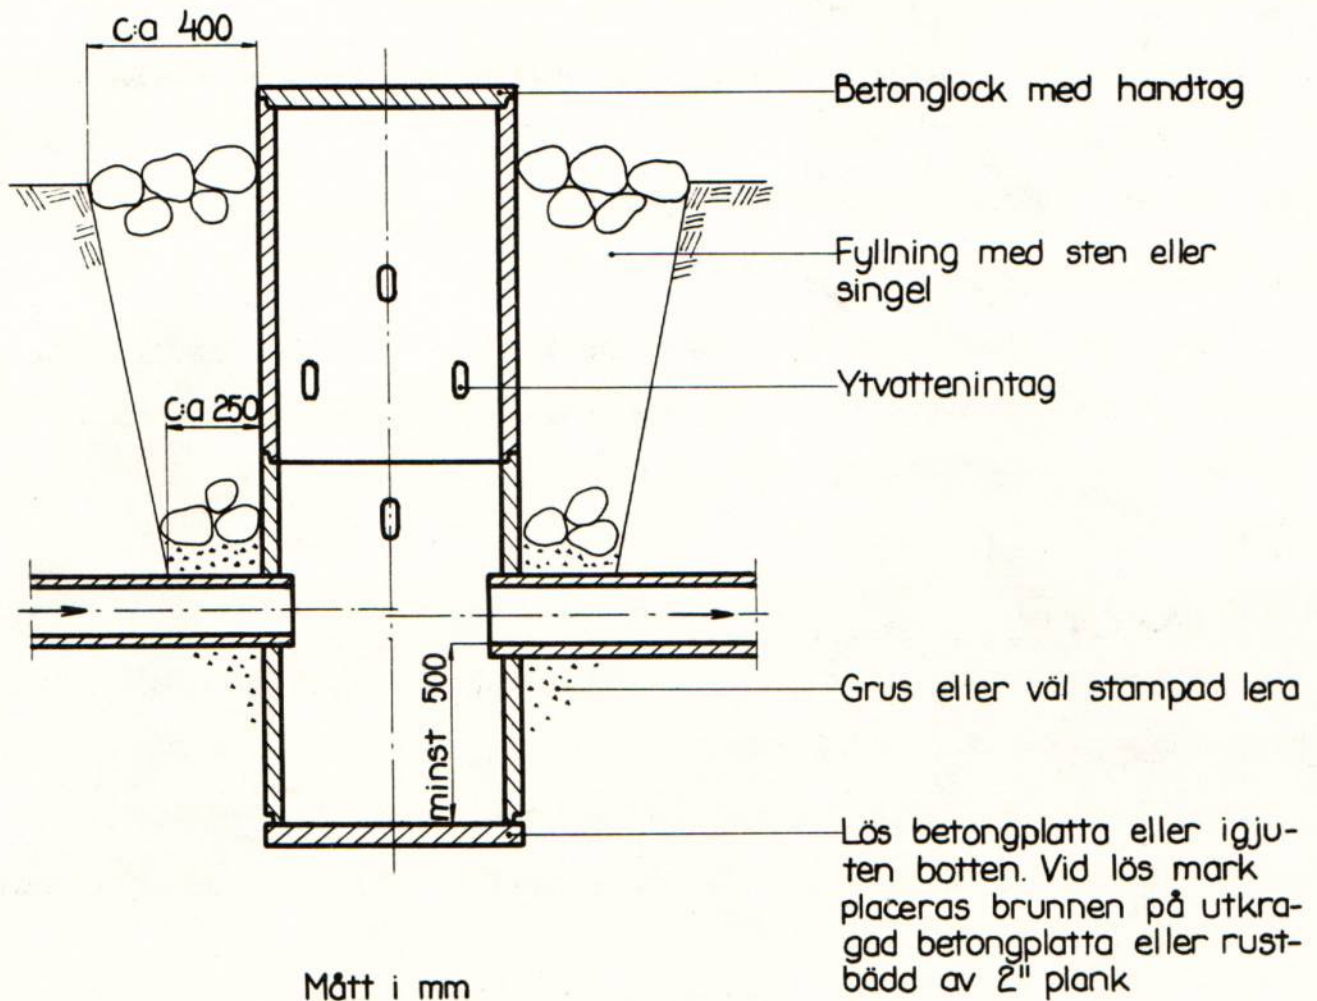
Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Höga, Viste-Åskjum den 20 december 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Höga, Viste-Askjum den 20 december 1960.

I tjänsten:

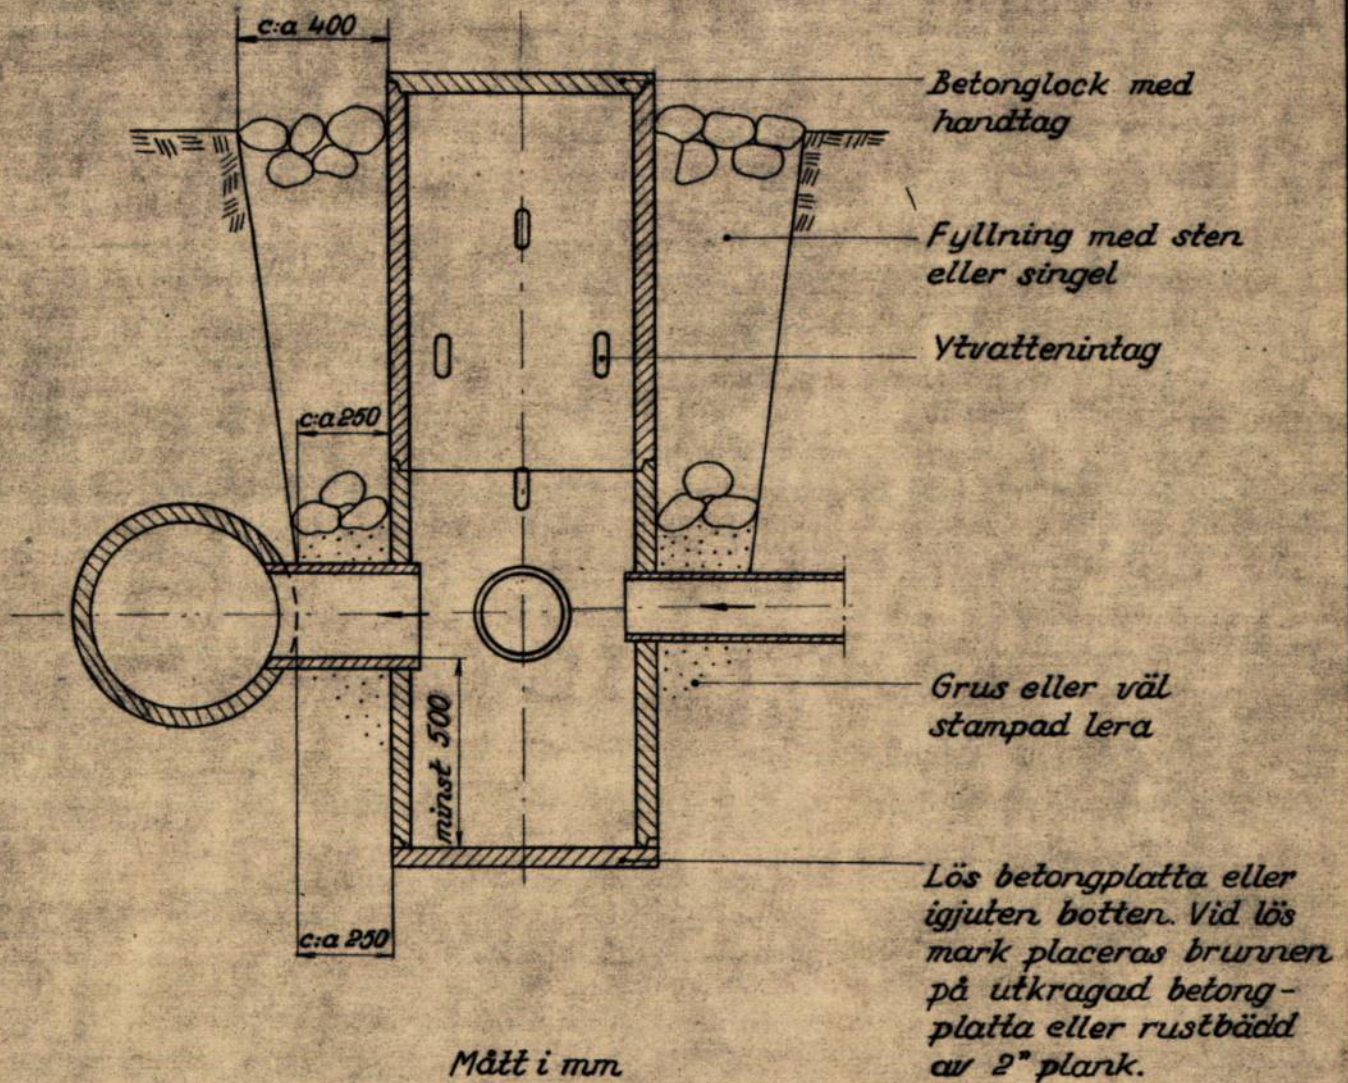
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN



Höga, Viste-Askjum den 20 december 1960.

I tjänsten:

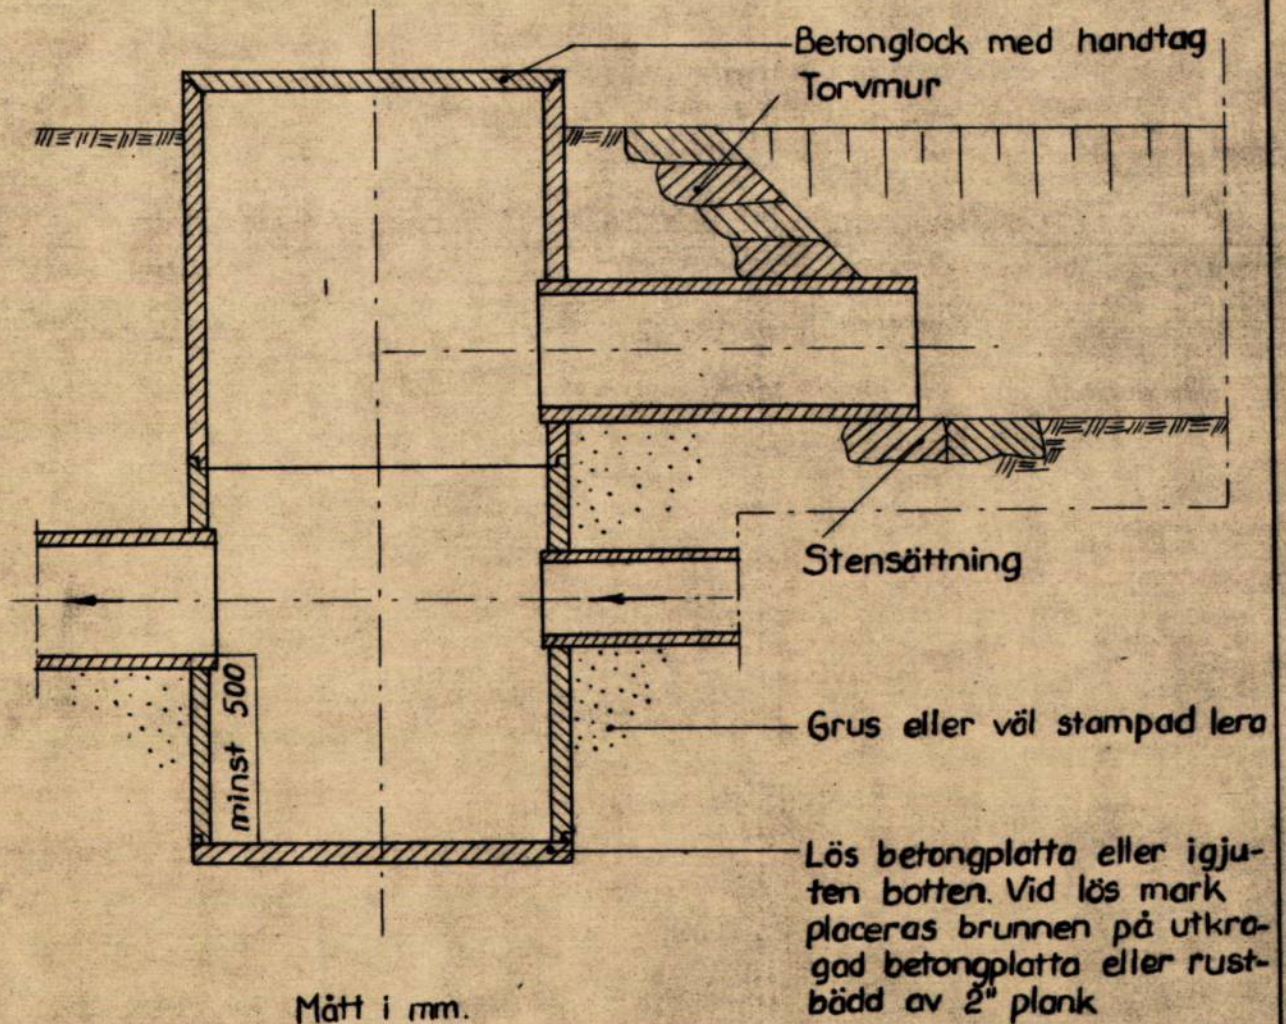
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

BRUNN MED INTAG

Typritning B-5

BRUNN



Höga, Viste-Askjum den 20 december 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.
