



Akt nr:

R-F4b-LS445 / 67

AU\$R-F4b-LS445/67

Handlingar angående

KAMBO INVALIDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1967
i N:a Kedums socken, Örslösa kommun
av Skaraborgs län; upprättade år
1967 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr

445-6

Företagets namn			
Kambo invallningsföretag av år 1967			
Socken N. Kedum		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen ~~Förtroendeman~~ ~~Endastressort~~ Lantbrukare Tore Johansson, Kambo, N. KEDUM			
Statligt stöd bev. den Ännu ej behandlat		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid -	Medgiven förlängd arbetstid -	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 31/12 1973	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
BESIKTNING verkställd den Avs. 27 nov. 1967		BESIKTNING verkställd av Avs. Ingenjör Bertil Franssohn	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag av rördiket F2 - F4, som hade framdragits från sektion 20+94 till gräns mellan Kambo 1:2 och 1:3, ca 62 m söder om den föreslagna ändpunkten F4.

Ändringen har skett efter överenskommelse med resp. markägare och har inritats på ritningarna med grön beteckning.

Företaget godkännes i befintligt skick.

De slutliga kostnaderna har uppgått till de beräknade.

Skara den 28 nov. 1967.

I tjänsten:
J. Lippert

Mål BU 7/1967.

Dom B 4/1968.

D O M

meddelad av Västerbygdens vattendomstol å domstolens kansli i Vänersborg den 2 maj 1968 i nedannämnda ansökningsmål.

Domstolen: Vattenrättssekreteraren Ulf af Klintberg, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjören Sven Svensson och särskilde vattenrättsingenjören Åke Göhlner samt vattenrättsnämndemännen Bernt Olsson i Åsaka och Lennart Lundin i Främmestad.

Saken: Underställning jämlikt 7 kap. 55 § vattenlagen.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert har med biträde av gode män den 21 juni 1967 handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning medelst invallning mot Vänern av mark tillhörande fastigheterna Kambo 1², 1³, 1⁴, 1⁶, 1⁷ och 1⁸ i N:a Kedums socken, Örslösa kommun, Skaraborgs län. Det samma dag rörande företaget meddelade utlåtandet har jämlikt 7 kap. 55 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Över utlåtandet har besvär icke anförts.

Utan avgift

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara.

Vattendomstolen har vid den prövning av utlåtandet, som föran-
letts av underställningen, icke funnit anledning till erinran mot
densamma.

Utlåtandet fastställles därför av domstolen.

Det åligger sökandena till företaget att till vattendomstolens
kansli inbetala kostnaderna för två i målet utfärdade kungörelser.

Fullföljds-
hänvisning.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot do-
men, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 16
maj 1968 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vat-
tenrättssekreterare vid vattendomstolen, adress Box 71, 462 01
Vänersborg 1, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som
anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den
30 maj 1968 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till
vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöver-
domstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakt-
tagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att
inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet ut-
gick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vade-

talán förfaller, om den första vadetalán återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Ulf af Klintberg
(Ulf af Klintberg)

Handlingar angående
KAMBO INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1967
i N:a Kedums socken, Örslösa kommun
av Skaraborgs län; upprättade år 1967
vid syneförrättning enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.Sid.

Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	4-
Kungörelse	" B	6-
Förteckning	" C	7-
Förening	" D	8-
Värderingslängd	" E	9-
Kostnadsförslag	" F	16-
Hydrografisk utredning	" G	22-
Arbetsbeskrivning	" H	23-
Kostnadsfördelningslängd	" I	26-
Översiktskarta		27-
Utlåtande	bil. K	28-
Typritningar	" L, M	33-34.

Till förslaget hör 1 plankarta, 4 profilritningar och 1 ritning över pumpanläggning.

1.
Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för betäckning av mark till-
hörande Kambo i N:a Kedums
socken, Östlöösa kommun av Skaraborgs
län.

Den 21 juni 1967 hos lantbr. Tore Johansson, Kambo, N:a Kedum.
Närvarande: Understecknad o. o. lantbruksingenjör och
förrättningsman samt godemännen Gunnar Carlsson,
Gröneberg, ^{N:a Kedum} och Karl-Erik Svensson, Orravalla, Tädene,
ävensom följande sakägare:

Sökande:

Tage och Tore Johansson - äg. Kambo 1:4 och 1:8
genom Tore Johansson.

Ar övriga sakägare:

Walfried Johansson - äg. Kambo 1:6 och 1:7

Jonas Fransson - " Kambo 1:3.

Waldemar Birgersson - " Kambo 1:2

Tage Johansson - " Kambo 1:4 och 1:8

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
förelösnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej uttröñas.

§3.

Tage Johansson, Walfried Johansson och Jonas Fransson
bekräftade, att de den 6. apr. detta år skriftligen förenat
sig med sökanden, bilaga...

2.

§4.

Sökanden och de, som förenat sig honom har underhand hos förrättningsmannen påyrkat de befintliga arluppens fördjupning och igenläggning med rör samt invallning av ifrågakvarande område, så att deras härav berornde mark må kunna på ändamålsentligt sätt torrläggas och brukas.

§5

Det upplystes att något fiske på de för invallning avsedda markerna ej förekommer.

§6

Någon ersättning för mark, som åtgår till vall och vallgräv påyrkas ej.

§7

Förelades det upprätkade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning med härtill hörande handlingar och ritningar.

§8.

Upplästes oynemännens utlåtande, som hade lyddes enligt bitaga.

§9.

Bestöts att styrelsen skall bestå av två ordinarie ledamöter och en suppleant.

§10.

Till ordförande för företaget valdes Tore Johansson, Kambo, N:a Kedum, och till ledamot

utsågs Tage Johansson, Kambo, N:o Kedum.

Till suppleant valdes Jonas Fransson, Kambo, N:o Kedum.

Till revisor och granska styrelsens räkenskaper valdes Valdemar Birgersson, Liaköping.

§ 11

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs synemännen företagets ordförande Tore Johansson, Kambo N:o Kedum.

§ 12

Redogjorde förrättningarna för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades: att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras, och att utskittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bli beviljade.

§ 13.


Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

Tjänsten
J. Lippert

Biträdande godemän

Emmer Larsson Karl-Erik Lennström



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Norra Hedem

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning och invallning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Pedersöping

Meddelanden om förrättningen ställes till

San Henrikss Torz Johansson Henric S. Hedem

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tele 0510/72036

Henric S. Hedem den 29/6 19 66

Sökandes namn:

Fastighet:

Torgvald Torz Johansson för fastigheten Henric 1:4 och 1:8
fm. Torz Johansson » »
 » »

22060

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Valfrid Johansson</i>	ägare av fastigheten	<i>Plan 1:6 och 1:7</i>
<i>Jonas Ersson</i>	» » »	» 1:3
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Jaak Lippert

Skara

den 7 juli

1966

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bengt Riitz
Bengt Riitz

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 15 augusti 1966.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik Christiansson
Erik Christiansson

Sven Tidén
Sven Tidén

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande KAMBO i N:a Kedums socken av Skaraborgs län genom invallning mot sjön Väneren samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp inom det invallade området, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Tore Johansson, Kambo, N:a Kedum onsdagen den 21 juni 1967 klockan 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

KAMBO 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:7 och 1:8.

Skara den 2 juni 1967.

I tjänsten:


J. LIPPERT

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i NYA LÄNS-TIDNINGEN NYA LIDKÖ-PINGS-TIDNINGEN måndagen den 5 juni 1967, intygas.

Skara den 6 juni 1967.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Tore Johansson, Kambo, N:a Kedum onsdagen den 21 juni 1967 kl. 10.00, vilka, medelst avdrag av kungörelse, denna dag avsänts till följande:

Tore Johansson	Kambo	<u>Norra Kedum</u>
Tage Johansson	"	- " -
Walfrid Johansson	"	- " -
Jonas Fransson	"	- " -
Waldemar Birgersson	Västergatan 21	<u>Lidköping</u>
Skiftesgodemän:		
Gunnar Carlsson	Gröneberg	<u>Norra Kedum</u>
Karl-Erik Svensson	Orrevalla	<u>Tådene.</u>

Skara den 7 juni 1967.

I tjänsten:


J. Lipert

Lantbruksingenjör

Undertecknade, förenar oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kambo i N:ra Kedums socken, Östlösa kommun, genom invallning mot sjön Vänern, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Kambo, N:ra Kedum den 6. apr. 1967

Tage Johansson

Kalfrid Johansson.

Jonas Fransson

Bestyrkes i tjänsten

J. Lyytinen

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
N:a Kedums socken							
Kambo 1:2							
Waldemar Birgersson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på ngt mo o.mjälbl.lera	1	0,03		~~600~~ 390	4000	3610	~~108~~ 978
" " "	2	0,03		~~2000~~ 1500	"	2500	~~75~~ 675
" " "	3	0,17		~~800~~ 520	"	3480	~~592~~ 5298
" " "	4	1,13		~~1200~~ 900	"	3100	~~3503~~ 3133
" " "	5	0,54		~~2400~~ 2040	"	1960	~~1058~~ 9464
Summa		1,90					~~4773~~ 5336
Brukningsbåtnad							
21+94-22+44 = 50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
					5:--		~~250~~ 0
Summa							~~250~~ 0
Totalsumma		1,90					4773
Kambo 1:3							
Jonas Fransson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på ngt mo o.mjälbl.lera	6	0,09		3800	4000	200	18
" " "	7	0,26		~~1200~~ 1020	"	2980	775
" " "	8	0,78		~~400~~ 300	"	3700	2886
" " "	9	0,31		~~1000~~ 858	"	3150	977
" " "	10	0,10		3600	"	400	40
" " "	11	0,19		"	"	"	76
" " "	12	0,14		3840	"	160	22
" " "	13	0,61		~~2200~~ 1870	"	2130	1299
" " "	14	0,60		~~1200~~ 1020	"	2980	1788
" " "	15	0,30		~~800~~ 600	"	3400	1020
" " "	16	0,57		~~600~~ 450	"	3550	2024
" " "	17	0,85		~~1400~~ 1190	"	2810	2389
" " "	18	0,09		~~400~~ 300	"	3700	333

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på ngt mo o. mjälbl. lera	19	0,16		~~1000~~ 850	4000	3150	504
" " "	20	0,10		~~240~~ 180	"	3820	382
" " "	21	0,80		~~800~~ 680	"	3320	2656
" " "	22	0,25		1600	"	2400	600
" " "	23	0,35		~~400~~ 340	"	3660	1281
" " "	24	0,04		1000	"	3000	120
Tomt " "	25	0,18		1200	"	2800	504
" " "	26	0,16		1400	"	2600	416
Odlingsm., mylla på ngt dybl. lera	27	0,55		~~350~~ 228	3500	3272	1800
Skogsm., " "	28		0,37	~~800~~ 600	1000	400	148
" " "	29		0,13	~~1000~~ 850	"	150	20
Summa		7,48	0,50				22078
<u>Brukningsbåtnad</u>							
9+97-10+76 = 79 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr							
20 - 20+89 = 89 m	-	"	-			11:-	979
20+94-21+68 = 74 m	-	"	-			11:-	814
Summa							2267
Totalsumma		7,48	0,50				24345
<u>Kambo 1:4</u>							
Tage och Tore Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsm., mylla på ngt dybl. lera	30	0,12		~~350~~ 228	3500	3272	393
Åker " "	31	0,22		~~600~~ 390	4000	3610	794
" mylla på ngt mo o. mjälbl. lera	32	0,07		~~1600~~ 1200	"	2800	196
" mylla på ngt dybl. lera	33	0,07		~~800~~ 600	"	3400	238
" mylla på ngt mo o. mjälbl. lera	34	0,07		~~1600~~ 1360	"	2640	185
" " "	35	0,84		~~600~~ 450	"	3550	2982
" " "	36	0,49		~~600~~ 450	"	"	1740
" " "	37	0,07		~~2400~~ 2040	"	1960	137

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på ngt mo o. mjälbl.lera	38	1,12		~~400~~ 300	4000	3700	4144
" " "	39	0,51		~~600~~ 450	"	3550	1811
" " "	40	0,63		~~1800~~ 1530	"	2470	1556
" " "	41	0,08		3840	"	160	13
" " "	42	0,20		~~1200~~ 1020	"	2980	596
" " "	43	0,50		~~1000~~ 850	"	3150	1575
" " "	44	0,30		~~800~~ 600	"	3400	1020
" " "	45	0,96		~~1200~~ 1020	"	2980	2861
" " "	46	0,02		3200	"	800	16
" " "	47	0,09		~~400~~ 300	"	3700	333
" " "	48	0,32		~~1000~~ 850	"	3150	1008
" " "	49	0,20		~~800~~ 680	"	3320	664
Tomt	50	0,06		2400	"	1600	96
Summa.		6,94					22358
<u>Brukningsbåtnad</u>							
10+80-11+69 = 89 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
Gräns-25+30 = 86 m	-	"	-		"	11:--	946
25+34-26+2 = 68 "	-	"	-		"	11:--	748
Summa.							2228
Totalsumma.		6,94					24586
<u>Kambo 1:8</u>							
Tage och Tore Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på ngt mo o. mjälbl.lera	51	0,29		~~600~~ 450	4000	3550	1030
" " "	52	0,27		~~1000~~ 750	"	3250	878
" " "	53	0,25		~~1400~~ 1190	"	2810	703
" " "	54	0,71		~~800~~ 680	"	3320	2357
" " "	55	0,02		3000	"	1000	20
" " "	56	0,24		~~1000~~ 850	"	3150	756

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på ngt mo o. mjälbl. lera	57	0,29	.	3000	4000	1000	290
Tomt, " "	58	0,03		2800	"	1200	36
Åker " "	59	0,05		~~1600~~ 1360	"	2640	132
" " "	60	0,30		2000	"	2000	600
" " "	61	0,22		1800	"	2200	484
" " "	62	0,70		2400	"	1600	1120
Summa		3,37					8406
<u>Brukningssåtnad</u>							
26+2-26+29 = 27 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
					å kr	11:--	297
Summa							297
Totalsumma		3,37					8703
<u>Kambo 1:7</u>							
Valfrid Johansson							
<u>Alstringsåtnad</u>							
Åker, mylla på ngt mo o. mjälbl. lera	63	0,41		~~400~~ 260	4000	3740	1533
" " "	64	0,28		~~800~~ 600	"	3400	952
" " "	65	0,46		~~1400~~ 1190	"	2810	1293
" " "	66	0,17		3400	"	600	102
" " "	67	0,67		~~800~~ 680	"	3320	2224
" " "	68	0,05		3000	"	1000	50
" " "	69	0,02		2800	"	1200	24
" " "	70	0,05		"	"	"	60
" " "	71	0,06		2200	"	1800	108
" " "	72	0,47		~~1200~~ 1020	"	2980	1401
" " "	73	0,16		1800	"	2200	352
" " "	74	0,32		3200	"	800	256
Summa		3,12					8355

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
26+29-gräns = 38 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	11:-	418
40+15-40+65 = 50 m - " -					"	6:-	300
Summa							718
Totalsumma		3,12					9073
<u>Kambo 1:6</u>							
Valfrid Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på ngt mo o. mjälb.lera	75	0,77		~~400~~ 260	4000	3740	2880
" - " -	76	0,47		~~1000~~ 750	"	3250	1528
" - " -	77	0,41		~~1800~~ 1530	"	2470	1013
" - " -	78	0,04		3400	"	600	24
" - " -	79	0,06		"	"	"	36
" - " -	80	0,19		~~1400~~ 1190	"	2810	534
" - " -	81	0,05		3600	"	400	20
" - " -	82	0,40		~~1400~~ 1190	"	2810	1124
" - " -	83	0,17		3200	"	800	136
" - " -	84	0,41		2000	"	2000	820
" - " -	85	1,01		~~1200~~ 1020	"	2980	3010
" - " -	86	0,22		2200	"	1800	396
" - " -	87	0,07		3000	"	1000	70
" - " -	88	0,28		2200	"	1800	504
" - " -	89	0,02		2000	"	2000	40
" - " -	90	0,29		~~1000~~ 850	"	3150	914
" - " -	91	0,17		2400	"	1600	272
Summa		5,03					13321

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
27+54-tvärdike = 83 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					à kr	6:--	498
Tvärdike-gräns = 47 m	-- "	--			"	11:--	517
40+65-tvärdike = 118 m	-- "	--			"	6:--	708
Tvärdike-42+6 = 44 m	-- "	--			"	9:--	396
Summa							2119
Totalsumma		5,03					15440
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Kambo 1:2</u>							
Waldemar Birgersson	1,5 ab	1,90				4773	
	brb					-	4773
<u>Kambo 1:3</u>							
Jonas Fransson	6-29 ab	7,48	0,50			22078	
	brb					2267	24345
<u>Kambo 1:4</u>							
Tage och Tore Johansson	30-50 ab	6,94				22358	
	brb					2228	24586
<u>Kambo 1:8</u>							
Tage och Tore Johansson	51-62 ab	3,37				8406	
	brb					297	8703
<u>Kambo 1:7</u>							
Valfrid Johansson	63-74 ab	3,12				8355	
	brb					718	9073
<u>Kambo 1:6</u>							
Valfrid Johansson	75-91 ab	5,03				13321	
	brb					2119	15440
Summa		27,84	0,50				86920

x/ = båtnadsminskning på grund av avdragsdike.

ab = alstringsbåtnad.

brb = brukningsbåtnad.

blå siffra = markens värde före torrläggning efter minskning på grund av
översvämningsskador, som
uppskattats under höjdkurvan 44,85 50 procent
mellan höjdkurvorna 44,85 - 45,10 35 "
" " 45,10 - 45,35 25 "
" " 45,35 - 45,85 15 "

Kambo, N:a Kedum den 21 juni 1967.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Gunnar Carlsson *Karl-Erik Svensson*

SVENSKT ARKIV

TUMBA 1963

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Pumpanläggning vid F</u>					
		Pumpbrunnen av 1500 mm:s brunnsrör	m	3,5	298	693	
		med färdiggjuten botten; d=1600 mm	st	1	126	126	
		Gjutning av 150 mm:s botten- platta på botten med rutarme- ring i överkant $\emptyset$ 10 c/c 150 inborrade i brunnsringen	m ³	0,4	350	140	
		Schaktning, länshållning, pålning och ev. rustbädd under bottenplatta av 150 mm:s rundvirke, sättning av brunns- ringar samt tätning av fogar med plastmassa, cementbruk eller fogband, ävensom kring- gjutning av utloppsröret				500	
		Överbyggnad med uppfällbart koniskt tak av 0,56 mm:s för- zinkad järnplåt som fästes på cirkelformig 3 x 4" träram eller brutet tak av korrugerad aluminiumplåt, KP 158/0,55, grön, som fästes på 3 x 4" träram				300	
		Spontvägg för tätning kring utloppsrör: 2 x 3 m:s spontad vägg av 1 x 4" råspont	m ²	6	16	96	
		1 x 2" läkt för tvärsål	m	6	1:20	7	
		Manschetter av 3 mm:s plåt med gumminatta och bultar				60	
		Utloppsbrunn av 1200 mm:s brunnssringar med fastgjuten botten och täta fogar samt med evakueringsöppning för luft i locket	st	1	400	400	
		400 mm:s lantbruksrör som hop- fästes med koppartråd	m	3	34	102	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	3	4	12	
		Uppgrävning av öppet dike på en längd av 4 m samt sten och torvsättning enl. ritning vid utloppet				100	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Schaktning och uppläggning av lera kring utloppsbrunnen jämte finjustering vid pumpanläggningen	m ³	10	10	100	
		Ehlins dränkbara invallningspump I, största uppforderingshöjd 2,70 m, kapacitet 75 l/sek vid uppforderingshöjd 2,00 m, avloppsrör 4,25 m, rörkrok, låsanordning för fläns mot avloppsrör, automatisk smörjanordning, motorskydd, el.-utrustning för automatisk drift med nivåvipor, skyddsanordning för nivåvipor mot vattenvirvel, bakslagslucka och i övrigt enligt offert, varuskatt, frakt, montage m.m.				7150	
		Lågspänningskabel, FKKJ 1 kv 3 x 10+10 montage, installation m.m.				5000	
		Arbetsledning och oförutsett				1474	16260
		<u>Vallen A - B</u>					
0 - 0+28	28	Uppläggning av vall enl. ritning, med undanröjande av matjord under vallen (en 0,60 m:s bred ränna under vallens mitt) och med vallkärna av tätande material	m ³	37	2:--	74	
		Vallens finjustering	m	28	1:50	42	
		Arbetsledning och oförutsett				14	130
		<u>Vallen C - D</u>					
11 - 2+56	156	Uppläggning av vall enl. ritning, med undanröjande av matjord under vallen (en 0,60 m:s bred ränna under vallens mitt) och med vallkärna av tätande material	m ³	250	2:--	500	
		Vallens finjustering	m	156	1:50	234	
		Arbetsledning och oförutsett				76	810
		<u>Vallen E - F - G</u>					
3 - 5+35	235	Uppläggning av vall enl. ritning, med undanröjande av matjord under vallen (en 0,60 m:s bred ränna under vallens mitt) och med vallkärna av tätande material	m ³	740	1:80	1332	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
8 - 8+93	93	Vallens finjustering	m	235	1:50	353	1850
		Arbetsledning och oförutsett				165	
		<u>Vallen H - I</u>					400
		Uppläggning av vall enl. ritn., med undanröjande av matjord under vallen och med vall- kärna av tätande material	m ³	110	2:--	220	
		Vallens finjustering	m	93	1:50	140	
		Arbetsledning och oförutsett				40	
		<u>Rörledningen och samlingsbassängen F - Fl</u>					
9+97-11+69	172	600 mm:s rör med frakt	m	172	35:50	6106	
9+97-10+2		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	5	8:--	40	
		Genomgående rustbädd av 2" plank	"	5	7:--	35	
		Tätning av fogar med plast- massa eller cementbruk	"	5	5:--	25	
10+2-11+69		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	167	8:--	1336	
9+97		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av pumpbrunnen; anslutning av brunnen till pumpbrunnen med en 5 m lång 150 mm:s rörledning. Fogarna (150 mm:s) tätas med cement- bruk	st	1	200:--	200	
10+80		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörledn. med ett 0,3 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:--	150	
11+69		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel	"	1	300:--	300	
		Arbetsledning och oförutsett				818	9010
		<u>Rörledningen Fl - F2</u>					
11+69-12+32	63	300 mm:s rör med frakt	m	63	10:--	630	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	63	4:50	284	
12+32		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	240:--	240	
12+32-13+84	152	250 mm:s rör med frakt	m	152	7:20	1094	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	152	4:--	608	
13+84		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st	1	180:--	180	
		Arbetsledning och oförutsett				304	3340

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Rörledningen F2 - F3</u>					
13+84-15+90	206	150 mm:s rör med frakt	m	206	4:--	824	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	206	3:--	618	
15+51-15+58 15+85-15+90		Genomgrävning av vägbana	st	2	25:-	50	
15+51, 15+58, 15+90		Brunn typ B-1; d=0,5 m	"	3	150:-	450	
15+90-17+66	176	100 mm:s rör med frakt	m	176	2:90	510	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	176	2:50	440	
16+80, 17+66		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	2	150:-	300	
		Arbetsledning och oförutsett				318	3510
		<u>Rörledningen F2 - F4</u>					
20 - 20+94	94	200 mm:s rör med frakt	m	94	5:45	512	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	94	3:50	329	
20+89-20+94		Genomgrävning av vägbana	st	1	25:-	25	
20+89, 20+94		Brunn typ B-1; d=0,5 m	"	2	150:-	300	
20+94-21+68	74	150 mm:s rör med frakt	m	74	4:--	296	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	74	3:--	222	
21+68		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning och oförutsett				186	2020
		<u>Rörledningen F - F5</u>					
19 - 19+22	22	75 mm:s rör med frakt	m	22	1:70	37	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	22	2:--	44	
19+22		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning och oförutsett				29	260
		<u>Rörledningen F1 - F6</u>					
25 - 26+29	129	300 mm:s rör med frakt	m	129	10:-	1290	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	129	4:50	581	
25+82, 26+29		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	2	240:-	480	
		Arbetsledning och oförutsett				239	2590
		<u>Rörledningen F6 - F7</u>					
26+29 - 27	71	150 mm:s rör med frakt	m	71	4:--	284	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	71	3:--	213	
27		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
27 - 27+54	540	100 mm:s rör med frakt	m	54	2:90	157	
		Grävn., lägg.n.o. återfylln.	"	54	2:50	135	
27+54		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning och oförutsett				101	1190
		<u>Rörledningen F6 - F8</u>					
30 - 32+67	267	250 mm:s rör med frakt	m	267	7:20	1922	
		Grävn., lägg.n. o. återfylln.	"	267	4:--	1068	
32+67		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st	1	180:-	180	
		Arbetsledning och oförutsett				320	3490
		<u>Rörledningen F8 - F9</u>					
32+67-34+28	161	200 mm:s rör med frakt	m	161	5:45	877	
		Grävn., lägg.n. o. återfylln.	"	161	3:50	564	
33+72, 33+77, 34+28		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	3	150:-	450	
34+28-34+78	50	150 mm:s rör med frakt	m	50	4:--	200	
		Grävn., lägg.n.o. återfylln.	"	50	3:--	150	
34+78		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
34+78-35+93	115	100 mm:s rör med frakt	m	115	2:90	334	
		Grävn., lägg.n. o. återfylln.	"	115	2:50	288	
35+93		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning och oförutsett				317	3480
		<u>Rörledningen F8 - F10</u>					
40 - 42+6	206	150 mm:s rör med frakt	m	206	4:--	824	
		Grävn., lägg.n. o. återfylln.	"	206	3:--	618	
41+42, 42+65		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	2	150:-	300	
		Arbetsledning o. oförutsett				178	1920
		Summa kronor					50260
		<u>Avdragsdiket F4 - Fa</u>					
21+68-22+44	76	75 mm:s rör med frakt	m	76	1:70	129	
		Grävn., lägg.n.o. återfylln.	"	76	2:--	152	
22+44		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning och oförutsett				39	470
		Summa kronor					470
							Vänd!

Hydrografisk utredning.

Vattensamlingsområde 30,8 ha åker och 12,2 ha skog.

Flödesvattenmängd $(2,0 \times 30,8) + (1,0 \times 12,2) = 73,8$ l/sek.

Skillnad mellan yttre och inre vattenstånden:

Största $5,60 - 2,90 = 2,70$ m

Vanlig $4,85 - 3,00 = 1,85$ m.

Pumpanläggningen skall kunna uppfordra minst 75,0 l/sek. vid 1,85 m uppfordringshöjd.

Medelnederbörden för ifrågavarande trakt uppgår till 600 mm per år, varav 350 mm kan beräknas åtgå till växtligheten och avdunstning samt 250 mm avrinna.

Den årliga pumpningskostnaden med pumpaggregatets verkningsgrad 0,55 och med ett energipris av 8 öre/kwh beräknas till följande:

$$K = \frac{10000 \times 43,0 \times 0,25 \times 1,85 \times 1000 \times 0,08}{0,55 \times 75 \times 1,36 \times 3600} = \frac{15910000}{201960} = 78:78 \text{ kr}$$

eller avrundat 79:-- kronor.

Den årliga driftskostnaden beräknas sålunda till:

Fast årlig avgift	kr 198:--
Energiavgift	" 79:--
Tillsyn, smörjmedel, underhållskostnader, energiskatt m.m.	" 198:--
Summa kronor	<u>475:--</u>

Kapitaliserat efter en räntesats av 5 procent motsvarar sålunda driftskostnaden ett belopp av

$$\frac{475:-- \times 100}{5} = 9\,500:-- \text{ kronor.}$$

Kambo, N:a Kedum den 21 juni 1967.

I tjänsten:

J. Lipper

E.o.lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall iakttas:

att i grävningstabell angivna djup resp. vallhöjder och -bredder är beräknade i förhållande till de avvägda pålarna;

att med höjd resp. djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till vallkrönet, resp. rörets inre underkant;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vid uppläggning av skyddsvall grästorven i vallägets mitt till en bredd av minst en meter borttages, så att god tätning mellan markytan och vallen ernås;

att vallmaterialet ej får innehålla astubbar, rötter eller större stenar;

att om marken under vallen utgöres av vattengenomsläppligt material, skall en 0,60 meters bred ränna under vallens mitt grävas till erforderligt djup och fyllas med tätande material;

att till vallkärna skall användas tätande material av lagom fuktighet, som upplägges i högst 0,40 m tjocka horisontella skikt och packas väl;

att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår;

att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet;

att tegelrör skall uppfylla gällande standardbestämmelser;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst ett 10 cm väl avjämnat gruslager;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör;
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas S-märkta gummiskarvade muffrör av betong; tätningen utföres med tätningsring av gummi samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts;
- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att pumpbrunnen med in- och utloppsledningar göres vattentät;
- att särskild uppmärksamhet ägnas tätningen av och runt pumpstationens rör;
- att brunnarna utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning;
- att rörledning lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga, innan den borttages, genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.


För höjdbestämmningen har nedan omnämnda fixpunkt utmärkts:

Järndubb i berg c:a 45 m norr om sekt. F 8 å höjden + 6,70 m.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 40,00 m över Sveriges normalnollplan.

Kambo, N:a Kedum den 21 juni 1967.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>N:a Kedums socken</u>						
<u>Kambo 1:2</u>						
Waldemar Birgersson		4773		2760	5,491	
<u>Kambo 1:3</u>						
Jonas Fransson	S	24345		14077	28,009	
<u>Kambo 1:4</u>						
Tage och Tore Johansson	S	24586		14217	28,286	
<u>Kambo 1:8</u>						
Tage och Tore Johansson	S	8703		5032	10,013	
<u>Kambo 1:7</u>						
Valfrid Johansson	S	9073		5246	10,438	
<u>Kambo 1:6</u>						
Valfrid Johansson	S	15440		8928	17,763	
<u>Summa</u>		86920		50260	100,000	
Kambo, N:a Kedum den 21 juni 1967. I tjänsten: <i>J. Lipwert</i> J. Lipwert E.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män: <i>Gunnar Carlsson</i> <i>Karl-Erik Svensson</i>						

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande K A M B O i N:a Kedums socken, Örslösa kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser invallning mot sjön Vänern samt fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp inom det invallade området för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,0 km NV N:a Kedums kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom invallning mot sjö.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta vall- och dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Pumpanläggning vid F,

vallarna A - B, C - D, E - F - G och H - I,

samlingsbassängen och rörledningen F - F1 och

rörledningarna F1 - F2 - F3, F2 - F4, F - F5, F1 - F6 - F7, F6 - F8 - F9 och F8 - F10.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomiska kartan och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

För underlättande av tillrinningen till pumpanläggningen har rörledningarna F1 - F2, F1 - F6 och F6 - F8 dimensionerats för 2,4 liter per sekund och hektar från åker och 1,2 liter per sekund och hektar från skog, medan flödesvattenmängden för övriga rörledningar beräknats till 2,0 resp. 1,0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med honom förenat.

Av bifogade hydrografiska utredning framgår närmare dimensioneringen av pumpanläggningen vid sekt. F och årliga driftskostnader.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen och invallningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m.

Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll samt drifts- och underhållskostnader för pumpanläggningen med vallarna skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökanden och med dem jämförda.

7. Allmänna intressen, fiske.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

Då det synes uppenbart att företaget ej kan beröra fiskeintresse av någon betydelse, har avskrift av ansökningshandlingarna ej översänts till Kungl. Fiskeristyrelsen för yttrande.

8. Broar och trummor.

På grund av dikenans igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till vall och vallgrav har ersättning ej påyrkats och skall ej heller utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen skriftligen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 173:84 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 40,00 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1973,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt
att det skall benämnas Kambo invallningsföretag av år 1967.

16. Tillåtlighet.

Nyttan av genom företaget vidtagna åtgärder överstiger kostnaderna härför, varför de i vattenlagen 7. kap. 38 § stadgade villkoren för företagets tillåtlighet får anses uppfyllda.

17. Verkställighet.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7. kap. 55 § skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

18. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kambo, N:a Kedum den 21 juni 1967.

I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:


Gunnar Carlsson

Karl-Erik Svensson

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

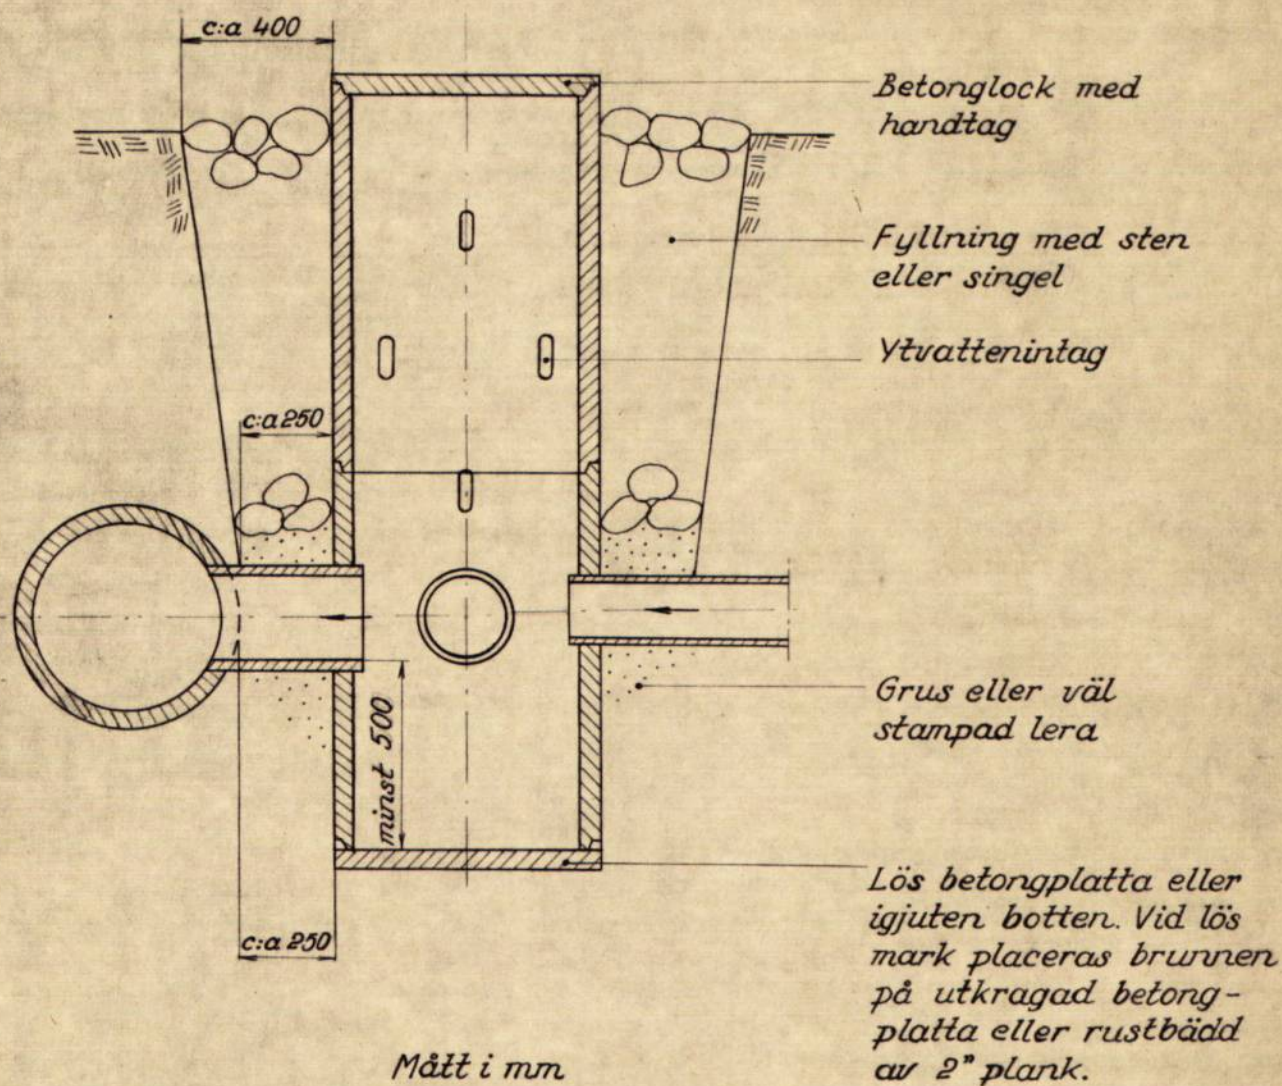


Kambo, N:a Kedum den 21 juni 1967.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

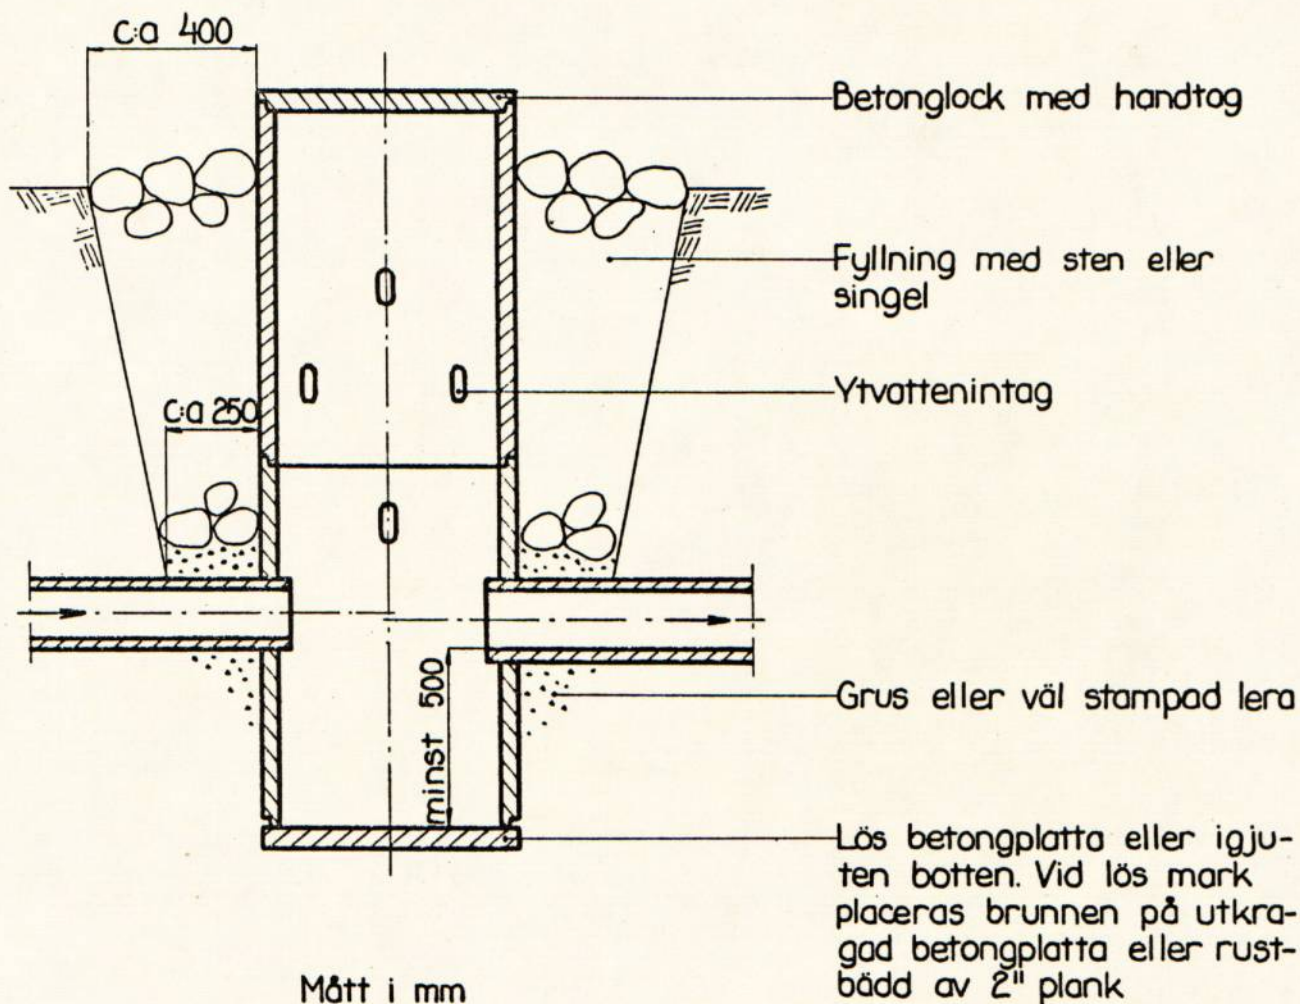

Kambo, N:a Kedum den 21 juni 1967.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.
