



Akt nr:

R-F4b-LS56/56

AU\$R-F4b-LS56/56

56
56



1
Protokoll vid seque-
strering enligt värde-
lagen för försäkring
av mark, bebyggelse
och gärdar i Hälunda
lokal av Skaraborgs
län.

Den 20 december 1955 i Skara.

Närvarande: Underbecknad statens lant-
bruksingenjör och förättningsman
samt följande bodelägare:

Sökanden Gust. Fägerwall äg. Häl-
unda 12:1

Skara pastorat äg. Hälunda Prästgården
10:1 genom bevakningsstyrelsens ordförande
Närds domare Sven Wennerstedt

§ 1
Närslutet det för förättningsmannen
utfärdade förordnandet, och hade ly-
dte enligt bilaga A.

§ 2
Något för när förättningsmannen
kunde ej utlösas.

§ 3
Sökanden bekräftade under hand till
förättningsmannen gjorda yrskanden
samt dels värdet för försäkring av mark,
samt ursprungligen ingått i Skaraborgs

2

Stämning förtag. år 1945, men som
på ystade av före ägaren till Öl-
gården utgått av detta förtag, och
dels på det ständ att Samfundets
Öl gårdens invallnings förtag av år
1941, så att invallningen finge den
för tilläggningseffekt, som från början
utsetts.

Beträffande det omtalade förtaget
uppläses, att pumpaggregatet varit
på otillräckligt att bortföra även
Gården måttliga flöden, beroende på,
att den tillräckande vatten mängden
upprebarligen var oerhört större än
den beräknade. Vidare hade botten i
den del rör diken varit så lös vid
pumpstället för förens tilläggning, att stätt-
ningar, i träffat, varit orsakat igen-
skallning i stora diken, vilka där för
måtte beläggas med rör försett
med mordning mot förskjutning av
rören i förhållande till varandra.

§ 4

Området för Skara pastorat framhåll,
att man ej hade besögenhet godkänna
Åtgärder, som påhade pastoratets några
beständ. Vad 1941 års invallnings-
förtag beträffar, så hade prästgårdens
areator för pastoratets medgivande
gå med den önskan till förändringar
under villkor, att man sökte för

under arrende tiden för fullaste produkt-
undelar och i fråga om underhålls-
arbeten valde man kontrakt enligt
skylning svara för dessa. På arrend-
tiden återstår för närvarande dygt
ett år.

§ 5

Först nämnda nämnen förmedde
ett preliminärt förslag till ipräg-
varande förslagsmångt gård.

§ 6

Ingen av sakenarna hade något
att erinra mot, att de kortade,
som varit beaktad plettering av 1941
års inrättning förslag, uppdelades
efter samma procenttal, som
just ställts för delaktigheten i in-
rättning förslaget, varvid för pasto-
ratsambudet medgivande dock skulle
gälla den prövsättningen, att pasto-
ratet i låga ordning ålades detta
i dessa kortade.

§ 7

Man videt vidare fanns att
för protokollet anteckna för-
skendes sammankommet avslutat

Med tillstånd givande, att för-
 entningen i Skidhuggning skulle
 fortsättas vid nytt stannantråde
 på ort och vid den kommer att
 i laga ordning för sakägarna
 tillstånd givas.

Det och lid som vara

9 Hjärtan:

Wendellin

Den 16 Maj 1956 i Ekgården.

Närvarande: Under tecknad förädlingsman
 samt gode män Eric Waller, Skara,
 och Håll-Gustav Sandström, Hörby, ävensom
 följande sakägare:

Herr. Fägerswall, Ekgården.

Eric Lager arr. Hälsunda Prästgården

Fru Pertha Arner " Mellomg:n nr 6'

Skara pastorat genom boställsstyrelsens

r. ordf. nämnde man Eric Samuelsson

N. Arner Hälsunda Mellomg:n nr 6' genom

nämnde man Samuelsson enf. fullmakt
 bit. C^I.

Per Bröman arr. riknämnde förtyg

Vägförvaltningen i Skaraborg, samt genom väg-

mästare Anders Karlsson, fullmakt bit. C^{II}.

§ 8
Mågot för mot gode männen kunde
nj utroas.

§ 9
Förelades det sedan förra sammankom-
mans protokoll förslaget till de dratten.
Förordade medlemmarna bättre förläggning
med denna förordade handlingar.

§ 10
Supplärarernas sammankomman utlåtande,
som under lydelse enligt bil. H.

§ 11
Att Mattias och förvara till för-
slaget förordade handlingar och sit-
tingar utgåga sammankomman förordade
G. Hägerwall, till gården.

§ 12
Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades för-
sättningen avslutad och sammankom-
mandet upplöst.

ort och till som ovan

4 Hjärtan;

Wenttallin

inbjudande gode män:

33. G. Sandström

Erik Lilander

B. 7. 17

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Närmaste järnvägsstation Skara

Förvaltare Gust. Fägerwall, Afzeliigatan 1, Falköping, tel. 11995.
titel, namn och fullständig adress samt telefon. Skara 2 20 89 (Älgården)

Falköping den 20 maj 1955

Fastighet:

för fastigheten

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Vägförvaltningen i Skara- ägare av fastigheten allm.vägen Bjärklunda- N.Vånga
borgs län

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 31-maj 1955

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & lönðskansliet den 8 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Förteckning

Över sakägare i Ekgårdens dikningsaföretag av år 1956, som denna dag kallats till sammanträde hos förvaltare G. Fägerwall, Ekgården, onsdagen den 16 maj 1956 klockan 12.00.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Gust. Fägerwall, Danska vägen 116,

Falköping.

F. M. Anner, Källegatan 3,

Skara.

Boställsstyrelsen i Skara pastorat, S. Wennerstedt,

" .

Gode män:

Agronom Eric Waller,

Skara.

Lantbrukaren Karl-Gustav Sandström, Höryda, Härlunda,

" .

Skara den 9 maj 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Nämndemannen Erik Samuelsson, Härlunda, att å mina vägnar närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen, den 16 maj 1956 kl. 12.00 å Ekgården, Härlunda, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Källegatan 3, Skara den 15 maj 1956.

A. Amner

Ägare till Härlunda, Mellomgård 6:1.

Bevittnas:

Måten Eidsjö

Majlundström

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 2101-43/56

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Karlsson, Kålltorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Ekgården m.fl. hemman inom Härlunda socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 maj 1956



VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Härlunda socken:</u>							
<u>Samfällighet 1.</u>							
<u>Härlunda 12¹</u>							
Gustaf Fägorvall							
Betesmark, mylla på lera	1		0.09	650	1050 ~~1100~~	400	36
Åker, - " -	2	0.18		900	1700 ~~2000~~	800	144
" - " -	3	0.31		1300	1900 ~~2000~~	600	186
Betesmark, - " -	4		0.04	650	1100 ~~1800~~	450	18
Åker, - " -	5	0.74		700	1900 ~~2000~~	1100	814
" - " -	6	0.49		800	1900 ~~2000~~	1100	539
" - " -	7	0.16		900	1900 ~~2000~~	1000	160
" , mylla på sand	8	0.64		1300	2000	700	448
" - " -	9	0.10		1300	2000	700	70
" - " -	10	0.21		1400	2000 ~~1050~~	600	126
Betesmark, mylla på lera	11		0.04	500	~~1100~~	550	22
" mylla på sand	12		0.05	650	1100 ~~1800~~	450	23
Åker, - " -	13	0.40		900	~~2000~~	900	360
" - " -	14	0.04		1300	2000	700	28
" - " -	15	0.05		1400	2000	600	30
" - " -	16	0.18		1100	2000 ~~1900~~	900	162
" - " -	17	0.46		1000	~~2000~~ ~~1800~~	900	414
" - " -	18	0.22		800	~~2000~~	1000	220
" - " -	19	0.12		1600	2000	400	48
" - " -	20	0.42		1500	2000 ~~1900~~	500	210
" - " -	21	0.92		900	~~2000~~ ~~1900~~	1000	920
" - " -	22	0.08		1000	~~2000~~	900	72
" - " -	23	0.19		1400	2000 ~~1700~~	600	114
" - " -	24	0.94		800	~~2000~~	900	846
— = Åsatt värde i fullt torrlagt skick.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sand	25	0.68		1400	2000	600	408
<u>Summa</u>		7.53	0.22				6418
<u>Samfällighet 2.</u>							
<u>Härlunda 12¹</u>							
Gustaf Fägerwall							
Åker, mylla på morän	26	0.24		1200	2000	800	192
" " "	27	0.26		800	"	1200	312
" torvmylla på dybl. lera	28	0.16		60	1800	1740	278
" " "	29	0.17		60	"	1740	296
<u>Summa A-båtnad</u>		0.83					1078
Brukningsbåtnad:							
Igenläggning av str. 41+85-42+28 = 43 m å 7:50 kr.							323
" " " 42+46-43+46 = 100 " " 6:- "							650
<u>Summa</u>							973
<u>Alstringsbåtnad</u>							1078
<u>Summa båtnad</u>							2051
<u>Mellomgården av 6¹</u>							
F.N. Anner							
Åker, mylla på morän	30	0.06		1700	2000	300	18
" torvmylla på morän	31	0.26		20	1000	980	255
" mylla på morän	32	0.03		1710	1800	90	3
<u>Summa A-båtnad</u>		0.35					276
<u>Sammandrag samf. 2:</u>							
Härlunda 12 ¹ , G. Fägerwall		0.83					2051
Mellomgården av 6 ¹ , F.N. Anner		0.35					276
<u>Summa</u>		1.18					2327

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet 3.</u>							
<u>Härlunda 12¹</u>							
Gustaf Fägerwall							
Skogsmark	33		0.06	900	1000	100	6
"	34		0.03	900	"	100	5
Åker, mylla på lera o. sand	35	0.30		850	1700	850	255
" - " -	36	0.24		770	"	930	223
" mylla på morän	37	0.14		900	1500	600	84
" - " -	38	0.08		900	"	600	48
" mylla på lera o. sand	39	0.21		420	1700	1280	269
" - " -	40	0.63		510	"	1190	750
" - " -	41	0.52		600	"	1100	572
" - " -	42	0.95		510	"	1190	1130
" - " -	43	0.70		510	"	1190	833
" - " -	44	0.65		510	"	1190	774
" - " -	45	0.20		510	"	1190	238
" - " -	46	0.07		100	1500	1400	98
Summa		4.69	0.11				5285
<u>Härlunda Skattegården</u>							
Åker, mylla på lera o. sand	47	0.61		630	1400	770	470
<u>Sammandrag:</u>							
Härlunda 12 ¹ , Gustaf Fägerwall	33-46	4.69	0.11				5285
" Skatteg.,	47	0.61					470
Summa		5.30	0.11				5755
Härlunda den 16 maj 1956.							
Biträdande godemän:		I tjänsten:					
							
		Sven Hallin Lantbruksingenjör.					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet 1.</u>						
<u>Avloppet A - B - C.</u>						
7+47-7+77	30	Lantbruksrör, d = 225 mm	lm	30	3:50	105:-
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	30	3:-	90:-
7+48-7+54		Omläggning av trumma genom byväg				150:-
7+54-7+77		Justering av flödesdike	"	23	1:-	23:-
7+77-7+90	13	Trumma genom allmän väg har utförts och bekostats av vägförvaltningen				368:-
7+90		Intagsbrunn, d = 500 mm				80:-
7+90-16+57	867	Hård lera med sten och block	m ³	325	5:-	1625:-
		Lera, sand o. dyjord	"	1050	2:-	2100:-
10+00		Trumma av betongrör typ A, d = 600 mm				400:-
14+20		Trumma av betongrör typ A, d = 600 mm				220:-
		Tillägges för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m. m. c:a 10 %				507:-
		<u>Summa kronor</u>				<u>5300:-</u>
<u>Samfällighet 2.</u>						
<u>Avloppet B¹ - B².</u>						
<u>Öppet avlopp.</u>						
41+50-41+78	28	Pinnmo	m ³	20	4:50	90:-
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsett c:a 10 %				10:-
<u>Täckt avlopp.</u>						
41+78-42+33	55	Lantbruksrör, d = 200 mm	lm	55	3:30	181:50
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	55	5:-	275:-
42+08-42+17		Sprängning av berg	"	9	25:-	225:-
41+78		Rörlutlopp				35:-
		Tillägges				73:50
42+33-42+44		200 mm rör genom landsvägen inkl. brunn å nedströmssidan				790:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		utföres och bekostas av vägför- valtningen i Skaraborgs län				
42+44-43+00	56	Lantbruksrör, d = 150 mm	lm	56	2:50	140:-
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	56	4:-	224:-
42+44, 43+00		Brunn typ A, d = 500 mm	st	2	80:-	160:-
		Tillägges			56:-	580:-
43+00-43+46	46	Lantbruksrör, d = 125 mm	lm	46	2:50	115:-
		Underlag av 1" bräder	"	46	0:70	32:20
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	46	1:50	69:-
43+46		Brunn typ A, d = 400 mm			65:-	
		Tillägges			28:80	310:-
		Summa kronor				1780:-
		<u>Samfällighet 3.</u>				
		(Avlopp från och genom den s. k. Helvetesmossen.)				
		<u>Sträckan D - E - F.</u>				
20-20+10	10	Justering av utlopp				25:-
20+10-21+70	160	Lantbruksrör, d = 250 mm	lm	160	3:85	616:-
(20+10-20+90, 21+30-21+70)	120)	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	120	6:-	720:-
(20+90-21+30	40)	- " -	"	40	2:-	80:-
20+10		Rörutlopp			35:-	
21+70		Intagsbrunn, d = 500 mm			80:-	1531:-
21+70-27+21	551	Dybl. lera	m ³	1120	2:-	2240:-
		Sand	"	90	2:50	225:-
		Pinnmo delvis m. block	"	5	6:-	30:-
22+70		Trumma av betongrör ø 400 mm			125:-	2620:-
~~21+70-27+21~~	~~551~~	~~(enl. alt. I)~~				
		Tillägges ca 10 %				424:-
		Summa kronor				4600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet 4.</u>						
<u>Vallen och avloppet G - H - I.</u>						
<u>Utløppsdike fr. skogsmark med vall.</u>						
0+00-0+64	64	Dybl. lera m ³	40	2:50	100:-	100:-
0+64-1+63	99	Röjning av skog o. buskar lm	65	1:-	65:-	
		Dybl. lera m. sten m ³	135	2:40	324:-	
		Sten o. grus delvis m. block "	40	6:-	240:-	
0+75-0+80		Trumma av betongrör typ A, d = 500 mm			170:-	799:-
1+63-3+44	181	Röjning av skog o. buskar lm	75	0:60	45:-	
		Dybl. lera m. ngt. sten m ³	210	2:-	420:-	
2+18-2+23		Trumma av betongrör typ A, d = 500 mm			170:-	635:-
2+25-3+80	155	Material till vallbyggnad från sidotag m ³	250	2:-	500:-	
		Justering av vallen lm	155	1:-	155:-	
3+02		Uppgrävning och igentäppning av täckdike			15:-	670:-
		Tillägges c:a 10 %				226:-
<u>Summa kronor</u>						2430:-
<u>Slutsammandrag.</u>						
Samfällighet 1					5300:-	
" 2					1780:-	
" 3					4600:-	
" 4					2430:-	
<u>Summa kronor</u>					14110:-	
Ekgården den 16 maj 1956.						
I tjänsten:						
						
(Sven Hallin)						
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att skyddsvall skall stampas väl och i övrigt utföras så att läckage genom eller under vallen ej kan uppkomma;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits och fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy, - moss-, lös lerjord eller annat jordslag med otillräcklig bärighet;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


för samfälligheterna 1 och 2 inhugget kors i toppen av jord-fast sten 8 m väster om punkt 11+79; höjd +5,49 m.

för samfälligheten 3 inhugget kors i toppen av jordfast sten 25 m öster om punkt 22+32; höjd +4,35 m.


för samfälligheten 4 inhugget kors i toppen av jordfast sten 15 m öster om punkt 0+15; höjd +6,36 m

Ekgården den 16 maj 1956.

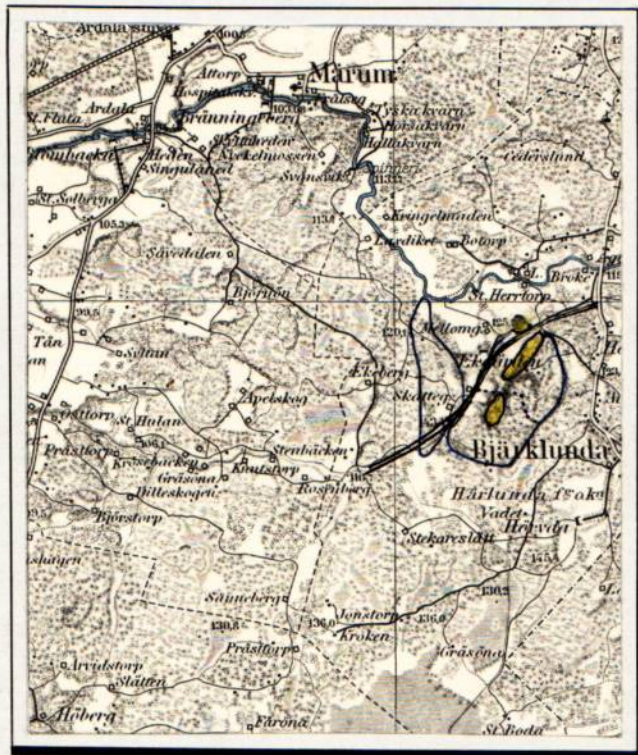
I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Härlunda socken:</u>						
<u>Samfällighet 1.</u>						
<u>Härlunda 12¹</u>						
G. Fägerwall	S	6418		5300	100.00	37.56
<u>Samfällighet 2.</u>						
<u>Härlunda 12¹</u>						
G. Fägerwall	S	2051		1569	88.14	
<u>Mellomgården av 6¹</u>						
F.N. Anner		276		211	11.86	
<u>Summa</u>		<u>2327</u>		<u>1780</u>	<u>100.00</u>	<u>12.62</u>
<u>Samfällighet 3.</u>						
<u>Härlunda 12¹</u>						
G. Fägerwall	S	5285		4600	100.00	32.60
<u>Samfällighet 4.</u>						
<u>Härlunda 12¹</u>						
G. Fägerwall	S			2133	87.76	
<u>Härlunda Prästegården 10¹</u>						
Skara Pastorat				297	12.24	
<u>Summa</u>				<u>2430</u>	<u>100.00</u>	<u>17.22</u>
Härlunda den 16 maj 1956.						
I tjänsten:						
						
Sven Hallin						
Lantbruksingenjör.						
Biträdande godemän:						
						
						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ekgården m.fl. hemman i Härlunda
socken och Ardala kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning av tre avloppsdiken genom Ekgårdens mark och dels uppgrävning av ett nytt öppet dike i ändamål att avskära vatten från ett skogsområde, som nu avbördas till Ekgårdens invallningsföretag av år 1941, och avleda detta direkt till ån Flan utanför invallningsföretaget, allt från marker, belägna omkring 2 å 3 km nordväst Bjärklunda kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C, B¹-B² och D-E-F för de tre avloppen samt G-H-I för det avskärande diket utmed invallningens västra sida. Från H-I skall dessutom uppläggas en jordvall för att hindra att vattnet vid högvatten i Flan rinner över marken in på invallningsområdet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Valläget har utmärkts med grönt. Avloppens och vallens ^{blivande} dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgått å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för

vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden. Avskärningsdiket G-H-I har dimensionerats så, att det tillrinnande vattnet skall kunna avledas till Fläns nedströms invallningsområdet, utan att torrläggningen för ovanför liggande mark försämrats.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Vad beträffar avskärningsdiket G-H-I med tillhörande skyddsvall, så är dessa arbeten nödvändiga för att den genom invallningsföretagets utförande avsedda båtnaden skall uppkomma. Denna beräknades år 1941 till kr. 23.606:90. På grund av penningvärdets fall kan denna båtnad i dagens priser anses motsvara omkring 47.000:- kr., vilket belopp alltså äventyras, om inte denna eller annan motåtgärd vidtages. Den direkta båtnaden kan anses utgöra summan av dels kostnaden för inköp och montage av ett pumpaggregat med till- och avloppsledning för 100 l/sek. och dels kapitaliserade värdet av de pumpningskostnader, som sålunda inbesparas. Det sistnämnda värdet kan beräknas till 5.000:- kr. och kostnaden för pumpaggregatet med tillbehör kan uppskattas till 6.000:- kr. eller tillsammans till 11.000:- kr. vilket alltså skulle vara den direkta förbättringen av ifrågevarande åtgärd.

Företaget skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet 1, 2, 3 och 4. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderingslängden och kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för samfälligheterna 1 och 3 gäldas av ägaren till Ekgården ensam. Kostnaderna för samfällighet 2 fördelas på delägarna i mån av båtnaden

för vars och ens mark. Inom samfällighet 4 skall kostnaden fördelas efter de procenttal, som tidigare fastställes för Eksgårdens invallningsföretag av år 1941. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens och vallens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet A-C korsar allmän väg vid sektion 7+80. Det här befintliga genomloppet är tillräckligt djupt för ifrågavarande torrläggning, varför inga kompletteringsarbeten här erfordras. Avloppet B¹-B² korsar samma allmänna väg vid 42+44. Då genomloppet tillkommit efter år 1880 och är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup, skall det åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ett nytt genomlopp av minst 200 mm. rör på å profilritningen angivet djup genom vägen. Om vägförvaltningen själv ombestyr arbetet skall det så bedrivas att det nya genomloppet kan tas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företags försorg färdigställt och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vederbörande vägdirektör utfärdade bestämmelser noggrant iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmålles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten överstiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.


Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få eynemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:


- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller försträkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsyntas och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Ekgårdens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

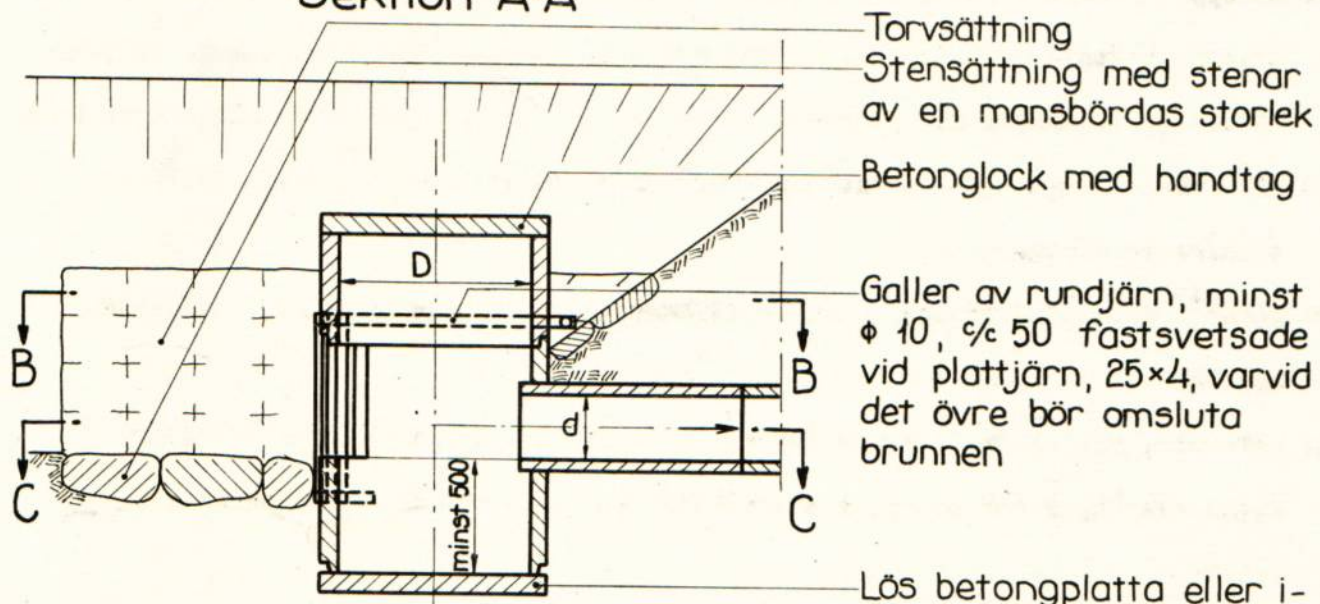
Ekgården den 16 maj 1956.

Å tjänsten

 Sven Hallin
 Lantbruksingenjör.

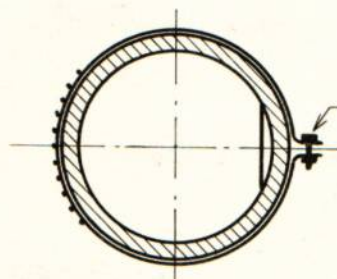
Biträdande godemän:



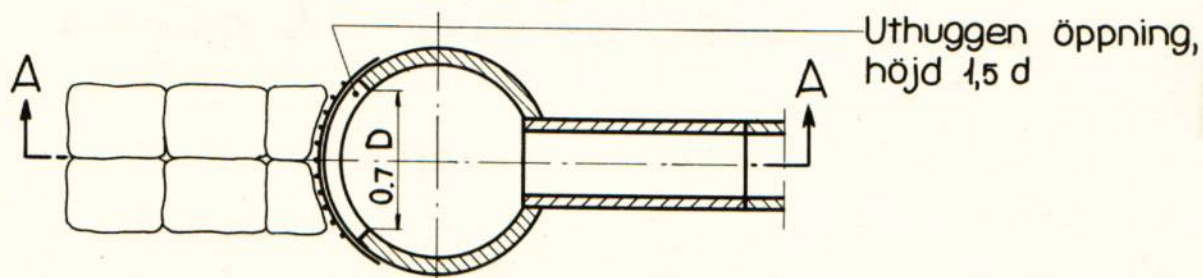

Sektion A-A



Sektion B-B



Sektion C-C

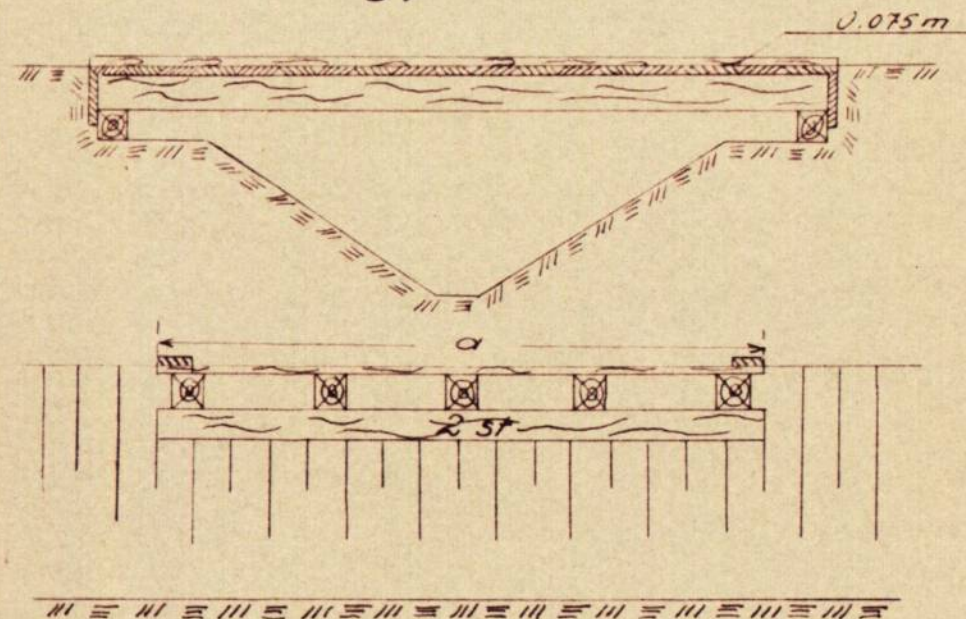


Mått i mm

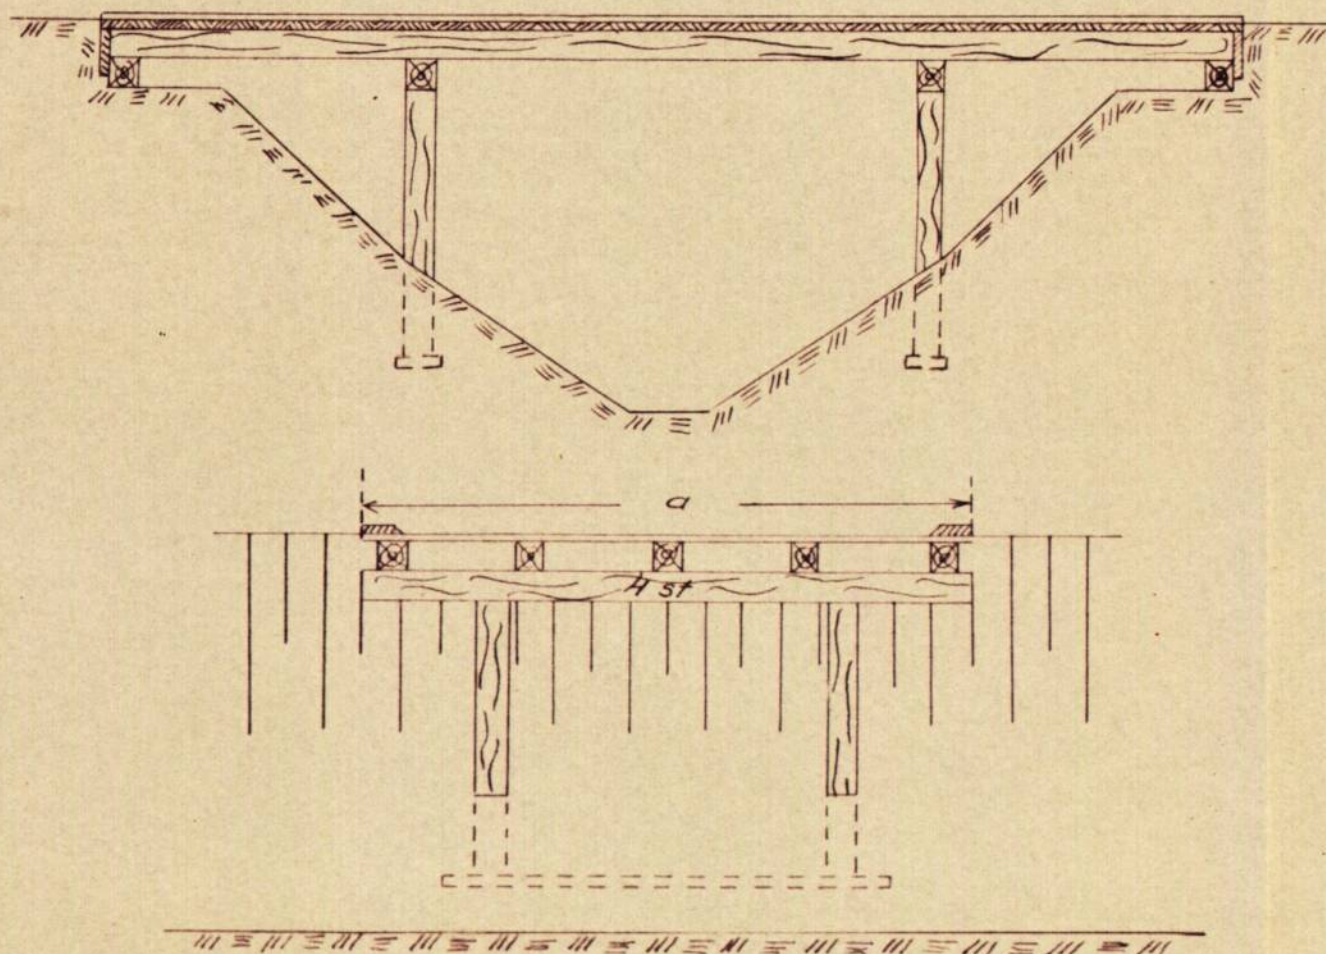
Typritningar

Träbroar

typ A



typ B

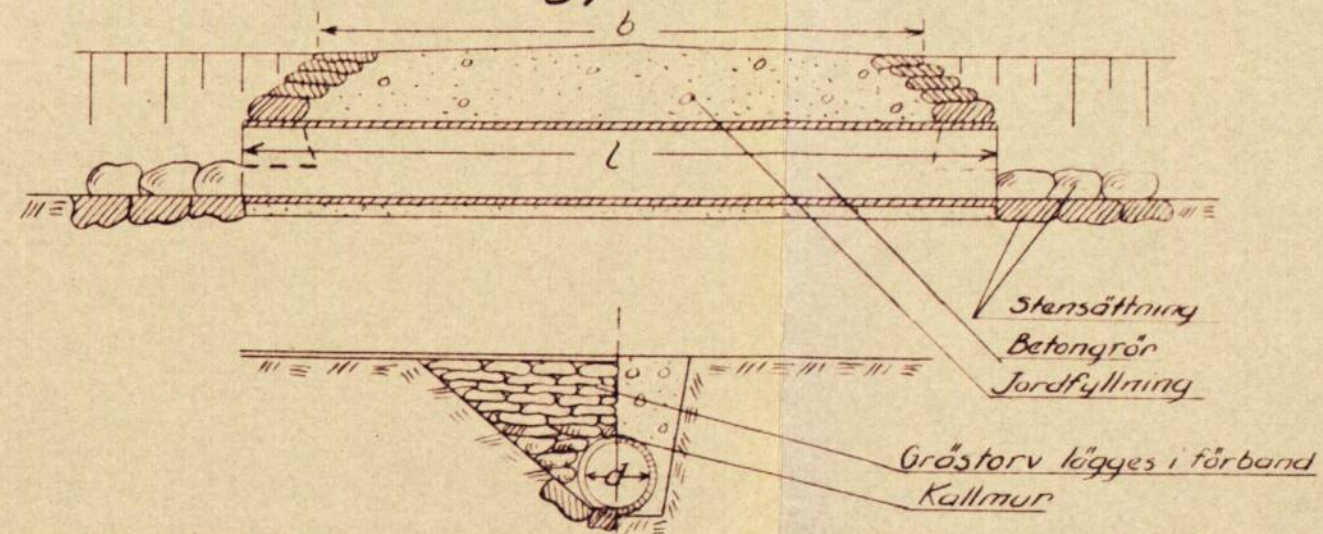


Trummar

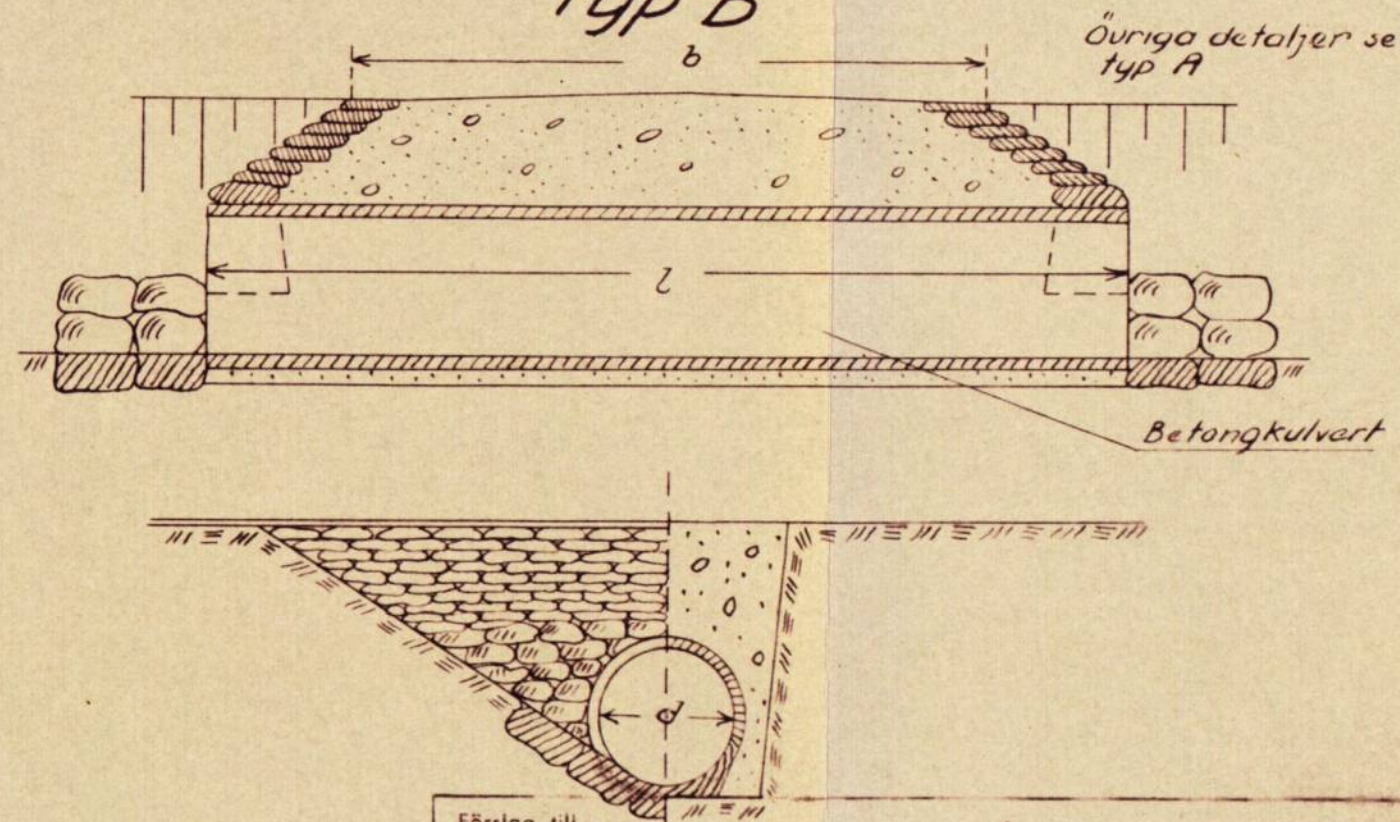
26

Blad

typ A



typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

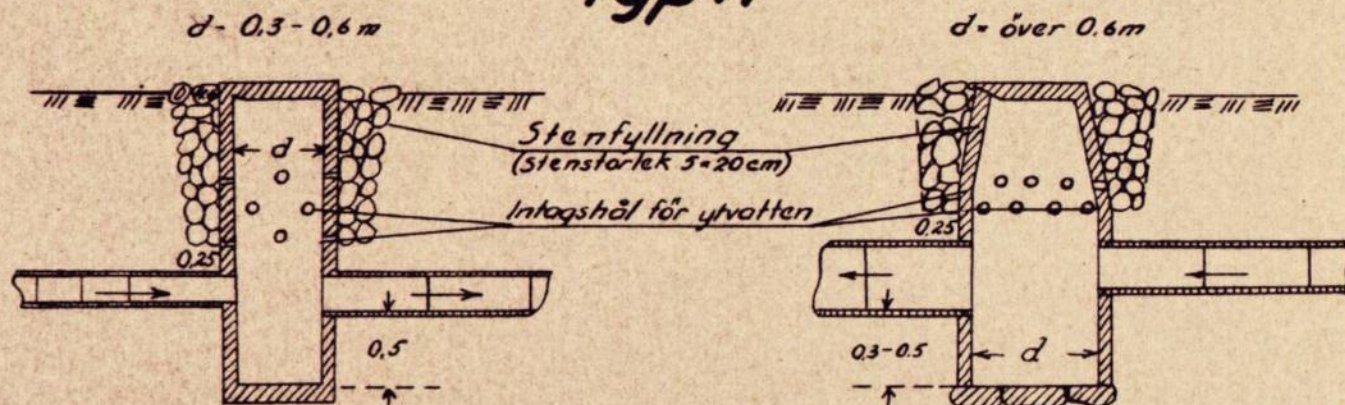
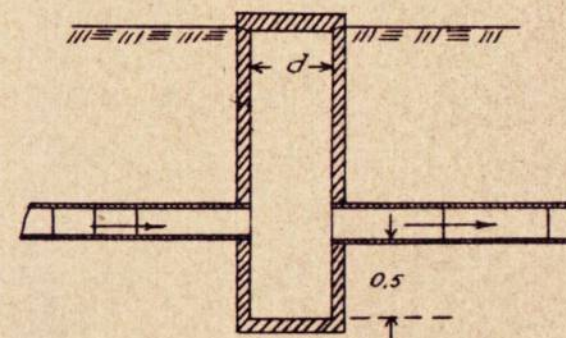
saken(-nar) av

samband med synförmåga enl. vattenlagen av

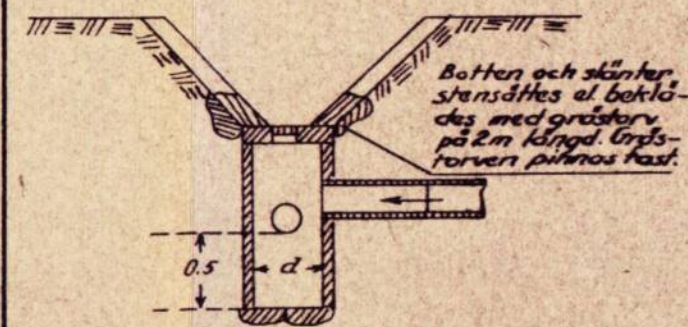
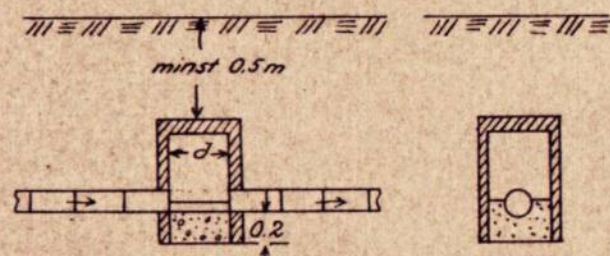
utan

Arkivnummer

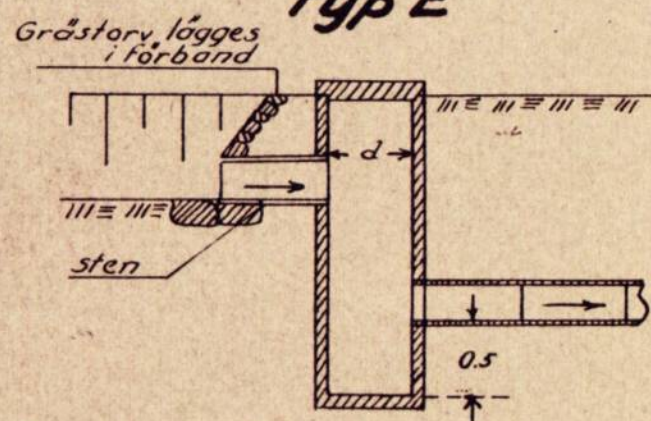
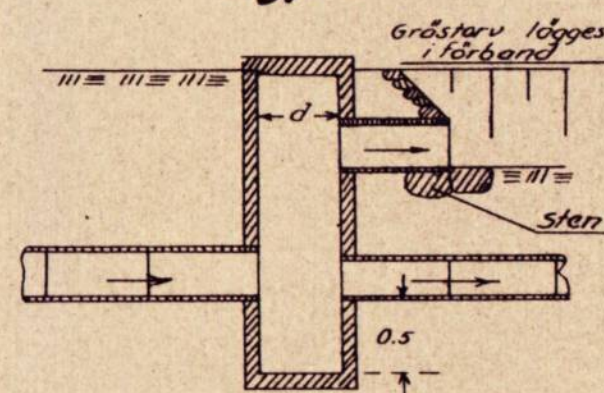

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

typ B

typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål


typ C


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vori en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

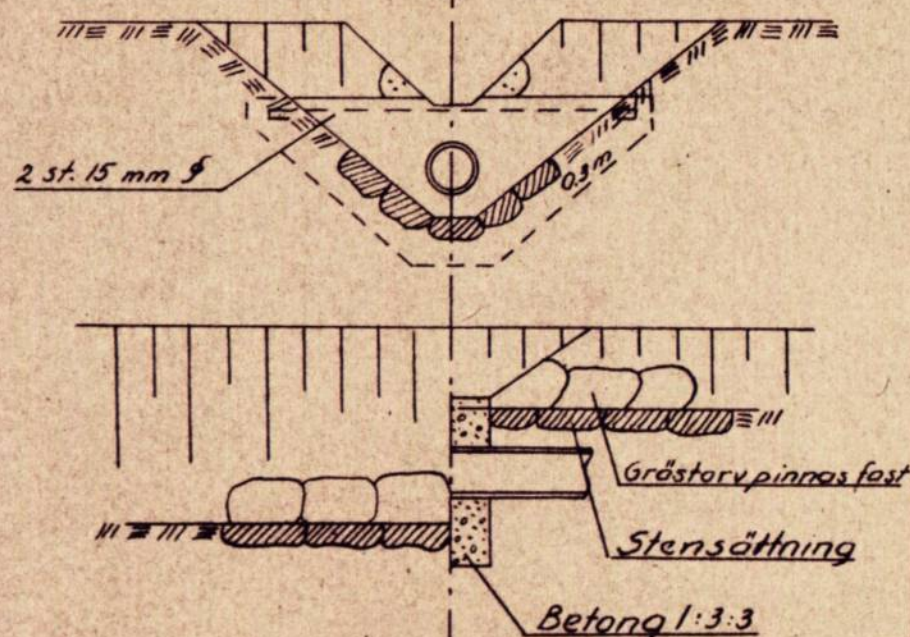
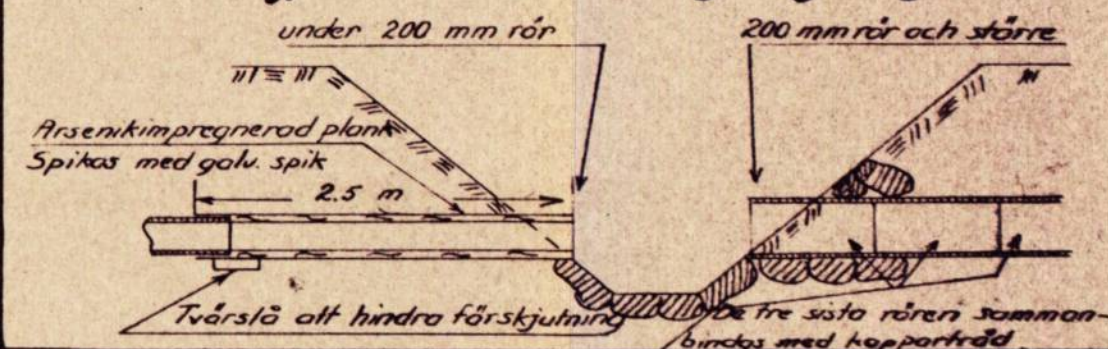
typ E

typ F

Detaljritning för lock med hål


Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn

d = 0.3 m " 0.60 " "

d = 0.5 m " 0.90 " "

**Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike**
typ A

typ A Rörledningsöga typ B


Förslag till

i
upprättat år(-en)

socken(-nar) av

{ utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Ekgårdens dikningsföretag av år 1956

Socken

Härlunda

Län

Skaraborgs

~~XXXXXXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXXXXXX~~

Förvaltare Gustaf Fägerwall, Danska vägen 116, Falköping.

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

18/10-1956

Bidrag till utförandet, kr

6.040:-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31/12-1960

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10-1960

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

1.930:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den

9 och 25 juli 1957

Besiktning verkställd av

Tekniker Paul Olsson

Vid avsyningen har befunnits att samf. I, II och IV utförts enligt den fastställda arbetsplanen, medan samf. III i sin helhet utförts som öppet avlopp. Företagets förtroendeman, som även är ensam intressent i berörd samfällighet anholder i särskild skrivelse om sådan ändring i arbetsplanen att företaget kan godkännas.

Denna ansökan tillstyrkes och föreslås att företaget godkännes.

Kostnaderna för företagets utförande framgår av bifogad sammanställning.

Skara den 29 juli 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan, införd med blått, godkänd av delegationens för inre rationalisering sammanträde den 10 sept. 1957, § 163, ärende 3.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.
