Akt nr:

P-F2a-LS137/68

AU$P-F2a-LS137/68

137

Berga dikningsföretag av år 1968

i Örs socken

Älvsborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Berga dikningsföretag av år 1968

i Örs socken, Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

Akten innehåller 24 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid syneförrättning för bättre torrläggning av åker tillhörande Halvardsbyn, Berga och Myckeläng i Örs och Erikstads socknar av Älvsborgs län.

Den 12 november 1968 inställde sig undertecknad lantbrukskonsulent hos lantbrukare Helge Andersson, Halvardsbyn, Ör, för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Följande sakägare hade infunnit sig till sammanträdet:

Helge Andersson, Halvardsbyn, Ör

Henry Fäldt, Assarbyn, Ör

Erik Arvidsson, Berga, Ör

Arne Alexandersson, Assarbyn, Ör

Hjalmar Karlsson, Myckeläng, Ör

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes: Hjalmar Karlsson och Arne Alexandersson.

§ 2.

Upplästes förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning.

§ 3.

Laga hinder mot företaget ansågs ej föreligga.

§ 4.

Något jäv mot förrättningsmannen anfördes ej.

§ 5.

Sakägarna enades om att förrättningen skulle genomföras efter frivillig överenskommelse.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget och framvisade till granskning upprättade ritningar och kartor.

§ 7.

Sedan sakägarna tagit del av torrläggningsförslag och kostnadsfördelningslängd, enades man om att underteckna den i förväg upprättade föreningsskrivelsen.

§ 8.

Beslöts att stängselskyldig markägare en vecka före arbetets utförande skall riva och undanskaffa stängsel, så att dessa ej utgöra hinder för dikningen.

§ 9.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, mot vilket ingen anmärkning gjordes.

§ 10.

Till styrelse för företaget utsågs:

Ordförande: Helge Andersson

Övriga ledamöter: Arne Alexandersson och Henry Fäldt.

§ 11.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Erik Arvidsson och Hjalmar Karlsson.

§ 12.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag att vara aktförvarare och att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget.

§ 13.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning upptaga lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och för arbetets igångsättande till dess utdebiterade medel blivit tillgängliga.

§ 14.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna utredningskostnaderna från år 1964 kr 1 452:89 samt avgiften för vattendomstolens dom 2.2.1968, Mål BU 12:1964, Beslut B1:1968, kr 119:55 eller tillhopa kronor 1 572:44.

§ 15.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, förklarades förrättningen avslutad.

§ 16.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Halvardsbyn, Ör den 12 november 1968.

I tjänsten

J. Edwardsson

J. Edwardsson
Lantbrukskonsulent

Justeras:

Carl Ingemar Alexandersson

Hjalmar Carlsson

5

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Bil. 1

Ink. till Lantbruksnämnden Vänersborg den - 6 AUG 1962 Dnr Jd 442 32-105

M9 12 62

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig/oss tillhörig mark inom Kroppefjäll (Ö) socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

En l. grävnings fabell utgm. 32 - 112

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, ovloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brålanda

Meddelanden om förrättningen ställas till

Helge Andersson Halvardsbyn Ö

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fil. Assarbyn 7

Halvardsbyn den 4/8 1962

Sökandes namn: Helge Andersson för fastigheten Assarby - Bugg 1:31

» »

» »

Lantbruksstyrelsen 3029, febr. 49., 10.000.

Vänd !

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Erik Arvidsson	ägare av fastigheten	Assby - Ryga
Mandall	» » »	" "
Anna Alexandersson	» » »	" "
Hjalmar Karlsson		Myrkslätt
Sandsvägen	Bråslunda - Assaberg	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent J. Edwardson, Vänersborg

Vänersborg den **7 augusti** 19 **62**

På Lantbruksnämndens vägnar:

Ernst Ljungfelt

t.f. Lantbruksdirektör

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbrukskonsulenten J. Edwardson, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmälda förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande. Vänersborg i landskansliet den 8 augusti 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven-Erik Husberg

Sven-Erik Husberg

Ingvar Runquist

Ingvar Runquist

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916215

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Berga dikningsföretag av år 1968 hava denna dag träffat följande överenskommelse:

1. Vi förbinda oss att enligt här nedan under punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda torrläggningen av oss tillhöriga vattenbesvärade marker i fullkomlig överensstämmelse med det förslag, som upprättats av lantbrukskonsulent J. Edwardsson, Vänersborg. Föreningen avser endast Avd. II, sträckorna B-E samt $C-C^2$ samma förslag.

2. Likaså förbinda vi oss att efter samma grunder för framtiden underhålla dikningsföretaget.

3. Kostnaderna för utförande och framtida underhåll fördelas enligt följande:

Ägare och fastighet.	Andel i kostnaden %
Halvardsbyn 1:1 och Berga 1:31 Helge Andersson	36,177
Berga 1:18, 1:26 o. 1:31 Henry Fäldt	19,139
Berga 1:9, 13 o. 1:19 Erik Arvidsson	39,512[1)]
Berga 1:32 Arne Alexandersson	2,982
Myckeläng N:a 1:16 Hjalmar Karlsson	2,190
	100,000

1) Av anläggningskostnaden erlägger dock Erik Arvidsson högst 2 500:- kr. Överskjutande belopp erlägges av Helge Andersson.

Arbetet skall vara avslutat senast den 31 december 1973.

Halvordsbyn, Ör den 12 nov. 1968.

Helge Andersson — Henry Fäldt

Erik Arvidsson — Arne Alexandersson

Hjalmar Karlsson

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig intygas å tjänstens vägnar dag som ovan.

J. Edwardsson
Lantbrukskonsulent

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning I.							
Halvarsbyn 1:1							
Kungl. Maj:t och Kronan							
Sträckan A-B. Brukningsbåtnad 200 meter à 5 kronor							1 000
							1 000
Berga 1:31							
Helge Andersson							
Åker	1	0,85		2 160	2 400	240	204
"	2	0,13		2 040		360	47
"	3	0,44		2 160		240	106
"	4	0,90		2 250		150	135
Alstringsbåtnad summa	1-4	2,32					492
Avdelning II.							
Berga 1:31							
Helge Andersson							
Åker	5	0,10		2 160		240	24
"	6	0,09		2 250		150	14
"	7	0,08		2 160		240	19
"	8	0,08		2 250		150	12
"	9	0,16		2 250		150	24
"	10	0,14		2 160		240	34
"	11	0,23		2 250		150	35
"	12	0,23		2 250		150	35
"	13	0,43		1 800		600	258
"	14	0,10		1 800		600	60
"	15	0,08		1 680		720	58
"	16	0,34		1 440		960	326
"	17	0,28		2 000		400	112
"	18	0,39		1 200		1 200	468
"	19	0,22		2 160		240	53
Alstringsbåtnad summa	5-19	2,95					1 532
Brukningsbåtnad, 250 meter á 10 kr							2 500
Summa kronor							4 032

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Berga 1:26							
Henry Fäldt							
Åker	20	0,16		1 920		480	77
"	21	0,09		1 100		1 300	117
"	22	0,10		600		1 800	180
"	23	0,20		1 680		720	144
"	24	0,07		2 250		150	11
Alstringsbåtnad summa	20-24	0,62					529
Brukningsbåtnad 50 meter á 10 kr							500
Summa kronor							1 029
Berga 1:30							
Henry Fäldt							
Åker	25	0,09		2 040		360	32
"	26	0,09		1 200		1 200	108
"	27	0,07		1 100		1 300	91
"	28	0,07		1 200		1 200	84
"	29	0,14		1 920		480	67
"	30	0,24		1 800		600	144
"	31	0,23		480		1 920	442
"	32	0,20		2 250		150	30
Alstringsbåtnad summa	25-32	1,13					998
Brukningsbåtnad 80 meter á 10 kr							800
" 70 " " 5 "							350
Summa kronor							2 148
Berga 1:18							
Henry Fäldt							
Åker	33	0,22		2 250		150	33
"	34	0,21		600		1 800	378
"	35	0,40		600		1 800	720
"	36	0,31		2 250		150	47
Alstringsbåtnad, summa	33-36	1,14					1 178
Brukningsbåtnad 30 meter á 10 kr							300
Summa kronor							1 478

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Berga 1:9							
Erik Arvidsson							
Åker	37	0,32		2 160		240	77
"	38	0,08		240		2 160	173
"	39	0,75		600		1 800	1 350
"	56	0,03		1 920		480	14
Alstringsbåtnad, summa 37-39+56		1,18					1 614
Berga 1:19							
Erik Arvidsson							
Åker	40	0,06		2 250		150	9
"	41	0,30		1 680		720	216
"	42	0,30		600		1 800	540
"	43	0,18		2 040		360	65
"	44	0,10		1 920		480	48
"	45	0,16		480		1 920	307
"	46	0,22		240		2 160	475
"	47	0,13		2 160		240	31
Alstringsbåtnad, summa	40-47	1,45					1 691
Brukningsbåtnad 165 meter á 5:-							825
Summa kronor							2 516
Berga 1:13							
Erik Arvidsson							
Åker	48	0,30		720		1 680	504
"	49	0,40		120		2 280	912
"	50	0,18		120		2 280	410
"	51	0,17		1 920		480	82
Alstringsbåtnad, summa	48-51	1,05					1 908
Brukningsbåtnad 60 meter á 10 kr							600
Summa kronor							2 508
Berga 1:32							
Arne Alexandersson							
Åker	52	0,32		1 920		480	154
"	53	0,13		360		2 040	265
Alstringsbåtnad	52-53	0,45					419
Brukningsbåtnad 60 meter á 5 kr							300
Summa kronor							700

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Myckeläng N:e 1:16							
Hjalmar Karlsson							
Åker	54	0,21		240		2 160	454
	55	0,24		2 160		240	58
Alstringsbåtnad, summa	54-55	0,45					512
		Sammandrag.					
Avdelning I.	Sträckan A-B						1 000
Berga 1:31	1-4	2,32					492
Avdelning II.							
Berga 1:31	5-19	2,95					4 032
Berga 1:26	20-24	0,62					1 029
Berga 1:30	25-32	1,13					2 148
Berga 1:18	33-36	1,14					1 478
Berga 1:9	37-39+56	1,18					1 614
Berga 1:19	40-47	1,45					2 516
Berga 1:13	48-51	1,05					2 508
Berga 1:32	52-53	0,45					700
Myckeläng N:e 1:16	54-55	0,45					512
Summa båtnad	1-56	12,74					18 029
					Varav	A =	10 873
						B =	7 156

Vänersborg den 1 november 1968.

I tjänsten

Lantbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan A-B-B^1.				
0+00		Utloppsskydd Vg 6				
		Sten och grus m^3	5	20:-	100:-	
		Betongrör 600 mm	1	30:-	30:-	
	140	" 200 mm		5:-	700:-	
	50	" 250 mm		6:-	250:-	
1+41		Sidobrunnar				
1+91		Betongrör 1 st. 400 + 1 st 250 mm	2	30:-	60:-	
		Sten och grus m^3	1		20:-	
B-B^1	40	Betongrör 150 mm		4:-	160:-	
		Brunn 300 mm	1		40:-	
B^1	230	Grävning, läggning o. återfylln.		4:-	920:-	2 280:-
		Sträckan B-C-D-E.				
	90	Betongrör 300 mm		8:-	720:-	
	225	" 400 mm		12:-	2 700:-	
3+20		Sidobrunn 300 mm	1		40:-	
4+50		Brunn 1 000 mm	1		300:-	
5+15		" 800 mm	1		200:-	
	315	Grävning läggning o. återfyllning		5:-	1 575:-	5 535:-
		Vägtrumma bekostas av Vägf.				
		Sträckan C-C^1-C^2.				
	20	Betongrör 150 mm		4:-	80:-	
	170	Tegelrör 100 mm		3:-	510:-	
		Brunnar 300 mm	2	40:-	80:-	
	190	Grävning, läggning o. återfyllning		2:-	380:-	1 050:-
		Beräknad kostnad				8 865:-
		Arbetsledning och oförutsett				435:-
		Summa kostnad				9 300:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 62 aug. 6 000.

SRA 458362

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avdragsdiken.				
		Sträckan D-D^1-D^2.				
	25	Betongrör 200 mm		5:-	125:-	
	45	" 150 mm		4:-	180:-	
		Brunn 300 mm			40:-	
	70	Grävning läggning o. återfyllning		3:-	210:-	555:-
		Sträckan E-F.				
	80	Betongrör 300 mm		8:-	640:-	
	85	" 250 mm		6:-	510:-	
	140	" 200 mm		5:-	700:-	
	60	" 150 mm		4:-	240:-	
	70	Tegelrör 100 mm		3:-	210:-	
		Brunnar 300 mm	6	40:-	240:-	
	435	Grävning, läggning och återfyllning		4:-	1 740:-	4 280:-
						4 835:-
						265:-
						5 100:-

Vänersborg den 1 november 1968.

I tjänsten

Lantbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Anläggningskostnad.		Avdelning I.				
Halvardsbyn 1:1						
Kungl. Maj:t o. Kronan		1 000		1 000		
Helge Andersson	S					
Berga 1:31						
Helge Andersson	S					
Ägofig. 1-4		492		353		
		1 492		1 353		14,550
		Avdelning II.				
Berga 1:31						
Helge Andersson	S					
Ägofig. 5-19		4 032	2 875	2 875	36,177	
Berga 1:26						
Avdragsdiken						
Henry Fäldt	-					
Ägofig. 20-24		1 029	734	336[1]		
Berga 1:30						
Henry Fäldt	-					
Ägofig. 25-32		2 148	1 532	702[1]		
Berga 1:18						
Henry Fäldt	-					
Ägofig. 33-36		1 478	1 054	483[1]		
			3 320	1 521	19,139	
Berga 1:9						
Erik Arvidsson	-					
Ägofig. 37-39+56		1 614	1 151	527[1)]		
Berga 1:19						
Erik Arvidsson	-					
Ägofig. 40-47		2 516	1 794	1 794		
Berga 1:13						
Erik Arvidsson	-					
Ägofig. 48-51		2 508	1 788	819[1]		
			4 733	3 140[2)]	39,512	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Berga 1:32						
Arne Alexandersson	–					
Ägofig. 52-53		700	499	237 1)	2,982	
Myckeläng N:e 1:16						
Hjalmar Karlsson	–					
Ägofig. 54-55		512	365	174 1)	2,190	85,450
		16 537	11 795	7 947	100,000	100 000
Sammandrag:						
Avd. I			1 353			
Avd. II			7 947			
Summa kronor			9 300			

Vänersborg den 30 oktober 1968

I tjänsten

J. Edwardsson

J. Edwardsson
Lantbrukskonsulent

1) Avgår 54,210 % emedan diket t.v. ej utförts.

2) Av anläggningskostnaden utbetalar dock Arvidsson högst 2 500. Överskjutande erlägges av Helge Andersson.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för A-B-B[1]	B-F	A-F								Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	1-4	1 492											
	5+8	36	2 280										
		1 528	2 280										1 492
II	6-7	33											
	9-56	16 468		11 770									
		16 501		11 770									0,713
I+II	1-56	18 029			13 700								0,759

Kostnaden för avdelning II har beräknats under förutsättning att avdelning I icke utföres. I så fall måste 400 mm rör användas ända ned till B. Om avdelning I utföres minskas kostnaden för avdelning II. Denna vinst skall tillgodoräknas avdelning I.

Vänersborg den 1 november 1968.

I tjänsten

Lantbrukskonsulent

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall diket på nytt avvägas och grävningslista upprättas av därtill sakkunnig person. Å sträckan A - B är rören beräknade endast för 1/3 av den vattenmängd, som beräknats för sträckan B - C. En del av vattnet kommer därför att tidvis rinna ovanpå. I den starka lutningen å sträckan A - B bör dock flödesrännan helst vara bred och gräsbevuxen. I annat fall kan lätt erosionsskador uppstå.

Vid C - D skall landsvägstrumma utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Efter rörläggningen återfylles diket helt. Endast gränsdiken bibehållas.

Befintliga gränsmärken och fixpunkter få icke förstöras eller döljas. Betongrören skola vara tillverkade av betongsrörsfabrik, som är ansluten till Kontrollrådets allmänna betongrörskontroll och som vid kontinuerliga provtagningar erhållit tillfredsställande provningsresultat.

Alla arbeten skola utföras i noggrann överensstämmelse med ritning och föreskrifter i kostnadsförslag och arbetsbeskrivning samt efter kontrollantens anvisningar.

Läggningen skall utföras av kompetent och vid dylika arbeten van person och rörledningen får ej täckas innan den blivit genom lantbrukskonsulent eller hans ombud kontrollerad. Om jorden är bemängd med flytbenägen finsand skall rörfogarna täckas med grus, om berg eller stora stenar förekommer, skall botten avjämnas med grus.

Vänersborg den 12 november 1968.

I tjänsten

J. Edwardsson

J. Edwardsson
Lantbrukskonsulent

ÖVERSIKTSKARTA.

Del av generalstabskarta, varå företaget markerats för orientering. Nederbördsområdet kringritas med blå linje.

Skala 1:50000.

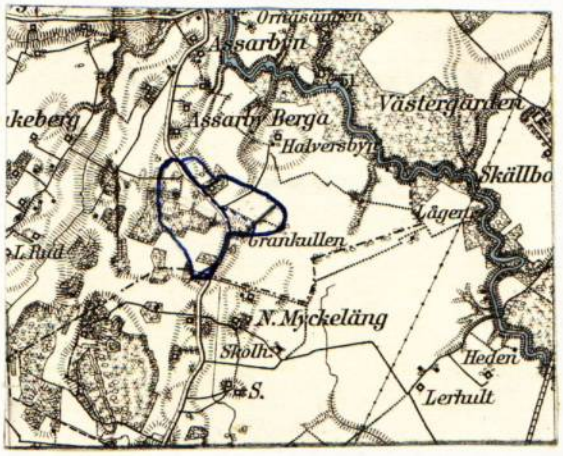

Nederbördsområde: 130:2

Utlåtande angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Halvardsbyn, Berga och Myckeläng i Örs och Erikstads socknar av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får undertecknad avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 6 brukningsenheter.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 700 meter avlopp i huvudsakligen täckt utförande. Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder har av ingen anmälts och ej heller har förrättningsmannen kunnat utröna att sådant föreligger. Allmän väg beröres och Vägförvaltningen har genom sin representant vid första sammanträdet medgivit omläggning av 1 st vägtrumma. Enskilda vägar beröras, men dessa begagnas i huvudsak av sakägarna i företaget, varför erforderlig omläggning av vägtrummor sker genom ifrågasatt rörläggning.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Förrättningsmannen anser, att företaget lämpligen kan benämnas Berga dikningsföretag av år 1968.

På grund av lutningsförhållandena har företaget uppdelats i två avdelningar. Övre delen av huvuddiket samt ett mindre sidodike skola icke utföras nu, utan äro t.v. att betrakta som avdragsdiken.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta inritats med blå linje, uppgår till cirka 40 ha. Exceptionella högvattenflöden äro dock ledningarna icke dimensionerade för, emedan detta skulle bli för dyrt i förhållande till den skada de kan föranleda.

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har förrättningsmannen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde per hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrläggningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av värderingslängden vari alstringsbåtnaden beräknats uppgå till 10 873 kronor och brukningsbåtnaden till 7 156 kronor eller tillhopa 18 029 kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. Om dikningen utföres med nödig försiktighet och vid årstid, då minsta möjliga skada behöver åsamkas på åkern växande gröda, kan särskilda ersättningar för skada ej beräknas behöva utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har för alla diken med undantag för avdragsdikena beräknats till 9 300 kronor, varvid 1968 års priser lagts till grund för beräkningarna. Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna fördelats och uppförts i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts fastighetens procentuella andel i anläggningskostnaderna. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader för varje enskild fastighet beräknas och fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökanden förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skall förrättningskostnaderna och andre gemensamma kostnader fördelas enligt kolumn 6 i kostnadsfördelningslängden.

Mom. 8.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll föreskrives:

att företagets utförande och framtida underhåll skall till alla delar ombesörjas av styrelse, som av delägarna utses;

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid arbetets utförande iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen och dels på de ritningar, som tillhör förslaget;

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras;

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll.

Mom. 9.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen kronor av den uppskattade båtnaden enligt nedan angivna belopp. Då den så beräknade avgiften i detta fall blir mindre än 50 kronor, skall jämlikt angiven paragraf avgift här icke utgå.

Mom. 10.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1973. För avgörande om företaget må anses fullbordat, skall besiktning verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom. 11.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftägande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i mom. 11 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Halvardsbyn, Ör den 12 november 1968.

I tjänsten

J. Edwardsson

J. Edwardsson
Lantbrukskonsulent

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 januari 1969.

I tjänsten:

24

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Berga dikningsföretag av år 1964 i Örs socken av Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning till godemän						134	19
		Annons						47	70
		Ersättning till statsverket enl. S.F.S. 317:1960, räkning nr 69112.						1.271	-
		Diverse						2	11
				Summa kronor				1.455:-	

Vänersborg den 10 oktober 1964.

Lantbrukskonsulent

BESIKTNINGS-RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn Berga dikningsföretag av år 1968	
Socken Ör	Län Älvsborg
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Helge Andersson, Halvarsbyn, Ör, 464 00 Mellerud	
Statligt stöd bev. den	Beviljat bidrag, kr
Föreskriven arbetstid / Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr
Arbetstid jml. V L 10:62. / Förlängning jml. V L 7:58.	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr
Besiktigad verkställd den Avs. 12.11.1971	Besiktigad verkställd av Avs. Ingenjör Erik Pehrsson

Den 21.3.1972 meddelade företagets ordförande att de mindre justeringsarbeten som återstod vid avsyningstillfället nu färdigställts. Företaget är utfört i nära överensstämmelse enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande ändringar.

Rörledningen B-B[1] utgår ur arbetsplanen.

Föreslagen brunn vid 3+23 flyttats till 2+64
" " " 1+90 " " 1+74
" " " 1+41 " " 1+24

Rörutloppet vid 0+00 slopats, därigenom att berörd markägare nedströms denna sektion nedlagt rör av ensartad dimension.

Avvikelserna från det fastställda förslaget har med grön beteckning införts på plan- och profilritningarna.

Företaget godkännes med ovannämnda ändringar, vilka ej äventyrar en ändamålsenlig torrläggning.

Ändringarna har utförts på markägarens begäran.

Vänersborg den 24.3.1972
I tjänsten
Ingemar Carlson
Ingenjör

Lantbruksstyrelsen 17—16. 68 sept. 3 000. SRA 86744
