



Akt nr:

R-E1a-1166

AU$R-E1a-1166

314/49

FÖRETAG: Gammalstorp. R 9*1166

lantbrukskonsulenten E.Almlöf

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~

i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 23 december 1949

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 16.950

» en första rensning ..... » - kr. 16.950

Lån till företagets utförande ..... kr. 33.950

563/49

Skuldförbindelse överlämnad till Kerstin Friberg den 6/4 1950 godkänd den 18/4 1950

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS 1950
DIARIE Nr 545
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1949 till

Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextontusenniohundrafemtio (16.950) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiotretusenniohundrafemtio (33.950) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Gammalkopp, Tim den 18/3 1950

Per Mark

Att Per Mark, Gammalstorp, Tun.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

~~Karl A. Andersson~~ Olof Hamner

Adress ~~Höjdarna~~ Adress Gammalstorp Tun

Henry Johansson Gammalstorp Tun

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 maj 1950.

Sune Wennberg

Martin Häggblund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII komb
2168

LANTBRUKSSTYRELSEN
R 9*1166

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv
168-9

Handlingar angående

Gammalstorps dikningsföretag av år 1948

i Tuns socken, Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

2B
12/49

Protokoll vid syneförrättning enligt Ordningslagen för Landskapet Åland av mark, tillhörande Gammalstorps ägendom m.fl. i Finströms socken av Skeppsbrogrundet.

Den 21 okt. 1946 å Gammalstorp.

Närvarande: Lantbrukaren och jordbruksbonden Erik Nordlöf, förrättningsmannen samt goda männen Gustaf Magnusson Gastelsberg, Finström och Gustav Karlson, Hagen Finström, varunder följande sakägare:

Sökanden: Fastighetsägaren Gammalstorp 2:1 och Lägenheten Gammalstorp 2:12.

Av övriga sakägare:
John Andreasson, ägare av Lägenheten Gammalstorp 2:16 (Bäckängen)
Karl Ramberg, ägare av 9/128 mtl. av Hemmanet Hafsgården 12:6
Andreas Andersson, ägare av 1/64 mtl. av Hemmanet Hafsgården 12:7
Elis Karlsson, ägare av Lägenheten Gammalstorp 2:4 (Ängstorp)
Sven Hjärn, ägare av Lägenheten Gammalstorp 2:2 - 2:14 (Björklunda)
Folke Andersson, ägare av Lägenheten Gammalstorp 2:7 (Andreslund)
Vägförvaltningen i Skarpnäs län genom Vägmästare O.B. Johansson mot fullmakt Utb. F.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som lyder enligt utb. bil. A.

§ 2.

Något jäv vest skiftesgodemännen anföras ej och ej heller vest förrättningsmannen.

§ 3.

Förrättas den vid förrättningen upprättade nivåhandlingen även det vattenområde området samt profiler över uppgrundningen.

§ 4.

Åtgärderna gjorde på i förgörande uppgrundning och igenläggning med sig, så att hans skäror bevarade vederlag må kunna tillbörligen upprättad lämplighetsgrunden och på ändamålsenligaste sätt verkas.

§ 5.

Det kunde ej ersättas bevarade landsvinstrummen vid E:t nya- eller omläggets upptagande 1880. Väghållningens omkostnad hade ingalunda att ersätta kostnaden för trummans omläggning vad beträffar väghållningen. Omkostnaden gjorde att vid detta arbetes utförande likaväl som vid utförande av övriga arbeten, som berörde allmän väg, väghållningens föreskrifter skola beaktas.

§ 6.

John Andersson, Bockängen framhåll

att kans berörda lägenheter ej bade någon olägenhet av vattnet, varför kans bolet sas att avloppsfrågan ordnas så att bena fastighet ej kommer att beröras av dik-ningsföretaget.

§ 7.

Nedanstående personer förenade sig med sökanden i företaget att ytbade på datsammas utvidgning så att deras lägor, berörde markar jämväl må kom-na på ändamålsenligaste sätt tor-läggas och brukas, bil. 5

Folke Andersson lägenheten Sammalet nr 27
Elis Karlsson -"- -"- 24
Karl Ramberg 9/128 mtl. Lia Hofgården 126
Anders Andersson 1/64 mtl. Lia Hofgården 127

Förrättningen vitsordades av ägarnamnen.

§ 8.

Elis Karlsson, Ängstorp och Sven Hjäm Björkhaven ytbade på att avloppen genom deras fastigheter utföras halvtäckta (rör med rämna) men någon ersättning bok-ningsbetvang ej uppstår genom att resp. diken utföras halvtäckta.

§ 9.

Som intet vidare fanns att tin förra-bolet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande av att nytt sammanträde komma att utlysas sedan förrättningen komplettrats.

Biträdande gode män: Ovt och tid som ovan

Gustaf Magnusson
Gustaf Karlsson

Erik Andersson.

Den 16 juli 1948, å Gammalstorps.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Aurlöf, förrättningsman samt skiftesgodemännen Gustav Karlsson, Hagen Tim och Karl A. Andersson, Höjentorna, Håle Töng, även följande sakägare:

Per Mark, Gammalstorps, Tim.
Elis Karlsson, Ängstorps, Tim.
Folke Andersson, Nordenlund, Tim.
Lars Lundgren, Åse-Kanby, Nordängen 28.5 -

§ 10.

Något jäv mot den sedan föregående sammanträda tillkallade skiftesgodemannen Karl A. Andersson, Höjentorp, Håle Töng anmäldes ej.

§ 11.

Köpman Lars Lundgren åg. av Nordängen 2[13] hade under förrättningens gång uttryckt önskan att få förvärv sig i förslaget, vilken framställning behandlades utom någon annans från övriga sakägare. Förrättningen vittordades av synemännen.

§ 12.

Föreslades, den sedan föregående sammanträde fördigställda nivåkartan över det utbrutna området samt profilerna över avloppen däri från samt däröver berörande handlingen.

Förättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, kostnadsförslag, värderingsräkningar och kostnadsfördelning m.m. Någon ändring därmot framfördes ej.

§ 13.

Upplästes syssmannens utlåtande, som här lyder enligt bil. O

§ 14.

Att motlaga och förvara till förrättningen hörande räkningar och handlingar och att sammankalla delägarna för val av ständig ersättare syssmannen Per Mark Gammelstorps syssloman, Tun. (Jfr Tun 1.)

§ 15.

Som intet vidare fanns att tid protokollet avslutades förrättningen avsentad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Erik Persson.

Gustav Karlsson Roy A. Andersson
biträdande gode män.

Bilaga A 6

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 6/4 1946 Dnr 77/19
Exp. den 7/6 1946 nr

E. D. 83-49
1946

8 JUN 1946

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gammalstorp i Tuns socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida,

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Grästorp

Meddelande angående förrättningen torde ställas till:
Ing. Per Mark
adress Gammalstorp
pr Tun.
Telefon: Tun 1.

Gammalstorp den 4 april 1946
Per Mark

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksingenjören~~ Jordbrukskonsulenten
~~Ekonomiassistenten~~
Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29/6 1946.
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

Täckdikningsplan finnes å största delen av den berörda arealen.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA
448949

Bilaga B

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gammalstorp m.fl. i Tuns socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Mark, Gammalstorp, Tun, fredagen den 16 juli 1948 kl. 11 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Tuns socken:

Gammalstorp 2^{1}, 2^{12}
" 2^{4} (Ängstorp)
" 2^{7} (Andreelund)
" 2^{14} (Björklunda)

L:a Hofsgården 12^{6}, 12^{7}

Nordängen 2^{13}

Skara den 23 juni 1948

I tjänsten

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Tuns församling den 27/6 1948 betygas:

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 23/6 1948.

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Bilaga C

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gammalstorps m. fl. i Tuns socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Mark, Gammalstorp, Tun, fredagen den 16 juli 1948 kl 11 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Tuns socken:

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Gammalstorp 2^{1}, 2^{12}
" 2^{4} (Ängstorp)
" 2^{7} (Andreelund o. Ängabacken)
" 2^{14} (Björklunda)
L:a Hofsgården 12^{6}, 12^{7}
Nordängen 2^{13}

Skara den 21/6 1948.

I tjänsten:
ERIK ALMLÖF
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 22 juni 1948 bestyrkes

Erik Almlöf

Bilaga D

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Godsägare Per Mark, Gammalstorp, Tun, den 21 oktober 1946 klockan 10.

Per Mark	Gammalstorp	Tun
Jon Andreasson	Bäckängen	"
Karl Ramberg	L:a Hofsgården	"
Elis Karlsson	Ängstorp	"
Sven Hjärn	Björklunda	Tun
Folke Andersson	Andreelund	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Skiftesgodemännen:		
Gustaf Magnusson	Gustafsberg	Tun
Gustav Karlson	Hagen	"

Skara den 21 oktober 1946

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

10

Bilaga E

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Per Mark, Gammalstorp, Tun, fredagen den 16 juli 1948 klockan 11 fm.

Per Mark	Gammalstorp	Tun
Elis Karlsson	Ängstorp	"
Folke Andersson	Andreelund	"
Karl Ramberg	L:a Hofsgården	"
Anders Andersson	Ängabacken	"
Sven Hjärn	Björklunda	"
Lars Lundgren	Nordängen	Åse Karaby

Skiftesgodemännen:

Gustav Karlsen	Hagen	Tun
Karl A. Andersson	Häljestena	Håle Täng

Skara den 21/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 3007/46-43

Bilaga F

//

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare O.B. Johansson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Gammalstorps egend. m.fl. hemman inom Tuns socken av Skaraborgs län.

Bestyrkt avskrift av Styrelsens skrivelse bifogas.

Mariestad den 11 oktober 1946.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren

/Nils G. Lenas

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen,

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål,

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter,

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titelsn Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E. G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnads-
styrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Aina Backlund

Bilaga G

Undertecknade förenar sig med sökanden om den begärda ändringen, som avser torrläggning av mark, tillhörande Gammalstorps ägoområde m.fl. i Tuns socken och yrka vi på fastställelse av utskrivningen så att ifrågavarande våra fastigheter berörande vatten må kunna på gällande villkorsenligaste sätt torrläggas och bevaras.

Tuve den 21 okt. 1946

För lägenheten Gammalstorp 2:7 (Sundsmarken)
Falke Andersson

För lägenheten Gammalstorp 2:4 (Ängstorp)
Elis Karlsson

För 9/120 mtl. Lia Hofgården 12:6 ~~För lägenheten Gammalstorp 2:6 (Åkerlyckan)~~
Karl Karlberg

För 1/64 mtl Lia Hofgården 12:7 (Kvisthyddan)
Anders Andersson

Förestående förening bivittnas
Emil Bendtsson.

...

Biträdande gode män
Gustav Eriksson Karl A. Andersson

Bilaga G 1

Undertecknad förenar jag med sökanden till den syneförrättning, som avser torläggning av mark tillhörande Gammalstorps egendom m. fl. i Enns socken, och yrkar jag på företagets utskrivning så att jämväl min därav berörde mark må bliva på ändamålsenligaste sätt torlägges och brukas

Enn den 16. juli 1948

Förestående förening vitsordas

Biträdande gode män

Gustav Carlson Karl A. Andersson

Bilaga H

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur planen för Gammalstorps dikningsföretag av år 1946, Tuns socken, i de delar som beröra Vägförvaltningen.


Vägförvaltningens ombud vid syneförrättningen har varit vägmästate O.B. Johansson, som för sin del intet hade att erinra mot förslaget.

Trumman C - C^{1} har avsett att bekostas av Dikningsföretaget och trumman E^{1} - E^{II} jämte dagvattenbrunn uppströms vägen av Vägförvaltningen.

Det ena utdraget är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde benäget återsändas med yttrande.

Skara den 13/11 1946

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

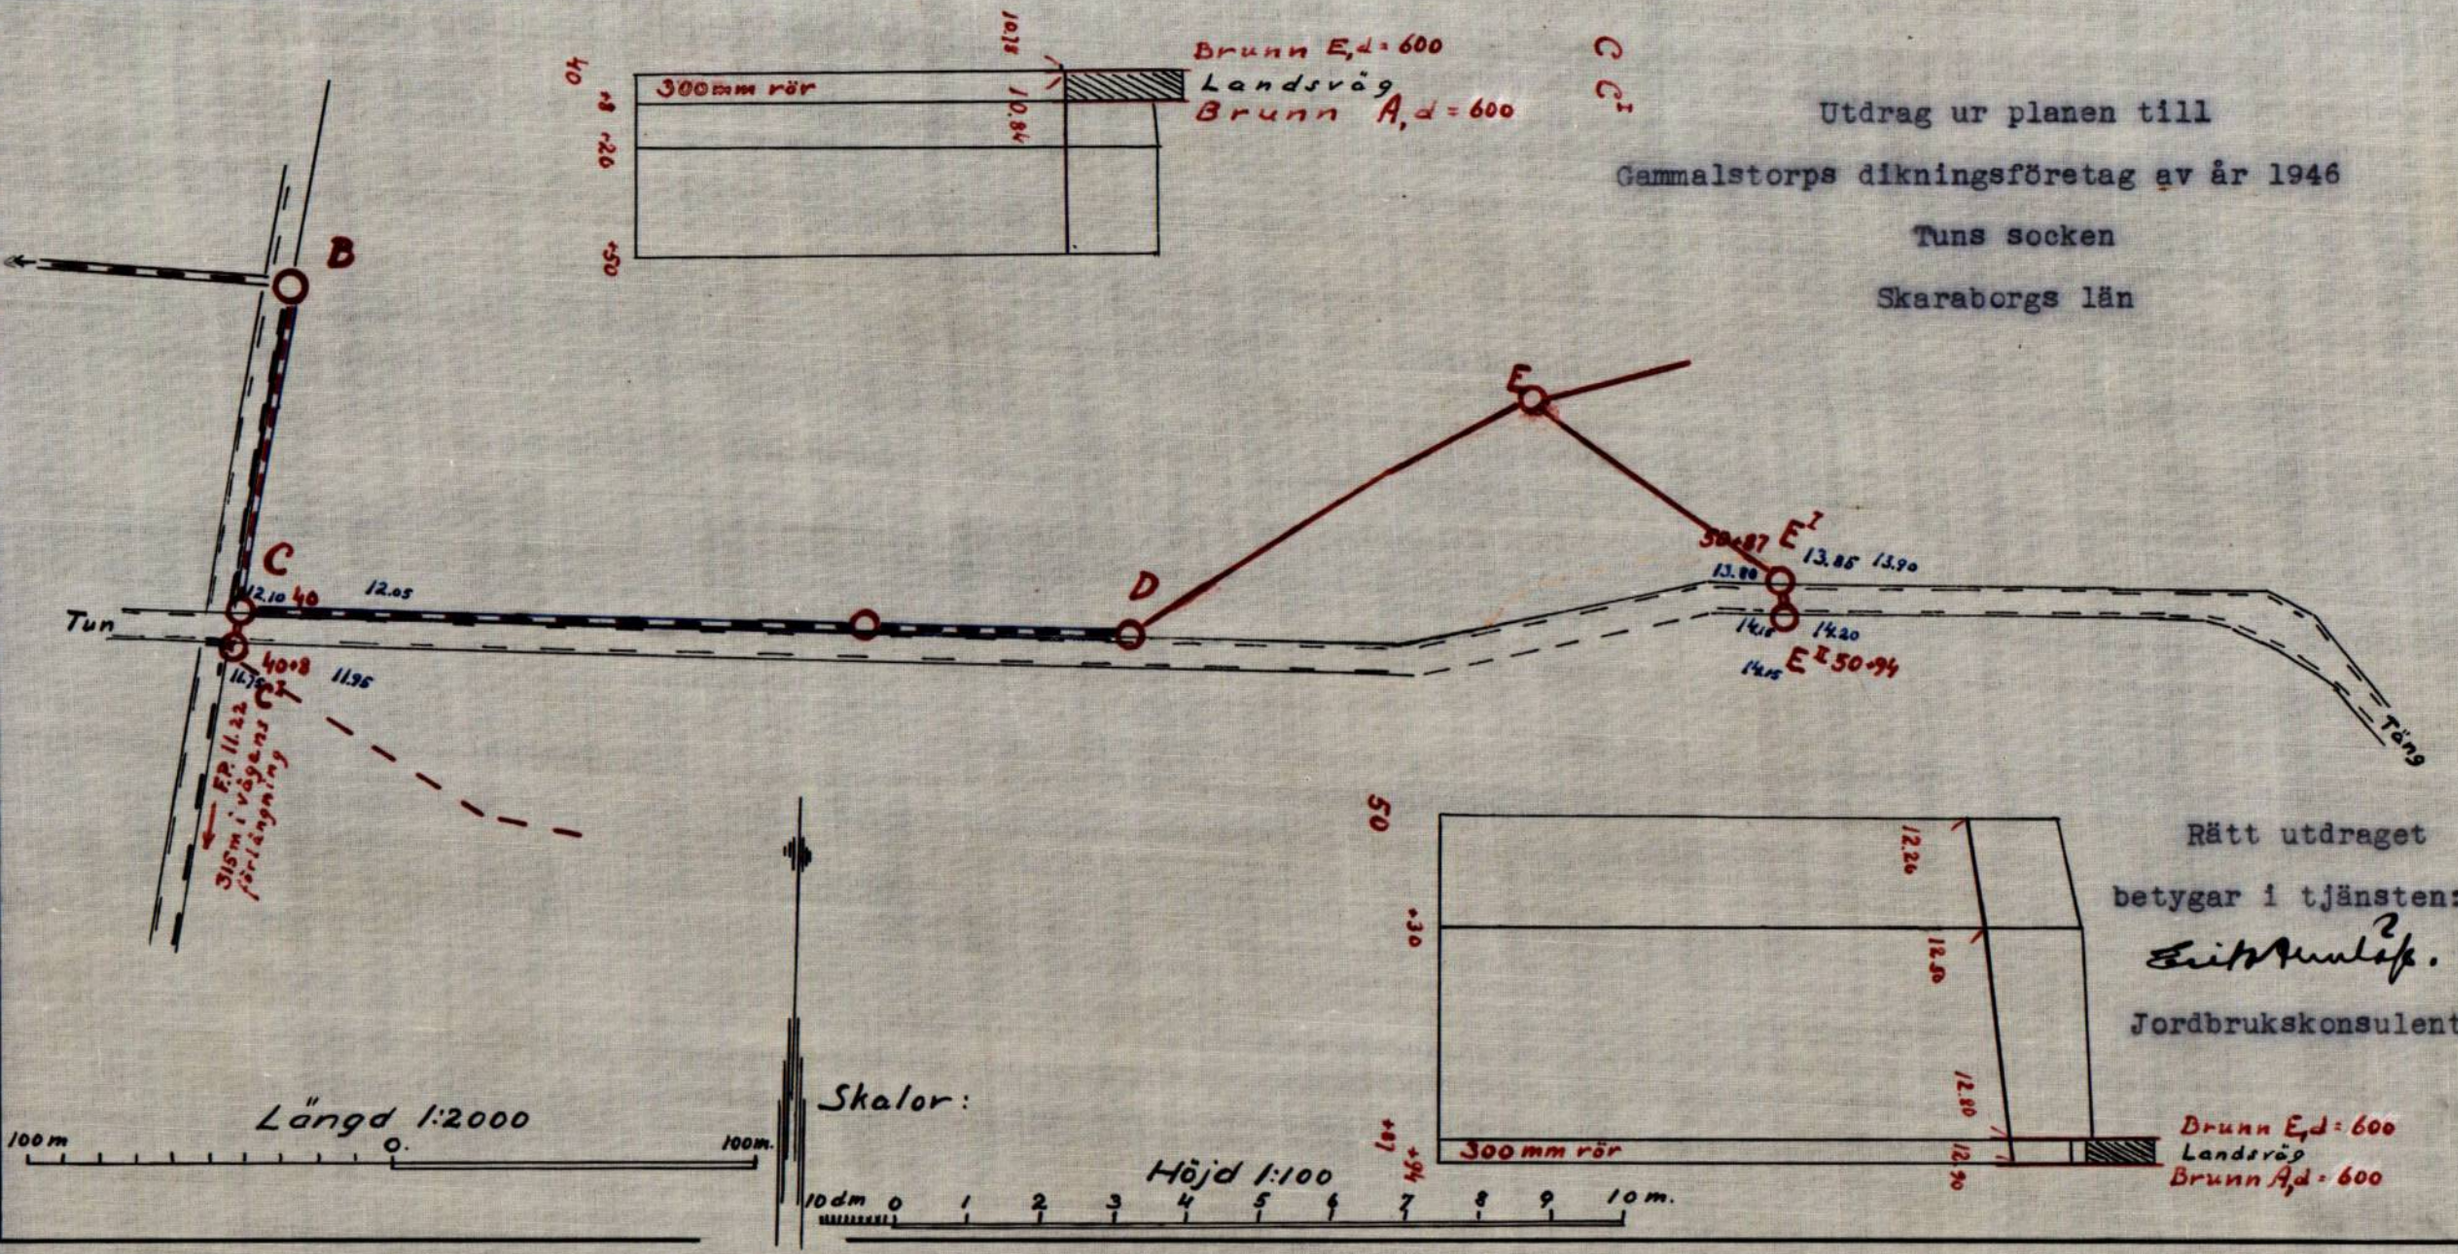
Utdrag ur planen till
Gammalstorps dikningsföretag av år 1946
Tuns socken
Skaraborgs län
Brunn E,d = 600
Landsväg
Brunn A,d = 600
300 mm rör
B
C
D
E
E I
E II
Tun
Täng
Längd 1:2000
Höjd 1:100
Skalor:
Rätt utdraget
betygar i tjänsten:
Jordbrukskonsulent

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 3470/46-43

Bilaga I

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

Skara.

Ang. Gammalstorps dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 11 november 1946 angående rubr. dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela.

Förvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag att dikningsföretaget utför och bekostar nytt vattengenomlopp genom allmänna vägen Täng-Tun vid E^{I} -E^{II} och att vägförvaltningen utför omläggning av trumman C-C^{I} jämte 600 mm brunn å uppströms sidan. Enligt Edert förslag skall nuvarande vägdike bibehållas å sträckan C-D för avledande av ytvatten men skulle det ur förvaltningens synpunkt vara avsevärt fördelaktigare om rörledningen å sträckan C-D dimensionerades för den totala vattenmängden, varefter ytvattendiket kunde läggas igen. Vägförvaltningen får därför föreslå att dikningsföretaget utför detta arbete och förvaltningen ersätter företaget för de merkostnader, som härigenom enligt Eder beräkning komma att uppstå.

För omläggning av trumman C-C^{I} skall meddelande om tidpunkten härför minst tre veckor i förväg lämnas till Vägmästaren i Grästorps vägmästareområde.

Ett exemplar av de översända utdragen ur täckdikningsplanen bilägges. För att bättre kunna avgöra huru förslagsställaren avser att låta utföra anläggningen, vore det lämpligt om å utdragen även angavs de till vägtrummorna anslutande rörledningarnas dimensioner och botten å ytvattendike vid kombinerat system. I de fall avlopp går parallellt med och omedelbart intill allmän väg bör även någon sektion medtagas.

Mariestad den 18 november 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren

/Nils G. Lenas

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 1684/48 - 43

Bilaga J

Till

Jordbrukskonsulent E. Almlöf,

S k a r a.

Angående Gammalstorps dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Edert telefonsamtal med övervägmästare Mattsson får vägförvaltningen härmed bekräfta att i vägförvaltningens skrivelse den 18 november 1946 trummorna förväxlats.

Vägförvaltningen kommer sålunda att utföra och bekosta trumman E' - E", medan trumman C - C' utföres av dikningsföretaget och på dess bekostnad.

Mariestad den 14 maj 1948
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

/ Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten A - G										
Tun socken										
Gammalstorp 2[1]										
Per Mark										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig lera på lera	1	2	62			1190	1700	510	1.336	20
"	2	2	61			1530	"	170	443	70
"	3	0	54			420	"	1280	691	20
"	4	0	47			1020	"	680	319	60
"	5	1	40			680	"	1020	1.428	-
"	6	0	82			680	"	1020	836	40
"	7	1	51			850	"	850	1.283	50
"	8	0	96			680	"	1020	979	20
"	9	0	46			600	"	1100	506	-
"	10	0	83			420	"	1280	1.062	40
"	11	1	04			760	"	940	977	60
"	12	1	21			1190	"	510	617	10
"	13	2	54			1280	"	420	1.066	80
"	14	1	82			1190	"	510	928	20
"	15	1	10			600	"	1100	1.210	-
"	16	0	80			850	"	850	680	-
"	17	2	23			850	"	850	1.895	50
"	18	1	90			850	"	850	1.615	-
"	18a	0	10			850	"	850	85	-
bete, mullhaltig sand på lera	19			1	04	1170	1300	130	135	20
" "	20			1	28	1230	"	70	89	60
	A-summa	24	96	2	32				18.186	20
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 2-5, 10-12	B-summa	8	10					50	405	-
Totalsumma samf.A-G									18.591	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten H - O										
Gammalstorp 2[1]										
Per Mark										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig lera på lera	21	3	90			940	1700	760	2.964	-
"	22	0	74			1280	"	420	310	80
"	23	1	52			1020	"	680	1.033	60
"	24	1	31			940	"	760	995	60
"	25	1	22			1020	"	680	829	60
"	25a	0	30			1020	"	680	204	-
"	26	2	00			940	"	760	1.520	-
"	26a	0	30			940	"	760	228	-
"	27	2	30			1190	"	510	1.173	-
"	28	2	41			940	"	760	1.831	60
"	29	1	73			1610	"	90	155	70
"	29a	0	70			1610	"	90	63	-
"	30	1	70			940	"	760	1.292	-
"	31	1	11			940	"	760	843	60
"	32	0	82			940	"	760	623 699	20 20
"	33	1	10			1610	"	90	99	-
"	33a	0	10			1530	"	170	17	-
"	34	1	67			680	"	1020	1.703	40
"	34a	0	15			1190	"	510	76	50
bete mullhaltig sand på lera	35			2	80	990	1300	310	868	-
"	36			0	73	1040	"	260	189	80
"	37			0	67	840	"	460	308	20
"	38			0	74	990	"	310	229	40
"	38a			0	90	1230	"	70	63	-
"	39			0	17	1170	"	130	22	10
"	39a			0	10	780	"	520	52	-
"	40	0		0	84	1040	"	260	218	40
	A-summa	25	08	6	95				17.914 17.990	50 50
			✓		✓				✓	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	2. Brukningsbåtnad									17.9 14	58
2	ägofig. 21-34a		25	08					50	1.254	-
3	enbart brukn.båtn. fig. 41,42,47		1	65			1650	1700	50	82	50
4		B-summa	26	73						1.336	50
5	Totalsumma samf. H-O			✓						19.251 19.327	- -
6										✓	
7	Samfälligheten P - Q										
8	Gammalstorp 2[1]										
9	Per Mark										
10	1. Alstringsbåtnad										
11	åker, mullhaltig lera på lera	42	0	70			1020	1700	680	476	-
12	"	43	0	61			760	"	940	573	40
13	"	44	1	01			680	"	1020	1.030	20
14	"	45	0	60			760	"	940	564	-
15	"	46	0	81			940	"	760	615	60
16		A-summa	3	73						3.259	20
17	2. Brukningsbåtnad			✓						✓	
18	ägofig. 43-46	B-summa	3	03					50	151	50
19	Summa			✓						3.410	70
20										✓	
21	Lägenheten Gammalstorp 2[7]										
22	Folke Andersson										
23	1. Alstringsbåtnad										
24	åker, mullhaltig lera på lera	48	1	72			850	1700	850	1.462	-
25		A-summa	1	72						1.462	-
26				✓						✓	
27	Lägenheten Gammalstorp 2[4]										
28	Elis Karlsson										
29	1. Alstringsbåtnad										
30	åker, mullhaltig lera på lera	49	1	25			1280	1700	420	525	-
31	"	50	0	50			1280	"	420	210	-
32	"	51	0	74			1100	"	600	444	-
33	Överföres		2	49						1.179	
				✓						✓	

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	49						1.179	–
åker, mullhaltig lera på lera	52	1	36			1190	1700	510	693	60
"	53	0	42			1100	"	600	252	–
"	54	0	50			1190	"	510	255	–
	A-summa	4	77						2.379	60
Totalsumma samf. P-Q									7.252	30
Samfälligheten R - V										
Gammalstorp 2[1]										
Per Mark										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig lera på lera	55	1	50			1200	1500	300	450	–
"	56	1	13			750	"	750	847	50
"	57	1	79			1120	"	380	680	20
"	58	1	80			750	"	750	1.350	–
"	59	1	08			1050	"	450	486	–
"	60	1	21			750	"	750	907	50
"	61	2	50			830	"	670	1.675	–
"	62	2	36			1270	"	230	542	80
"	63	3	50			750	"	750	2.625	–
"	64	0	90			830	"	670	603	–
"	65	1	41			900	"	600	846	–
	A-summa	19	18						11.013	–
2. Brukningsbåtnad ägofig 2	B-summa	11	19					50	559	50
Summa									11.572	50
L:a Hofgården 12[6]										
Karl Ramberg										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig lera på lera	66	0	80			450	1500	1050	840	–
	A-summa	0	80						840	–

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	L:a Hof-gården 12[7]										
2	Anders Andersson										
3	1. Alstringsbåtnad										
4	åker, mullhaltig lera på lera	67	0	54			380	1500	1120	604	80
5		A-summa	0	54						604	80
6	Totalsumma samf. R-V									13.017	30
7											
8	Samfälligheten X - Å										
9	Gammalstorp 2[1]										
10	Per Mark										
11	1. Alstringsbåtnad										
12	åker, mullhaltig lera på lera	68	0	16			1480	1500	20	3	20
13	"	69	0	70			1050	"	450	315	-
14	"	70	0	78			530	"	970	756	60
15	"	71	1	99			1480	"	20	39	80
16	"	72	1	58			600	"	900	1.422	-
17	"	73	1	50			830	"	670	1.005	-
18	"	74	0	80			300	"	1200	960	-
19	"	75	1	86			600	"	900	1.674	-
20		A-summa	9	37						6.175	60
21	2. Brukningsbåtnad										
22	ägofig. 68 -70	B-summa	1	64					50	82	-
23	Totalsumma samf. X-Å									6.257	60
24											
25	Samfälligheten a - c										
26	Gammalstorp 2[1]										
27	Per Mark										
28	1. Alstringsbåtnad										
29	åker, mullhaltig lera på lera	76	0	94			1050	1500	450	423	-
30	"	77	0	26			600	"	900	234	-
31	"	78	0	40			750	"	750	300	-
32	"	79	0	56			970	"	530	296	80
33		A-summa	2	16						1.253	80
	Totalsumma samf. a-c									1.253	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten d - g[1]										
Gammalstorp 2[1]										
Per Mark										
1. Alstringsbåtnad										
bete, mullhaltig lera på mobl. lera	80			0	54	1040	1300	260	140	40
"	81			0	80	1040	"	260	208	-
"	82			0	50	390	"	910	455	-
"	83			0	78	520	"	780	608	40
"	84			0	98	910	"	390	382	20
åker, mullhaltig lera på lera	85	1	10			670	1500	830	913	-
"	86	1	63			450	"	1050	1.711	50
"	87	0	98			1350	"	~~300~~ 150	147	-
"	88	1	33			1420	"	80	106	40
	A-summa	5	04 ✓	3	60 ✓				4.671	90
									✓	
Nordängen 2[13]										
Lars Lundgren										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig lera på lera	89	0	72			1460	1500	40	28	80
"	90	0	72			1350	"	150	108	-
"	91	1	00			1420	"	80	80	-
"	92	0	74			1200	"	300	222	-
"	93	1	73			1200	"	300	519	-
"	94	1	70			1200	"	300	510	-
	Apsumma	6	61 ✓						1.467	80
									✓	
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 89,90,91-94		6	61					50	330	50
endast brukn. båtn. fig. 89a,95		2	29			1450	1500	50	114	50
	B-summa	8	90 ✓						445	-
									✓	
Summa									1.912	80
									✓	
Totalsumma samf. d-g[1]									6.584	70
									✓	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten h - i[11]										
Lägenheten Gammasltorp 2[12]										
Per Mark										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig lera på lera	96	0	70			1200	1500	300	210	-
"	97	0	69			1200	"	300	207	-
"	98	0	95			750	"	750	712	50
"	99	0	80			900	"	600	480	-
"	100	0	56			1350	"	150	84	-
bete, mullhaltig sand på sandbl. lera	100a			1	18	910	1300	390	460	20
åker, mullhaltig lera på lera	101	1	24			1120	1500	380	471	20
	A-summa	4	94	1	18				2.624	90
			v		v				v	
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 96-101	B-summa	4	94					50	247	-
			v							
Totalsumma samf. h-i[11]									2.871	90
									v	
Samfälligheten j - j[1]										
Gammalstorp 2[1]										
Per Mark										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig lera på lera	102	1	09			1440	1500	60	65	40
"	103	0	18			1050	"	450	81	-
"	104	0	72			1440	"	60	43	20
"	105	0	76			1350	"	150	114	-
"	106	1	44			300	"	1200	1.728	-
	A-summa	4	19						2.031	60
			v						v	
Totalsumma samf. j-j[1]									2.031	60
									v	

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten k - m										
Gammalstorp 2[1]										
Per Mark										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig lera på lera	107	1	32			900	1500	600	792	-
"	108	0	43			1050	"	450	193	50
	A-summa	1	75						985	50
			v						v	
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 107,108	B-summa	1	75					50	87	50
			v							✓
Totalsumma samf. k-m									1.073	-
									v	
Samfälligheten n - o										
Gammalstorp 2[1]										
Per Mark										
1. Alstringsbåtnad										
bete mullh. sandbl. lera på sand-	109			0	53	910	1300	390	206	70
" bl. lera	110			1	40	990	"	310	434	-
"	111			3	33	460	"	840	2.797	20
"	112			4	14	520	"	780	3.229	20
åker, mullhaltig lera på lera	113	0	17			80	1500	1420	241	40
	A-summa	0	17	9	40				6.908	50
			✓		✓				v	
Totalsumma samf. n-o.									6.908	50
									v	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag										
Samfälligheten A - G	1 - 20	24	96	2	32	26856:80	45448		18.591	20
" H - O	21-40	25	08	6	95	35319:-	54646		19.251 19.327	--
" P - Q	42-46 48-54	10	22			10121:70	17.374		7.252	30
" R - V	55-67	20	52			17762:70	30780		13.017	30
" X - Å	68-75	9	37			7797:40	14055		6.257	60
" a - c	76-79	2	16			1986:20	3240		1.253	80
" d - g[1]	80-94	11	65	3	60	19005:30	25590		6.584	70
" h - i[11]	96-101	4	94	1	18	6072:10	8994		2.871	90
" j - j[1]	102-106	4	19			4253:40	6285		2.031	60
" k - m	107-108	1	75			1552:-	2625		1.073	-
" n - o	109-113	0	17	9	40	5566:50	12475		6.908	50
	Summa	115	01	23	45		221462		85.092 85.168	90 90
		138	46	156293:10						
				Summa alstringsbåtnad					81.778 81.854	90 90
				Summa brukningsbåtnad					3.314	-

Gammalstorp den 16 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Gustaf Karlsson

Karl Anton Andersson

Biträdande gode män:

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfälligheten P - Q								
2		395	Sträckan P - påle 173+95								
3	170-173+90		150 mm rör med frakt m.	390	1:67	651	30				
4	170-170+5										
5	173+90-173+95		450 " " " " "	10	8:13	81	30				
6	170-173+95		Grävn. läggn. o återfylln. "	395	1:60	632	-				
7	170		Rörutlopp A st	1	50:-	50	-				
8	170+66										
9	171+58 172+93		Brunn E d=525 "	3	50:-	150	-				
10	173+90		Brunn E d=600 "	1	65:-	65	-				
11	173+95		Brunn A d=600 "	1	65:-	65	-				
12	172+35		Grusfilter "	1	8:-	8	-				
13	170-170+5										
14	173+90-173+95		Rörens framdragande genom väg	2	10:-	20	-				
15	170-173+90		Justering av flödesdike m	390	0:50	195	-	1.917	60		
16											
17			Arbetsledning och oförutsett c:a 10%					182	40	2.100	-
18											
19		205	Sträckan påle 173+95-Q								
20	173+95-174+82		300 mm rör med frakt m	87	4:19	364	53				
21	174+82- 176		250 " " " " "	118	2:75	324	50				
22	173+95-174+26		Grävn. läggn. o återfylln. "	31	2:90	89	90				
23	174+26-174+82		" " " " "	56	2:70	151	20				
24	174+82-176		" " " " "	118	2:50	295	-				
25	174+82,176		Brunn A d=525 st	2	55:-	110	-	1.335	13		
26			Arbetsledning och oförutsett c:a 10%					134	87	1.470	-
27		600	Samfälligheten P - Q summa kronor							3.570	-
28											
29			Samfälligheten H - O								
30		471	Sträckan H - K								
31	180-181+3		450 mm rör med frakt m	103	8:13	837	39				
32	181+3-182+40		375 " " " " "	137	5:63	771	31				
33	182+40-184+71		250 " " " " "	231	2:75	635	25				
34			Överföres			2.243	95				
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	471	Överfört				2.243	95				
180-181+3		Grävn. läggn. o återfylln.	m	103	4:20	432	60				
181+3- 182+40		" " " "	"	137	3:40	465	80				
182+40- 183+55		" " " "	"	115	2:60	299	-				
183+55- 184+71		" " " "	"	116	2:45	284	20				
181+3 182+40 183+55		Brunn A d=600	st	3	65:-	195	-				
184+71		Brunn A d=525	"	1	55:-	55	-	3.975	55		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10%						374	45	4.350	-
	589	Sträckan K - 0									
184+71- 185+25		250 mm rör med frakt	m.	54	2:75	148	50				
185+25- 187+15		225 " " " "	"	190	2:35	446	50				
187+15- 189+13		200 " " " "	"	198	2:-	396	-				
189+13- 190+60		125 " " " "	"	147	1:18	173	46				
184+71- 185+25		Grävn. läggn. o återfylln.	"	54	2:45	132	30				
185+25- 187+15		" " " "	"	190	1:80	342	-				
187+15- 189+13		" " " "	"	198	1:80	356	40				
189+13- 190+60		" " " "	"	147	1:60	235	20				
185+25 186+12		Brunn A d=525	st	2	55:-	110	-				
187+15 187+94 189+13 190+60		Brunn A d=450	"	4	45:-	180	-				
189+57		Stensil	"	1	10:-	10	-				
189+3- 189+13		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-	2.540	36		
		Arbetsledning och oförutsett						259	64	2.800	-
		Överföres								7.150	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								7.150	-
2		423	Diket I - I[1]									
3	200-202+12		250 mm rör med frakt	m	212	2:75	583	-				
4	202+12-											
5	202+87		225 " " " "	"	75	2:35	176	25				
6	202+87-											
	203+50		200 " " " "	"	63	2:-	126	-				
7	203+50-											
8	204+23		150 " " " "	"	73	1:67	121	91				
9	200-200+73		Grävn. läggn. o återfylln.	"	73	2:60	189	80				
10	200+73-											
	202+12		" " " "	"	139	2:45	340	55				
11	202+12-											
12	202+87		" " " "	"	75	2:25	168	75				
13	202+87-											
	203+50		" " " "	"	63	2:-	126	-				
14	203+50-											
15	204+23		" " " "	"	73	1:40	102	20				
16	200+73											
	202+12		Brunn A d=525	st	2	55:-	110	-				
17												
18	202+87											
	204+23		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-	2.134	46		
19			Arbetsledning och oförutsett						215	54	2.350	-
20												
21		125	Diket K - K[1]									
22	240-241+25		100 mm rör med frakt	m	125	0:90	112	50				
23	240-241+25		Grävn. läggn. o återfylln.	"	125	1:40	175	-				
24	241+25		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	322	50		
25			Arbetsledning och oförutsett						27	50	350	-
26												
27		216	Diket L - L[1]									
28	210-212+16		150 mm rör med frakt	m	216	1:67	360	72				
29	210-212+16		Grävn. läggn. o återfylln.	"	216	2:-	432	-				
30	211+20											
31	212+16		Brunn A d=450	st	2	45:-	90	-	882	72		
32			Arbetsledning och oförutsett						87	28	970	-
33			Överföres								10.820	-
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								10.820	-
	337	Diket L - L^{II}									
220-220+42		200 mm rör med frakt	m	42	2:-	84	-				
220+42-221+7		150 " " " "	"	65	1:67	108	55				
221+7-221+59		125 " " " "	"	52	1:18	61	36				
221+59-222+50		100 " " " "	"	91	0:90	81	90				
222+50-223+37		75 " " " "	"	87	0:58	50	46				
220-220+42		Grävn. läggn. o återfylln.	"	42	1:80	75	60				
220+42-222+50		" " " "	"	208	1:40	291	20				
222+50-223+37		" " " "	"	87	1:50	130	50				
220+42		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-				
221+7 221+59 222+50 223+37		Brunn A d=375	"	4	35:-	140	-	1.068	57		
		Arbetsledning och oförutsett						101	43	1.170	-
	119	Diket M - M^{1}									
250-251+19		150 mm rör med frakt	m.	119	1:67	198	73				
250-251+19		Grävn. läggn. o återfylln.	"	119	1:60	190	40				
251+19		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	424	13		
		Arbetsledning och oförutsett						35	87	460	-
	159	Diket N - N^{1}									
230-230+96		100 mm rör med frakt	m	96	0:90	86	40				
230+96-231+59		75 " " " "	"	63	0:58	36	54				
230-231+37		Grävn. läggn. o återfylln.	"	137	1:40	191	80				
231+37-231+59		" " " "	"	22	1:50	33	-				
230+96		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-				
231+59		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	427	74		
		Arbetsledning och oförutsett						42	26	470	-
	2439	Samfälligheten H - O summa	kronor							12.920	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfälligheten A - G									
2		496 ✓	Sträckan A - C									
3	0-4+96		225 mm rör med frakt	m	496	2:35	1.165	60				
4	0-4+96		Grävn. läggn. o återfylln.	"	496	1:90	942	40				
5	0		Rörutlopp A	st	1	50:-	50	-				
6	1+42,2+23		Brunn E d=525	"	2	55:-	110	-				
7	4+5,4+96		Brunn E d=600	"	2	65:-	130	-				
8	3+99-4+5		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-				
9	0-3+99											
10	4+5-4+96		Justering av flödesdike	m	490	0:50	245	-	2.653	- ✓		
11			Arbetsledning och oförutsett						257	-	2.910	-
12											✓	
13		246 ✓ (250)	Sträckan C - D			(2:75)	(676	50)				
14	4+96-7+42		150 mm rör med frakt	m	246	1:67	410	82				
15			Mellanskillnad mellan 150 mm rör och 250 mm bekostas av vägförv.									
16			uppgår till 327:18 (265:68)									
17	4+96-7+42		Grävn. läggn. o återfylln.	m	246	2:-	492	-				
18	6+70,7+42		Brunn A d=600	st	2	65:-	130	-				
19	5+87-5+92		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-	1.042	82 ✓		
20			Arbetsledning och oförutsett						107	18	1.150	-
21											✓	
22		323 ✓	Sträckan D - F									
23	7+42-10+65		250 mm rör med frakt	m.	323	2:75	888	25				
24	7+42-10+65		Grävn. läggn. o återfylln.	"	323	2:60	839	80				
25	8+67,9+91											
26	10+65		Brunn A d=600	"	3	65:-	195	-				
27	9+40		Stensil	"	1	10:-	10	-				
28	7+42-7+46		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-	1.943	05 ✓		
29			Arbetsledning och oförutsett						186	95	2.130	-
30											✓	
31		435	Sträckan F - G									
32	10+65-12+47		200 mm rör med frakt	m	182	2:-	364	-				
33	12+47-13+12		150 " " " "	"	65	1:67	108	55				
34	13+12-15		100 " " " "	"	188	0:90	169	20				
35	10+65-12+47		Grävn. läggn. o återfylln,	"	182	2:-	364	-				
			Överföres				1.005	75			6.190	-
							✓				✓	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				1.005	75			6.190	-
12+47-13+12		Grävn. läggn. o återfylln.	m	65	1:75	113	75				
13+12-15		" " " " "		188	1:60	300	80				
12+47,13+12 15		Brunn A d=450	st	3	45:-	135	-				
12+43-12+47		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-	1.565	30		
		Arbetsledning och oförutsett						154	70	1.720	-
	392	Diket C - C^{II}									
40-41+39		200 mm rör med frakt	m	139	2:-	278	-				
41+39-42+3		150 " " " " "		64	1:67	106	88				
42+3-42+50		125 " " " " "		47	1:18	55	46				
42+50-43+92		75 " " " " "		142	0:58	82	36				
40-41+39		Grävn. läggn. o återfylln.	"	139	1:90	264	10				
41+39-42+50		" " " " "		111	1:75	194	25				
42+50-43+92		" " " " "		142	1:30	184	60				
40+8		Brunn A d=600	st	1	65:-	65	-				
41+39,42+3		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-				
42+50,43+92		Brunn A d=375	"	2	35:-	70	-				
40-40+8		Rörens framdragande genom väg			40:-	40	-	1.430	65		
		Arbetsledning och oförutsett						139	35	1.570	-
	94	Diket E - E^{II}									
50-50+87		75 mm rör med frakt	m	87	0:58	50	46				
50-50+87		Grävn. läggn. o återfylln	"	87	1:40	121	80				
50+87		Brunn E d=450	st	1	45:-	45	-				
50+87-50+94		E^{I}-E^{II} bekostas av vägförv.						217	26		
		Arbetsledning och oförutsett						22	74	240	-
	108	Diket E - E^{III}									
260-261+8		100 mm rör med frakt	m	108	0:90	97	20				
260-261+8		Grävn, läggn. o återfylln.	"	108	1:30	140	40				
261+8		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	272	60		
		Arbetsledning och oförutsett						27	40	300	-
		Överföres								10.020	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1											10.020	-
2		300	Diket F - F1									
3	20-20+66		200 mm rör med frakt	m	66	2:-	132	-				
4	20+66-21+96		125 " " " "	"	130	1:18	153	40				
5	21+96-23		75 " " " "	"	104	0:58	60	32				
6	20-20+66		Grävn. läggn. o återfylln.	"	66	2:35	155	10				
7	20+66-21+96		" " " "	"	130	1:95	253	50				
8	21+96-23		" " " "	"	104	1:25	130	-				
9	20+66,21+96											
10	23		Brunn A d=450	st	3	45:-	135	-	1.019	32		
11			Arbetsledning och oförutsett						100	68	1.120	-
12		2394	Samfälligheten A - G summa	kronor							11.140	-
13												
14			Samfälligheten R - V									
15		244	Sträckan R - U									
16	70-71+44		300 mm rör med frakt	m.	144	4:19	603	36				
17	70-71+44		Grävn. läggn. o återfylln.	"	144	2:90	417	60				
18	70		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	-				
19	71+26		Grusfilter	"	1	8:-	8	-				
20	71+44		Brunn A d=600	"	1	65:-	65	-				
21	69+60-70		Uppgrävn. av avlopp	m	40	0:80	32	-	1.165	96		
22			Arbetsledning och oförutsett						114	04	1.280	-
23												
24		533	Sträckan U - V									
25	71+44-72+4		225 mm rör med frakt	m	60	2:35	141	-				
26	72+4-73+86		200 " " " "	"	182	2:-	364	-				
27	73+86-74+98		150 " " " "	"	112	1:67	187	04				
28	74+98-76+77		125 " " " "	"	179	1:18	211	22				
29	71+44-73+86		Grävn. läggn. o återfylln.	"	242	2:25	544	50				
30	73+86-74+98		" " " "	"	112	1:75	196	-				
31	74+98-75+33		" " " "	"	35	1:55	54	25				
32	75+33-76+77		" " " "	"	144	1:80	259	20				
33	72+4		Brunn A d=525	st	1	55:-	55	-				
34	72+75,73+86											
35	74+98		Brunn A d=450	"	3	45:-	135	-				
			Överföres				2.147	21			1.280	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				2.147	21			1.280	-
76+77		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-				
74+91-74+98		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-	2.192	21		
		Arbetsledning och oförutsett						217	79	2.410	-
	420	Diket T - T^{II}									
80-82+18		150 mm rör med frakt	m	218	1:67	364	06				
82+18-84+20	82	125 " " " "	"	202	1:18	238	36				
T^{I} - 270+10	68	125 " " "	"	68	1:16	78	88				
80-82+18		Grävn. läggn. o återfylln.	"	218	2:-	436	-				
82+18-84+20	150	" " " "	"	202	1:90	383	80				
T-270+10		Tvärdike läggs				15	-				
82+18		Brunn C d=375	st	1	20:-	20	-				
84+20		" A d=375	"	1	35:-	35	-	1.477	22		
		Arbetsledning och oförutsett						142	78	1.620	-
		Fördjupning av dikesbank 271+10 - X								180	-
	86	Diket T^{1} - T^{III}									
320-320+86		100 mm rör med frakt	m	86	0:90	77	40				
320-320+86		Grävn. läggn. o återfylln.	"	86	1:80	154	80				
320+86		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	267	20		
		Arbetsledning och oförutsett						27	80	295	-
	212	Diket U - U^{1}									
90-91+43		125 mm rör med frakt	m	143	1:18	168	74				
91+43-92+12		75 " " " "	"	69	0:58	40	02				
90-91+43		Grävn. läggn. o återfylln.	"	143	1:55	221	65				
91+43-92+12		" " " "	"	69	1:25	86	25				
91+43		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-				
92+12		Brunn E d=375	"	1	35:-	35	-				
91+43-92+12		Justering av flödesdike	m	69	0:40	27	60				
91+39-91+43		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-	624	26		
		Arbetsledning och oförutsett						55	74	680	-
	1495	Samfälligheten R - V summa kronor								6.285	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfälligheten X - Å									
2		556	Sträckan X - Å									
3	271+90-											
4	272+54		125 mm rör med frakt	m	64	1:18	75	52				
5	272+54- 273+56		100 " " " "	"	102	0:90	91	80				
6	271+90-											
7	273+56		Grävn. läggn. o återfylln.	"	166	1:65	273	90				
8	271+90		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
9	272+54 273+56		Brunnar A d=375	"	2	35:-	70	-				
10	268+60-											
11	271+90		Uppgrävn. av avlopp	m	390	0:50	195	-	721	22		
12			Arbetsledning och oförutsett						68	78	790	-
13												
14		383	Diket Y - Y^1									
15	280-281+90		200 mm rör med frakt	m	190	2:-	380	-				
16	281+90-											
17	282+63		150 " " " "	"	73	1:67	121	91				
18	282+63- 283+83		125 " " " "	"	120	1:18	141	60				
19	280-281+90		Grävn. läggn. o återfylln.	"	190	2:20	418	-				
20	281+90-											
21	282+63		" " " "	"	73	2:-	146	-				
22	282+63-283+ 83		" " " "	"	120	1:90	228	-				
23	280		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
24	281+90											
25	282+63		Brunn A d=450	st	2	45:-	90	-				
26	283+37 283+83		Brunn A d=375	"	2	35:-	70	-				
27	283+33		Stensil	"	1	10:-	10	-				
28	283+33-											
29	283+37		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-	1.630	51		
30			Arbetsledning och oförutsett						169	49	1.800	-
31		939	Samfälligheten X - Å summa kronor								2.590	-
32												
33												
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	397	Samfälligheten k - m									
	397	Sträckan k - m									
100-100+97		250 mm rör med frakt	m	97	2:75	266	75				
100-100+97		Grävn. läggn. o återfylln	"	97	2:10	203	70				
100		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	-				
100+97		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-				
100+92-100+97		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-				
97-99		Avlopp tillfredsställande	m	200	-	-	-				
99-100		Upprensning av avlopp	"	100	1:-	100	-	665	45		
		Arbetsledning och oförutsett						64	55	730	-
		Samfälligheten k - m summa	kronor							730	-
		Samfälligheten n - o									
	394	Sträckan n - o									
101+53-101+87		250 mm rör med frakt	m	34	2:75	93	50				
101+87-102+59		225 " " " "	"	72	2:35	169	20				
102+59-103+45		200 " " " "	"	86	2:-	172	-				
103+45-104+50		150 " " " "	"	105	1:67	175 ~~173~~	35 ~~35~~				
104+50-105+31		75 " " " "	"	81	0:58	46	98				
101+53-101+87		Grävn. läggn. o återfylln	"	34	4:-	136	-				
101+87-103+45		" " " "	"	158	2:50	395	-				
103+45-104+50		" " " "	"	105	1:75	183	75				
104+50-105+31		" " " "	"	81	1:40	113	40				
101+53		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	-				
101+87-102+59		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-				
103+45-104+50-105+31		Brunn A d=375	"	3	35:-	105	-				
101+37-101+53		Uppgrävning av avlopp	m	16	1:-	16	-				
		Överföres				~~1.734~~ 1736	~~18~~				

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört			~~1.734~~ 1736	~~18~~ 18				
2	101+62-							1746	18		
	101+69		Rörens framdragande genom väg		10:-	10	-	~~1.744~~	~~18~~		
3								173	82		
			Arbetsledning och oförutsett					~~175~~	~~82~~	1.920	-
4											
		394	Samfälligheten n - o summa kronor							1.920	-
5											
6											
7			Samfälligheten a - c								
8		278	Sträckan a - c								
9	290-291+55		125 mm rör med frakt m	155	1:18	182	90				
10	291+55-										
	292+78		75 " " " " "	123	0:58	71	34				
11	290-291+55		Grävn. läggn. o återfylln. "	155	1:80	279	-				
12	291+55-										
13	292+78		" " " " "	123	1:40	172	20				
14	290		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
15	290+55-										
	292+78		Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-				
16	290-290+5		Rörens framdragande genom väg		10:-	10	-	820	44		
17			Arbetsledning och oförutsett					79	56	900	-
18											
19											
20		110	Diket b - b^1								
21	300-301+10		75 mm rör med frakt m	110	0:58	63	80				
22	300-301+10		Grävn. läggn. o återfylln. "	110	1:40	154	-				
23	301+10		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	262	80		
24			Arbetsledning och oförutsett					27	20	290	-
25		388	Samfälligheten a - c summa kronor							1.190	-
26											
27			Samfälligheten d - g^1								
28		550	Sträckan d - g^1								
29	413+50-										
	415+40		Avlopp tillfredsställande m	190							
30	415+40-419		Upprensning av avlopp "	360	1:-	360	-				
31	415+4-415+8		Försvårad överfart, justering av brotrumma		200:-	200	-	560	-		
32			Arbetsledning och oförutsett					50	-	610	-
33											
34			Överföres							610	-
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								610	-
	625	Diket e - e II									
110-110+66		250 mm rör med frakt	m	66	2:75	181	50				
110+66-113+48		200 " " " "	"	282	2:-	564	-				
113+48-114+46		125 " " " "	"	98	1:18	115	64				
114+46-116+25		75 " " " "	"	179	0:58	103	82				
110-110+66		Grävn. läggn. o återfylln.	"	66	2:50	165	-				
110+66-113+48		" " " "	"	282	1:60	451	20				
113+48-114+46		" " " "	"	98	1:30	127	40				
114+46-116+25		" " " "	"	179	1:20	214	80				
110		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	-				
110+66		Brunn A d=525	"	1	55:-	55	-				
113,113+48-114+46		Brunn A d=450	"	3	45:-	135	-				
116+25		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	2.188	36		
		Arbetsledning och oförutsett						211	64	2.400	-
	125	Diket f - f1									
460-461+25		100 mm rör med frakt	m	125	0:90	112	50				
460-460+45		Grävn. läggn.o återfylln.	"	45	1:35	60	75				
460+45-461+25		" " " "	"	80	1:50	120	-				
461+25		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
460,460+45		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-	398	25		
		Arbetsledning och oförutsett						41	75	440	-
	210 ~~238~~	Diket g - g II									
450-~~452+38~~ 452+10		100 mm rör med frakt	m	~~238~~ 210	0:90	~~214 20~~ 189 -					
450-452+38		Grävn. läggn. o återfylln.	"	~~238~~ 210	1:35	~~321 30~~ 283 50					
450		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
452+38 +10		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-	~~595 50~~ 532 50			
		Arbetsledning och oförutsett						~~54 50~~ 47 50		~~650~~ 580	-
		Överföres								~~4.100~~ 4030	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								4.030	-
											~~4.100~~	-
2		200	Diket $e^1 - e^{III}$									
3	310-310+55		150 mm rör med frakt	m	55	1:67	91	85				
4	310+55-											
5	311+5		125 " " " "	"	50	1:18	59	-				
6	311+5-312		75 " " " "	"	95	0:58	55	10				
7	310-310+55		Grävn. läggn o återfylln.	"	55	1:60	88	-				
8	310+55-											
	311+5		" " " "	"	50	1:80	90	-				
9	311+5-312		" " " "	"	95	1:20	114	-				
10	310+55		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-				
11	311+5,312		Brunn A d=375	"	2	35:-	70	-	612	95		
12			Arbetsledning och oförutsett						57	05	670	-
13		1738	Samfälligheten d - g^1 summa kronor								~~4.700~~	
											~~4.770~~	-
14												
15			Samfälligheten j - j^1									
16												
17		650	Sträckan j - j^1									
18	125+32-127 +46		75 mm rör med frakt	m	214	0:58	124	12				
19	127+46-											
20	128+50		125 " " " "	"	96	1:18	113	28				
21	125+32- 127+46		Grävn. läggn. o återfylln.	"	214	1:60	342	40				
22	127+46-											
23	128+50		" " " "	"	96	1:90	182	40				
24	125+32		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
25	127+46		Brunn F d=375	"	1	35:-	35	-				
26	128+50		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-				
27	122-125+32		Uppgrävn. av avlopp	m^3	300	2:-	600	-				
28	123-123+5		900 mm rör till bro	st	8	18:-	144	-				
29	123-123+5		Iordningsställande av bro				200	-	~~1.791~~ 944	~~20~~		
30			Arbetsledning och oförutsett						~~178~~ 96	~~80~~	~~1.970~~ 1040	-
31		650	Samfälligheten j - j^1 summa kronor								~~1.970~~ 1640	-
32												
33												
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten h - i II								
	367	Sträckan h - i - i II								
130-131+70		200 mm rör med frakt m.	170	2:-	340	-				
131+70-132+30		150 " " " " "	60	1:67	100	20				
132+30-133+4		100 " " " " "	74	0:90	66	60				
130-130+78		Grävn. läggn. o återfylln. "	78	2:20	171	60				
130+78-131+70		" " " " "	92	2:-	184	-				
131+70-132+30		" " " " "	60	1:75	105	-				
132+30-133+4		" " " " "	74	1:40	103	60				
130		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
130+78-131+70 132+30		Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-				
133+4		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
120-120+63		Uppgrävning av avlopp m	63	0:50	31	50	1.287	50		
		Arbetsledning och oförutsett					122	50	1.410	-
	100	Diket i 1 - i III								
140-141		100 mm rör med frakt m	100	0:90	90	-				
140-141		Grävn. läggn. och återfylln."	100	1:70	170	-				
141		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	295	-		
		Arbetsledning och oförutsett					25	-	320	-
	467	Samfälligheten h - i II summa kronor							1.730	-
		Sammandrag:								
	600	Samfälligheten P - Q							3.570	-
	2439	" H - O							12.920	-
	2394	" A - G							11.140	-
	1495	" R - V							6.285	-
	939	" X - Å							2.590	-
	397	" K - M							730	-
	394	" n - o							1.920	-
	388	" a - c							1.190	-
	1738	" d - g 1							4.770	-
	650	" j - j 1							1.970	-
	467	" h - i II							1.730	-
	11901				Totalsumma				46.815	-

Skara den 16 juli 1948

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga M

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skrapa, utan böra i möjligaste må uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annän än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,


att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är: fp. + 15,33, utmärkt med kors i berg inom fig. 19 å Gammalstorp 2^{1}.

Skara den 16 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Översiktskarta

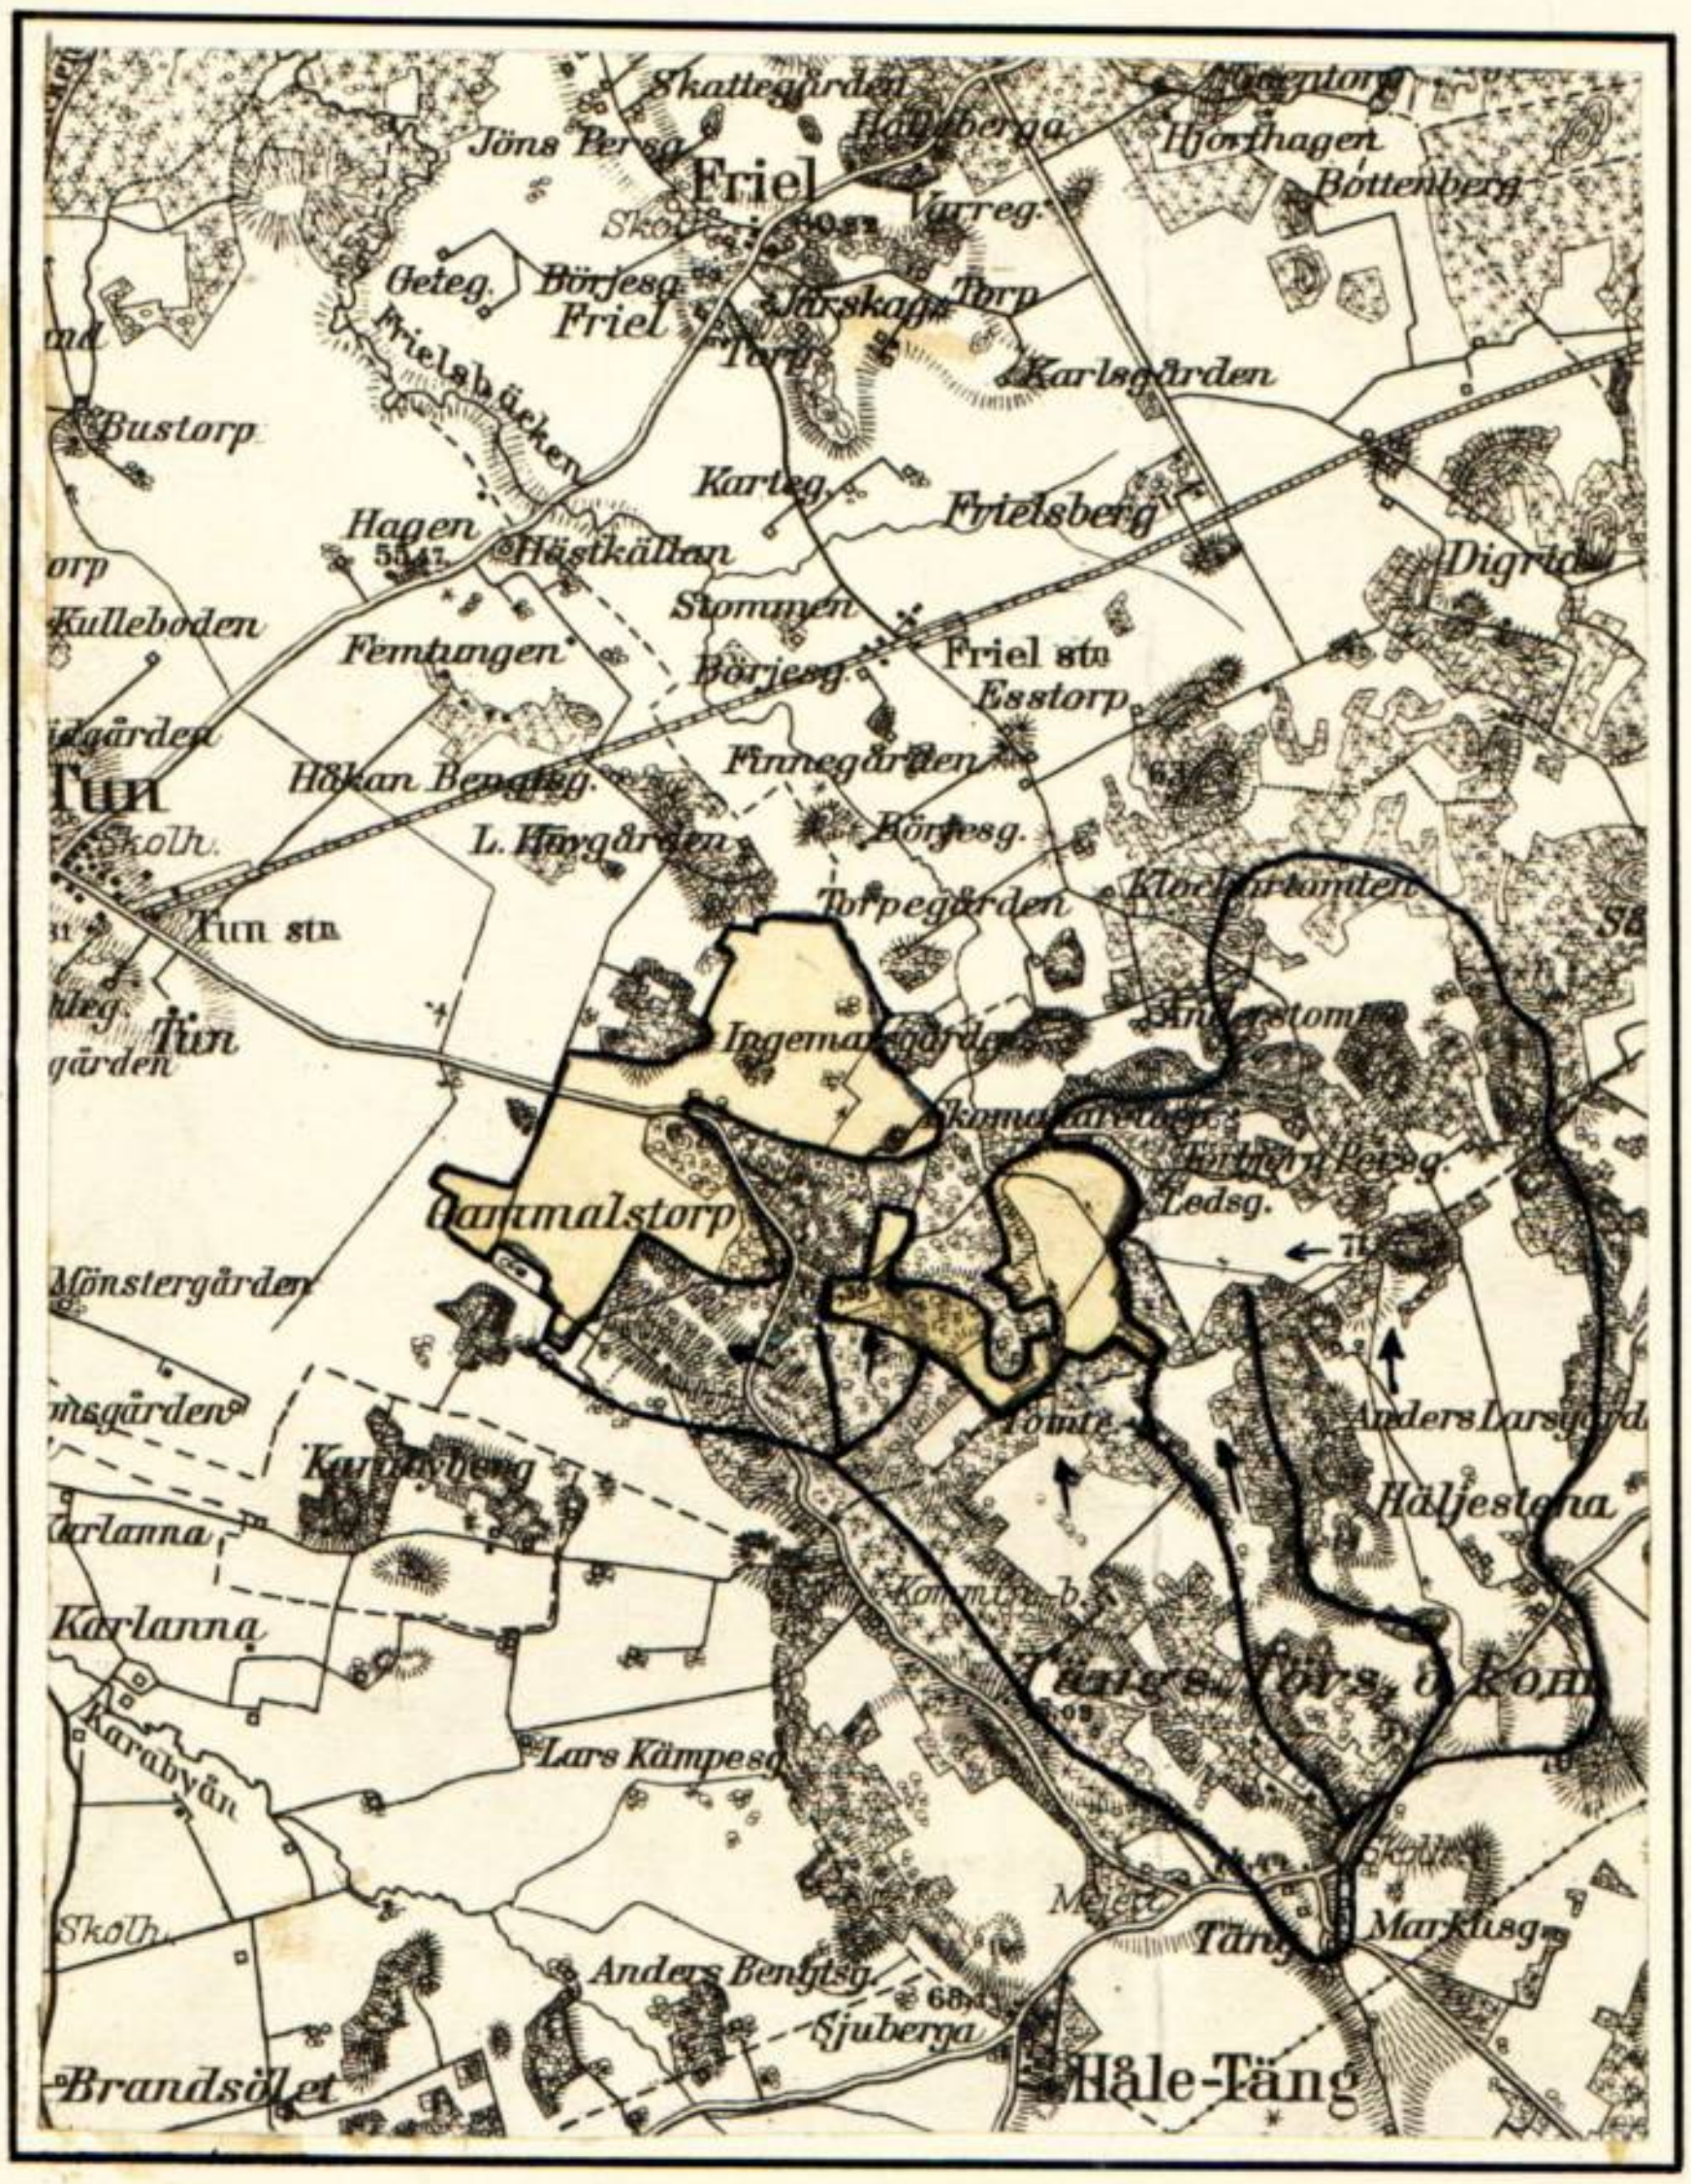

Skala 1:50.000

Bilaga 0

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gammalstorps egendom m.fl. hemman i Tuns socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km OSO Tuns kyrka inom nederbördsområde 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörde markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla samt streckad linje mellan två heldragna röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G, H - J - K - L - M - N - O, P - Q, R - S - T - U - V, X - Y - Z - Å, a - b - c, d - e - f - g - g^{1}, h - i - i^{11}, i - i^{1}, k - l - m, n - o för huvudavlopp och C - C^{1} - C^{11}, E - E^{1} - E^{11}, E - E^{111}, F - F^{1}, J - J^{1}, K - K^{1}, L - L^{1}, L - L^{11}, M - M^{1}, N - N^{1}, T - T^{1} - T^{11}, T^{1} - T^{111}, U - U^{1}, Y - Y^{1}, b - b^{1}, e - e^{1} - e^{11}, e^{1} - e^{111}, f - f^{1}, g - g^{11} och i - i^{111} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,30 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats förmöjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och dem som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en blå prickad lije utvisande vattendelare eller en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 11 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-G, H-O, P-Q, R-V, X-Å, a-c, d-g^{1}, h-i^{11}, j-j^{1}, k-m, n-o.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Enl. bil. I har vägförvaltningen yrkat på heltäckt ledning sträckan C - D utmed allmänna landsvägen till Tun. Med anledning härav påföres vägförvaltningen en kostnad i nämnda sträcka motsvarande mellanskillnaden mellan heltäckt (250 mm) och halvtäckt (150mm rör) utgörande c:a 325 kronor.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdig-ställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Beträffande övergrävning av allmänna landsvägen sträckan $C-C^1$ har kostnaden helt påförts dikningsföretaget. Kostnaden för trumman å sträckan $E^1 - E^{11}$ har helt påförts vägförvaltningen jämte brunn uppströms vägen.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med för samf.-A-G 27:89, samf. H-O 28:99 och för samf. R-V 19:52 eller tillsammans 76 kronor och 40 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

- - - - - - - - - - -

Jämlikt föreskrifter i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Gammalstorps dikningsföretag av år 1948".

- - - - - - - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gammalstorp den 16 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Gustaf Karlsson

Gustaf Karlsson

Karl Anton Andersson

Karl Anton Andersson

Biträdande gode män:

Bilaga P

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	Andel i gemensamma kostnader procent
	1	2	3		4		5		6	7
1	Samfälligheten A - G				Areal Total	Åker				
2	Gammalstorp 2[1]									
3	Per Mark	S			227.0	110.0				
4	ägofig. 1-20		18.591	20			11.140	-	100,000	21.829
5										
6	Samfälligheten H - O									
7	Gammalstorp 2[1]									
8	Per Mark	S								
9	ägofig. 21-40		19.327	-			12.920	-	100,000	22,693
10										
11	Samfälligheten P - Q									
12	Gammalstorp 2[1]									
13	Per Mark	S								
14	ägofig. 42-46		3.410	70			1.678	93	47,029	
15	Lägenheten Gammalstorp 2[7]									
16	Folke Andersson	S			13.5	8.0				
17	ägofig. 48		1.462	-			719	68	20,159	
18	Lägenheten Gammalstorp 2[4]									
19	Elis Karlsson	S			9.5	6.6				
20	ägofgi. 49-54		2.379	60			1.171	39	32,812	
21	Summa		7.252	30			3.570	-	100,000	8.515
22	Samfälligheten R - V									
23	Gammalstorp 2[1]									
24	Per Mark	S								
25	ägofig. 55-65		11.572	50			5.587	43	88,901	
26	L:a Hofgården 12[6]									
27	Karl Ramberg	S			18.2	10.0				
28	ägofig. 66		840	-			405	57	6.453	
29	L:a Hofgården 12[7]									
30	Anders Andersson	S			23.0	16.5				
31	ägofig. 67		604	80			292	-	4,646	
32	Summa		13.017	30			6.285	-	100,000	15,284
33	Överföres									68,321

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	Andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3		4		5		6	7
Överföres									68,321
Samfälligheten X - Å									
Gammalstorp 2[1]									
Per Mark	S								
ägofig. 68-75		6.257	60			2.590	-	100,000	7,347
Samfälligheten a - c									
Gammalstorp 2[1]									
Per Mark	S								
ägofig. 76-79		1.253	80			1.190	-	100,000	1,472
Samfälligheten d - g[1]									
Gammalstorp 2[1]									
Per Mark	S								
ägofig. 80-88		4.671	90			3.384	36	70,951	
Nordängen 2[13]									
Lars Lundgren	S								
ägofig. 89-94		1.912	80	28.5-85		1.385	64	29,049	
Summa		6.584	70			4.770	-	100,000	7.731
Samfälligheten h - i[11]									
Lägenheten Gammalstorp 2[12]									
Per Mark	S								
ägofig. 96-101		2.871	90			1.730	-	100,000	3,372
Samfälligheten j - j[1]									
Gammalstorp 2[1]									
Per Mark	S								
ägofig. 102-106		2.031	60			1.970	-	100,000	2.385
Överföres									90,628

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensamma kostnader
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		procent
1	2	3		4		5		6		7
1 Överfört										90,628
2 Samfälligheten k - m										
3 Gammalstorp 2[1]										
4 Per Mark	S									
5 ägofig. 107-108		1.073	-			730	-	100,000		1.260
6										
7 Samfälligheten n - o										
8 Gammalstorp 2[1]										
9 Per Mark	S									
10 ägofig. 109-113		6,908	50			1.920	-	100,000		8.112
11 Totalsumma		85.168	90			48,815	-			100,000
12										
13										

Gammalstorp den 16 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Gustaf Karlsson

Karl Anton Andersson

Biträdande gode män;

Bilaga Q

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Gammalstorp m.fl i Tuns socken av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	100 ha	710:-	
	39 " däröver	195:-	
Tillägg 1,6 % av kostnaden 48.815		781:04	1.686:04

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	300:-	
Ersättning till gode män:		
Gustaf Karlsson	25:20	
Karl Anton Andersson	14:-	
Gustaf Magnusson	11:20	350:40
Summa kronor		2.036:44


Skara den 16 juli 1948

I tjänsten:


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

TÄCKDIKESÖGON

Täckdikesöga.
typ A.

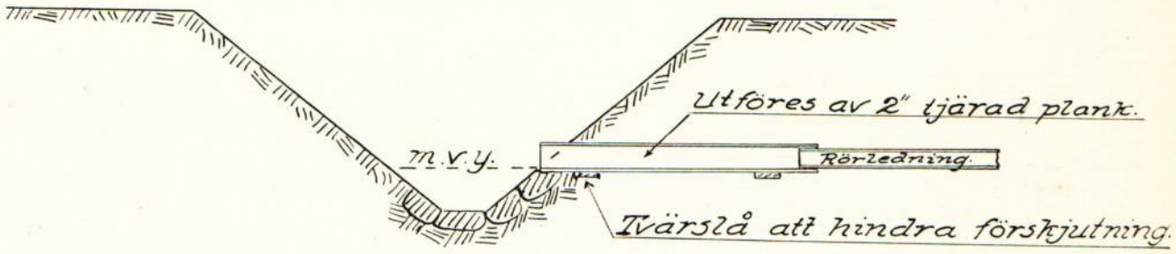


Rörutlopp.
typ B.

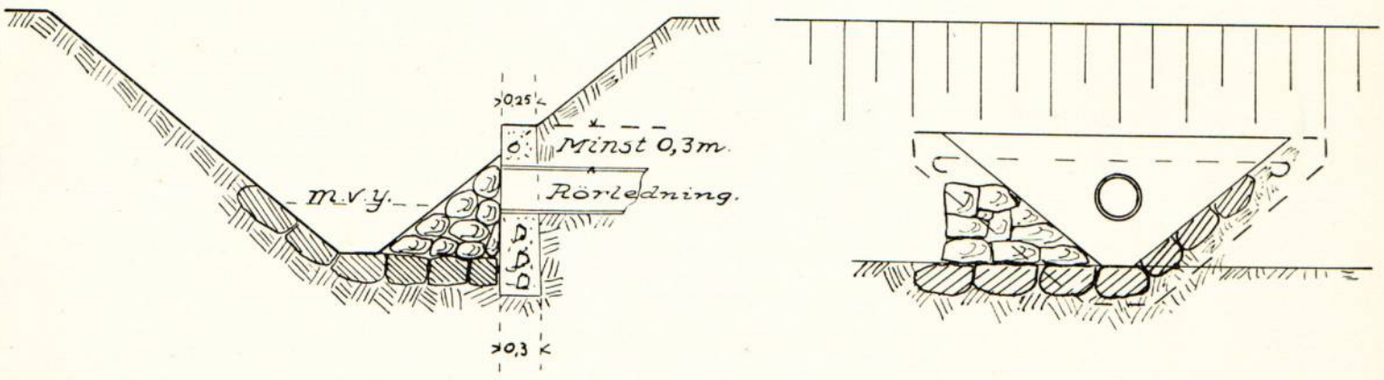

typ C.



typ D.

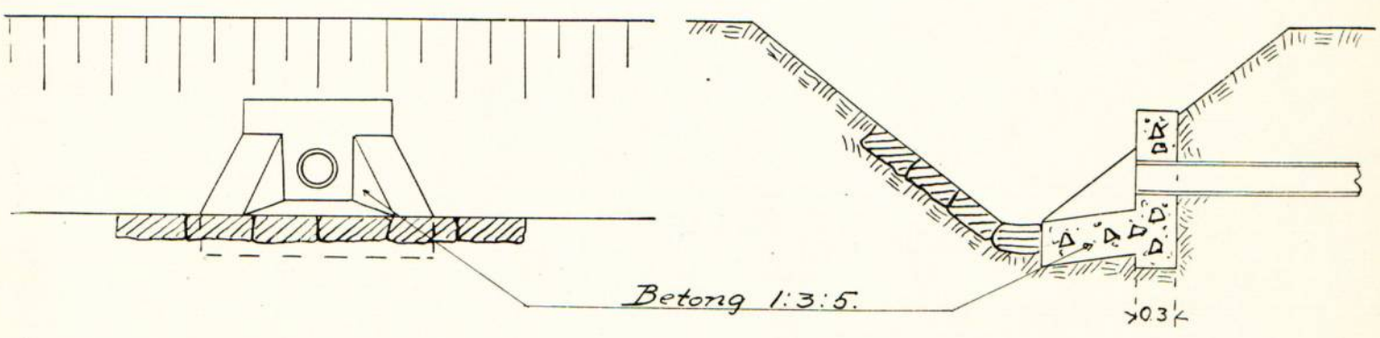


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

Ytvattenbrunn.

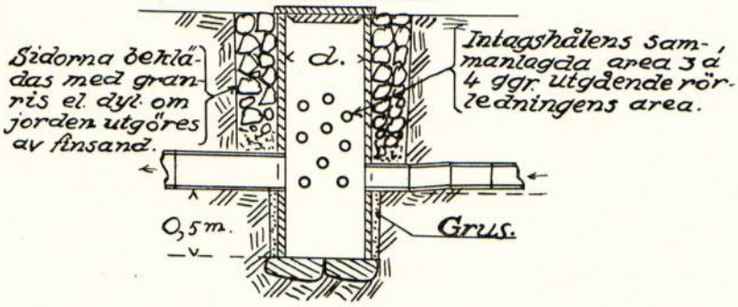


typ B.

Större ytvattenbrunn.

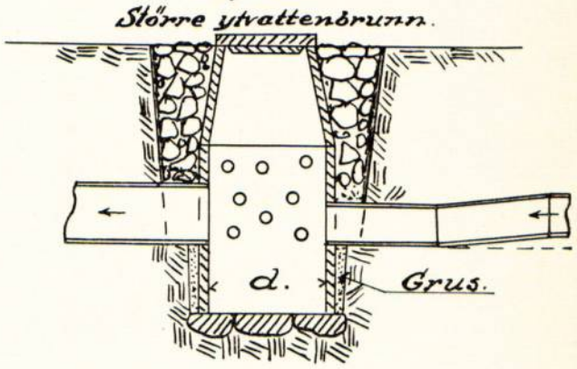


typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.

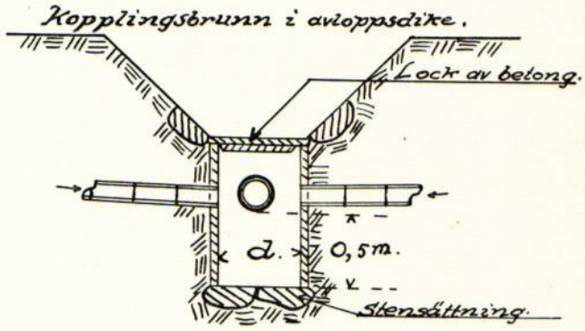


typ E.

Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.

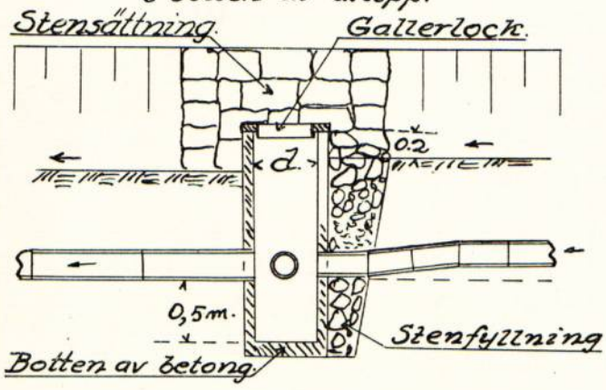


typ F.


Bräddavloppsbrunn.

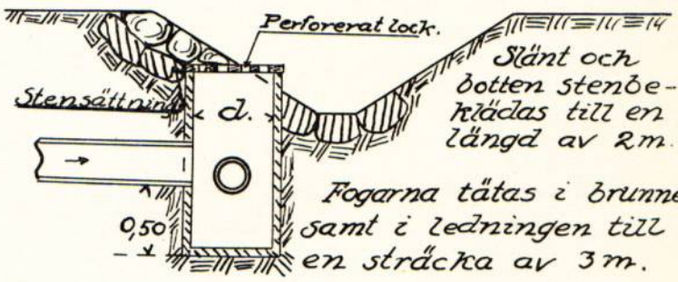

Detalj i plan.




Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.

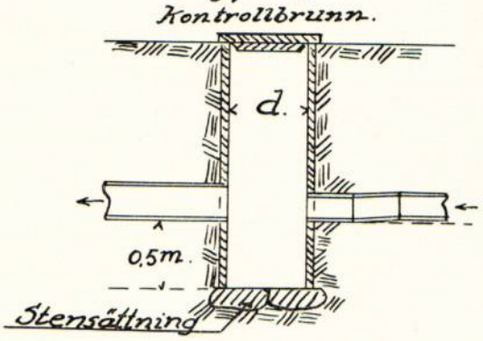

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA


403091

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

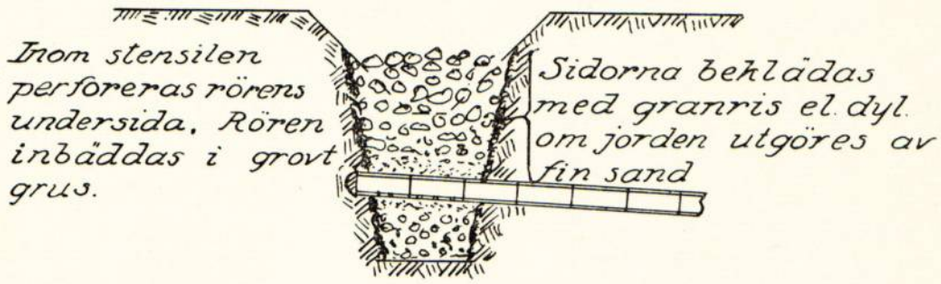

Grusfilter.



Inom grusfiltret avhuggas rören för erhållande av större antal fogar.

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
2) Lägg grus över rörfogarna.
3) Stick ner rikligt med matjord.
4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.


Återfyll aldrig dikena med sur, genomåttad lera.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403091

Rörutlopp typ A

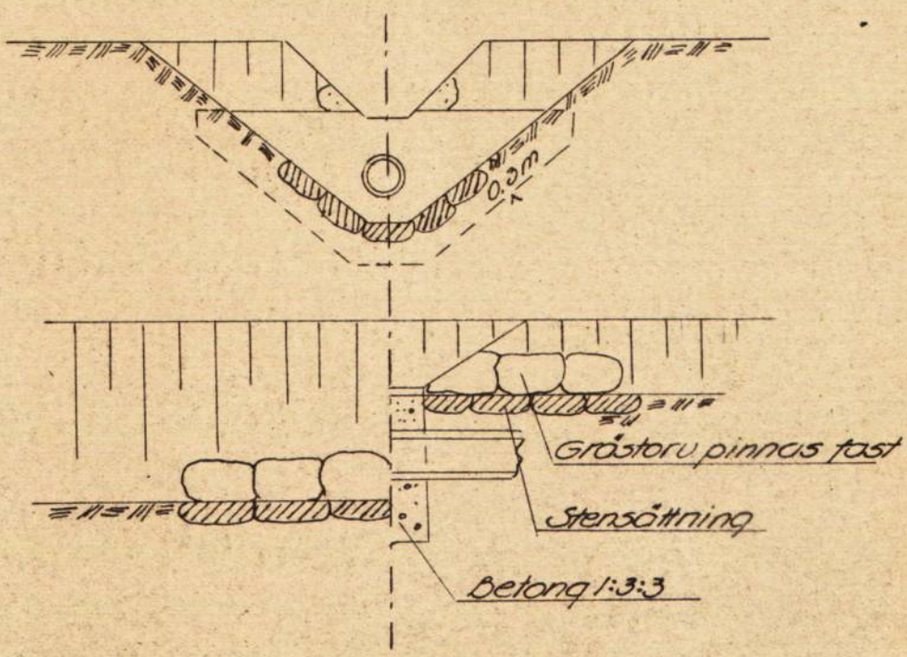

314
1/9 kamb

Nr. 12. Fnr. 725.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr U 334
SAK Nr

RAPPORT

Rapport över verkställda arbeten å "Gammalstorps dikningsföretag av år 1948" i Tuns socken av Skaraborgs län vid av undertecknad den 7 december 1951 verkställd besiktning varöver bevis insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1951 har befunnits, att följande delar av företaget voro utförda nämligen: A-B-C-D-E-F-G, C-C^{1}-C^{II}, E-E^{1}-E^{II}; E-E^{III}; F-F^{1}; H-I-K-L-M-N; K-K^{1}; L-L^{1}; L-L^{II}; N-N^{1}; N- 189+13; P-171+58; R-S-T-U-V; X-Y; Z-Å; T-T^{1}-T^{III}, U-U^{1}; Y-Y^{1}; d-e-f-g-g^{1}; e-e^{1}-e^{II}; e^{1}- e^{III}; l-m.

Motsvarande c:a 70 % av hela företaget. Fastställd arbetstid enligt utlåtande 31/12 1955, enligt kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1/9 1951.

Skara den 12 januari 1952

Enligt uppdrag:

Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

314/19

Bevis

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1952
DIARIE Nr 02057
SAK Nr

över verkställd slutavsyning

Företag: Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i
(namn, socken och län)
Tuns socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Godsäg. Per Mark, bek. Gammalstorp, Tun.
Förtroendeman:
Ende intressent:

godk.

BESLUT
DEN 20 JAN 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 16.950:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 33.950:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1952

Vid förrättningen, som verkställts av assistent John Wikström

den 14 nov. 1952, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande avvikelser:

Samf. d - g^{I}.

Diket f - f^{1} har utförts med 20 cm högre bottenläge än förslaget. Å diket g-g^{II} har sträckan 452+10-452+38 ej utförts emedan en damm iordningsställts å denna plats. Ledningen slutar med en brunn vid 452+10.

Samf. a - c.

Den å sträckan a-290+85 föreslagna 125 mm rörledningen har ej utförts. I stället har en c:a 100 m lång 250 mm rörledning lagts i öppna diket parallellt med ovannämnda sträcka och slutar med en brunn i mötande tvärdike. Genom vägen sträckan 290-290+5 har en 375 mm rörtrumma samt en brunn vid 290+5, utförts. Föreslagen brunn vid b har ej utförts. Från p 290+85 har 125 mm rörledningen kopplats direkt i 250 mm ledningen.

Samf. R - V.

Sträckan 83-T^{II} har ej utförts på grund av förekomst av berg. I stället har en 125 mm rörledning lagts från T^{II} med utlopp vid p 271+10, å sträckan X-Y och sträckan 271+10-X har fördjupats 25 cm. Rördimensioner å sträckan T^{I}-83 har minskats från 125 mm till 100 mm.

Samf. j - j^{I}.

Rörledningen å sträckan 125+32-j^{I} har ej utförts, då det framkommit att det finns gammal täckdikning å berörda figurer. Vidtagna ändringar ha med grönt införts å plankarta och profiler.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

De slutliga kostnaderna uppgå till kronor 50.044:59 och överensstämma med de beräknade för samtliga samf. utom j - j^{I}, vilken utförts för mindre kostnad genom uteslutning av ovannämnda sträcka. Räntorna under arbetstiden uppgå till kronor 1.792:-.

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick.

Skara den 20/11 1952.

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1952
DIARIE NR J 2057
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m .

BESLUT
DEN 20 JAN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Angående Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken av Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt översända följande skrivelser och akter rörande ovannämnda dikningsföretag:

1) Bevis över verkställd slutavsyning.
2) Uppgift över verkliga kostnder för företagets utförande.
3) Rekvisition av sista delen av beviljat lån.
4) Rekvisition av sista delen av beviljat statsbidrag.

Som framgår av avsyningsbeviset förekommer vissa ändringar och avvikelser av det ursprungliga förslaget. Med anledning härav översändes det exemplar av betänkandet, som tillhör företaget och samtidigt sändes separat ritningarna i 8 exemplar för överföring av ändringarna till arkivexemplaret i Kungl. Lantbruksstyrelsen. Skara den 22 november 1952.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1952
DIARIE NO 2057
SAK Nr

BESLUT
DEN 20 JAN 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Gammalstorps dikningsföretag av år 1948" i Tun socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets förtroendeman lämnade uppgifter.

	Samfällighet											Summa
	A - G	H - O	P - Q	R - V	X - Å	a - c	d - g[I]	h - i[II]	j - j[I]	k - m	n - o	kronor.
Syneförrättningen	443:53	461:08	183:88	310:55	158:67	31:79	166:96	72:82	51:51	27:21	175:19	2.083:19
Vattendomstolsavgift	27:89	28:99		19:52								76:40
Jordersättning för avloppens breddning												-
Arbets- och materialkostnad	10.144:--	11.776:03	3.252:73	5.726:85	2.351:73	1.083:24	4.355:06	1.582:50	936:-	665:45	1.744:18	43.617:77
Extra arbeten												-
Ersättning för jordupplag												-
Diverse omkostnader	451:77	608:78	175:82	329:18	154:11	74:13	266:36	87:76	89:35	38:15	88:82	2.364:23
Räntor under arbetstiden	520:--	510:--	132:--	212:--	76:--	31:--	140:--	56:--	12:--	25:--	78:--	1.792:--
Arbetsledning m.m.	24:23	25:19	9:45	16:97	8:16	1:63	8:58	3:74	2:65	1:40	9:--	111:--
.....												.....
.....												.....
Summa kronor	11.611:42	13.410:07	3.753:88	6.615:07	2.748:67	1.221:79	4.936:96	1.802:82	1.091:51	757:21	2.095:19	50.044:59

Beräknad kostnad 50.974:59

Båtnad 85.168:90

Skara den 21 november 1952.

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

314/49 komb.

FÖREDRAGET
DEN 19 DEC. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 2282,2494/50

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 23/12 1949

Kontrakt: 2/5 1950

Fullbordas: 1/9 1951

Statsbidrag: 16.950 kronor

Lån: 33.950 kronor

Beräkn. kostnad: 50.974:59 kronor

Verkst. utbet. d. 2 maj 1950 av statsbidrag: 3.500 kr.

av lån: 7.000 kr.

Utfört arbete enligt lantbrukskonsulent E. Almlöf den 4/11 1950

- kr. = c:a ? %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Godsägaren Per Mark, Gammalstorp, Tun.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 5.000 kr.

av lån 10.000 kr.

Stockholm den 19/12 1950

H.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

314/49

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1950
DIARIE Nr U 2282
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Gammalstorps dikningsföretag av år 1948, Tuns socken, Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

beg.

~~Ordf. i styrelsen:~~ Godsägare Per Mark, Gammalstorp, Tun.
Förtroendeman:
~~Enda intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 23/12 1949.

Ändring medgiven den ---

Bidrag från statens avdikningsanslag 16.950:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 33.950:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1955.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till ---

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Erik Almlöf den 2/11 1950, har befunnits att följande avlopp utförts i enlighet med förslaget:

Halvtäckta och täckta avloppet A-B-C-D, heltäckta avloppet C^{I}-C^{II}, heltäckta avloppet L-L^{I}, heltäckta avloppet L-L^{II}, heltäckta avloppet N-189+13, öppna avloppet X-Y, heltäckta avloppet Y-Y^{I}, öppna avloppet d-e-f-g-g^{I}, heltäckta avloppet e-e^{I}-e^{II} samt heltäckta avloppet l-m.

Vid vissa brunnar kompletteras stenfyllning enligt anvisning.

Öppna flödesdiket A-B-C återfylles ytterligare c:a 20 cm.

Mot avsyningsbevis av den 11 febr. 1950 har förut utbetalts 10.500:- kr. x/

Med anledning av ovanstående får undertecknad vördsamt tillstyrka för utbetalning ytterligare ett belopp av 16.000:- kr. av beviljade bidrag och lån.

Skara den 4 november 1950.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Rekv. ej använd!
Erik

x/ Verkliga kostnaden understiger ej den beräknade.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

314/49 Kumb.

D. N:r J 2521/51
AD/EF

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

BESLUT
DEN 22 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: GAMMALSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Tuns socken, Skaraborgs län.

Arb. plan: 23 december 1949

Kontrakt: 2 maj 1950

Fullbordas: 1 september 1951

Statsbidrag: 16.950 kronor

Lån: 33.950 kronor

Beräkn. kostnad: 50.974:59 kronor

Verkst. utbet. d. 2 maj 1950 m.fl. av statsbidrag: 8.500 kr.

av lån: 17.000 kr.

Utfört arbete enligt lantbr.konsulent Erik Almlöf den 18/12 1951

..... kr. = c:a 70 %.

Bidr. $\frac{70}{100} \cdot 16950 = 11860$; $11860 - 8500 = 3360$ ≃ 3 000

Lån $\frac{70}{100} \cdot 33950 = 23760$; $23760 - 17000 = 6760$ ≃ 6500

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Per Mark, bof. Gammalstorp, Tun.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3000 / kr.

av lån 6500 / kr.

Arb.förl. tin 1/952.

Stockholm den 12/1 1952

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

314/49

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1951
DIARIE NR J 2521
SAK NR

över verkställd besiktning

Företag: Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Godsägare Per Mark, Gammalstorp, Tun.
~~Förrättningsman~~
~~Ende intressent~~

BESLUT
DEN 22 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 23/12 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 16.950:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 33.950:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1955. 21/12 55.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1951.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Gunnar Bergström den 7 december 1951, har befunnits att företaget är utfört i sådan omfattning, som motsvarar 70 % av företagets beräknade totala kostnad. Verkliga kostnaden understiger ej den beräknade.

Med anledning av ovanstående får undertecknad vördsamt tillstyrka att ytterligare belopp i den omfattning som Kungl. Lantbruksstyrelsen finner lämpligt utbetalas.

Skara den 18 december 1951.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

FÖREDRAGET
DEN 2 MAJ 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1950
DIARIE Nr J 545
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Gammalstorps dikningsföretag av år 1948, Tun socken, Skaraborgs län
(namn, socken och län)

~~Ordf. i styrelsen:~~
Förtroendeman:
~~Ende intressent:~~ Godsäg. Per Mark, Gammalstorp, Tun

Arbetsplanen fastställd den 23/12 1949

Ändring medgiven den -----

Bidrag från statens avdikningsanslag 16.950:— kronor

Lån från statens avdikningslånefond 33.950:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1951

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -------

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Erik Almlöf

den 11/11 1949, har befunnits att arbete för en kostnad av c:a 10.000:-

kronor (20 % av företaget) utförts.

Skara den 11 februari 1950.

Erik Almlöf.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

311/49

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

J 545/50

MH

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbrukskonsulenten E. Almlöf,

S k a r a.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av kontraktshandlingar o.d. rörande Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken, Skaraborgs län, har befunnits, att Karl A. Andersson, Häljestena, dels gått i borgen för kontraktets fullgörande och dels bevittnat förtroendemannens namnteckning å kontraktet. Med anledning härav återgå de båda kontraktsexemplaren för kompletteringar, varefter desamma hit återförväntas.

Stockholm den 11 april 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Försman.

J 545/50

MH

Remiss.

Lantbrukskonsulenten E. Almlöf,

S k a r a.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av kontraktshandlingar o.d. rörande Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken, Skaraborgs län, har befunnits, att Karl A. Andersson, Häljestena, dels gått i borgen för kontraktets fullgörande och dels bevittnat förtroendemannens namnteckning å kontraktet. Med anledning härav återgå de båda kontraktsexemplaren för kompletter ing, varefter desamma hit återförväntas.

Stockholm den 11 april 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

1950 den 2 maj.

BA

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 23 december 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 33.950 kronor till utförande av Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register nummer	Ägare
Tuns socken		
Gammalstorp	2^{1}	Per Mark
" (Ängstorp) läg.	2^{4}	Elis Karlsson
" (Andreelund) läg.	2^{7}	Folke Andersson
"	2^{12}	Per Mark
Lilla Hofgården	12^{6}	Karl Ramberg
"	12^{7}	Anders Andersson
Nordängen	2^{13}	Lars Olof Lundgren

Stockholm den 2 maj 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

316
49 kmb

SL/BE

Lantbruksingenjörsavdelningen
Skara.

Ang. FRIELSBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Tuns kommun, Skaraborgs län.

Genom beslut den 17 november 1952 har Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat ytterligare lån med 5.910 kr.

1. Med anledning härav översändas för att vederbörande tillställas formulär till skuldförbindelse och rekvisition.

Styrelsen anmodar Eder tillse, att formulären utan onödigt dröjsmål ifyllas samt att de efter erforderlig granskning hit återställas.

Stockholm den 17 december 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Comp

316/49

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1951
DIARIE Nr J 1245
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Frielsbergs dikningsföretag av år 1948
(namn, socken och län)
i Frids p:rn, Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Godsägare Jonas Kjellberg,
~~Förtroendeman~~:
~~Ledamot~~:
Frielsberg, Friel.

BESLUT
DEN 28 SEP. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 23/12 1949 Utför. godk

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.930+170 = 14.100:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 27.640:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 23 juli 1951, har befunnits att företaget var i sin helhet färdigställt enligt fastställd arbetsplan och förordas till godkännande. utförandet

Verkliga kostnaderna för första utförandet ha uppgått till kronor 47.933:41, varav i räntor under arbetstiden 1.335:10 kronor.

ber. kostn. 42.350:66 kr.

Skara den 1 augusti 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STÄMPELMÄRKE TVÅ KRONOR 3/8-51

obs: Fullmakt. 4053/49

1951 den 28 september. 2547.

J 385/50, 1245/51

MP

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

M a r i e s t a d

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 23 december 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 27.640 kronor till utförande av Frielsbergs dikningsföretag av år 1948 i Friels socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ä g a r e
Friels socken.		
Köregården	15^{2}	Jonas F. Kjellberg
"	15^{3}	Densamme
Böckersgården	11^{1}	Densamme
Håkan Verresgården	10^{1}	Densamme
Torbjörn Persgården	1^{5}	Densamme
"	1^{6}	Densamme

Stockholm den 28 september 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

52

Nilsbergs dj 1948. Skaraborgs län.

Styrka

Bodsäjaren Jonas Kjellberg,

Nilsberg, Nicl.

Ej säkerh. f.

~~Skuldf. ej kungjd~~. återvänd med
fast. anv. till kontr.

FÖREDRAGET
DEN 4 APR 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1950
DIARIE Nr
SAK N. J 385

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende styrelseledamot och låntagare i "Frielsbergs dikningsföretag av år 1948" i Friels socken, Skaraborgs län, får härmed vördsamt anmäla, att företaget avstår från utfående av någon del av beviljat bidrag intill dess företaget i sin helhet blivit avsynat och godkänt och likaledes från uppbärande av beviljat lån intill dess beslut enligt 2 § i lagen den 14 juni 1929 om kronans förmånsrätt för avdikningslån meddelats och vunnit laga kraft.

Frielsberg pr Friel den 13 febr. 1950.

Max Gellerd

ej aktuell
redan skuldf. godkänt
numera

Frielsbergs-Skaraborg 9.5.51.
Telefonsamtal med sparbanken:
Sparbanken vill ha bekräftelse på att inget inbrissat medförande att sparbanken ej får pengarna.
S-E W.

ur 66.

BESLUT
DEN 28 SEP. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1949
DIARIE NR J 4053
SAK Nr

FULLMAKT.

I egenskap av ordförande och kassör för Frielsbergs diknings-företag av år 1948 i Friels socken, Åse härad, Slaraborgs län, befullmäktigar jag härmed Åse och Viste härads sparbank i Grästorp att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera av Kungl. Lantbruksstyrelsen beviljade bidrag och lån av statsmedel för diknings-arbetenas utförande., intill ett belopp av Kronor 40.000:--.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grästorp den 28 november 1949.

Att Godsägaren hr Jonas Kjellberg, Frielsbergs Egendom, Friel, egenhändigt underskrivit förestående fullmakt betyga på en gång närvarande vittnen:

bådas adress Grästorp.

41.570 ha
mtt. f. Sparb.
d. 28/9 51 / enl.
nis. juhar:e.

ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK

Telefon 45 Postgiro 14 23 00

GRÄSTORP

FÖREDRAGET
DEN 6 DEC. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1949
DIARIE NR J 4053
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
S T O C K H O L M.

BESLUT
DEN 28 SEP. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

För benäget godkännande och med anhållan att Kungl. Lantbruksstyrelsen i sinom tid behagade överlämna handlingen till Kungl. Statskontoret översända vi härmed en av godsägaren Jonas Kjellberg, Frielsbergs Egendom, Friel, i egenskap av ordförande och kassör för Frielsbergs dikningsföretag av år 1948 i Friels socken, Åse härad, Skaraborgs län, denna dag för oss utfärdad fullmakt, att uppbära och utkvittera de bidrag och lån av statsmedel, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kommer att bevilja angivna dikningsföretag.

Vi äro tacksamma för erkännande härav.

Grästorp den 28 november 1949.

Vördsamt
ÅSE och VISTE HÄRADS SPARBANK

Ans m bilder och lån s 2194/49

SL/BE

Lantbruksingenjören S. Hallin,
Skara.

Ang. FRIELSBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Friels socken, Skaraborgs län.

Med anledning av rekvisition den 13 oktober 1952 av kartor och handlingar rörande företaget översändes härmed dels 1 häfte synehandlingar och 1 häfte betänkande, vilka efter användning torde vidarebefordras till vederbörande intressenter, dels 8 blad ritningar tillhörande Lantbruksstyrelsens arkiv. Kvitto å ritningarna bifogas och återförväntas.

./.

Stockholm den 18 oktober 1952.
Enligt uppdrag

I. B.

I. Berglund

J 2309/52

AD/BE

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 17 november 1952 beviljat ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 5.910 kr till utförande av FRIELSBORGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Tuns kommun, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Friels socken		
Köregården	15^{2}	Jonas F. Kjellberg
-"-	15^{3}	Densamme
Böckersgården	11^{1}	Densamme
Håkan Verresgården	10^{1}	Densamme
Torbjörn Persgården	1^{5}	Densamme
-"- -"-	1^{6}	Densamme

Stockholm den 30 december 1952.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

316
49

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av första rensning

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Frielsbergs dikningsföretag av år 1948"

Kommun	Län
Tun Friels vreken	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXX — XXXXXXXXXX~~

Godsägare Jonas Kjellberg, Frielsberg, F r i e l

Reuen. godk. BESLUT DEN 9 FEB 1954

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
23/12 1949	170:-- till 1:a rensning	LANTBRUKSSTYRELSEN
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad

den 21/8 1953, har befunnits att en första rensning var verkställd, så att avloppen befunno sig i föreskrivet skick.

Skara den 7/12 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ber. till senm. kr. 170:-

Utbet. bidrag kr. 170:-

VH

Ser. E XIII kvmb
2168
LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1949
DIARIE Nr 074
SAK Nr

R 9*1166

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Gammalstorps dikningsföretag av år 1948

i Tuns socken av Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent E.Almlöf.

Statsbidrag: 17.570:- kronor.

Statslån: 33.270:- kronor.

Genom beslut den 23 dec. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 50.974:59 kr., till företaget beviljat bidrag med 16.950:– kr. och lån med 33.950:– kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken, Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1949
DIARIE Nr 074
SAK Nr

~~Ordförande~~ Förtroendeman: Godsägare Per Mark, Gammalstorp, Tun.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29 juni 1946. Förrättningen avslutad den 16 juli 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 9 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1955.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 85.168:90 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 50.974:59 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: **Grävning, läggning och återfyllning 1:10 - 4:- kr/m. Rörpriser kr/m 450 mm 8:13, 375 mm 5:63, 300 mm 4:19, 250 mm 2:75, 225 mm 2:35, 200 mm 2:—, 150 mm 1:67, 125 mm 1:18 100 mm 0:90 och 75 mm 0:58.**

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A – G	11.140	–			471	42	11.611	42		11.611	42
H – O	12.920	–			490	07	13.410	07		13.410	07
P – Q	3.570	–			183	88	3.753	88		3.753	88
R – V	6.285	–			330	07	6.615	07		6.615	07
X – Å	2.590	–			158	67	2.748	67		2.748	67
a – c	1.190	–			31	79	1.221	79		1.221	79
d – g^{I}	4.770	–			166	96	4.936	96		4.936	96
h – i^{II}	1.730	–			72	82	1.802	82		1.802	82
j – j^{I}	1.970	–			51	51	2.021	51		2.021	51
k – m	730	–			27	21	757	21		757	21
n – o	1.920	–			175	19	2.095	19		2.095	19
Summa	48.815	–			2.159	59	50.974	59		50.974	59

Lantbruksstyrelsen har dels medgivit, att företaget må utföras med de ändringar, som angivits
(Forts. se sid 3.)

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
A - G	24	96	2	32	27	28	18.591	20	0	11.611	42	420	1/3	3.870
H - O	25	08	6	95	32	03	19.327	-	0	13.410	07	410	1/3	4.470
P - Q	10	22			10	22	7.252	30	3	3.753	88	360	1/2	1.870
R - V	20	52			20	52	13.017	30	0	6.615	07	320	1/3	2.200
X - Å	9	37			9	37	6.257	60	0	2.748	67	290	1/3	910
a - c	2	16			2	16	1.253	80	0	1.221	79	560	1/3	400
d - g^{I}	11	65	3	60	15	25	6.584	70	2	4.936	96	320	1/3	1.640
h - i^{II}	4	94	1	18	6	12	2.871	90	0	1.802	82	290	1/3	600
j - j^{I}	4	19			4	19	2.031	60	0	2.021	51	480	1/3	670
k - m	1	75			1	75	1.073	-	0	757	21	430	1/3	250
n - o	0	17	9	40	9	57	6.908	50	0	2.095	19	210	1/3	690
Summa	115	01	23	45	138	46	85.168	90		50.974	59			17.570

~~xx~~ Bidraget belöper ~~xxxxxxx~~ sig ..... ~~xx~~. på företagets utförande ~~xxxxxxxxx~~ ..... ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen: kronor	öre	hela samfälligheten: procent	kostnaden för utförandet: kronor	öre	Lånekvot	Lån: kronor
A - G	18.591	20	100.000	11.611	42	2/3	7.740
H - O	19.327	--	"	13.410	07	2/3	8.940
P - Q	7.252	30	"	3.753	88	1/2	1.870
R - V	13.017	30	"	6.615	07	2/3	4.400
X - Å	6.257	60	"	2.748	67	2/3	1.820
a - c	1.253	80	"	1.221	79	2/3	800
d - g^{I}	6.584	70	"	4.936	96	2/3	3.280
h - i^{II}	2.871	90	"	1.802	82	2/3	1.200
j - j^{I}	2.031	60	"	2.021	51	2/3	1.340
k - m	1.073	-	"	757	21	2/3	500
n - o	6.908	50	"	2.095	19	2/3	1.380
Summa	85.168	90		50.974	59		33.270

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av såväl bruknings- som alstingsbåtnad. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av kostnadsfördelningslängden kol. 4 överstiger den totala åkerarealen 10,- ha för två av de sex fastigheter som vinna båtnad av företaget. De ofullständiga jordbruken ingå endast i samfälligheterna P - Q till väsentlig del. De ha där påförts 52.971 % av samfälligheternas totala kostnad. I samfälligheterna R - V ingå de med endast 11.099 % och i samfälligheterna d - g^{I} med 29.049 % av respektive samfälligheters totala kostnad.

Arbetet är till stor del utfört.

Det öppna avlopp i vilket samfälligheterna A - G och P - Q utmynna är tidigare reglerat i samband med laga syneförrättning, Gamlegårdens dikningsföretag av år 1931. Samfälligheterna H - O utmynna i en halvtäckt avloppsledning som likaledes reglerats i samband med laga syneförrättning, Sågkullens dikningsföretag av år 1931. Nämnda dikningsföretag har understötts av statsmedel.

Ingen av de nu föreslagna åtgärderna äro att hänföra till underhåll av de gamla företagen.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatta bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat för utom vad som avser samfälligheterna P - Q där de ofullständiga jordbruken påförts huvudelen av kostnaden. Till denna samfällighet har föreslagits 1/2 av kostnaden i bidrag.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 17.570 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 33.270 kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1 Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2 Protokoll angående bl.a.sökande av statsunderstöd.

" 3 Förening rörande ansökan om lån.

" 4 Fastighetsförteckning.

" 5 Sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

I den slutliga handläggning av detta ärende ha deltagit delegationens samtliga ledamöter, nämligen sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare A.Andersson samt föredraganden lantbrukskonsulent E. Almlöf.

Skara den 18 maj 1949.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

/Elis Enderstein/

/Erik Almlöf/

x) i ett av lantbrukskonsulenten E. Almlöf den 20 november 1952 utfärdat avvägningsbevis på sätt å de fastställda ritningarna markerats med grön beteckning, dels ock minskat statsbidraget från 16.950 kronor till 16.620 kronor och lånet från 33.950 kronor till 33.280 kronor.

Stockholm den 20 januari 1953.

Enligt uppdrag



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 16 juli 1948 avslutad syneförrättning rörande Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 januari 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken av Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Per Mark, Gammalstorp, Elis Karlsson, Ängstorp, Folke Andersson, Andreelund och Lars Lundgren, Nordängen.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Lars Lundgren och Elis Karlsson.

§ 2

Till företagets (styrelse och) förtroendeman valdes godsägare Per Mark, Gammalstorps egendom, Tun, tel. Tun 1.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

1 Per Mark, Gammalstorps egendom
1 Elis Karlsson, lägenheten Gammalstorp 2^{4}
1 Lars Olof Lundgren, Nordängen 2^{13}
1 Folke Andersson, lägenheten Gammalstorp 2^{7}
1 Anders Andersson, L:a Hofgården 12^{7} och
1 Karl Ramberg, L:a Hofgården 12^{6}.

§ 4

Förtroendemannen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras,

- att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat samt

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Gammalstorp den 16 juli 1948

Erik Almlöf

Justeras:

Lars Lundgren

Elis Karlsson

Bilaga 3

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 inom Tuns socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets förtroendeman i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gammalstorp den 16 maj 19 49.

Per Mark. Elis Karlsson.

Folke Andersson

Anders Andersson Karl Ramberg

Bilaga 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter ingående i Gammalstorps dikningsföretag av år 1948 i Tuns socken av Skaraborgs län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Tun socken:

Gammalstorp 2^{1} och 2^{12}	Per Mark
läg.Gammalstorp 2^{4} (Ängstorp)	Elis Karlsson
läg.Gammalstorp 2^{7} (Andreelund)	Folke Andersson
Lilla Hofgården 12^{6}	Karl Ramberg
Lilla Hofgården 12^{7}	Anders Andersson
Nordängen 2^{13}	~~Karl~~ Lars Olof Lundgren ?

Skara den 14 maj.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Gammalstorps dikningsföretag av år 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Tuns socken

Skaraborgs län

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948 juli	16	Ersättning enligt arvodesräkningen i synehandlingarna						2.036	44
		Vattendomstolsavgift						76	40
		Lagakraftbevis				3	50		
		Inbindning av handlingarna				4	--		
		Kartornas uppklistring				20	40		
		Kungörelser i tidningarna				18	85		
						46	75	2.112	84
								46	75
		Summa utgifter						2.159	59

Skara den 14 maj 1949.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247
