KOPIA

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Fuglie-Mellan Grevie
av år 1936"
uti Fuglie och Mellan Grevie socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Claes-Henrik Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Av Henning Hansson påvisade avlopp (förrättningsprotokollets § 12.)

Undersökt punkt A (förrättningsprotokollets § 16.)

Mellan Grevie s:n
Fuglie s:n.

Avlopp för dikningsföretaget Fuglie dikning av år 1930.

Fixpkt +13.98.

Fixpkt +13.04

Fixpkt +13.24

Fixpkt +13.65

Till Mellan Grevie.

Från Fuglie.

Till Fuglie hemman nr. 8.

Avlopp för Dikningsföretaget Fuglie nr 8 av år 1926.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras ex officio
C.H. Wallén
LTN. Nr 001
M 4:0524 1

Nr 456 Malmöhus 4 mtn

KOPIA

DIARIE Nr 14780
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP 1937

Kungl. Lantbruksstyrelsens Registratorsarkiv.

Förslag

till

"Diknings-företaget Fuglie - Mellan Grevie

av år 1936"

uti Fuglie och Mellan Grevie socknar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Claes-Henrik Malm.


Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Blad 2.


Profil- och sektionsritningar.


Östra företaget.

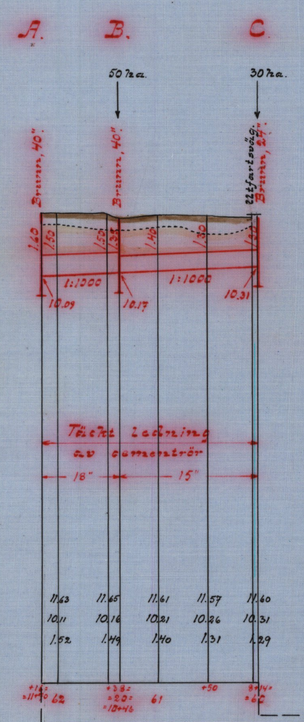

Östra företaget.

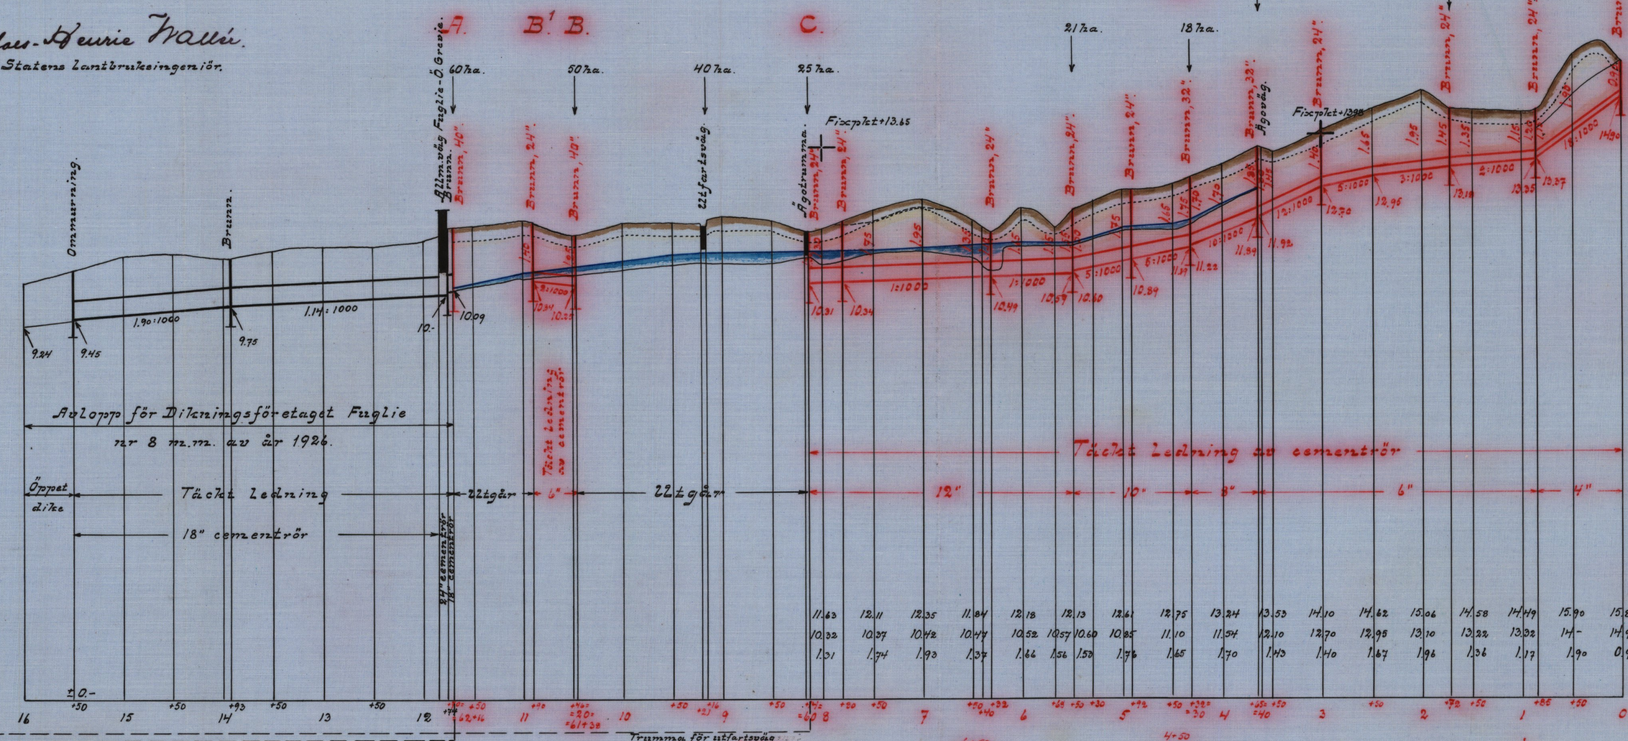



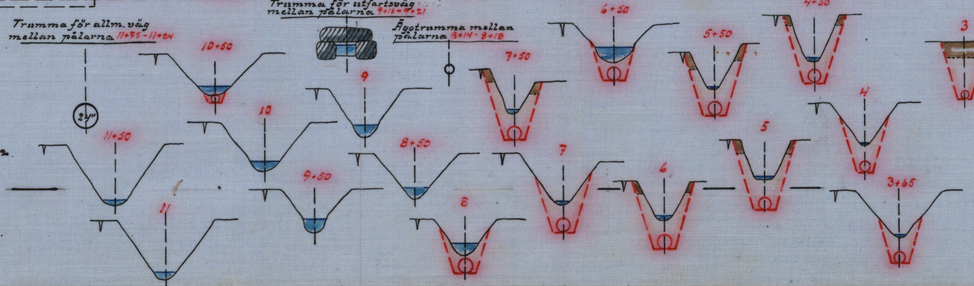

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Vidimeras ex officio:
C.H. Malm.

KTN. Nr 002
M 4×0524 2
Nr 456 Malmöhus 4:rta

KOPIA

DIARIE Nr 14150
K LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1937

Kungl. Lantbruksstyrelsens Dikningsarkiv.

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Fuglie-Mellan Grevie

av år 1936"

uti Fuglie och Mellan Grevie socknar


av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Elon. Henrik Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

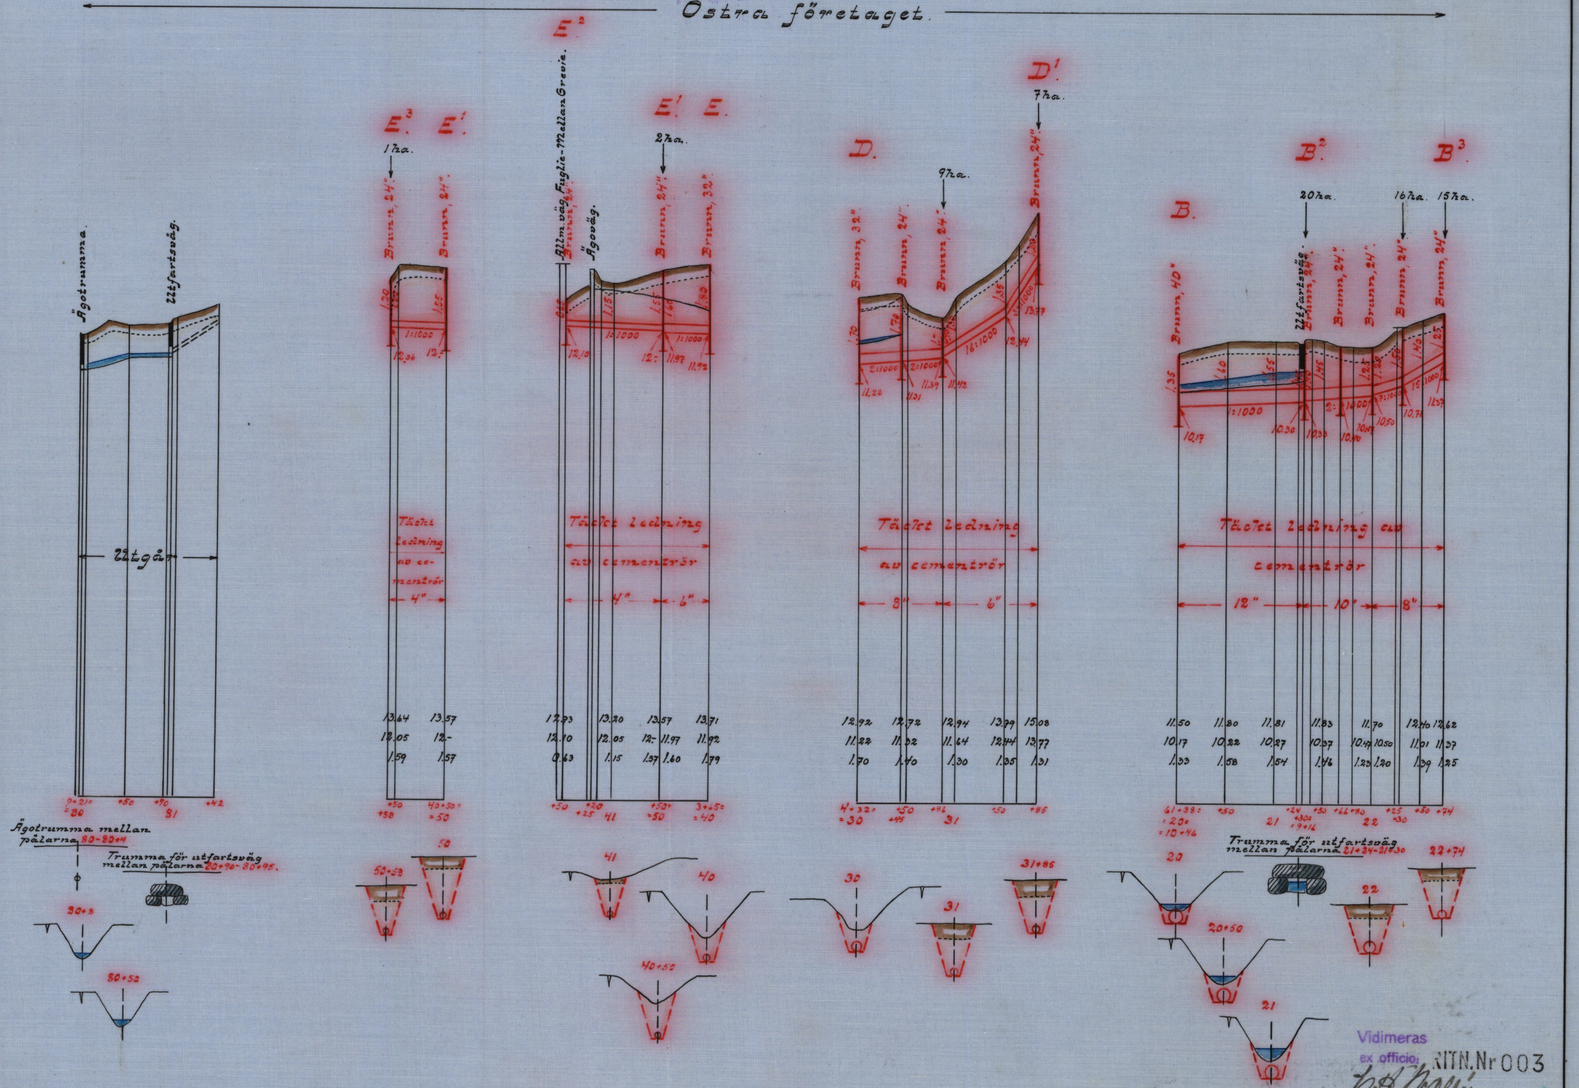

Vidimeras
ex officio
LANTBR. NR 003
E. H. Wallin.

M 4*0524

3

Nr 4:36 Malmöhus 4 prt.

KOPIA

DIARIE NR 14680
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1937

Blad 4.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Fruglie-Mellan Grevie

av år 1936"

uti Fruglie och Mellan Grevie socknar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Claes-Henrik Wallén.


Statens Lantbruksingeniör.


Kungl. Lantbrukstyrelsens Ritningsarkiv.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Västra företaget.

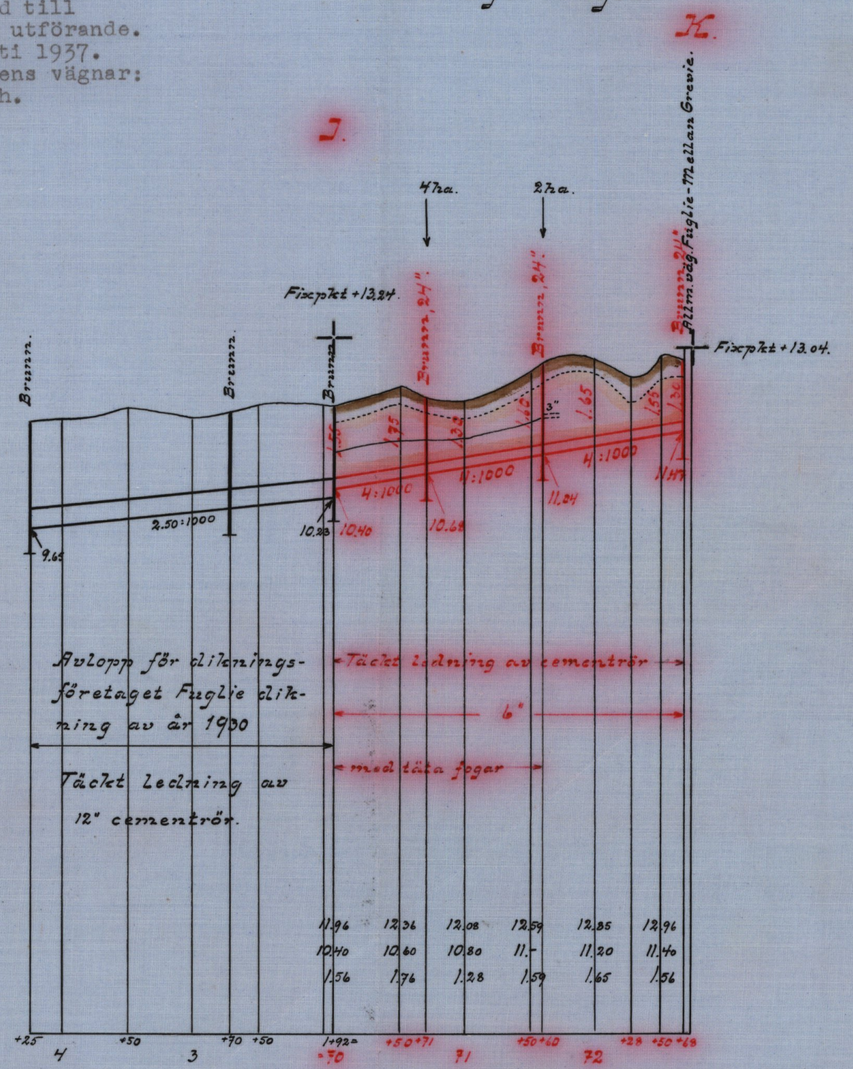

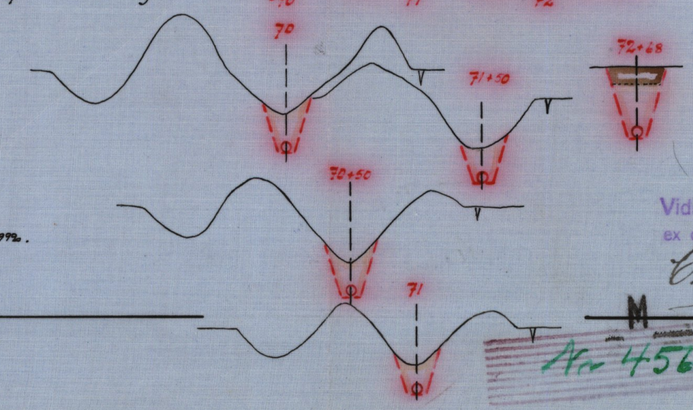

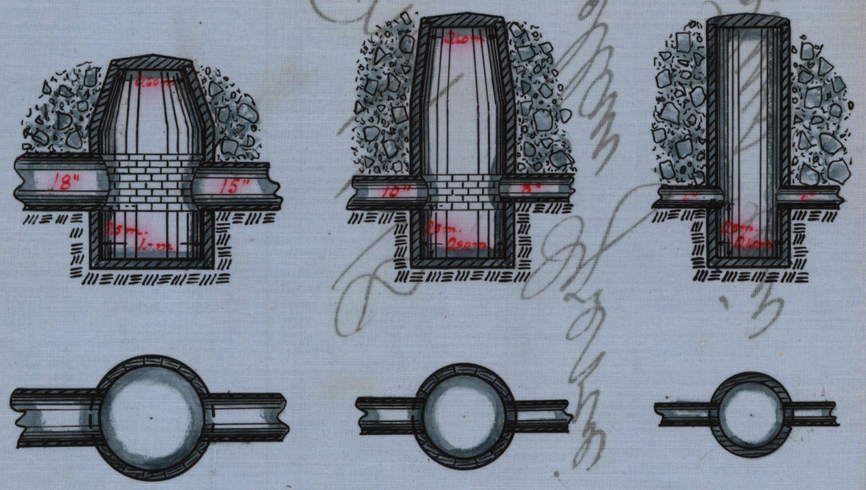

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.

Vidimeras ex officio
RITN.Nr 004
C.H.Wallén
4
M 4*0524
Nr 456 Malmöhus 4:ans

M 4 0524
DIARIE 14780
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP 1937

Avskrift.

Betänkande

till

Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie

av år 1936"

uti Fuglie och Mellan Grevie socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie
av år 1936"
uti Fuglie och Mellan Grevie socknar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, omfattar vissa marker på båda sidor om allmänna vägen Mellan Fuglie och Mellan Grevie kyrkor, belägna omkring 3,- km. sydväst om Östra Grevie järnvägsstation på statsbanelinjen Malmö-Trelleborg. De berörda områdena, vilka till huvudsaklig del utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Avdikningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade

Östra företaget och

Västra företaget

samt omfattande de områden, vilka närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/ i förrättningshandlingarna.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 12 september 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 3 oktober 1936, varefter förrättningen avslutades den 28 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 28 oktober 1936 /förrättningsprotokollets § 21/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare hava därjämte undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de båda företagens utförande samt lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av den Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheten 2/3 mtl. Fuglie 5^{3} har erhållit Domkyrkorådets tillstånd /Bil. V/ att söka och komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av de båda företagen berörda markerna skola kunna än-

damålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för de båda företagen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar i sin helhet 17,82 ha åker samt 0,24 ha äng och odlingsbar jord eller tillsammans 18,06 ha inägojord, fördelade på de olika företagen sålunda:

	Åker.	Ängs- och odlingsmark.	Summa.
Östra företaget	16,08 ha	0,24 ha	16,32 ha
Västra företaget	1,74 "	-	1,74 "
Summa	17,82 ha	0,24 ha	18,06 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Östra företaget	9051,71 kr.
Västra företaget	981,76 "
Summa	10033,47 kr.

Fördelas dessa kostnader på de i respektive företag ingående arealerna belöpa torrläggningskostnaderna per ha till efterstående belopp:

Östra företaget 555,- kr.

Västra företaget 564,- " .

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I och kostnadssammandraget Bil. II i detta betänkande framgår angående de olika företagens ekonomiska utbyte följande:

Östra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	40722,-	kr.
" före "	30138,-	"
Värdeförhöjning	10584,-	"
Kostnad	9051,71	"
Rel. kostnad	0,86	
Bidrag i % av kostnaderna	45,10	.

Västra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	4350,-	kr.
" före "	3306,-	"
Värdeförhöjning	1044,-	"
Kostnad	981,76	"
Rel. kostnad	0,94	
Bidrag i % av kostnaderna	47,90	.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skola de båda företagen vara fullbordade inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för dikningsföretagets avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till utförandet av "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" måtte beviljas såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond med följande belopp:

	Bidrag.	Lån.
Östra företaget	4080,- kr.	4850,- kr.
Västra företaget	470,- "	510,- "
Summa	4550,- kr.	5360,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Domkyrkorådets skrivelse den 13 februari 1937	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 4 blad.	

Malmö i februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och låntagarandel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Östra företaget.			
		Inglie socken.			
2. 3. 4. 5. 2/3	5 3	Inglie ; Lunds Domkyrka, au. Olof Jönsson sterbhus-delåg.: Enkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson	1-11, 14-25	6 60	
			26-46	4 44	
1/2	no 14'	Steglarp ; Edvin Eriksson	12, 13	48	
1. 1/3	5 2	Inglie ; Arvid Svensson	47-54	80	14
			55-77	2 92	10
		Mellan Gerne socken.			
6. 7/45	1 5	Mellan Gerne ; Per Larsson	78-80	13	
6. 1/90	1 7	Do ; Dens.	81-86	36	
6. 14/45	1 4	Do ; Dens.	87-92	35	
		Summa		16 08	24
		Relativ kostnad 0.86.			
		Bidrag i % av kostnaderna 45.10.			
		Västra företaget.			
		Inglie socken.			
1. 1/8	no 6 2	Inglie ; Arvid Svensson	93, 94	1 15	
1. 1/8	6 4	Do ; Dens.	95	59	
		Summa		1 74	
		Relativ kostnad 0.94.			
		Bidrag i % av kostnaderna 47.90.			
		Summa för hela företaget		17 82	24

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4196 -								—	
2879 -		521	634	369	86	92	61	9	98	5688	79	2565	64	3123	15	
272 -		197	24	13	95	3	49	-	38	215	06	96	99	—	-	Söker ej lån.
737 -				—												
2061 -		247	727	175	66	43	98	4	74	2701	65	1218	45	1483	20	
69 -		64	31	4	53	1	14	-	12	70	10	31	62	38	48	
177 -		164	96	11	71	2	93	-	32	179	92	81	14	98	78	
193 -		179	88	12	77	3	20	-	34	196	19	88	48	107	71	
10584 -		8300 -		588	48	147	35	15	88	9051	71	4089	32	4851	32	
690 -		594	81	43	22	10	82			648	85	310	80	338	05	
354 -		305	19	22	17	5	55			332	91	159	46	173	45	
1044 -		900 -		65	39	16	37			981	76	470	26	511	50	
11628 -		9100 -		653	87	163	72	15	88	10033	47	4559	58	5362	82	

Malmö i februari 1937.

C. A. Walfer

Statens kanalbyggnadsingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader:

Östra företaget.

Dikningskostnader		8300.- kr.	
Förrättningskostnader;			
Syneförrättning	588.48 kr.		
Betänkande	147.35 "		
Domstolsavgift	15.88 "	751.71 "	9051.71 kr.

Västra företaget.

Dikningskostnader		900.- kr.	
Förrättningskostnader;			
Syneförrättning	65.39 kr.		
Betänkande	16.37 "	81.76 "	981.76 "
		Summa kostnader	10033.47 kr.

Malmö i februari 1937.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.033 kronor 47 öre, varav å lantägarnas andel 9.818 kronor 94 öre.

Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26 per Håslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hilding Jönsson, Fuglie nr 5 per Östra Grevie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fuglie den 28 oktober 1936.

1. Arvid Svensson

2. Hilding Jönsson

Att Arvid Svensson och Hilding Jönsson egenhändigt undertecknat föreståend förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

3. Sofia Jönsson 4. Joh.Emil Jönsson 5. Agnes Jönsson

Lantbr., Ö. Kattarp 5

Att Sofia Jönsson, Joh. Emil Jönsson och Agnes Jönsson egenhändigt skrivit sina namn intyga:

Gunnar Nilsson Ida Nilsson

Lantbr., Ö. Kattarp, Kvarnby. Fru, Ö. Kattarp, Kvarnby.

6. Per Hansson.

Att Per Hansson egenhändigt skrivit sin namnteckning intygas:

Axel Håkansson Anna-Greta Rasmusson

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-företaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" uti Fuglie och Mellan Grevie socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel. Stämpel.

Bil. V.

DOMKYRKORÅDET
LUND.

Till Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

Sedan arrendatorn av Lunds Domkyrka tillhöriga hemmanet 2/3 mantal Fuglie 5^{3} i Fuglie socken, Olof Jönssons sterbhus, jämte övriga delägare i "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" undertecknat förening för sökande av bidrag och lån av statsmedel får Domkyrkorådet i Lund härigenom meddela, att Rådet för sin del medgiver Olof Jönssons sterbhus att söka och komma i åtnjutande av ifrågavarande medel till bestridande av de kostnader, som för företagets utförande komma att belöpa å Lunds Domkyrkas ovannämnda hemman Fuglie 5^{3}. Lund den 13 februari 1937.

Å Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Yngve Briliot.

/ A. Neuman.

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Fuglie socken.

1/3	mtl.	Fuglie	$5\frac{2}{}$	;	Arvid Svensson,
1/8	"	"	av $6\frac{2}{}$	;	Dens.,
1/8	"	"	$6\frac{4}{}$	;	Dens.,
2/3	"	"	$5\frac{3}{}$	;	Lunds Domkyrka; arr. Olof Jönssons sterbhusdeläg.: Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson.

Mellan Grevie socken.

14/45	mtl.	Mellan Grevie	$1\frac{4}{}$	;	Per Hansson,
7/45	"	"	" $1\frac{5}{}$	;	Dens.,
1/90	"	"	" $1\frac{7}{}$	;	Dens.

Malmö i februari 1937.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1-13 riktig.

Ex officio:

C.H. Wallér.

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Ingelstad-Mellan Grevie av år 1936"
inom Ingelstad och Mellan Grevie socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synehandlingarna ~~à~~	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2 + 5 × 0.50 + 0.40 + 2) ~~à~~	6	90
Upprättande av ansökningshandlingar jämte ~~m. m.~~ särskild utredning till Domkyrkorådet dagar 3/4 "	9	—
Kopia av plankartan å väv (38.79 - 2.31)	36	48
" " profiler och sektioner } 0.75 (33.65 + 9)	31	99
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (80 + 5 + 12) · 0.55	53	35
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkande	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	163	72

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 1 mars 1937.

C. H. Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kvitteras per postförskott.
C. H. Wallén.

PETTERSONSKA BOKTR. LTD
356933

M 4*0524
DIARIE NR 14780
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1937

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fuglie-Mellan Grevie

av år 1936"

uti Fuglie och Mellan Grevie socknar


av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Fuglie-Mellan Grevie
av år 1936"
uti Fuglie och Mellan Grevie socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.

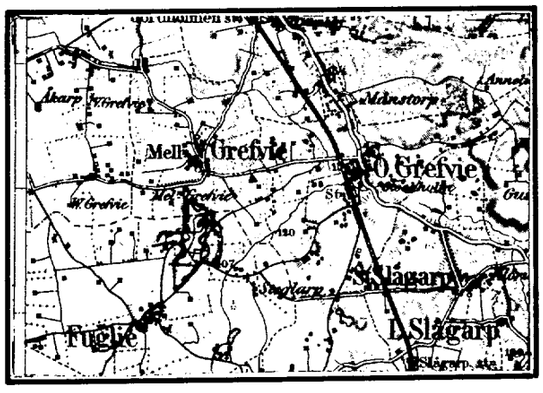

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län.

År 1936 den 3 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Petter G. Göransson, Fuglie, och August Persson, Bodarp, båda med postadress Håslöv, hos lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 12 sistlidne september översänt till pastorsämbetena i Fuglie och Mellan Grevie församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 20 september respektive söndagen den 13 september 1936 /Bil. n:ris 2 och 3/. Då förrättningen torde beröra marker under den Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheten Fuglie nr 5 /2/3 mtl. $5^{3}/_{4}$, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 12 september 1936 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 14 september 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 15 september 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Arvid Svensson, Fuglie nr 26, äg. 1/3 mtl. Fuglie 5^{2}, 1/8 mtl. av Fuglie 6^{2}, 1/8 mtl. Fuglie 6^{4}, en från Fuglie nr 6 avsöndrad lägenhet kallad Fuglie litt. D, 11/84 mtl. Fuglie 26^{2} samt 5/48 mtl. Fuglie 26^{3}, allt uti Fuglie socken;

Lantbr. Edvin Eriksson, Fuglie nr 4, äg. 1/2 mtl. av Steglarp 14^{1} uti Fuglie socken samt arr. Lunds Domkyrka tillhöriga 1/2 mtl. av Fuglie 4^{1}.

Av övriga sakägare:

Domkyrkorådet i Lund förande talan för Lunds Domkyrka tillhöriga 2/3 mtl. Fuglie 5^{3} och 1/2 mtl. av Fuglie 4^{1} allt uti Fuglie socken genom domkyrkokamreraren E. Grönquist enl. fullmakt /Bil. nr 5/;

Olof Jönssons sterbhusdelägare /änkan Sofie Jönsson, sönerna Hilding Jönsson och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson/, Fuglie nr 5, arr. Lunds Domkyrka tillhöriga 2/3 mtl. Fuglie 5^{3} uti Fuglie socken genom Hilding Jönsson enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Lantbr. Hans Mattsson, Östra Grevie, äg. 1/2 mtl. av Steglarp 14^{1} uti Fuglie socken.

Lantbr. Per Hansson, Mellan Grevie nr 1, äg. 14/45 mtl. Mellan Grevie 1^{4}, 7/45 mtl. Mellan Grevie 1^{5} och 1/90 mtl. Mellan Grevie 1^{7} allt uti Mellan Grevie socken genom lantbrukaren Henning Hansson, Mellan Grevie nr 3 enl. fullmakt /Bil. nr 7/;

Skytts härads vägstyrelse gn sin v. ordförande, lantbrukaren Olof Nilsson i Håslöv;

Lantbr. Johan Larsson, Fuglie nr 8, förande talan för "Dikningsföretaget Fuglie nr 8 av år 1926".

Förenämnde lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26, förande talan för dikningsföretaget "Fuglie dikning av år 1930".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, även-som profilritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och av-vägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Lantbrukare Arvid Svensson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning, som erfordrades för torrläggning av hans marker. De marker, vars torr-

läggning nu avsåges, delades av allmänna vägen från Fuglie till Mellan Grevie i ett västligt och ett östligt område. För torrläggning av det västra området yrkade Svensson, att dikessträckan 70 - 72+68 skulle upptagas från brunnen för dikningsföretaget "Fuglie dikning av år 1930" vid påle 70 till allmänna vägen Fuglie - Mellan Grevie vid påle 72+68. Det nya avloppet borde å sträckan 70 - 71+60 förläggas till det nuvarande diket norr om den i rågången mellan fastigheterna Fuglie 6^{3} och Fuglie 6^{4} befintliga pilvallen. För att förhindra, att pilrötterna växte in i och möjligen täppte ledningen, borde det nya avloppet utföras av cementrör med muff, vilka sammanfogades med cementbruk.

För torrläggning av sina till det östra området hörande marker yrkade Svensson, att dikessträckorna 4+32 - 0, 4+32 = 30 - 31+85, 3+65 = = 40 - 41+50 och 40+50 = 50 - 50+58 skulle upptagas samt utföras såsom täckta ledningar av cementrör. Nedströms påle 4+32 borde vidare det nuvarande avloppet fördjupas och utvidgas i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall från hans marker.

§ 6.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företagets genomförande i den omfattning, som Svensson påyrkat, nödvändiggjorde fördjupning och utvidgning av det nuvarande avloppet genom Lunds Domkyrka tillhöriga Fuglie 5^{3}, yrkade domkyrkokamrer E. Grönquist, att det nya avloppet skulle utföras som täckt ledning i den omfattning, detsamma berörde domkyrkans jord.

§ 7.

Meddelades, att synegången omedelbart skulle företagas. Av sakägarne under synegången samt efter återkomsten till sammanträdeslока-

len gjorda yrkanden och uttalanden antecknas här nedan.

§ 8.

Arvid Svensson och Hilding Jönsson, den senare med instämmande av domkyrkokamrer Grönquist, förklarade, att de skulle rothugga och borttaga de piltråd, som växte utmed rågången i sträckorna 4+32 - 3+65 och 3+65 = 40 - 41+50.

§ 9.

Det ansågs lämpligt, att den nuvarande dikessträckan 8+14 - 11+70 helt slopades som huvudavlopp, samt att nytt huvudavlopp upptoges i sträckningen 8+14 = 60 - 62+16 = 11+70.

§ 10.

Edvin Eriksson yrkade, att i företaget skulle ingå utförandet av dikessträckan 61+38 = 20 - 22+74.

§ 11.

Hilding Jönsson yrkade, att i företaget skulle ingå jämväl dikessträckan 10+46 = 61+38 = 20 - 10+90.

§ 12.

Henning Hansson ombud för sin fader Per Hansson, yrkade, att inga som helst kostnader för företagets genomförande måtte påföras fastigheten Mellan Grevie nr 1. Denna fastighet vore nämligen redan nu avdikad norr och väster ut över egna marker genom avlopp, vilka, sedan desamma av Hansson utvisats på marken, inritades på plankartan. Hansson förklarade vidare, att av de påvisade dikena det som ginge från söder till norr utförts av 4" tegelrör, samt att det som ginge från öster till väster utförts av 10" cementrör.

§ 13.

Herr Olof Nilsson förklarade, att han såsom ombud för Skytts härads vägstyrelse intet hade att invända mot det planerade dikningsföretagets utförande, därest inga kostnader för detsamma tillskyndades vägdistriktet. Liknande förklaring hade herr Johan Larsson beträffande "Dikningsföretaget Fuglie nr 8 m.m. av år 1926".

§ 14.

Överlämnades till Arvid Svensson ett häfte handlingar med däri inbundna ritningar för dikningsföretaget "Fuglie dikning av år 1930" samt 1 häfte handlingar och 2 st. ritningar till "Dikningsföretaget Fuglie nr 8 m.m. av år 1926". Sistnämnda handlingar och ritningar skulle av Svensson tillställas Johan Larsson, Fuglie nr 8.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26, onsdagen den 28 oktober 1936 kl. 3 e.m.

Fuglie den 3 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

P.G. Göransson Aug. Persson

Gode män.

År 1936 den 28 oktober inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26 för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommitt:

Lantbr. Arvid Svensson, Fuglie nr 26,

Lantbr. Edvin Eriksson, Fuglie nr 4,

Domkyrkorådet i Lund gn domkyrkokamreraren E. Grönquist enl. fullmakt /Bil. nr 5/,

Olof Jönssons sterbhusdelägare gn Hilding Jönsson enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

§ 16.

Till protokollet skulle följande antecknas:

Sedan sammanträdet den 3 oktober avslutats, begåvo sig synemännen åtföljda av lantbrukarne Henning Hansson och Arvid Svensson till fastigheten Mellan Grevie 1 6 för att närmare undersöka de av Hansson omnämnda och på marken påvisade dikena /se förrättningsprotokollets § 12/. Vid en av Hansson påvisad punkt, å plankartan betecknad med a samt belägen 32 m. öster om allmänna vägen Fuglie - Mellan Grevie och 25 m. norr om gränsen mellan Fuglie och Mellan Grevie socknar, uppgrävdes och blottades ett täckt dike, vilket befanns utfört av på 0,90 m. djup liggande 1" tegelrör. Diket hade lutning söder ut och efter närmare undersökning påträffades också dess öga i gränsdiket mellan Fuglie och Mellan Grevie socknar. Efter enskild överläggning beslöto synemännen, att de å plankartan med 78-86 betecknade ägofigurerna skulle medtagas såsom betalningsskyldiga till det planerade dikningsföretaget, dels enär de hade sin naturliga lutning söder ut, dels enär de tydligen

ej såsom Hansson påstått avdikats norr ut. Beträffande åter den håla, som omfattade och begränsades av ägofigurerna 87-92, ansågo synemännen möjligt,att densamma avdikats norr ut. Oaktat de ansågo det för jordägaren förmånligast att avdika även hålan söder ut, skulle densamma därför ej medtagas till förevarande företag, däreat jordägaren ej uttalade särskild önskan att få avdika densamma söder ut till det nya avlopp, som sedermera komme att utföras. Beslutet meddelades Henning Hansson, som därom skulle underrätta sin fader, Per Hansson. I anledning av synemännens omnämnda beslut, hade Per Hansson vid telefonsamtal med förrättningsmannen måndagen den 5 oktober meddelat, att han önskade beredas möjlighet att avdika hålan söder ut.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 18.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 19.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 20.

Överlämnades till lantbrukaren Arvid Svensson ett exemplar av arvo-

desräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26 per Håslöv att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 22.

Sedan närvarande sakägare inom "Östra företaget" förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Arvid Svensson, Fuglie nr 26 per Håslöv, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt Hilding Jönsson, Fuglie nr 5 per Östra Grevie.

§ 23.

Meddelades, att vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skulle enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande förvaras av styrelsen för "Östra företaget" genom dess ordförande och alltså nu inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26 per Håslöv för att av honom hållas tillgängliga för sakägarne.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

P.G. Göransson Aug. Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie socken av Malmöhus län.

Fuglie den 15 maj 1936.

Arvid Svensson Edvin Eriksson

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 september 1936.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26, lördagen den 3 oktober 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen be-

fullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fuglie n:ris 4, 5 och 6 samt Steglarp nr 14 uti Fuglie socken ävensom Mellan Grevie nr 1 uti Mellan Grevie socken, dels allm. vägen Fuglie - Östra Grevie inom Skytts härads väghållningsdistrikt, dels dikningsföretagen "Torrläggning av mark till Fuglie nr 8 m.fl. hemman av år 1926" och "Fuglie dikning av år 1930".

Malmö den 12 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 september 1936 för Fuglie församling i Fuglie kyrka betygar:

Karl Ekberg

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26, lördagen den 3 oktober 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde berörs dels marker tillhörande Fuglie n:ris 4, 5 och 6 samt Steglarp nr 14 uti Fuglie socken ävensom Mellan

Grevie nr 1 uti Mellan Grevie socken, dels allm. vägen Fuglie - Östra Grevie inom Skytts härads väghållningsdistrikt, dels dikningsföretagen "Torrläggning av mark till Fuglie nr 8 m.fl. hemman av år 1926" och "Fuglie dikning av år 1930".

Malmö den 12 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 13 september 1936 för Mellan Grevie församling i Mellan Grevie kyrka betygar:

B. Gynnerstedt.

komminister.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie och Mellan Grevie socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Fuglie församling, /kungörelse/,	Vellinge	12/9 1936
Pastorsämbetet i Mellan Grevie församling, /kungörelse/,	Jordholmen	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Petter G. Göransson, /god man/, Fuglie,	Häslöv	" "
Lantbr. Aug. Persson, /god man/, Bodarp,	"	" "

1.	2.	3.
Domkyrkorådet i Lund	Lund	15/9 1936
Lantbr. Arvid Svensson, Fuglie nr 26,	Håslöv	" "
Lantbr. Per Hansson, Fuglie nr 4,	"	" "
Lantbr. Olof Jönssons sterbhus, Fuglie nr 5,	Ö. Grevie	" "
Lantbr. Edvin Eriksson, Fuglie nr 4,	Ö. Grevie	" "
f. lantbr. Hans Mattsson,	Ö. Grevie	" "
Arr. Axel Bengtsson, Steglarp nr 14,	Ö. Grevie	" "
Lantbr. Per Hansson, Mellan Grevie nr 1,	Jordholmen	" "
Lantbr. Johan Larsson, sysslomam för dikningsföretaget Fuglie nr 8, Fuglie nr 8,	Håslöv	" "
Ordf. i Skytts härads vägstyrelse, Landstingsman Olof Bengtsson, Stamhem,	Anderslöv	" "
Lantbr. Arvid Svensson, sysslomam för dikningsföretaget Fuglie dikning av år 1930, Fuglie nr 26,	Håslöv	" "

Malmö den 15 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

DOMKYRKORÅDET
LUND.

Resolution.

Herr Domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom Domkyrkorådets ombud närvara vid i inneliggande handling omförmälda förrättning. Lund den 16 september 1936.

För Domkyrkorådet i Lund:

Yngve Brilioth

/ A. Neuman

Bil. nr 6.

Fullmakt.

I egenskap av sterbhusdelägare efter avlidne lantbrukaren Olof Jönsson, Fuglie nr 5, befullmäktiga vi sterbhusdelägaren Hilding Jönsson, Fuglie, att vid sammanträde den 3 oktober 1936 för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 5 vår talan föra som härmed erkännes.

Fuglie och Ö. Kattarp den 3 oktober 1936.

Sofia Jönsson Agnes Jönsson Joh. Emil Jönsson

Bevittnas:

Lars Larsson Gustav Andersson

Fuglie nr 5.

Joh. Emil Jönssons namnteckning bevittnas av:

Nils Liljedahl Kalle Olsson

Ö. Kattarp Ö. Kattarp.

Bil. nr 7.

Fullmakt för lantbrukare Henning Hansson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie och Mellan Grevie socknar hos lantbrukare Arvid Svensson, Fuglie, den 3 oktober 1936 kl. 10 f.m. bevaka min rätt

och håller jag för gilt allt vad mitt ombud i denna sak lagligen gör och låter.

Mellan Grevie den 30 september 1936.

Per Hansson.

Bevittnas;

Anna-Greta Rasmusson, Erik Jonsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Östra företaget.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fuglie socken.					**Avdelning I.**
Fuglie	5 3		2/3		Lunds Domkyrka, arr. Olof Jönssons sterbhusdelåg.: änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson.
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o högländ
				10	D:o m.p.lättlera
				11	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
Steglarp	av 14 1		1/2		Edvin Eriksson.
				12	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							1800	198	-	2500	275	-	700	77	-
1	03							2200	2266	-	2500	2575	-	300	309	-
	76							1800	1368	-	2500	1900	-	700	532	-
	17							1500	255	-	2500	425	-	1000	170	-
	26							1500	390	-	2500	650	-	1000	260	-
	30							1800	540	-	2500	750	-	700	210	-
	75							1800	1350	-	2500	1875	-	700	525	-
	25							2200	550	-	2500	625	-	300	75	-
							34									
	11							1800	198	-	2500	275	-	700	77	-
	04							2200	88	-	2500	100	-	300	12	-
3	78						34		7203	-		9450	-		2247	-
	16							2200	352	-	2500	400	-	300	48	-
	16								352	-		400	-		48	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				13	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Fuglie	5 3		2/3		Lunds Domkyrka, arr. Olof Jönssons sterbhusdelåg.: Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding ohh Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson.
				14	Åker, m.p.lättlera
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16								352	-		400	-		48	-
	32							1800	576	-	2500	800	-	700	224	-
	48								928	-		1200	-		272	-
	02							2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
	56							1800	1008	-	2500	1400	-	700	392	-
	15							1600	240	-	2500	375	-	900	135	-
	01							1600	16	-	2500	25	-	900	9	-
	13							1800	234	-	2500	325	-	700	91	-
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
	65							1500	975	-	2500	1625	-	1000	650	-
	26							1800	468	-	2500	650	-	700	182	-
	18							2200	396	-	2500	450	-	300	54	-
	19							2200	418	-	2500	475	-	300	57	-
	18							2200	396	-	2500	450	-	300	54	-
	43							1800	774	-	2500	1075	-	700	301	-
2	82								5101	-		7050	-		1949	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning III.
Fuglie	5 3		2/3		Lunds Domkyrka,
					arr. Olof Jönssons sterbhusdelåg.:
					Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt
					dottern Agnes Jönsson.
				26	Åker, m.p.lättlera
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							2200	572	-	2500	650	-	300	78	-
	25							1800	450	-	2500	625	-	700	175	-
	18							1500	270	-	2500	450	-	1000	180	-
	44							1500	660	-	2500	1100	-	1000	440	-
	32							1800	576	-	2500	800	-	700	224	-
	24							2200	528	-	2500	600	-	300	72	-
	31							2200	682	-	2500	775	-	300	93	-
	14							1800	252	-	2500	350	-	700	98	-
	36							2200	792	-	2500	900	-	300	108	-
	32							1800	576	-	2500	800	-	700	224	-
	12							1500	180	-	2500	300	-	1000	120	-
	07							1500	105	-	2500	175	-	1000	70	-
	27							1500	405	-	2500	675	-	1000	270	-
	25							1800	450	-	2500	625	-	700	175	-
	26							2200	572	-	2500	650	-	300	78	-
3	79								7070	-		9475	-		2405	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				41	Åker, m.p.lättlera
				42	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Fuglie	5^{3}		2/3		**Lunds Domkyrka,**
					arr. Olof Jönssons sterbhusdeläg.:
					Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hil-
					ding Jönsson och Johan Emil Jönsson
					samt dottern Agnes Jönsson.
				43	Åker, m.p.lättlera
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
					Summa
Fuglie	5^{2}		1/3		**Arvid Svensson.**
				47	Åker, m.p.lättlera
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	Äng, odlingsbar, m.p.lättlera
				51	D:o d:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	79								7070	-		9475	-		2405	-
	20							1800	360	-	2500	500	-	700	140	-
	05							1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
4	04								7505	-		10100	-		2595	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	05							2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
	12							1500	180	-	2500	300	-	1000	120	-
	20							1800	360	-	2500	500	-	700	140	-
	40								716	-		1000	-		284	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	17							1800	306	-	2500	425	-	700	119	-
	10							1500	150	-	2500	250	-	1000	100	-
			05					1000	50	-	~~2500~~ 2300	115	-	1300	65	-
			09					1000	90	-	~~2500~~ 2300	207	-	1300	117	-
	37		14						816	-		1247	-		431	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				52	Åker, m.p.lättlera
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
					Summa
					Avdelning V.
Fuglie	5 2		1/3		Arvid Svensson.
				55	Åker, m.p.lättlera
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	Tomt och trädgård
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	Äng
				66	Åker, m.p.lättlera
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37		14						816	-		1247	-		431	-
	15							1500	225	-	2500	375	-	1000	150	-
	18							1800	324	-	2500	450	-	700	126	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	80		14						1585	-		2322	-		737	-
	15							1500	225	-	2500	375	-	1000	150	-
	30							1800	540	-	2500	750	-	700	210	-
	14							2200	308	-	2500	350	-	300	42	-
	45							1800	810	-	2500	1125	-	700	315	-
	19							1600	304	-	2500	475	-	900	171	-
	07							1500	105	-	2500	175	-	1000	70	-
	03							1800	54	-	2500	75	-	700	21	-
	11							1800	198	-	2500	275	-	700	77	-
	07							1800	126	-	2500	175	-	700	49	-
	04							1800	72	-	2500	100	-	700	28	-
			10					1000	100	-	~~2500~~ 2000	200	-	1000	100	-
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
1	61		10						2974	-		4225	-		1251	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning VI.
Fuglie	2/5		1/3		**Arvid Svensson.**
				67	Åker, m.p.lättlera
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
					Summa
Mellan Grevie s:n.					
Mellan Grevie	1/5		7/45		**Per Hansson.**
				78	Åker, m.p.lättlera
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							2200	462	-	2500	525	-	300	63	-
	08							1800	144	-	2500	200	-	700	56	-
	08							1700	136	-	2500	200	-	800	64	-
	10							1300	130	-	2500	250	-	1200	120	-
	08							1300	104	-	2500	200	-	1200	96	-
	10							1700	170	-	2500	250	-	800	80	-
	11							1800	198	-	2500	275	-	700	77	-
	28							2200	616	-	2500	700	-	300	84	-
	14							2200	308	-	2500	350	-	300	42	-
	07							1700	119	-	2500	175	-	800	56	-
	06							1300	78	-	2500	150	-	1200	72	-
1	31								2465	-		3275	-		810	-
	02							1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
	04							1800	72	-	2500	100	-	700	28	-
	07							2200	154	-	2500	175	-	300	21	-
	13								256	-		325	-		69	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mellan Grevie	1 7		1/90		Per Hansson.
				81	Åker, m.p.lättlera
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
					Summa
	4		14		
Mellan Grevie	1 4		14/45		Per Hansson.
				87	Åker, m.p.lättlera
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							2200	198	-	2500	225	-	300	27	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	09							1800	162	-	2500	225	-	700	63	-
	01							1800	18	-	2500	25	-	700	7	-
	02							1800	36	-	2500	50	-	700	14	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	36								723	-		900	-		177	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	02							1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
	08							1800	144	-	2500	200	-	700	56	-
	02							1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
	07							1800	126	-	2500	175	-	700	49	-
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
	35								682	-		875	-		193	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Fuglie socken.					**Avdelning I.**
Fuglie	5 3		2/3	1-11	Lunds Domkyrka, arr. Olof Jönssons sterbhusdelåg.: Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Steglarp	av 14 1		1/2	12,13	Edvin Eriksson
Fuglie	5 3		2/3	14-25	Lunds Domkyrka, arr. Olof Jönssons sterbhusdelåg.: Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson
					Summa för avdelning II
					Avdelning III.
Fuglie	5 3		2/3	26-42	Lunds Domkyrka, arr. Olof Jönssons sterbhusdelåg.: Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson
					Summa för avdelning III
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr, ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	78						34		7203	-		9450	-		2247	-
3	78						34		7203	-		9450	-		2247	-
	48								928	-		1200	-		272	-
2	82								5101	-		7050	-		1949	-
3	30								6029	-		8250	-		2221	-
4	01								7505	-		10100	-		2595	-
4	01								7505	-		10100	-		2595	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning IV.
Fuglie	5 3		2/3	43-46	Lunds Domkyrka,
					arr. Olof Jönssons sterbhusdeläg.: Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson
Fuglie	5 2		1/3	47-54	Arvid Svensson
					Summa för avdelning IV
					Avdelning V.
Fuglie	5 2		1/3	55-66	Arvid Svensson
					Summa för avdelning V
					Avdelning VI.
Fuglie	5 2		1/3	67-77	Arvid Svensson
Mellan Grevie s:n.					
Mellan Grevie	1 5		7/45	78-80	Per Hansson
B:o	1 7		1/90	81-86	Dens.
D:o	1 4		14/45	87-92	Dens.
					Summa för avdelning VI
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								716	-		1000	-		284	-
	80		14						1585	-		2322	-		737	-
1	20		14						2301	-		3322	-		1021	-
1	61		10						2974	-		4225	-		1251	-
1	61		10						2974	-		4225	-		1251	-
1	31								2465	-		3275	-		810	-
	13								256	-		325	-		69	-
	36								723	-		900	-		177	-
	35								682	-		875	-		193	-
2	15								4126	-		5375	-		1249	-
16	08		24				34		30138	-		40722	-		10584	-

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			P.G.		Göransson Aug. Persson Gode män.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Västra företaget.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fuglie socken.					
Fuglie	av 6^{2}		1/8		**Arvid Svensson.**
				93	Åker, m.p.lättlera
				94	D:o d:o
					Summa
Fuglie	6^{4}		1/8		**Arvid Svensson.**
				95	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					Sammandrag.
Fuglie socken.					
Fuglie	av 6^{2}		1/8	93,94	Arvid Svensson
D:o	6^{4}		1/8	95	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75							1900	1425 -		2500	1875 -		600	450 -	
	40							1900	760 -		2500	1000 -		600	240 -	
1	15								2185 -			2875 -			690 -	
	59							1900	1121 -		2500	1475 -		600	354 -	
	59								1121 -			1475 -			354 -	
1	15								2185 -			2875 -			690 -	
	59								1121 -			1475 -			354 -	
1	74								3306 -			4350 -			1044 -	

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

P.G. Göransson Aug. Persson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. I Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		"Östra företaget".								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
11+70=62+16-61+38=10+46=20	78	**Inköp** av 18" cementrör m.	78	4,50	351	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	78	2,75	214	50	565	50		
Tills.	78	**meter.**								
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 11+70=62+16 och 61+38=10+46=20 st.	2	100,-			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					84	50	850	-
		Dikessträckan B-C.								
61+38=10+46=20-60=8+14	138	**Inköp** av 15" cementrör m.	138	3,50	483	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	138	2,25	310	50	793	50		
Tills.	138	**meter.**								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 60=8+14 st.	1	40,-			40	-		
		Överföres					833	50	850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					833	50	850	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 10 % med					86	50	920	-
		Dikessträckan C-D.								
60-8+14--5+50	264	Inköp av 12" cementrör m.	264	2,50	660	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	264	2,-	528	-				
5+50-4++32=30	118	Inköp av 10" cementrör m.	118	2,-	236	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	118	1,75	206	50	1630	50		
Tills. 382 meter.										
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 7+80, 6+32, 5+50 och 4+92 st.	4	40,-	160	-				
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 4+32=30 st.	1	60,-	60	-	220	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 10 % med					189	50	2040	-
		Överföres							3810	-

356388

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3810	-
		Dikessträckan D-E.								
4+32=30--3+65=40	67	Inköp av 8" cementrör m.	67	1,50	100	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	67	1,50	100	50	201	-		
Tills.	67	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 3+65=40 st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					29	-	290	-
		Dikessträckan E-F.								
3+65=40-3	65	Inköp av 6" cementrör m.	65	1,25	81	25				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	65	1,75	113	75	195	-		
Tills.	65	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 3 st.	1	40,-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					25	-	260	-
		Överföres							4360	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4360	-
		Dikessträckan F-G-H.								
3-0+85	215	**Inköp** av 6" cementrör m.	215	1,25	268	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	215	2,-	430	-				
0+85-0	85	**Inköp** av 4" cementrör m.	85	1,-	85	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	85	1,25	106	25	890	-		
Tills.	300	**meter.**								
		Brunnar av betong med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 1+72, 0+85 och 0 st.	3	40,-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					130	-	1140	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B-B$_1$.								
10+46=61+ +38=20- -10+90	44	**Inköp** av 6" cementrör m.	44	1,25	55	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	44	0,75	33	-	88	-		
Tills.	44	**meter.**								
		Brunn med 24" inre diame-								
		Överföres					88	-	5500	-

PETTERSONSKA BOKTR. STH

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					88	-	5500	-
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålo 10+90 st.	1	40,-			40	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					12	-	140	-
		Dikessträckan $B-B^{2}-B^{3}$.								
10+46=61+ +38=20-21 +30=9+16	130	Inköp av 12" cementrör m.	130	2,50	325	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	130	1,50	195	-				
21+30-22	70	Inköp av 10" cementrör m.	70	2,-	140	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	70	1,75	122	50				
22-22+74	74	Inköp av 8" cementrör m.	74	1,50	111	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	74	1,50	111	-	1004	50		
Tills.	274	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 21+30, 22+66, 22,								
		22+30 och 22+74 st.	5	40,-			200	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					1204	50	5640	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1204	50	5640	-
		ca 10 % med					125	50	1330	-
		Dikessträckan D_1-D_2.								
4+32=30--30+86	86	Inköp av 8" cementrör m.	86	1,50	129	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	86	1,50	129	-				
30+86-31+85	99	Inköp av 6" cementrör m.	99	1,25	123	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	99	1,25	123	75	505	50		
Tills.	185	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 30+45, 30+86 och 31+85 st.	3	40,-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					64	50	690	-
		Dikessträckan E_1-E_2-E_3.								
3+65=40--40+50=50	50	Inköp av 6" cementrör m.	50	1,25	62	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	50	1,25	62	50				
40+50=50--41+50	100	Inköp av 4" cementrör m.	100	1,-	100	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.								
Övf.	150	Överföres			225	-			7660	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
356388

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	150	Överföres			225	-			7660	-
		ning och höljning m.	100	1,-	100	-	325	-		
Tills.	150	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 40+50=50 och 41+ +50 st.	2	40,-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					45	-	450	-
		1 3 Dikessträckan K -K .								
40+50=50- -50+58	58	Inköp av 4" cementrör m.	58	1,-	58	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	58	1,25	72	50	130	50		
Tills.	58	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 50+58 st.	1	40,-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					19	50	190	-
					Summa kostnad				8300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för "Östra företaget".								
		Huvudavlopp.								
78		Dikessträckan A-B			850	-				
138		D:o B-C			920	-				
382		D:o C-D			2040	-				
67		D:o D-E			290	-				
65		D:o E-F			260	-				
300	1030	D:o F-G-H			1140	-			5500	-
		Sidoavlopp.								
44		Dikessträckan $B\text{-}B^{1}$			140	-				
274		D:o $B\text{-}B^{2}\text{-}B^{3}$			1330	-				
185		D:o $D\text{-}D^{1}$			690	-				
150		D:o $E\text{-}E^{1}\text{-}E^{2}$			450	-				
58	711	D:o $E^{1}\text{-}E^{3}$			190	-			2800	-
Summa	1741 meter.				Summa kostnad				8300	-

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

FRITZES KONSTH. BOKTR. AKTB. STHLM 9

356388

Kostnadsförslag.

Bil. II Mitt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		"Västra företaget."								
		Dikessträckan I-K.								
70-71+60	160	Inköp av 6" cementrör m.	160	1,25	200	-				
		Schaktning, rörens läggning, tätning av rörfogarna med cementbruk, rörens höljning m.	160	1,25	200	-				
71+60--72+68	108	Inköp av 6" cementrör m.	108	1,25	135	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	108	1,50	162	-	697	-		
Tills.	268	meter.								
		Koppling i nuvarande brunn vid påle 70			10	-				
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 70+71, 71+60 och 72+68 st.	3	40,-	120	-	130	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					73	-	900	-
					Summa kostnad				900	-

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. C:T:N
E. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Grävningstabell.	
						"Östra företaget".	
		Huvudavlopp.					
	Dikessträckan A-B.						
11+70= =62+16	-	1,60				10,09	18" rör mellan pålarna 11+70=62+16 och 61+38=10+46=20.
62	16	1,50				1:1000	
61+50	50	1,50					
61+38= =10+46= =20	12	1,35				10,17	
Summa	78	meter.					
	Dikessträckan B-C.						
61+38= =10+46= =20	-	1,35				10,17	15" rör mellan pålarna 61+38=10+46= =20 och 60=8+14.
61	38	1,40				1:1000	
60+50	50	1,30					
60=8+14	50	1,30				10,31	
Summa	138	meter.					
	Dikessträckan C-D.						
60=8+14	-	1,30				10,31	12" rör mellan pålarna 60=8+14 och 5+50.
8	14	1,30					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i gärdesgård, 5,- m. N. om boningshusets N.Ö. hörn; belägen på höjden + 13,65.
7+50	50	1,75				1:1000	
7	50	1,95					
6+50	50	1,35					
6+32	18	1,10				10,49	
6	32	1,65				1:1000	
Övf.	214						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	214						
5+68	32	1,15				1:1000	
5+50	18	1,55				10,57	
5+50	-	1,50				10,60	10" rör mellan pålarna 5+50 och 4+32=30.
5	50	1,75				5:1000	
4+50	50	1,65					
4+32=30	18	1,75				11,19	
Summa	382	meter.					
	Dikessträckan D-E.						
4+32=30	-	1,70				11,22	8" rör mellan pålarna 4+32 och 3+65=40.
4	32	1,70				10:1000	
3+65=40	35	1,85				11,89	
Summa	67	meter.					
	Dikessträckan E-F.						
3+65=40	-	1,80				11,92	6" rör mellan pålarna 3+65=40 och 3.
3+50	15	1,45				12:1000	
3	50	1,40				12,70	
Summa	65	meter.					
	Dikessträckan F-G-H.						
3	-	1,40				12,70	6" rör mellan pålarna 3 och 0+85.
2+50	50	1,65				5:1000 12,95	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundsten till boningshuset å Fuglie 5, N.Ö. hörnet; belägen på höjden + 13,98.
2	50	1,95				3:1000	
1+72	28	1,45				13,18	
Övf.	128						

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	128						
1+50	22	1,35				2:1000	
1	50	1,15					
0+85	15	1,20				13,35	
0+85	-	1,15				13,37	4" rör mellan pålarna 0+85 och 0.
0+50	35	1,90				18:1000	
0	50	0,90				14,90	
Summa	300	meter.					
		Sidoavlopp.					
		Dikessträckan B-B 1					
10+46= =61+38= =20	-	1,25				10,25	6" rör mellan pålarna 10+46=61+38=20.
10+90	44	1,40				2:1000 10,34	
Summa	44	meter.					
		Dikessträckan B-B 2 -B 3					
10+46= =61+38= =20	-	1,35				10,17	12" rör mellan pålarna 10+46=61+38= =20 och 21+30=9+16.
20+50	50	1,60				1:1000	
21	50	1,55					
21+30= =9+16	30	1,45				10,30	10" rör mellan pålarna 21+30=9+16 och 22.
21+30= =9+16	-	1,40				10,33	
21+50	20	1,45				2:1000	
22	50	1,25				10,47	
22	-	1,20				10,50	8" rör mellan pålarna 22 och 22+74.
Övf.	200						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	200					7:1000	
22+30	30	1,50				10,71	
22+50	20	1,40				15:1000	
22+74	24	1,25				11,37	
Summa	274	meter.					
		Dikessträckan D-D^{1}.					
4+32=30	-	1,70				11,22	8" rör mellan pålarna 4+32=30 och
						2:1000	30+86.
30+45	45	1,70				11,31	
						2:1000	
30+86	41	1,-				11,39	
30+86	-	0,95				11,42	6" rör mellan pålarna 30+86 och
31	14	1,30				16:1000	31+85.
31+50	50	1,35				12,44	
						38:1000	
31+85	35	1,30				13,77	
Summa	185	meter.					
		Dikessträckan E-E^{1}-E^{2}.					
3+65=40	-	1,80				11,92	6" rör mellan pålarna 3+65=40 och
						1:1000	40+50=50.
40+50=50	50	1,60				11,97	
40+50=50	-	1,55				12,-	4" rör mellan pålarna 40+50=50 och
							41+50.
41	50	1,15				1:1000	
41+50	50	0,65				12,10	
Summa	150	meter.					

PETTERSONSKA DOKTR. C:TR

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dikessträckan $E^{1}-E^{3}$.				
40+50=50	-	1,55				12,-	4" rör mellan pålarna 40+50=50 och 50+58.
50+50	50	1,60				1:1000	
50+58	8	1,20				12,06	
Summa	58	meter.					
		Sammandrag för "Östra företaget".					
		Huvudavlopp.					
78		Dikessträckan		A-B			
138			D:o	B-C			
382			D:o	C-D			
67			D:o	D-E			
65			D:o	E-F			
300	1030		D:o	F-G-H			
		Sidoavlopp.					
44		Dikessträckan		$B-B^{1}$			
274			D:o	$B-B^{2}-B^{3}$			
185			D:o	$D-D^{1}$			
150			D:o	$E-E^{1}-E^{2}$			
58	711		D:o	$E^{1}-E^{3}$			
Summa	1741	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		"Västra företaget".					
		Dikessträckan I-K.					
70	-	1,55				10,40	**Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till stallbyggnad å Fuglie nr 26, N. gaveln, 1,75 m. Ö. om N.V. hörnet; belägen på höjden + 13,24.**
70+50	50	1,75					**6" rör mellan pålarna 70 och 72+68.**
71	50	1,30					
71+50	50	1,60					
72	50	1,65					
72+50	50	1,55					
72+68	18	1,30				11,47	**Fixpkt.:av år 1930: Kors i grundsten till snickare Nilssons hus, S.Ö. hörnet; belägen på höjden + 13,04.**
Summa	268	**meter.**					

4.1000

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägare eller arrendator tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren respektive arrendatorn.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 40" inre diameter skola utföras med minst till 32" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämns med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 12 september 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 5 m.fl. hemman uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Fuglie n:ris 5 och 6 samt Steglarp nr 14 uti Fuglie socken ävensom Mellan Grevie nr 1 uti Mellan Grevie socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, äro belägna på båda sidor om allmänna vägen mellan Fuglie och Mellan Grevie kyrkor, omkring 3,- km. sydväst om Östra Grevie järnvägsstation på statsbanelinjen Malmö-Trelleborg. De berörda markerna utgöra tvenne av omnämnda väg skilda områden, vilka avvattnas åt olika håll, varför torrläggningsområdet uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende

dikningssamfälligheter eller företag, kallade "Östra företaget" och "Västra företaget". Båda företagen, vilka å hithörande översiktskarta utmärkts med gul färg, tillhöra nederbördsområdet nr 89/90.

"Östra företaget."

"Östra företaget", vilket omfattar de å hithörande plankarta med 1-92 betecknade ägofigurerna - se värderingslängden Bil. Litt. A I - , avvattnas f.n. till ett delvis täckt, delvis öppet avloppsdike, som från påle 0+85 i gränsen mellan Fuglie och Mellan Grevie socknar avrinner söder ut till ett större täckt avlopp /18" cementrör/ vid påle 11+70= =62+16, utfört för "Dikningsföretaget Fuglie nr 8 m.m. av år 1926". Då det nuvarande avloppsdiket ej utförts till erforderliga dimensioner, har förrättningsmannen i samråd med övriga synsmän samt med beaktande av vid förrättningen framförda yrkanden angående avlopp m.m. /se förrättningsprotokollets §§ 5, 6, 9, 10 och 11/ upprättat förslag till nya avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Oaktat det ej erfordras för torrläggning av sökandenas marker, skall det planerade dikningsföretaget dock enligt förrättningsmannens förslag utsträckas ända till punkten A eller påle 11+70 = 62+16, enär i annat fall skada torde uppkomma för den Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheten Fuglie 5 3. "Östra företaget" skall alltså omfatta utförandet av följande dikessträcker.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H från påle 11+70 = 62+16 vid det täckta avlopp av 18" cementrör, som utförts för "Dikningsföretaget Fuglie nr 8 m.m. av år 1926", över pålarna 61+38 = 20 = 10+46 och

60 = 8+14 till påle 0. Avloppet utföres som täckt ledning av cementrör /18" - 6"/ samt förlägges till samma sträckning som det nuvarande avloppsdiket med undantag för sträckan 11+70 = 62+16 - 60 = 8+14, vilken för undvikande av ett flertal krökar upptages i nyskärning.

Sidoavlopp.

2/ Dikessträckan $B-B^{1}$ från påle 61+38 = 20 = 10+46 till påle 10+90 i rågången mellan Fuglie nr 5 och Fuglie nr 4. Avloppet utföres som täckt ledning av cementrör /6"/ samt förlägges till samma sträckning, som det nuvarande avloppsdiket men med motsatt fall.

3/ Dikessträckan $B-B^{2}-B^{3}$ från påle 61+38 = 10+46 = 20 till påle 22+74 i rågången mellan Fuglie nr 5 och Steglarp nr 14. Avloppet följer å sträckan 61+38 = 10+46 = 20 - 21+30 = 9+16 det nuvarande avloppsdiket men upptages i övrigt i nyskärning samt förlägges å sträckan 21+30 - 22+30 cirka 3 m. norr om ett nu befintligt ägovägsdike. Utföres som täckt ledning av cementrör /12", 10" och 8"/.

4/ Dikessträckan $D-D^{1}$ från påle 4+32 = 30 till påle 31+85 i rågången mellan Fuglie nr 5 och Steglarp nr 14. Avloppet följer å sträckan 30 - 30+45 nu befintligt dike norr om rågången mellan fastigheterna Fuglie 5^{2} och Fuglie 5^{3} men upptages i övrigt i rak nyskärning. Utföres som täckt ledning av cementrör /8" och 6"/.

5/ Dikessträckan $E-E^{1}-E^{2}$ från påle 3+65 = 40 till påle 41+50 vid östra sidan av allmänna vägen mellan Fuglie och Mellan Grevie kyrkor. Avloppet förlägges omedelbart norr om rågången mellan fastigheterna Fuglie 5^{2} och Fuglie 5^{3} samt följer å sträckan 40 - 41+20 ett nu befintligt öppet dike. Utföres som täckt ledning av cementrör /6" och 4"/.

6/ Dikesströckan $E^{1}-E^{3}$ från påle 40+50 = 50 till påle 50+58. Utföres i rak nyskärning som täckt ledning av cementrör /4"/.

"Västra företaget".

De till "Västra företaget" hänförda markerna eller ägofigurerna 93-95 /se plankartan samt värderingslängden Bil. Litt. A^{II} / sakna f.n. ordnat avlopp. Enligt av förrättningsmannen upprättat förslag /angående yrkande därom se förrättningsprotokollets § 5/ skall därför ett nytt avlopp, dikesströckan I-K, upptagas från påle 70 vid den brunn, som utförts för dikningsföretaget "Fuglie dikning av år 1930", och öster ut till påle 72+68 vid västra sidan av allmänna vägen mellan Fuglie och Mellan Grevie kyrkor. Avloppet förlägges å ströckan 70 - 71+60 till ett nu befintligt öppet dike norr om rågången mellan fastigheterna Fuglie 6^{4} och Fuglie 6^{3} men upptages i övrigt i nyskärning. Utföres som täckt ledning av cementrör /6"/ med täta fogar.

Synemännen hava närmare prövat, i vilken omfattning de olika dikesströckorna böra komma till utförande som täckta ledningar, samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya avlopp utföras såsom täckta diken. De vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikesströckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikesströckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikesströckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, även-

som de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markernas nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3a

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför ej nybyggnad av broar eller trummor för vare sig allmänna eller enskilda vägar. Visserligen be-

röras av företaget ett flertal enskilda ägovägar, men för dessa erfordras inga nya broar eller trummor, då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att, för den händelse "Östra företaget" kommer till stånd, ersättning skall utgå för i samband med arbetets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Skulle genom de båda företagens utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagens fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för utförandet av "Östra företaget" till 8300,- kr. och för utförandet av "Västra företaget" till 900,- kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B^{I} och Bil. Litt. B^{II}.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående fördelningen av kostnaderna för utförandet av "Östra företaget", hava synemännen för detta företag verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60.

För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits ej endast till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden utan även till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 10584,- kr.- utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A I /, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A I /. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-11 med ett båtnadsvärde om 2247,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och B-B 1 utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1910,- /850+920+140/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 12-25 med ett båtnadsvärde om 2221,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna

A-B och B-B^2 -B^3 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2180,- /850+1330/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 26-42 med ett båtnadsvärde om 2595,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3810,- /850+920+2040/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 43-54 med ett båtnadsvärde om 1021,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-D^1 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, beräknat till 500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1190,- /690+500/ kronor.

För att avdelning V, omfattande ägofigurerna 55-66 med ett båtnadsvärde om 1251,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E, E-F, E-E^1 -E^2 och E^1 -E^3 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, beräknat till 500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1690,- /290+260+450+190+500/ kronor.

För att avdelning VI omfattande ägofigurerna 67-92 med ett båtnadsvärde om 1249,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan F-G-H upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-F eller 260,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1400,- /1140+260/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	10584,- kr.	8300,- kr.	0,784202.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2247,- kr.	1910,- kr.	0,850022
II	2221,- "	2180,- "	0,981539
III	2595,- "	3810,- "	1,468208
IV	1021,- "	1190,- "	1,165523
V	1251,- "	1690,- "	1,350919
VI	1249,- "	1400,- "	1,120896.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	4468,- kr.	3240,- kr.	0,725156
I+II+III	7063,- "	5280,- "	0,747557
I+II+III+IV	8084,- "	5970,- "	0,738495
I+II+III+IV+V	9335,- "	7160,- "	0,767005
I+II+III+IV+VI	9333,- "	7660,- "	0,820743
I+II+III+V+VI	9563,- "	7610,- "	0,795775
I+II+III+V	8314,- "	6470,- "	0,778205
I+II+III+VI	8312,- "	6970,- "	0,838546
I+III	4842,- "	3950,- "	0,815778
I+III+IV	5863,- "	4640,- "	0,791403

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+III+IV+V	7114,- kr.	5830,- kr.	0,819510
I+III+IV+V+VI	8363,- "	6970,- "	0,833432
I+III+V+VI	7342,- "	6280,- "	0,855352
I+III+IV+VI	7112,- "	6330,- "	0,890044
I+III+V	6093,- "	5140,- "	0,843591
I+III+VI	6091,- "	5640,- "	0,925956
III+IV	3616,- "	4500,- "	1,124446
III+IV+V	4867,- "	5690,- "	1,169098
III+IV+V+VI	6116,- "	6830,- "	1,116742
III+V	3846,- "	5000,- "	0,769200
III+IV+VI	4865,- "	6190,- "	1,272353
III+VI	3616,- "	5500,- "	1,521017
IV+V	2272,- "	2380,- "	1,047535
IV+V+VI	3521,- "	3520,- "	0,999715
IV+VI	2270,- "	2880,- "	1,268722
V+VI	2500,- "	2830,- "	1,132000.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelningarna I och II påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller kostnaderna för dikessträckorna A-B, B-C, $B-B^{1}$ och $B-B^{2}-B^{3}$, tillsammans 3240,- kr. Avdelningarnas relativa kostnad beløper då till 0,725156.

Avdelningarna III och IV påföras gemensamt kostnaderna för de avlopp, som skola upptagas genom deras områden eller kostnaderna för dikes-

sträckorna C-D och D-D^1, tillsammans 2730,- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper då till 0,754977.

Avdelningarna V och VI påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller kostnaderna för de dikessträckor - dikessträckorna D-E, E-F, F-G-H, E-E^1-E^2 och E-E^1-E^3-, som skola upptagas genom deras områden, tillsammans 2330,- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper då till 0,932000.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har för "Östra företaget" särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Delägare, som icke är sökande till företaget, ej heller med sökande dan likställd, är dock med det undantag, varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. I kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. De/ angives med beteckningen "sök." de delägare, vilka äro sökande till företaget eller med sökande likställda. Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 och 7:28-30 föreliga ej vid detta företag.

Av Henning Hansson såsom ombud för Per Hansson framfört yrkande /förrättningsprotokollets § 12/ att inga kostnader för det planerade

dikningsföretagets genomförande måtte påföras hans huvudman, enär dennes fastigheter under Mellan Grevie nr 1 redan nu vore avdikade norr ut, har på grund av vad under förrättningen framkommit /förrättningsprotokollets § 16/, ej föranlett någon synemännens åtgärd. Då vissa Per Hansson tillhöriga marker uppenbarligen komma att beredas båtnad genom det planerade dikningsföretaget, hava synemännen förpliktat honom att med viss andel deltaga i kostnaderna för detsammas genomförande.

För "Västra företaget" har särskild kostnadsfördelning ej verkställts, enär sökanden såsom ensam delägare själv skall gälda samtliga med företagets utförande förenade kostnader. Då sökanden emellertid förklarat sig vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande, hava synemännen uppskattat båtnaden eller jordförbättringen även för "Västra företaget", därvid de följt samma principer, som tillämpats för "Östra företaget".

För "Östra och Västra företagen" gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader, kostnader för företagens administration och skötsel m.m. skola fördelas företagen emellan med 90 % på "Östra företaget" och 10 % på "Västra företaget".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas /se bestämmelserna i V.L. 10:30 och 10:79/. Kommer "Östra företaget" till stånd, skola de förrättningskostnader, som påförts detta företag, fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagens utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de båda företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka desammas utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättade förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt beträffande "Östra företaget", sedan anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skola företagen vara fullbordade inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall, innan detsamma påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten, därvid anmälningsplikten åligger beträffande "Östra företaget" dess styrelse och beträffande "Västra företaget" sökanden. Sådan anmälan erfordras dock ej, för den händelse entreprenören är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närma-

re angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för "Östra företagets" framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller enligt de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Kostnaderna för framtida underhållet av "Västra företaget" påvila sökanden eller dennes efterföljare.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med "Östra företaget" förenade angelägenheter

skola delägarne inom detta företag utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen skall hava sitt säte i Fuglie socken. Styrelseledamöterna, vilka gemensamt ansvara för sin förvaltning, åligga:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

"Västra företaget" skall handhavas av sökanden ensam eller av dennes efterföljare.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen för "Östra företaget" genom dess ordföran-

de.

De båda företagen skola gemensamt benämnas "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936".

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall gäldas av "Östra företaget" med 15,88 kr., vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

P.G. Göransson Aug. Persson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas N:o	Torrläggningsgrader. 0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
					"Östra företaget".						
0	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20
+25	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50	16,70
+50	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20
+75	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70
1	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15	15,35	15,55
+50	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50
2	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45	14,65	14,85	15,05	15,25	15,45
+50	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15
3	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55	14,75
+25	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55
+50	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35
+75	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15
4	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95
+50	11,55	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55
5	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30
+50	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05
6	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-
+50	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95
7	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90
+50	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65	12,85

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
8	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80
+50	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75
9	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70
+50	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65
10	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55
+50	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40
11	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25
+50	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-
20=10+46	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40
20+50	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55
21	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65
+50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70
22	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80
+25	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-
+50	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30
+74	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60
30=4+32	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70
30+50	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75
31	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80
+25	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20
+50	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60
+75	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60
+85	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
40=3+65	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05	13,25	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25
40+50	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30
41	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35
+50	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40
40+50=50	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30
50+58	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35
					"Västra företaget".						
70	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60
+50	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80
71	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-
+50	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20
72	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40
+50	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. Db.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

"Östra företaget".

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fuglie socken.				
2/3	5 3		Fuglie; Lunds Domkyrka, arr. Olof Jönssons sterbhusdeläg.: Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson		1-11,14--25	12304,-	16500,-
					26-46	8221,-	11100,-
1/2	av 14 1		Steglarp; Edvin Eriksson	sök.	12,13	928,-	1200,-
1/3	5 2		Fuglie ; Arvid Svensson	sök.	47-54	1585,-	2322,-
					55-77	5439,-	7500,-
			Mellan Grevie socken.				
7/45	1 5		Mellan Grevie; Per Hansson		78-80	256,-	325,-
1/90	1 7		D:o ; Dens.		81-86	723,-	900,-
14/45	1 4		D:o ; Dens.		87-92	682,-	875,-
						30138,-	40722,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0,725156	Rel. kostn. 0,754977	Rel. kostn. 0,932000			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4196,-	3042,76								
2879,-		2173,58				5216,34	62,85	369,86	
272,-	197,24					197,24	2,37	13,95	
737,-		556,42							
2061,-			1920,85			2477,27	29,85	175,66	
69,-			64,31			64,31	0,77	4,53	
177,-			164,96			164,96	1,99	11,71	
193,-			179,88			179,88	2,17	12,77	
10584,-	3240,-	2730,-	2330,-			8300,-	100,-	588,48	

Fuglie den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

P.G. Göransson Aug. Persson

Gode män.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

DIARIE Nr 14780
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1937

M 4-0524

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för "dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" i Fuglie och Mellan Grevie socknar av MALMÖHUS LÄN under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusentrehundrasextio (5.360) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfemhundrafemtio (4.550) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/k undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er och förbind/er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav upplburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tveglie den 30 Augusti 1937.

Arvid Svensson

Att Lantbrukaren Arvid Svensson, Tveglie n:r 26 jämte Båslös

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Palén
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress

Ida Wallén
Malmö

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 23 september ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

448/37

DIARIE Nr 14781
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1937

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5360,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4550,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26 per Håslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 30 augusti 1937, därvid dikessträckorna A-B, B-C, C-D, B-B^{1} och B-B^{2}-B^{3} befunnos utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 5280,- kr.

Härtill komma förrättningskostnader 751,71 kr.

Summa 6031,71 kr.

motsvarande omkring 60 % av hela den beräknade kostnaden 10033,47 kr.

Malmö den 31 augusti 1937.

C. A. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26 per Håslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hilding Jönsson, Fuglie nr 5 per Östra Grevie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fuglie den 28 oktober 1936.

1. Arvid Svensson 2. Hilding Jönsson.

Att Arvid Svensson och Hilding Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

3. Sofia Jönsson 4. Joh. Emil Jönsson 5. Agnes Jönsson
Lantbr., Ö. Kattarp nr 5

Att Sofia Jönsson, Joh. Emil Jönsson och Agnes Jönsson egenhändigt skrivit sina namn intyga:

Gunnar Nilsson
Lantbr., Ö. Kattarp, Kvarnby.

Ida Nilsson
Fru, Ö. Kattarp, Kvarnby.

6. Per Hansson.

Att Per Hansson egenhändigt skrivit sin namnteckning intygas:

Axel Håkansson Anna-Greta Rasmusson.

Vidimeras
ex officio:

30/6 37

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Fuglie socken.

1/3	mtl.	Fuglie		5^{2}	Arvid Svensson,
1/8	"	"	av	6^{2}	Dens.,
1/8	"	"		6^{4}	Dens.,
2/3	"	"		5^{3}	Lunds Domkyrka; arr. Olof Jönssons sterbhusdelåg.: Änkan Sofia Jönsson, sönerna Hilding och Johan Emil Jönsson samt dottern Agnes Jönsson.

Mellan Grevie socken.

14/45	mtl.	Mellan Grevie		1^{4}	Per Hansson,
7/45	"	"	"	1^{5}	Dens.,
1/90	"	"	"	1^{7}	Dens.

Malmö i februari 1937.

C.A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 23 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Duglie - Hellan Grevie av år 1936 i Duglie och Hellan Grevie socknar av Malmöhus län.

Lån 5.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedannotiendo, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Duglie socken			
Duglie	1/3	5 2	Arvid Svensson
"	2/3	5 3	Lunds Domkyrka, arr. Olof Jönssons sterbhus
"	1/8	av 6 2	Arvid Svensson
"	1/8	6 4	Densamme
Hellan Grevie socken			
Hellan Grevie	14/45	1 4	Per Hansson
" "	7/45	1 5	Densamme
" "	1/90	1 7	Densamme

Stockholm den 23 september 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

3.200
2.700

448/37 Godkänt den 8 dec 1937

DIARIE Nr 20852
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1937

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fuglie - Mellan Grevie av år 1936" uti Fuglie och Mellan Grevie socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5360,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4550,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Svensson, Fuglie nr 26 per Håslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 november 1937. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Östra företaget.

Dikningskostnader	7830,- kr.	
Förrättningskostnader	751,71 "	8581,71 kr.

Västra företaget.

Dikningskostnader	870,- kr.	
Förrättningskostnader	81,76 "	951,76 "
	Summa kostnader	9533,47 kr.

Då kostnaderna för de båda företagens utförande vid statsunderstödets beviljande beräknats till 9051,71 kr., respektive 981,76 kr. eller tillsammans till 10033,47 kr., bör beviljat statsunderstöd alltså reduceras i förhållande till här redovisade kostnader.

Malmö den 25 november 1937.

K. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.
