Blad I
Plan.

Förslag
till

Dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942"

i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synetförrättning år 1942 av

Elsa-Henrik Mellin

Statens lantbruksingeniör.

SÖDERBYGDENS
27 SEP. 1944
VATTENDOMSTOL

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari **19** 44
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Hörsman

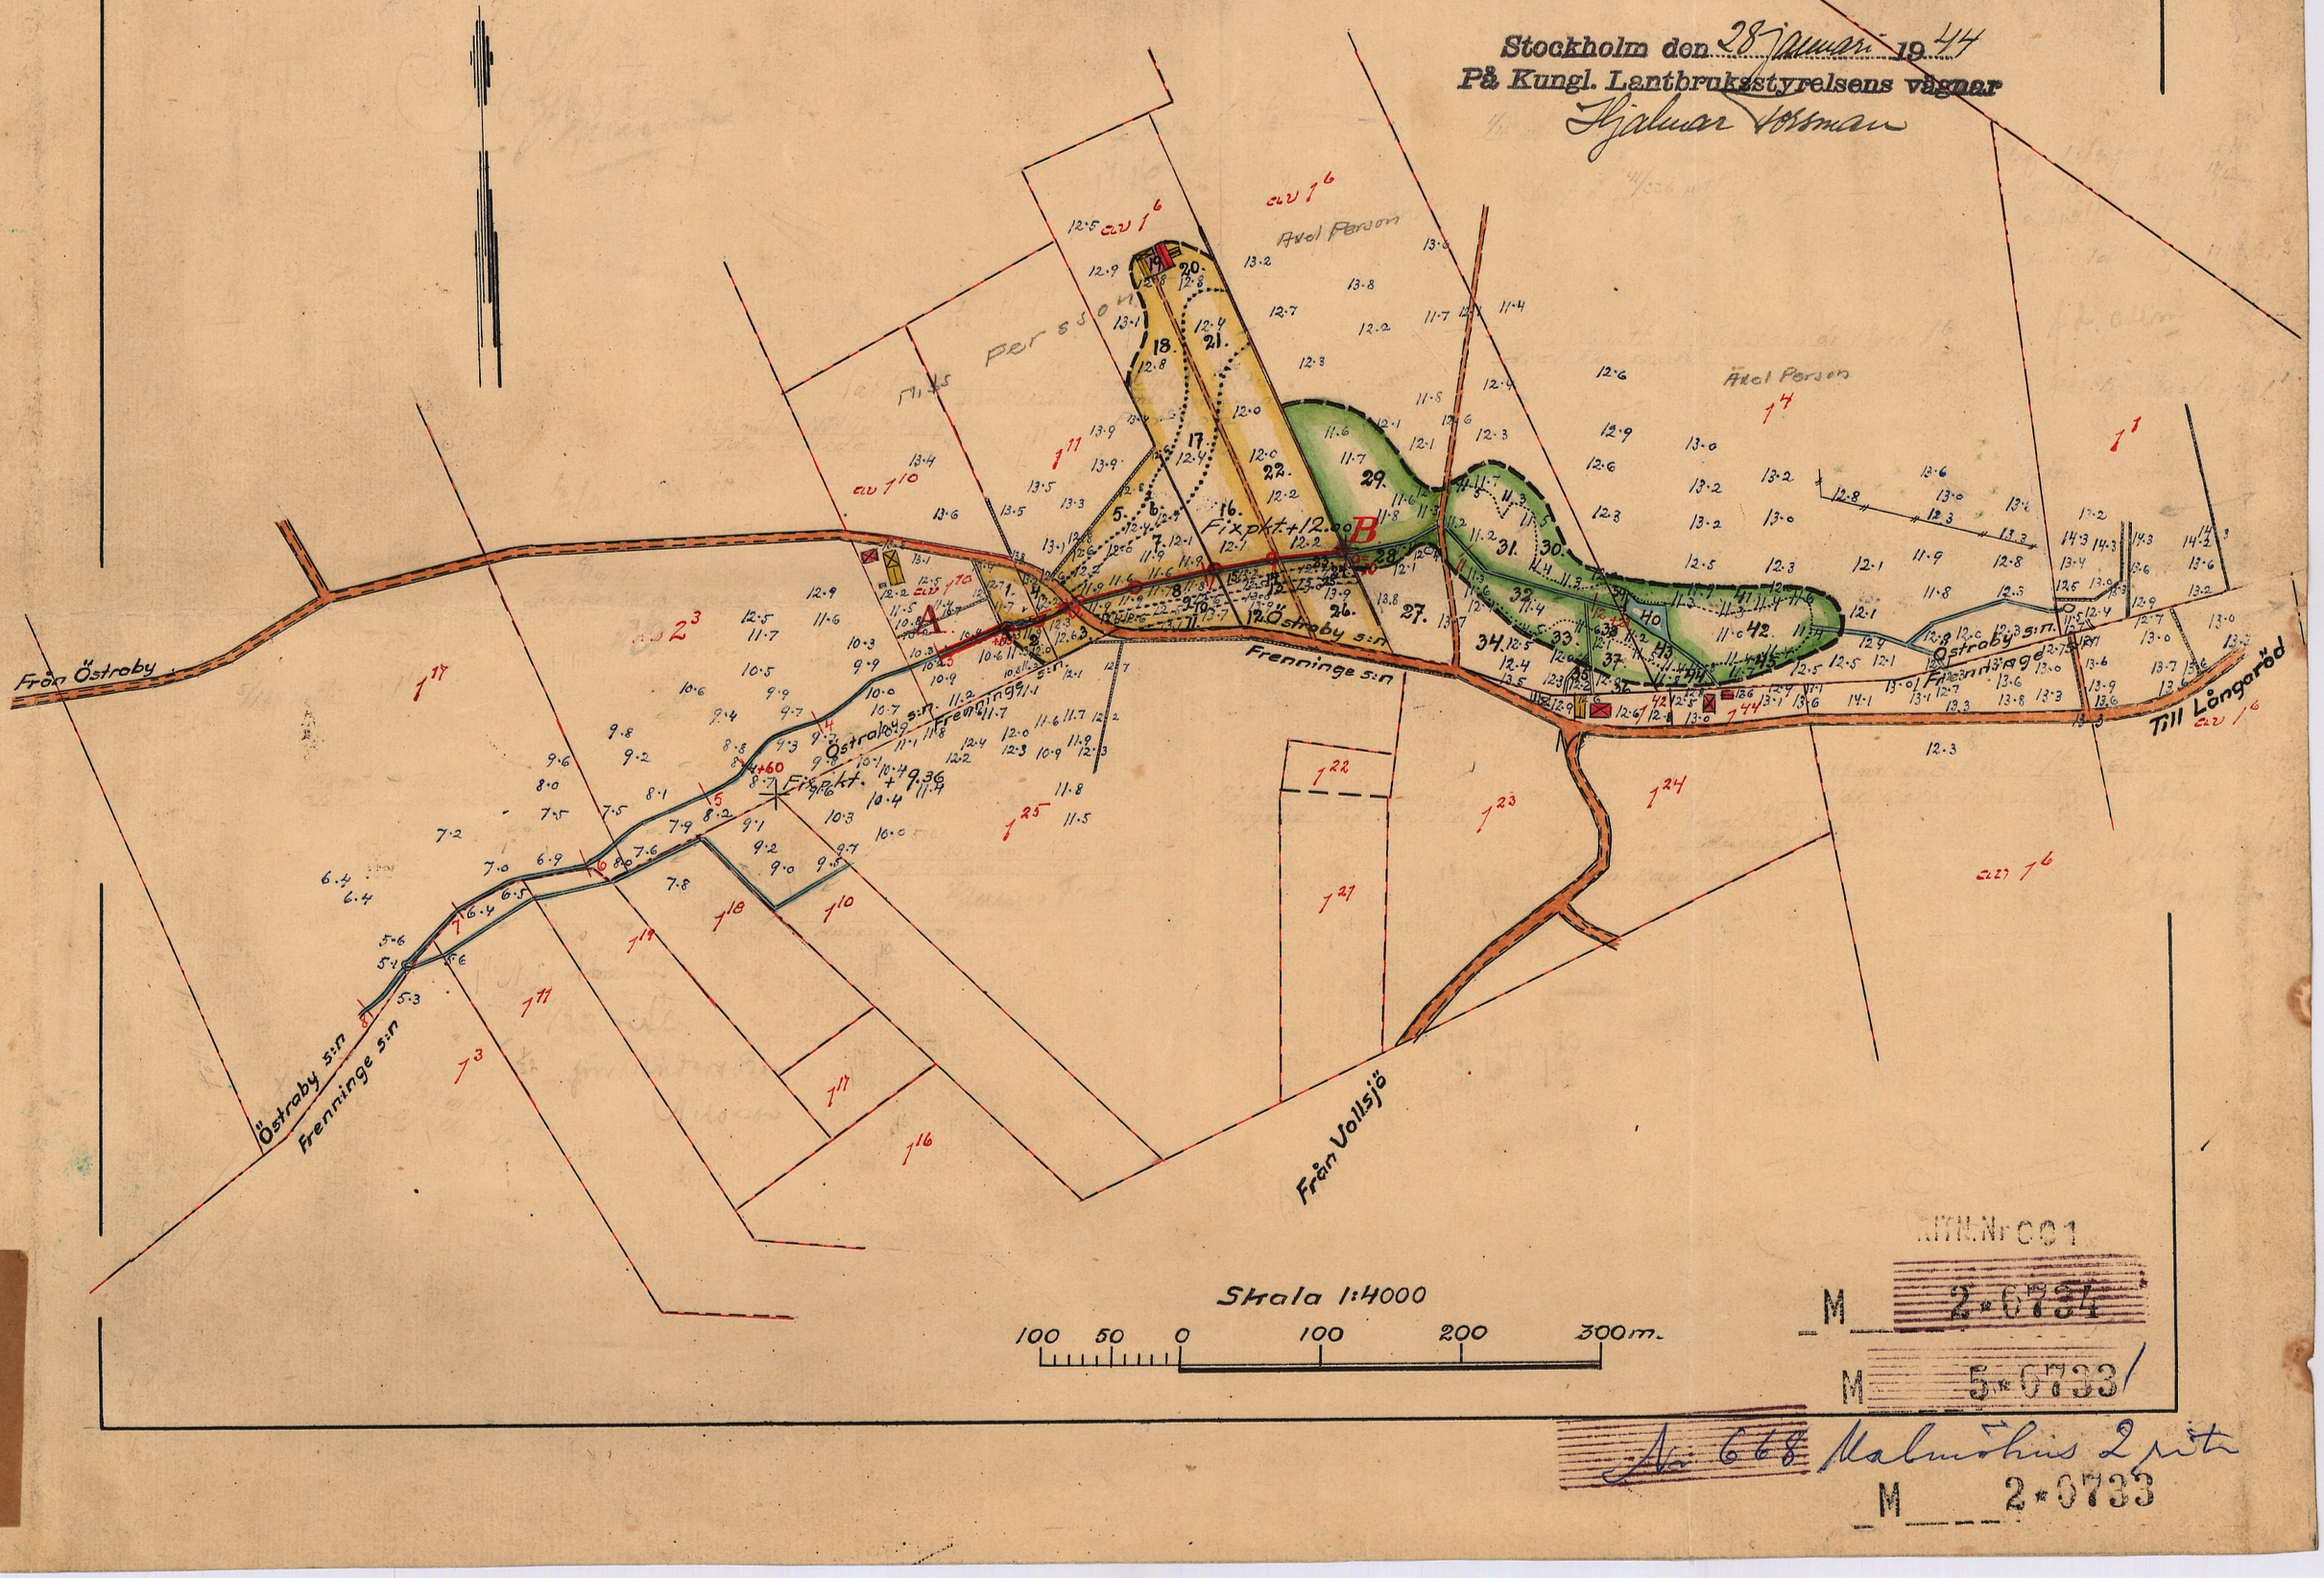

KTH.Nr 601
M 2*6734
M 5*6733
Nr 668 Malmöhus 2 rote
M 2*0733

Profil- och sektionsritningar m.m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

SÖDERBYGDENS
27 SEP. 1944
VATTENDOMSTOL

Förslag
till
Dikningsföretaget "Tollstorp nr 1
av år 1942"
i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Edw. Bewis Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gustaf Wilman

Typritning för brunn med 24" inre diameter och intag vid 0=10.
Skala 1:50.
Sektion.



Plan.



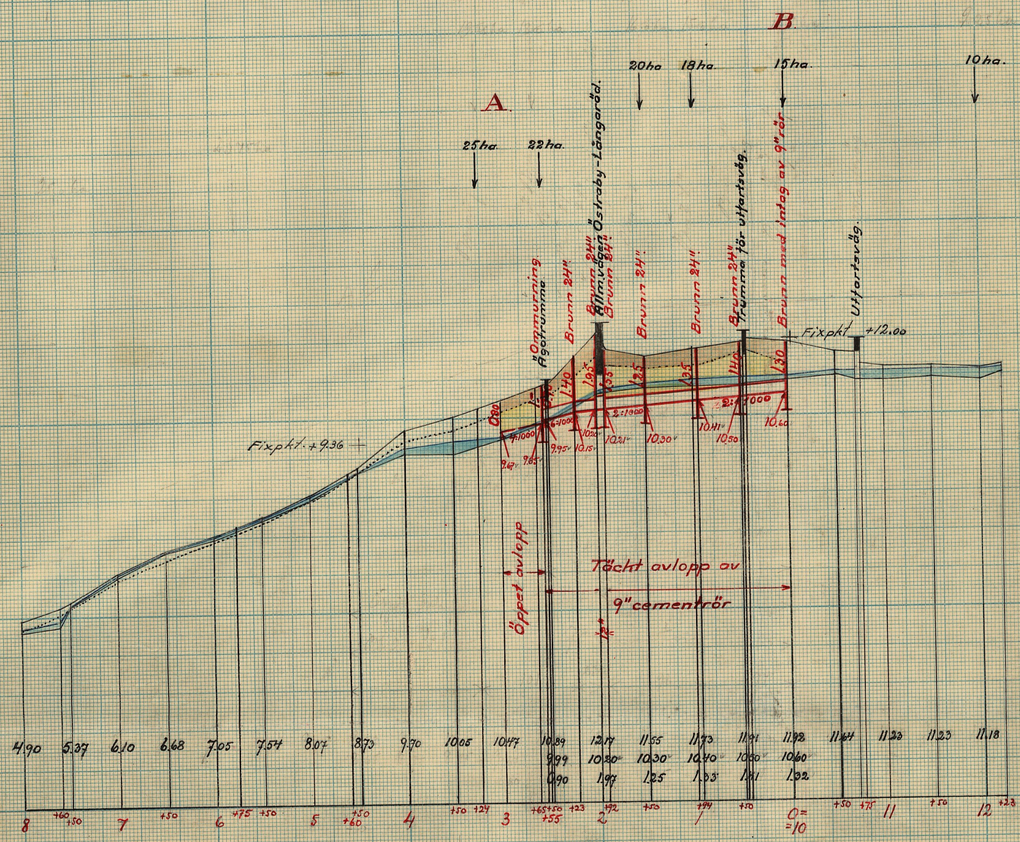

Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50.





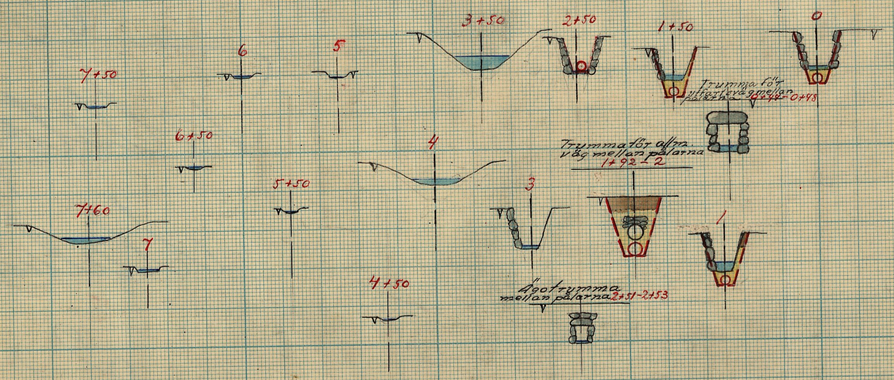

Typritning för ommurning vid 2+55



Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50
1 0,5 0 1 2 3 4 m.

ITN. Nr 002
M 5:0733
M 2:0733 M 2:0734 2
Nr 668 Malmöhus 2 prth

SÖDERBYGDENS
27 SEP. 1944
VATTENDOMSTOL

M 2•0733

DIARIE N:r 6562
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

Ink. till Svea Hovrätt
tillden 24 JAN. 1945

dikningsföretaget "Tollstorp nr 1
av år 1942"

i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Akt

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Tollstorp nr 1

av år 1942"

i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Innehåller 58 sid.

Härtill hör 2 st. ritningar.

Översiktskarta.

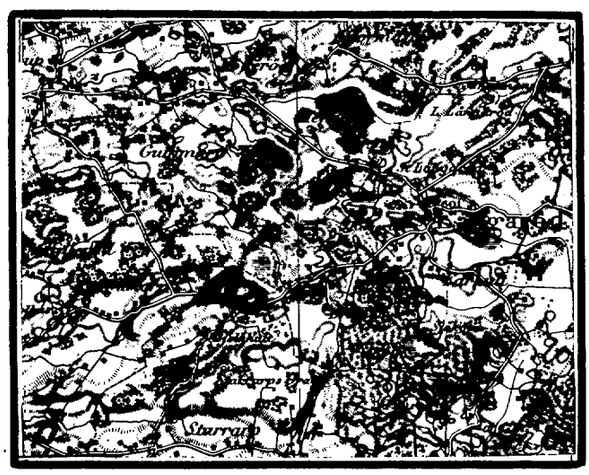

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående tomläggning av marker till Tollstorp nr 1 m. fl. hemman i Östraby och Fremminge socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 15 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hjalmar Olsson, Stararp per Vollsjö och Folke Svensson, Östraby boställe per Östraby hos lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp nr 1 för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande tomläggning av marker till Tollstorp nr 1 m. fl. hemman i Östraby och Fremminge socknar, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 23 september 1942 översänt till pastorsämbetena i Östraby och Fremminge församlingar. Kungörelsen hade enligt å densamma tecknade bevis anslagits i vederbörande kyrkor söndagen den 27 september 1942 (Bil. 2 och 3). Kungörelsen hade därjämte fredagen den 25 september 1942 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 september 1942 översänt underrättelser angående förrättningen. Över avsända kungörelser och underrättelser m. m. hade särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit.

Sökanden till förrättningen:
Lantbr. Nils Persson, Tollstorp, äg. 1/336 mtl. Tollstorp

av 1/6 och 1/256 mtl. Tollstorp 1/11 i Östraby s:n. Antagligen har Person erhållit lgf. å 1/336 mtl. av 1/6 d. 15/2 1909 § 58 och d. 5/6 1919 § 283. Beträffande 1/11 har Person erhållit lgf. å hälften eller å 1/512 d. 15/6 1919 § 383.

Övriga ednägare och ombud:

Lantbr. Axel Persson Tollstorp: äg. 41/336 mtl. av Tollstorp 1/4 1/6 (lgf. för Axel E. Persson o. h.h. Anna Elvira Persson d. 3/9 1926 § 48) i Östraby s:n. Antagligen utgör Axel E. Persson och h.h. fastighet 1/16 mtl. 1/4 + 20/336 mtl. av 1/6.

Lantbr. Olof Österlin, Bjälkehult: äg. j.d. samfällighet till Tollstorp i Östraby s:n kallad Bjälkestorp nr 1 samt 1/168 mtl. Bjälkehult av 1/6 (lgf. d. 14/10 1936 § 391) i Ingemunge s:n.

Fru Ida Linde, Tollstorp: äg. tillsammans med omyndiga dottern Anna-Lisa Gyllenborg Linde 1/512 mtl. Tollstorp av 1/8.

Lantbr. Per Olsson Killeröd per Östraby god man för omyndiga Anna-Lisa Gyllenborg Linde genom Herr Adolf Nilsson enl. fullmakt (Bil. 5).

Fru Elna Jönsson och hennes son Johan Göransson Tollstorp: äg. tillsammans 1/8 mtl. Tollstorp 2/3 genom Johan Göransson.

Lantbr. Olof Kristensson, Tollstorp, äg. 5/128 mtl. Tollstorp 1:17.

Lantbr. Nils Gösta Olofsson Bjälkehult äg. 6/366 mtl. Bjälkehult av 1:6 (lgf. d. 7/12 1938 nr 531) i Fegemåge s:n genom lantbr. Olof Österlin kvl. fullmakt (Bil. 6).

Lindkarlen Aug. Persson Bjälkehult, äg. avst. Bjälkehult 1:44 i Fegemåge s:n.

Handlanden Theo Persson, Bjälkehult, äg. avst. Bjälkehult 1:42 i Fegemåge s:n.

Fru Ingrid Nilsson Bjälkehult, äg. avsöndring från Bjälkehult nr 1 i Fegemåge s:n.

~~Lantbr. Gunnar Fridh Bjälkehult, äg. 5803/90720 mtl. Bjälkehult nr 1.~~

~~Lantbr. Nils Åkesson, Bjälkehult.~~

Fars vägdistrikt genom vägstyrelsens ordf., nämndeman Per Olsson i Ovanåa, företrädd av vägmästaren Alfred Persson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot sysnemännen hade ingen att anmäla. Synemännen borde ej heller stå i jävsförhållande till någon berörd sakägare. Både sysnemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de ~~fortfarande~~ i mellanhade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det om planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskarta över de marker som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över det utlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förrättningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yttranden som under förrättningen komma att framställas beträffande utloppets upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förrättningarna upprättade och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökanden Nils Persson förklarade, att han med sin ansökan om omregleringen avsåge, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas närmare bestämmelser rörande upptagande av avlopp, som erfordrades för torläggning av vissa honom tillhöriga, nu våtlendkadade marker. Persson yrkade därför, att det nuvarande avloppet i sträckningen 0-2+23 skulle fördjupas och rätas. Vidare borde det nuvarande diket norrom 2+23 upprensas i den omfattning, som erfordrades för erhållande av tillräckligt avfall.

§ 6.

Fru Ida Linde förklarade med instämmande av Adolf Nilsson, att hennes och hennes dotters fastighet 1/512 mtl. Tolstorp av 1:10 icke fullt torlagd och att det nuvarande avloppet från fastigheten icke fullt tillräckligt. Hon anhöll, att det planerade diknings företaget ej borde utsträckas längre västerut än som erfordrades för torläggning av sökandens marker. På särskild fråga av förrättningsmannen meddelade fru Linde, att hon ej ville som sökande biträda förrättningen.

§ 7.

Herr Axel Persson framhöll, att hans fastighet ej komme att beredas någon kostnad genom utförandet av det nu planerade diknings företaget. Den del av fastigheten, som ligger närmast Nils Perssons östra

gräs, utgjordes närmligen till övervägande del av högt bolagen och mycket stenbunden fjäladsmark med dåligt bete. Inom området fumnes även en uppodlaren mosse, som vid flöden står under vatten. Uppsed hade ej utnyttjats sedan år 1926, då Persson köpte egendomen.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att den omvarande trumman vid avvägningspunkten 1+92 för allmänna vägen Gäsboen - Långarod eller vägen nr 16 i Lärs vägdistrikt måste omfinggas därest det om planerade dikningsföretaget komme till utförande. Den omvarande trumman, som utförts av 15" cementrör, måste närmligen fördjupas 50 á 60 cm.

§ 9.

Det anmärkes såsom ostridigt, att den omvarande trumman tillkommit efter år 1880.

§ 10.

Vägdistriktets ombud, nämndeman Per Olsson, förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi och på egen bekostnad omlägga den omvarande trumman till de dimensioner, som komme att föreskrivas vid syneförrättningen. I sammanhang härmed skulle vägdistriktet även utföra anslutningsdiken vid trummans ändpunkter.

§ 11.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade närvarande icke sökande sakägare, att de ej ville såsom sökande bibehålla förrättningen.

§ 12.

Meddelades, att omregningen omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Persson i Tollstorp onsdagen den 4 instundande november kl. 9.30.

Tollstorp den 15 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:
O.H. Nelin
Statens lantbruksingenjör.

Tjänstem. vittne [illegible]
Bror Andén.

År 1942 den 28 november inställde sig omregleringsmännen hos lantbrukaren Nils Persson i Tollstorp för att återupptaga omregleringsförrättningen. Det till den 4 november utsatta sammanträdet hade på grund av oförutsett hinder

för förrättningsmannen inställts, varom intressenterna underrättats i skrivelse den 1 november 1942 (Bil. 10). I samma skrivelse hade underrättelse lämnats om dagen sammanträde.

Förutom syneförrättningsmannen hade följande tillståndskommit:

Lantbr. Nils Persson, Tollstorp.

Lantbr. Axel Persson, Tollstorp.

~~Lantbr. Elof Östedin, Björkholmen.~~

Fru Ida Linde, Tollstorp.

Lantbr. Per Olsson, Killerud per Östraby genom Adolf Nilsson (Bil. 5).

~~Fru Elna Jönsson och hennes son Johan Gösta genom Johan Gösta Jönsson.~~

~~Lantbr. Olof Kristensson, Tollstorp.~~

~~Lantbr. Nils Gösta Olofsson, Björkholmen.~~

~~Smickaren Aug. Persson, Björkholmen.~~

~~Handlanden Sten Sandsson, Björkholmen.~~

~~Fru Ingrid Nilsson, Björkholmen.~~

~~Lantbr. Gustav Emil, Björkholmen.~~

~~Lantbr. Nils Åkesson, Björkholmen.~~

~~Fars vårdnadsbild genom vårdnadsbevis och förd. (namnde mannen Per Olsson i Ömma biträdd av~~

~~Vägmästaren Alfred Persson.~~

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avloppets upptagande och förslagets utförande i övrigt, som framkommit vid den förrättade sammanträde samt framhöll till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingsutlåtande	såsom Bil. A.
Kostnadsförslag	såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivning	såsom Bil. C.

§ 15.

Upgav förrättningsmannen utlåtande – se Bil. D med tillhörande underbilaga – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södermanlands Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 18.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp nr 1 per Vollerö,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om statsbidrag;

att med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att kvittera och uppbära de penningemedel, som kunna bliva beviljade till företaget;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 19.

Nils Persson förklarade, att han önskade erhålla även lån från statens avdikningslåne-fond.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att han inhämtat yttrande från vägingenjören jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 52 §

vattenlagen (Bil. 7-9).

§ 21.

Till styresman och arbetsledare utsägs lanthushållaren Nils Persson, Tollstorp nr 1 per Vollsjö.

§ 22.

Överlämnades till Nils Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Innegående efter dagsvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tollstorp den 28 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Härtill: Nils Persson

Rune Nilsson

Ek.d.litt. C n:r 49/259 - 1938.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 15/10 1938.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 oktober 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Erhållet d. 27/10 -38.

Ek. D. litt. ~ nr 49/259 år 1938.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 14. OKT. 1938
Landskansliet.

13.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Härmed får undertecknad vördsamt anhålla om Länsstyrelsen vill ordna om ingenjör åt mig i o för reglering av såväl frammande som eget vatten genom mina ägor.

Östraby s:n
Tollstorps fpr. Vollsjö den 21. sept. 1938

Nils Persson.
Jordbrukare
Vejbystad

Överläggning å morgon?
Delägare?

2806 fm

Tollstorp N:1 pr Vollsjö den 28 sept. 1938

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

~~Hos Landskontoret Carnegie Gumaeliusgatan Malmö.~~

Härmed får undertecknad anmäla att den förrättning jag begärt lantmäteriingenjör Lilli gällande ett afstyckningsärende som nu går öppet genom mina ägor och är nedan nämnde personer berörda af densamma.

Tollstorp	N:1	Axel Persson	tel. 20 Bjärlöv på. Vollsjö
Bjälkhult	N:1	August Persson	" "
"	N:1	Olof Osterlin	" "
"	N:1	Sten Pålsson	Arrendator i Bjälkhult
"	N:1	Kryggeriet	" "
"	N:1	Ingrid Nilsson	" "

Tecknar med högaktning

som ovan

Nils Persson

a) Arrendator Sten Pålsson jr. i Vollsjö Rote Bjälkhult 11

Axel Persson bor c:a 200 m från Nils Persson

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/10 1942. Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tollstorp nr 1 m.fl. hemman i Östraby och Frenninge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp nr 1, torsdagen den 15 oktober 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Tollstorp n:ris 1 och 2 i Östraby socken samt Bjälkhult nr 1 i Frenninge socken, dels allmänna vägen Östraby-Långaröd i Färs vägdistrikt.

Malmö den 23 september 1942.

Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östraby församling söndagen den 27 sept. 1942 betygar:

Nils Erik Fornell
p.adj.

ÖSTRABY PASTORSÄMBETE
Kyrkb. Askeröd

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Östraby församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 5/10 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tollstorp nr 1 m.fl. hemman i Östraby och Frenninge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp nr 1, torsdagen den 15 oktober 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Tollstorp n:ris 1 och 2 i Östraby socken samt Bjälkhult nr 1 i Frenninge socken, dels allmänna vägen Östraby-Långaröd i Fürs vägdistrikt.

Malmö den 23 september 1942.

Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Frenninge församling söndagen den 27 september 1942 bevittnar:

Albin Pahlberg
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Frenninge församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4. 17.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Tollstorp nr 1 m.fl. hemman i Östraby och Frenninge socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Östraby församling /kungörelse,	Västerstad, Askeröd	23/9 1942
Pastorsämbetet i Frenninge församling, /kungörelse/,	Frenninge, Vollsjö	" "
√ Lantbr. Hjalmar Olsson /god man/,	Starrarp, "	" "
√ Nämndemannen Folke Svensson /god man/, Östraby boställe,	Östraby	" "
√ Lantbr. Nils Persson, Tollstorp nr 1,	Vollsjö	25/9 "
√ Fru Ida Linde, Tollstorp nr 1,	"	" "
Fru Elna Jönsson, Tollstorp nr 2,	Östraby	" "
Lantbr. Johan Göransson, Tollstorp,	"	" "
Lantbr. Olof Kristensson, Tollstorp nr 1,	"	" "
√ Lantbr. Axel Persson, Tollstorp nr 1,	Vollsjö	" "
Lantbr. Nils Gösta Olofsson, Bjälkhult nr 1,	"	" "
Lantbr. Elof Österlin, Bjälkhult nr 1,	"	" "
Snickaren August Persson, Bjälkhult nr 1,	"	" "
Handl. Sten Paulsson, Bjälkhult nr 1,	"	" "
Fru Ingrid Nilsson, Bjälkhult nr 1,	"	" "
Lantbr. Gunnar Frid, Bjälkhult nr 1,	"	" "
Färs vägstyrelse,	Sjöbo	" "
Lantbr. Nils Åkesson, Bjälkhult,	Vollsjö	" "
√ Lantbr. Per Olsson, Killeröd, /såsom förmyndare för Anna-Lisa Gunborg Linde/	Östraby	" "

Malmö den 25 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Hamilton

Statens lantbruksingeniör.

Skiftesgodemannen Folke Svensson, Östraby bost.,	Östraby	1/11 1942
Skiftesgodemannen Hjalmar Olsson, Starrarp,	Vollsjö	" "
Lantbr. Nils Persson, Tollstorp nr 1,	"	" "
Fru Ida Linde, Tollstorp nr 1,	"	" "
Lantbr. Axel Persson, Tollstorp nr 1,	"	" "
Lantbr. Per Olsson, Killaröd,	Östraby	" "
Ordf. i Färs vägstyrelse, Nämndemannen Per Olsson, Omma,	Sjöbo	" "

Malmö den 1 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Adolf Nilsson Tollstorp att föra undertecknads talan och skriva min namnteckning, vid synesförättningen angående fastläggning av mark hos Nils Persson nr 1 Tollstorp den 15 Oktober 1942

Killeröd den 11 Oktober 1942

Per Olsson
(Fademan för Anna-Lisa Gunborg Linde)

Bevittnas

Gotthard Nilsson
Killeröd

Anton Andersson
Killeröd Östraby

Bil. b

Härmed befullmäktigar jag min granne Lantbrukaren Olof Ostrlin Bjälkhult m:1 att föra min talan å sammanträdet hos Lantbr. Nils Persson Tollstorp m:1 Tisdagen den 15 Okt. 1942 kl. 10.

För min del är jag inte alls intresserad av företagets genomförande, då ifrågavarande mark, på mina ägor inte alls lider av för högt vattenstånd.

Bjälkhult den 10 Oktober 1942.

Göste Olofsson

Bevittnas:

Nils Ericsson
Bjälkhult.

Nils Nilsson
Tattarp.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 • MALMÖ

Bil. I. 20.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942" i Östraby socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 4 instundande november. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen från Östraby till Långaröd eller vägen litt. 16 i Färs vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 28 oktober 1942.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

1/ Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 2 och 1+92 korsar det nya avloppet allmänna vägen från Östraby till Långaröd eller vägen litt. 16 i Färs vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 6500 m OMO om vägaknäet i Östraby och ca 350 m V om vägaknäet i Bjälkhult, finnes nu en trumma av 38 cm /15"/ cementrör. Vägbanan ligger på medelhöjden + 12,55 m, trummans botten på medelhöjden + 10,65 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 11,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 30 cm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 10,20 m vid nerströmssidan eller vid sektionen 2 och på höjden + 10,21 m vid uppströmssidan eller vid sektionen 1+92. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa böra utföras av 60 cm /24"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Färs vägdistrikt. Vägdistriktet äger att genom sin vägstyrelse underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Malmö den 28 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 9.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 4/18/42

Till

Statens lantbruksingenjör,
Claes-Henric Wallér,
Malmö.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 oktober 1942 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i utlåtande av den 28 oktober 1942 angående dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 29 oktober 1942.

W. Mannerfelt.

Bil. 10 2.

Har översänts till:

Skiftesgodemannen Folke Svensson, Östraby bost., Östraby
" " Hjalmar Olsson, Starrarp, Vollsjö.
Lantbr. Nils Persson, Tollstorp nr 1, Vollsjö.
Fru Ida Linde, Tollstorp nr 1, Vollsjö.
Lantbr. Axel Persson, Tollstorp nr 1, Vollsjö.
Lantbr. Per Olsson, Killaröd, Östrabyä
Ordf. i Färs vägstyrelse,
Nämndemannen Per Olsson, Omma, Sjöbo.

[illegible] för [illegible] till Voll[illegible]
[illegible] i [illegible] socken.

[illegible] ansökningshandlingar [illegible] att [illegible] hos [illegible]
[illegible], Vollstorp nr 2, [illegible] den 24 november 1942 kl. 10, till vilken [illegible] kallas att tillvarataga sin[illegible] personligen eller genom laglig[illegible] ombud.

Malmö den 1 november 1942.

På tjänstens vägnar:

O.H. Waller.

Stadens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Kärndförteckning.

Hemmansdal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
11/512	ar 1/10		Östraby o:m. Tollstorp.	Ida Linde	
				Åker, vm p. Lådlera	1
				Gd do	2
				Summa	
11/1516	1/11		Tollstorp	Nils Persson	
				Åker, vm p. Lådlera	3
				Gd do	4
				Gd do	5
				Gd do	6
				Gd do	7
				Gd do	8
				Gd do	9
				Gd do	10
				Gd vpl. ej lötmad	11
				Summa	
11/336	ar 1/6		Tollstorp	Nils Persson	
				Åker, vpl. ej lötmad	12
				Gd vm p. Lådlera	13
				Gd do	14
				Gd do	15
				Gd do	16
				Gd do	17
				Gd do	18
				Torp o. trädg. do	19
				Åker do	20
				Gd do	21
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							1100	121	=	2000	220	=	900	99	=
	06							1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	17								187	=		340	=		153	=
7	09	v						1300	117	-	2000	180	-	1700	63	-
7	06	v						1300	78	-	2000	120	=	1700	42	-
9	18	v						1700	306	-	2000	360	-	3000	54	=
7	16	v						1300	208	-	2000	320	-	1700	112	-
5	30	v						900	270	-	2000	600	-	11100	330	-
5	12	v						900	108	-	2000	240	-	11100	132	=
7	06	v						1300	78	-	2000	120	-	1700	42	-
9	05	v						1700	85	-	2000	100	-	3000	15	=
							06	—	—	=	—	—	=	—	—	=
1	02						06		1250	-		2040	=		790	-
							12	—	—	-	—	—	-	—	—	=
9	03	v						1700	51	-	2000	60	-	3000	9	-
7	03	v						1300	39	-	2000	60	-	1700	21	-
5	04	v						900	36	-	2000	80	-	11100	444	-
5	33	v						900	297	-	2000	660	-	11100	363	-
7	20	v						1300	260	-	2000	400	-	1700	140	-
9	34	v						1700	578	-	2000	680	-	3000	102	-
9	05	v						1700	85	-	2000	100	-	3000	15	-
9	15	v						1700	255	=	2000	300	-	3000	45	-
7	24	v						1300	312	-	2000	480	-	1700	168	-
1	11						12		1913	-		2820	-		907	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker m. p. lättera	22
				do	23
				do	24
				do	25
				do	26
				Vinner ej täfnad	
				Summa	
20/336	1/6		Tollstorp	Axel Persson	
				Betesmark, vinner ej täfnad	27
				do m. p. lättera	28
				do do	29
				do do	30
				do do	31
				do do	32
				do do	33
				do vinner ej täfnad	34
				do do	35
				do do	36
				do m. p. lättera	37
				do do	38
				Summa	
1/16	1		Tollstorp	Axel Persson	
				Betesmark, m. p. lättera	39
				Vattenhåla, inrym.	40
				Betesmark m. p. lättera	41
				do do	42
				do do	43
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	11						12		1913	—		2820	—		907	—
	64	v						900	576	—	2000	1280	—	1100	704	—
	03	v						900	27	—	2000	60	—	1100	33	—
	04	v						1300	52	—	2000	80	—	1700	28	—
	03	v						1700	51	—	2000	60	—	3300	9	—
							22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	15						34		2619	—		4300	—		1681	—
							10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					08			350	28	—	400	32	—	50	4	—
					70			350	245	—	400	280	—	50	35	—
					24			350	84	—	400	96	—	50	12	—
					36			300	108	—	400	144	—	100	36	—
					26			300	78	—	400	104	—	100	26	—
					08			350	28	—	400	32	—	50	4	—
							38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					10			350	35	—	400	40	—	50	5	—
					08			300	24	—	400	32	—	100	8	—
				1	90		86		630	—		760	—		130	—
					02			300	6	—	400	8	—	100	2	—
							06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					24			350	84	—	400	96	—	50	12	—
					36			100	36	—	200 400	72	—	100	36	—
					08			300	24	—	400	32	—	400	8	—
					70		06		150	—		208	—		58	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Bretesmark m. p. Lådtera	44
				do	45
				Summa	
				Kammardrag:	
			Östadebygd s. ägn.		
1/512	ao 1/10		Tvetabygd	Ida Linder	1, 2
1/256	1/11		do	Nils Persson	3-11
1/336	ao 1/16		do	Dens.	12-26
29/336	ao 1/16		do	Axel Persson	27-38
1/16	1/11		do	Dens.	39-45
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				70		06			150	—		208	—		58	—
				04				350	14	—	400	16	—	50	2	—
				12				350	42	—	400	48	—	50	6	—
				86		06			206	—		272	—		66	—
	17								187	—		340	—		153	—
1	02					06			1250	—		2040	—		790	—
2	15					34			2619	—		4300	—		1681	—
				1	90	86			630	—		760	—		130	—
					86	06			206	—		272	—		66	—
3	34			2	76	1	32		4892	—		7712	—		2820	—

Tollstorp den 28 november 1942.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Palm
Statens lantbruksingenjör.
Hjalmar Olsson
Hilding Svensson
Ruda utsäde

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Påfartsstrecken A-B.								
B-2+55	45	Uppforsling av det								
		invarande stensatta								
		diket	m	45	0.20	9	—			
2+55 –	32	Inklädning av cement-								
– 2+23		rör, 9"	m	32	3.30	105	60			
		schaktning, stampning,								
		nedläggning och åter-								
		fyllning	m	32	2.50	80	—			
2+23 =	23	Inklädning av cement-								
– 2		rör, 9"	m	23	3.30	75	90			
		schaktning, stampning,								
		nedläggning och åter-								
		fyllning	m	23	3.50	80	50			
2 – 1+92	8	Nedmontering av trum-								
		mor för allm. vägen								
		Östraby – Långarod								
		efter vägen ca 16								
		m söder vägcentrum.								
		Arbetet skall ut-								
		föras av vägdistrik-								
		tet, som därvid								
		äger bestämma, dels								
		att trummans ej för								
		flyttbara delar mindre								
		än ca 300 kg (12 st.),								
		dels att trummans								
		inre underkant skall								
		ligga på höjden								
		+ 90.20 m				—	—			
Öfv.	108	Överföres				351	—			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0+00	108	Överföring			351	=				
1+92 – 0+94	98	Inköp av cement- rör 9"	m	98	3.30	323	40			
		Schaktning, stampning, rörläggning och återfyllning	m	98	2.25	220	50			
0+94 – 0+50	44	Inköp av cement- rör 9"	m	44	3.30	145	20			
		Schaktning, stampning, rörläggning och återfyllning	m	44	2.25	99	–			
0+50 – 0	50	Inköp av cement- rör 9"	m	50	3.30	165	–			
		Schaktning, stampning, rörläggning och återfyllning	m	50	2.75	137	50	1441	60	
Tills:	308	meter.								
Öppnande av rörledningen vid rör 2+50			st.	1	60.–	60	–			
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingen mellan rör vid 2+93, 1+50, 0+94 och 0+50			st.	4	60.–	240	–			
Brunn med 24" inre diameter, kopplingen vinkig för dagvatten av 9" rör mellan vid 0			st.	1	80.–	80	–			
Avstängningskranar vid den nya vägbrunnen mellan rören vid sektionerna 2 och 1+92. Kranar av vägkvalitet			st.	2	—	—	380	–		
För ofvanstående jobb arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							378	40	2400	–
					Summa Kostnad				2400	–

Kmh. 7/11 12. Pdv.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Tollstorp den 28 november 1942.
Å tjänstens vägnar:
L. A. Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA

Arbetsbeskrivning. Bil. 6.

Grävningstabell

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Diket sträckan A-B.				
3	=	0.80				9.67 4:1000		Uppmurning av nya öppna diket mellan 3 och 2+55.
2+55	45	1.-				9.85		
2+55	—	0.90				9.95		9" cementrör mellan 2+55 och 2
2+50	5	0.90				6:1000		samt mellan 1+92 och 0.
2+23	27	1.40				10.15		
2	23	1.95				10.20		Trumma av 30 cm (12") rör mellan
1+92	8	1.55				10.21 2:1000		2 och 1+92.
1+50	42	1.25				10.30		
1	50	1.35				2:1000		
0+50	50	1.40						
0	50	1.30				10.60		Fråplikt åker och järnvägsbanvall jordfast efter 2 m. Om fråpligan mellan Nils Persons och Axel Nystrom fastigheter 4 m N om diket, belägen på höjden +12.- nn.
Sma	300	meter						

Dikningsföretaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande är att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid upprensning av den öppna dikessträckan skola uppläggas utmed det nya avloppets kanter och med minst 0,80 m frikant.

2/ Ommurningen vid avvägningspunkten 2+55 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 och i övrigt enligt den typritning, som upprättats.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Möjligen överblivna massor skola uppläggas i sträng ovanför rörledningen.

8/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren men utföras av entreprenören, därest jordägaren därom gör framställning.

12/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med 0,5 m försänkning samt förses med hållbart lock av armerad betong.

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14/ Brunnar, som ligga i rågångar och krökar liksom även brunnar med flera än två kopplingar, skola utföras såsom öppna brunnar och uppdragas till 30 cm höjd över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar. Beträffande de täckta brunnarna föreskrives, att täckningen över brunnen eller avståndet mellan markytan och brunnslocket skall vara minst 0,50 m.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. I den mån det är möjligt skola sådana äldre ledningar kvarligga och kopplas till de nya brunnarna.

19/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Tollstorp den 28 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Tollstorp nr 1 i Östraby socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 oktober 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Tollstorp nr 1 i Östraby socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör endast marker tillhörande hemmanet Tollstorp nr 1.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget ca 6 km ONO om Östraby kyrka och ca 7 km NO om Bjärsjölagårds järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike, som från avvägningspunkten 0 avleder vattnet väster ut. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran /förrättningsprotokollets § 5/ upprättat förslag till utförandet av nytt avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erford-

ras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande avlopp upptagas.

Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 3 öster ut till avvägningspunkten 0.

a/ Delsträckan 3 - 2+55 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket.

b/ Delsträckan 2+55 - 2+23 skall upptagas i nyskärning till vänster om det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör.

c/ Delsträckan 2+23 - 2 skall upptagas i nyskärning till höger om det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör.

d/ Mellan avvägningspunkterna 2 och 1+92 skall Färs vägdistrikt utföra en ny trumma för allmänna vägen Östraby-Långaröd eller vägen nr 16 i Färs vägdistrikt. Vägdistriktet äger därvid beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm /12"/, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 10,20 m.

e/ Delsträckan 1+92 - 0+50 skall förläggas i högra sidan av det nuvarande floddiket och så långt till höger, att stensättningen i vänstra sidan kan bibehållas. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 9" cementrör.

f/ Delsträckan 0+50 - 0 skall upptagas i nyskärning till höger om det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrön.

Vid avvägningspunkten 2+55 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas, för den händelse detta erfordras

till förstärkning av slänterna. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 2+23, 1+50, 0+94, 0+50 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid den nya vägtrummans ändpunkter eller vid avvägningspunkterna 2 och 1+92 skall vägdistriktet utföra anslutningsbrunnar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta ledningarnas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profilritning har upprättats över avloppet och i viss utsträckning även sektionsritningar. Ritningarna angiva avloppets djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid

normala flöden uppgår till högst 0,9 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till stånd, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

1/ Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 2 och 1+92 korsar det nya avloppet allmänna vägen från Östraby till Långaröd eller vägen nr 16 i Färs vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 6500 m ONO om vägskälet i Östraby och ca 350 m V om vägskälet i Bjälkhult, finnes nu en trumma av 38 cm /15"/ cementrör. Vägbanan ligger på medelhöjden + 12,55 m, trummans botten på medelhöjden + 10,65 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 11,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 30 cm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 10,20 m vid nerströmssidan eller vid sektionen 2 och på höjden + 10,21 m vid uppströmssidan eller vid sektionen 1+92. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa böra utföras av 60 cm /24"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnar-

na. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Färs vägdistrikt. Vägdistriktet äger att genom sin vägstyrelse underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Då den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880, skall den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar utföras av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida.

2/ Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya brunnar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse rörande ersättningsbeloppets storlek ej träffas mellan vederbörande jordägare och företagets styresman, skall detsamma bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 2200,- kr. Kostnadsförslag har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskriften i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse pris å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden - tillsammans 2820,- kr - motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar, varför kostnaderna skola fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.

Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det nu planlagda dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ Avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan samt i mom. 2 här ovan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, [illegible] skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall ej utgå.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Tollstorp den 28 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

O. B. Mellé.

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Olsson Karl G. Jansson

Rune Nilsson

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östraby s:n.				
1/512	ang 10		Tollstorp 1/4 Ida Linde		1,2.	187.-	340.-
1/256	" 11		Dº " Nils Perssons	ang.	3-11	1950.-	2040.-
1/336	ang 16		Dº " Hans.	"	12-26	2619.-	4300.-
28/336	ang 14		Dº " Axel Persson		27-38	630.-	760.-
1/16	" 14		Dº " Hans.		39-45	206.-	272.-
					Summa	4892.-	7712.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
153.-						119.37	5.426	26.85	
790.-						616.31	28.014	138.64	
1681.-						1311.42	59.610	295.-	
130.-						101.42	4.610	22.81	
66.-						51.48	2.340	11.58	
2820.-						2200.-	100.-	494.88	

Tollstorp den 28 november 1942.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nilén.
Statens kulturtekniker.

Hjalmar Olsson
Ruda mån.

Fack. J. Simonsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget Tallstorp nr 1 av år 1942 i r

socken och Skaldmohus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	26	0,50			13	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1.7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15 ar ... st.	23	0.17	3	91		
		... har	3,34	1.06	3	54		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar ... st.	14	0.14	1	96		
		... har	2.76	0.74	2	04		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar ... st.	8	0.05		40		
		... har	1.32	0.78	1	03		
1939 23/10		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 å stycken dikningsområdet ... dag	1	12.-	12	=		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			11	—		
		övriga regalark blad ... st.					33	98
		Överföres ...					46	98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 98
1939 25-26/10		***Avvägning:***				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	2	12,00	24 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal → 4 *punkter pr har* ..... *har*	7.42	0.50	3 71	
		avvägda punkter ..... *st.*	300	0.03	9 =	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		36 71
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 16 *ar,* ..... *st.*	45	0.05	2 25	
		..... *har*	7.42	0.10	0 74	2 99
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	45	0,04		1 80
1942 15/10		***Markvärdering:***				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	37	0,12	4 44	1 88
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	1	3.50		3 50
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,.*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	13	0.14	1 82	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	5	0.25	1 25	
		..... „				
		..... „				3 07
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
1939 30/10 1/11		***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		~~Beräkningar av nederbördsområdet~~ *för vattenområdets areal* ..... ~~dagar~~	1	12.- 0,02	12 —	
		~~Uppritning av nederbördskarta m. m.~~ ..... *dagar*	1	12,00	12 =	26 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		10 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	8	0,03	24	1 24
		Överföres				154 17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 17
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor *st.*	2	2,00	4 —	7 =
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp Rörsta dikesbr. „		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 20	6 20
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	300	0,01		3 —
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	11	3,00		33 —
19/12 15, 16, 18/10, 19, 21/11		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00		24 —
1939 9 31/10		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2, fastighetsbildningsmyndighetens åtgärder* „	1	12,00		12 —
1939 9 2/11		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	2	12,00		24 =
1942 25/11		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunnar* 2 st. „	2/3	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/3	12,00	4 —	12 —
		slamficka „		12,00		
1942 28/10		Utredning å patriarkat enl. 28.10.52				12 —
		Löser för: *Summa kronor*				294 87
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* *bladet*			7 —	
		övriga *regalark* *blad* *st.*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 16 *ar ägofigurer* *st.*	45	0.07	3 15	
		har	7.42	0.14	1 04	
		Överföres			11 19	

54.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 05	
		3) insättning av höjdlägestal	300 st.	0,02	6 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	8	0,05	40	20 39
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	0,7 „	3	2 10	
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befinligt avlopp	0,3 „	6	1 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 07	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st.	3,00	3 –	9 97
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	½ „	12,00		6 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	47 sid.	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 1 –
		Summa kronor				66 21
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistning av ritningar~~ avskrifter			5 =	25 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64 =	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			44 =	
						408 –
		Summa kronor				133 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				294 87
		Lösen för kopior och avskrifter				66 21
		Övriga förrättningskostnader				133 80
		Summa kronor				494 88

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tåsa *häradsrätt.*

Tollstorp *den* 28 november *19* 42.

C. H. Mellé

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hjalmar Olsson

Hans G. Persson

Kronor 150. 88 *kvitteras:*

Tollstorp *den* 28 november *19* 42

C. H. Mellé

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Räkning

Tollstorp den 28 nov. 1942.

Tröskningsföretaget "Tollstorp nr 1 år 1942" Debet
till skiftesgodemannen Hjalmar Olsson, Stavarp.

1942.			
Okt.	15	Resa hemmet - Tollstorp - hemmet, 6 hem á 50 öre	3 —
		Dagtraktamente	10 —
Nov.	28	Ersättning lika med d. 15.10.	13 —
		Summa	26 —

Kvitteras:

Hjalmar Olsson

Räkning

Tollstorp den 28 nov. 1942.

Skjutningsföretaget Tollstorp nr 1 år 1942 / Debet

till skjutsegodemannen Folke Svensson, Östraby kvst.

1942.				
Okt.	15	Resa hemmet - Tollstorp - hemmet, 18 km. á 50 öre	9	—
		Dagtraktamente	10	—
Nov.	28	Ersättning lika med d. 15/10	19	—
		Kronor	38	—

Kvittera:

Folke Svensson

57.

№ 17030 * (B

MALMÖ den 25 sepyt 1942.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1942 Sept.	25	Kungörelse: Syneförrättning Tollstorp 1	1	80	26	20	80

Kvitteras den 26/9-42
E.-B. Skånska Dagbladet

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader.*

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 25 sept. 1942.

Malmö den 25 sept. 1942
Skånska Dagbladet

E. Roos

J. Jönsson

1941

Lantbruksstyrelsen

M 2*0733

6914

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

SÖDERBYGDENS
27 SEP. 1944
VATTENDOMSTOL

Avskrift.

Inl. till Svea Hovrätt den 24 JAN. 1945

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Tollstorp nr 1

av år 1942"

i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Forsman.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Tollstorp nr 1
av år 1942"
i Östraby socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942" i Östraby socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 6,- km ONO om Östraby kyrka och ca 7,- km NO om Bjärsjölagårds järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 28 november 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. I företaget ingår ombyggnad av trumma för allmänna vägen Östraby-Långaröd eller vägen nr 16 i Färs vägdistrikt. Yttrande har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägingenören i länet /bil. 7-9 till förrättningsprotokollet/

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 28 januari 1953. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 2?00,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen med 494,88 kr och kostnaderna för detta betänkande med 49,90 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 2744,78 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 28 november 1942 /bil. b/ hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. En delägare har därjämte förklarat, att han önskar komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande /förrättningsprotokollets § 19/. Förteckning över lånesökanden och honom tillhöriga fastigheter bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. d/.

Tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell bil. e utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1340,- kr från statens avdikningsanslag och 1230,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid syneförrättnings-sammanträdet den 28 november 1942	bil. b
Förteckning över lånesökanden och honom tillhöriga fastigheter	bil. c
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. d
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. e
Sammandrag av företagets kostnader	bil. f
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. g
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 28 november 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942" i Östraby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 april 1943.

Ex officio:
G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tollstorp nr 1 m.fl. hemman i Östraby och Frenninge socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 15 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hjalmar Olsson, Starrarp per Vollsjö och Folke Svensson, Östraby boställe per Östraby hos lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp nr 1, ...

. . . . . .

§ 18.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp nr 1 per Vollsjö;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om statsbidrag;

att med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att kvittera och uppbära de penningemedel, som kunna bliva beviljade till företaget;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 19.

Nils Persson förklarade, att han önskade erhålla även lån från statens avdikningslånefond.

. . . . . .

Tollstorp den 28 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Olsson. Folke G. Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942" i Östraby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Östraby socken.

1/336	mtl.	Tollstorp	av	1 6/11	Nils Persson,
1/256	"	"		1	Dens.

Malmö i april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. d.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	3.34	2.76	6.10	2744.78	2820.-	0.97
		Låneökandens andel.				
	3.17	-	3.17	2405.09	2471.-	

Malmö i april 1943.
C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Östraby socken.							
1/512	ar 1[10]		Tillstorp	Ida Linde		17				17
1/256	1[11]		Dº	Nils Persson	1	02			1	02
1/336	ar 1[6]		Dº	Dess.	2	15			2	15
20/336	ar 1[6]		Dº	Axel Persson			1	90	1	90
1/16	1[4]		Dº	Dess.				86		86
				Summa	3	34	2	76	6	10

Anm.

1) Söker ej lån.

Bil. e.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
153	–	119	37	26	85	2	71	148	93	0.97	48.95	72	90	–	–
790	–	616	31	138	64	13	98	768	93	"	"	376	39	392	54
1681	–	1311	42	295	–	29	74	1636	16	"	"	800	90	835	26
130	–	101	42	22	81	2	30	126	53	"	"	61	94	–	–
66	–	51	48	11	58	1	17	64	23	"	"	31	44	–	–
2820	–	2200	–	494	88	49	90	2744	78			1343	57	1227	80

Malmö i april 1943.
C. H. Walter
Statens kanalbyggnadsingenjör.

Bil. f.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad		2200.- kr
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	494.88 kr	
" " inträdningen ängående statsunderstöd m.m.	49.90 "	544.78 "
	Summa	2744.78 kr.

Malmö i april 1943.
L. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Till arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2744 kronor, 78 öre, varav i lånetagarens andel 2705 kronor, 9 öre.

Stockholm den 28 januari 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Persson

Avskriften, sid. 1-10, vidimeras

ex officio:
L. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget 'Tolkstorp om 1 av år 1942' i Östraby *socken och* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	26	0,50			13	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1.7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15 ar ... st.	23	0.17	3	91		
		... har	3.34	1.06	3	54		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar ... st.	14	0.14	1	96		
		... har	2.76	0.74	2	04		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar ... st.	8	0.05		40		
		... har	1.32	0.78	1	03		
1939 28/10		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 utöver dikningsområdet ... dag	1	12.-	12	–		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15 / < 10)						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad ... st.					33	98
		... Överföres					46	98

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					46	98
1939.		***Avvägning:***						
25-26/10		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	7.42	0.50	3	71		
		avvägda punkter ... *st.*	300	0.03	9	—		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *„*						
		avvägda punkter ... *„*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... *„*		5,00			36	71
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 16 *ar,* ... *st.*	45	0.05	2	25		
		... *har*	7.42	0.10	0	74	2	99
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	45	0,04			1	80
1942. 15/10		***Markvärdering:***						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	74	0,06	4	44		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	37	0,12	4	44	18	88
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ... *„*	1	3,50			3	50
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	13	0.14	1	82		
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	5	0.25	1	25		
		... *„*						
		... *„*					3	07
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00			3	—
1939. 30/10		***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		~~Rekognoscering av nederbördsområdet för vattenområdets areal~~ ... ~~dag~~ ~~kvm.²~~	1	12.- ~~0,02~~	12	—		
1/11		Uppritning av nederbördskarta m.m. ... *dagar*	1	12,00	12	—	26	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00			10	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	8	0,03		24	1	24
		Överföres					154	17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 17
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor *st.*	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp minsta arvode „		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 20	6 20
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	300	0,01		3 —
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	11	3,00		33 —
1942. 15/10, 16/10, 28/11		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* *dagar*	2	12,00		24 —
1939. 31/10		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* på fastställelsetalet ang. äganderätten „	1	12,00		12 —
1939. 2/11		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	2	12,00		24 —
1942. 25/9		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* 2 st. „	2/3	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/3	12,00	4 —	12 —
		slamficka „		12,00		
1942. 28/10		Utredning och skrivelser enl. T.S. 10:52				12 —
		Lösen för: *Summa kronor*				294 87
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 16 *ar ägofigurer* *st.*	45	0.07	3 15	
		har	7.42	0.14	1 04	
		Överföres			11 19	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			11	19		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	05		
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	300	0,02	6	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	8	0,05		40	20	19
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall *„*	0.7	3	2	10		
		nytt avlopp eller vall *„*						
		ändring av befinligt avlopp *„*	0.3	6	1	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3	07		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	1	3,00	3	–	9	97
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	1/2	12,00			6	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	47	0,55			25	85
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					66	21
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			20	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upphlåtring av ritningar~~ avskrifter			5	–	25	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			44	–		
							108	–
		Summa kronor					133	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					294	87
		Lösen för kopior och avskrifter					66	21
		Övriga förrättningskostnader					133	80
		Summa kronor					494	88

Den, som icke åtnöjes med ~~denna~~ räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fars *häradsrätt.*

Tollstorp, *den* 28 november *19* 42.

C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevisa:

Hjalmar Olsson. Folke G. Svensson.

Kronor 450.88 *kvitteras:*

Tollstorp *den* 28 november *19* 42.

C. H. Waller.

PETTERSONSKA BOKTR.-EXTR. SVARA 392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *diknningsföretaget "Tolbstorp och 1 av år 1942"*
inom *Östraby* socken
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar å		
Betänkande, sid. *4 sammanfattning* "	*12*	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ *(4+2+5×0.50+4)* ~~à~~	*12*	*50*
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar *1/3* "	*4*	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor *16 á 0.55*	*8*	*80*
Inhäftning av handlingar; *2 häften betänkande*	*5*	—
Diariebevis, utlägg	*2*	*50*
Kommissionärsarvode	*1*	—
Transumt av protokoll	*1*	*10*
Förteckning över låntagarens fastigheter	*3*	—
Summa Kronor:	*49*	*90*

Den, som med denna räkning sig ~~icke~~ åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Förs* häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *5 maj* 19*43*.

C.H. Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
356933

gödn 52

212
44

DIARIE N:r 6914
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1944

M 2*0733

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 januari 1944 till dikningsföretaget Tollstorp nr 1 av år 1942 i Östraby socken av MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med ettusentrehundrafyrtio (1.340) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med ettusentvåhundratrettio (1.230) *) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/t underteckna, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage/a och förbinde/a ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

*) Lånet indraget enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 4/4 1944.

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tollstorp den 24 mars 1944

Nils Persson

Att Lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp m.fl. i Tollsjö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallén — Rut Wallén

Adress Malmö — Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE[illegible]
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1944

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag överlämna med-
delande, att jag erhållit fråga och
svar i 1230 fr. av Kungl. Lant-
bruksstyrelsen den 28 januari 1944
angående tillämpningsföreskrift
"Tollstorps nr 1 av år 1942" i Östra-
byns socken, Malmöhus län.

Tollstorps gård Jollejö den 2 mars 1944.

Nils Persson

2/2

Godk. 14/4 1944

6913

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1944

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Tollstorp nr 1 av år 1942" i Östraby socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 januari 1944.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1340.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1230.- ".

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Nils Persson, Tollstorp nr 1, Vollsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 24 mars 1944. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 27 mars 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

28/144

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Tollstorp nr 1 av år 1942" i Östraby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Östraby socken.

1/336	mtl.	Tollstorp	av 1 6/11	,	Nils Persson,
1/256	"	"	1	,	Dens.

Malmö i april 1943.

Statens lantbruksingeniör.

6914

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1944

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tollstorp nr 1 m.fl. hemman i Östraby och Frenninge socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 15 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hjalmar Olsson, Starrarp per Vollsjö och Folke Svensson, Östraby boställe per Östraby hos lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp nr 1 .....

.....

§ 18.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Persson, Tollstorp nr 1 per Vollsjö;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om statsbidrag;

att med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att kvittera och uppbära de penningmedel, som kunna bliva beviljade till företaget;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 19.

Nils Persson förklarade, att han önskade erhålla även lån från statens avdikningslånefond.

.....

Tollstorp den 28 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Olsson. Folke G. Svensson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér
