Ritning 1.
Plankarta.

Förslag i 8 blad
till

Dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp
av år 1948

i Hässlunda och Mörarps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1948 av

Statens lantbruksingenjör

Från Mörarp

Väg 2

Väg 80

Hässlunda s:n
Mörarps s:n

Fp. 1 + 42 m

Fp. 2 + 48 m

Fp. 3 + 50 m

Fp. 4 + 32,30 m

Fp. 5 + 32,95 m

Fp. 6 + 32,28 m

Fp. 7 + 32,10 m

Fp. 8 + 32,30 m

Fp. 9 + 31,80 m

Fp. 10 + 32,90 m

Till Tågarp

Konnexion mot Blad 2

Mörarps s:n
Hässlunda s:n

Hässlunda s:n

Mörarps s:n

Konektionslinje

Till Vallåkra

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Malmö i augusti 1948

Statens lantbruksingenjör.

NR.N: 001


Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

M 8-0926

2377-1

Dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948

Ritning 2.
Plankarta.

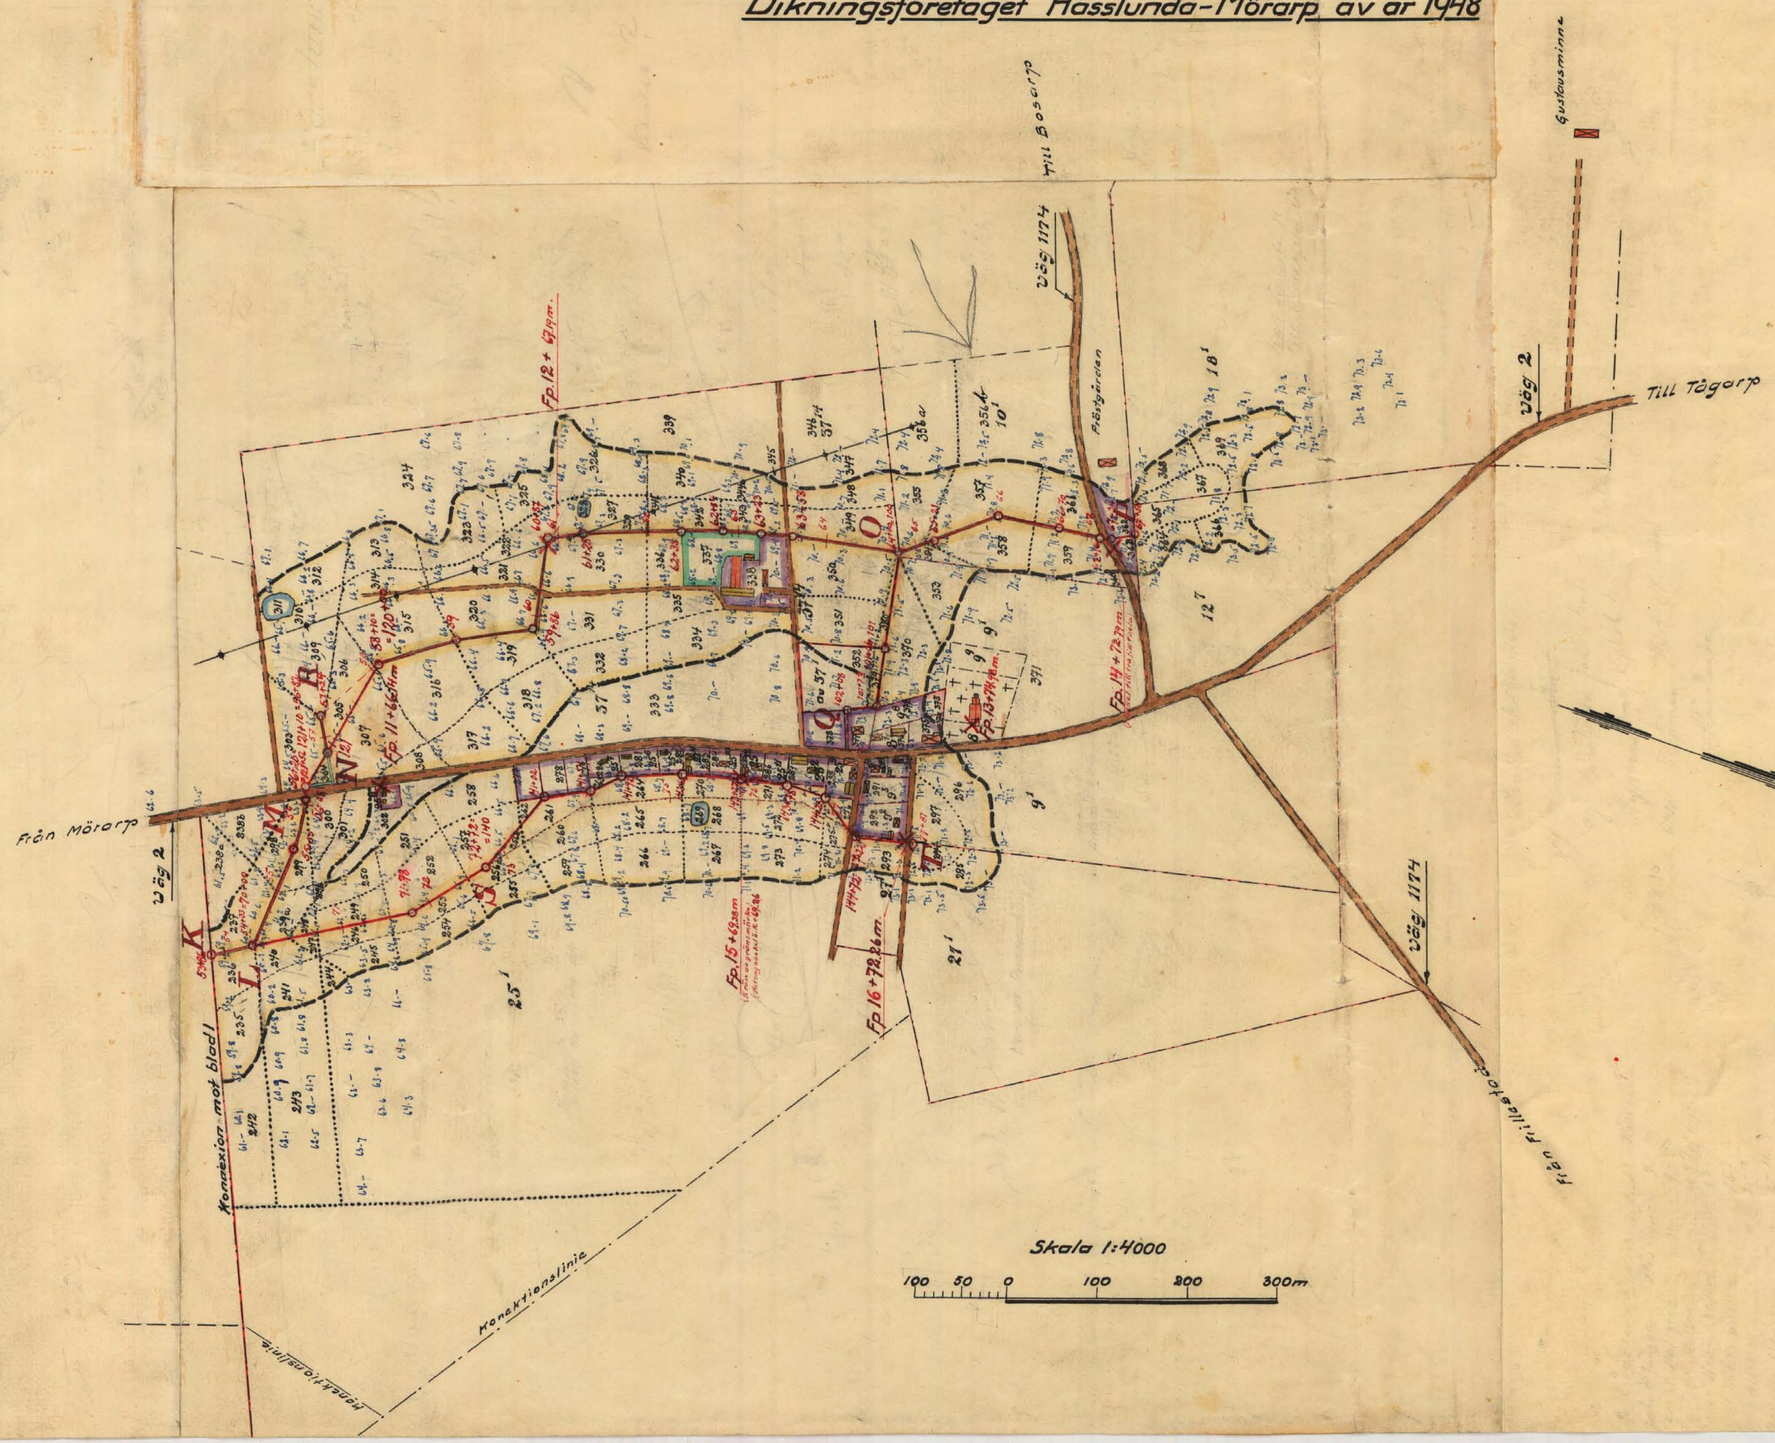

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m

Malmö i augusti 1948.


Statens Lantbruksingenjör.

RITN.N: 092
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
II 8-0926
2377-2

Ritning 3.

Dikningsföretaget Hässlunda – Mörarp av år 1948.

Profil- och sektionsritningar.

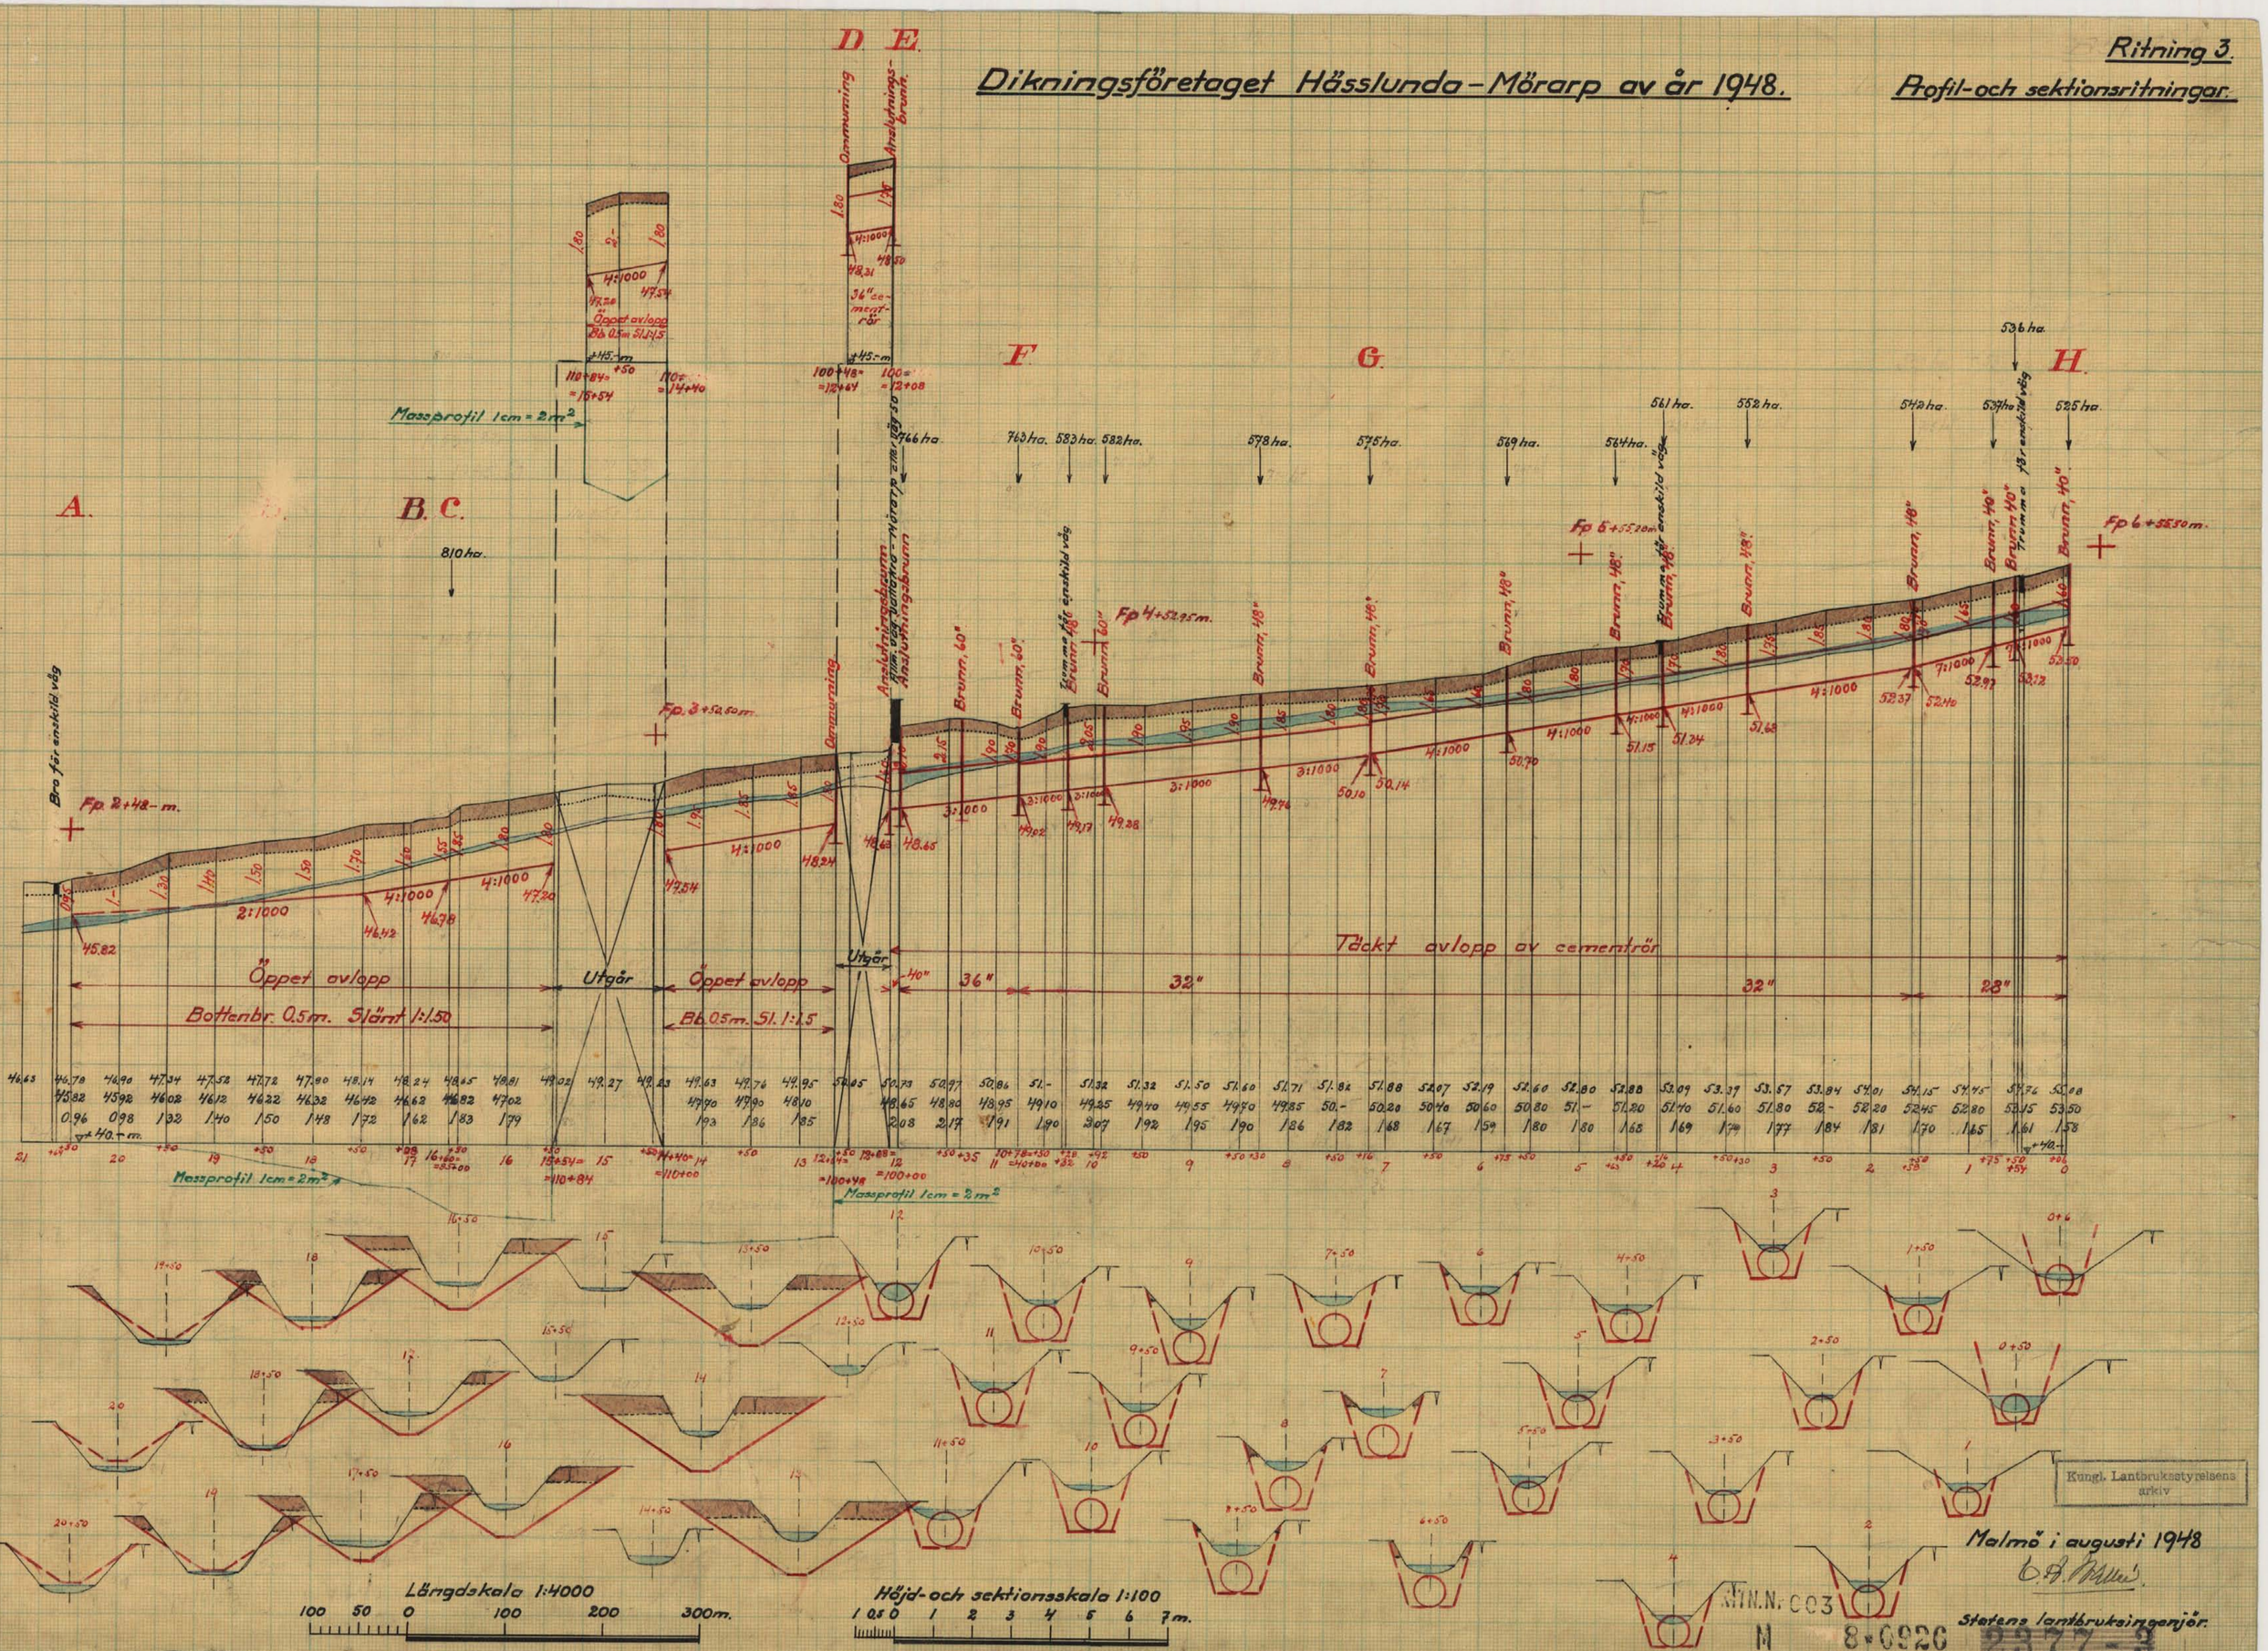

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
RIN.N: 003
M 8-0926
2377-3

Malmö i augusti 1948

C.A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Hässlunda–Mörarp av år 1948.

Ritning 4

Profil- och sektionsritningar.

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Malmö i augusti 1948

M 8-6926

Statens lantbruksingenjör.

NTN.N: 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

2377-4

Dikningsföretaget Hässlunda–Mörarp av år 1948.

M. N. O. P. Q. O. N. R.

Utgår

Täckt avlopp av cementrör

15" 12"

6" 8"

Bro för enskild väg mellan 12+43 och 12+96

Trumma för enskild väg mellan 63+53 och 63+58

Trumma för allm. väg Fjellestad–Hässlunda – Basarp eller väg 1174 mellan 67+16 och 67+24

Höjd- och sektionsskala 1:100

0 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Malmö i augusti 1948

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv


JTN.Nr 095

M 8-6926

2377-5

Dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948.

Profil- och sektionsritningar.

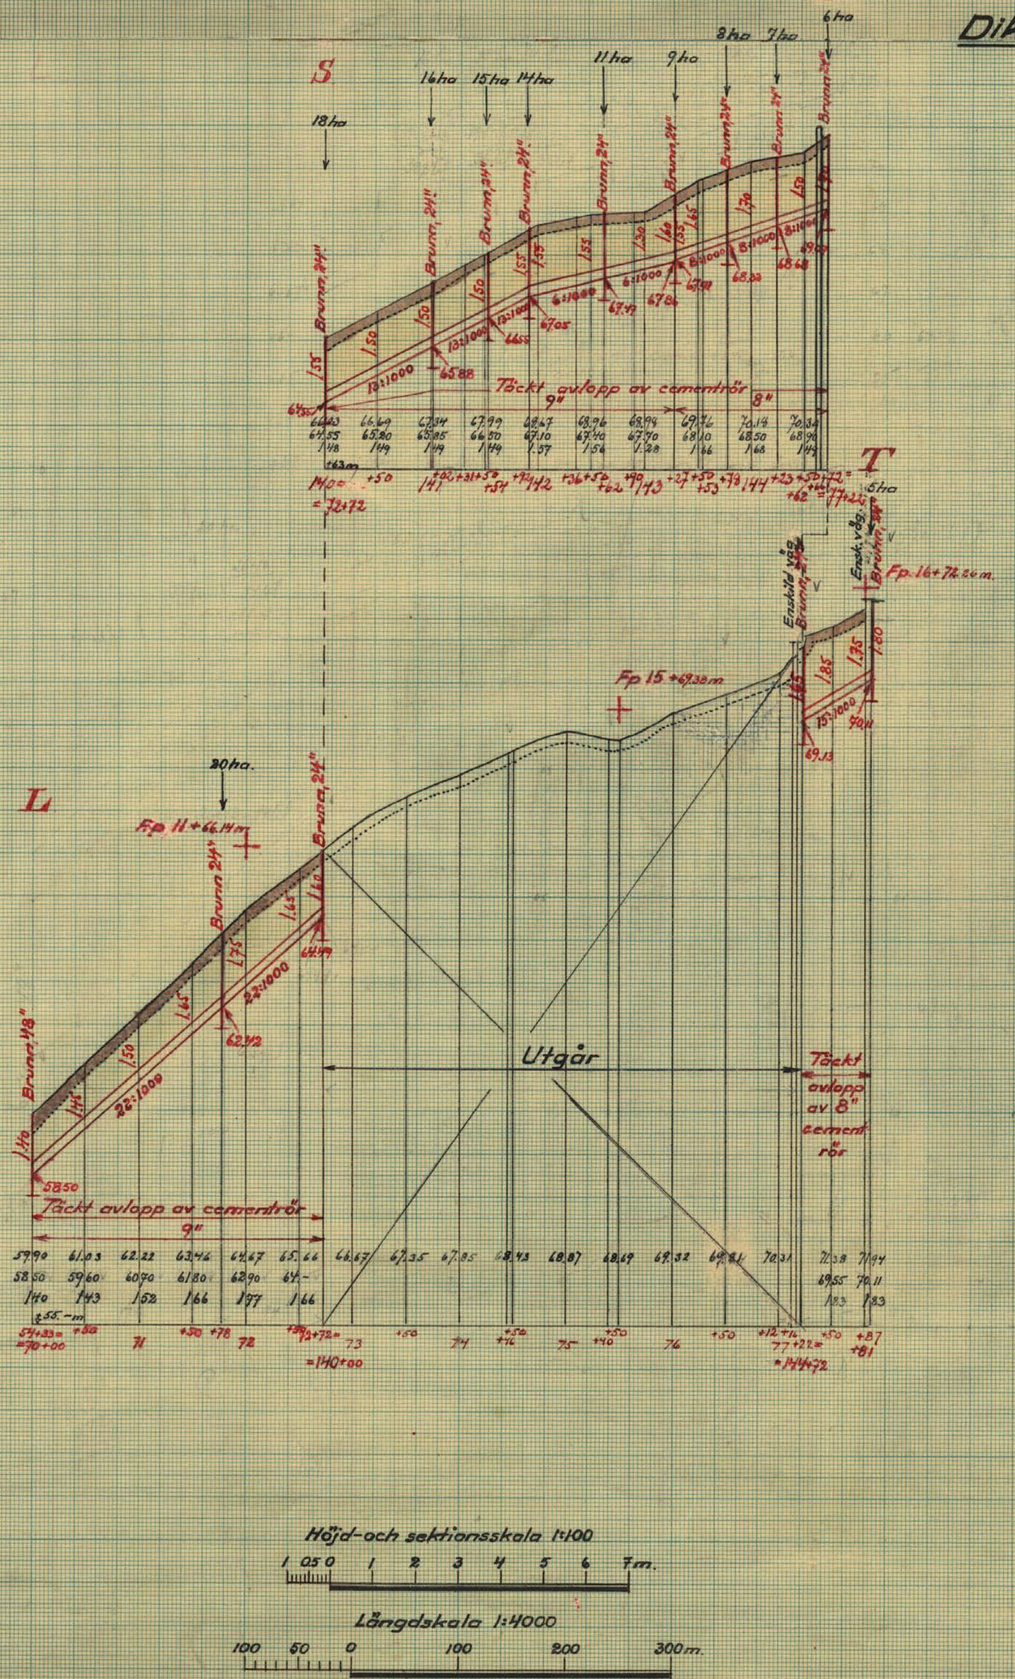

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i augusti 1948

Statens lantbruksingenjör.


STN. Nr 006
M 8-0926
2377-6


Dikningsföretaget Hässlunda–Mörarp av år 1948.


Ritning 7

Profil- och sektionsritningar.

Alternativt förslag

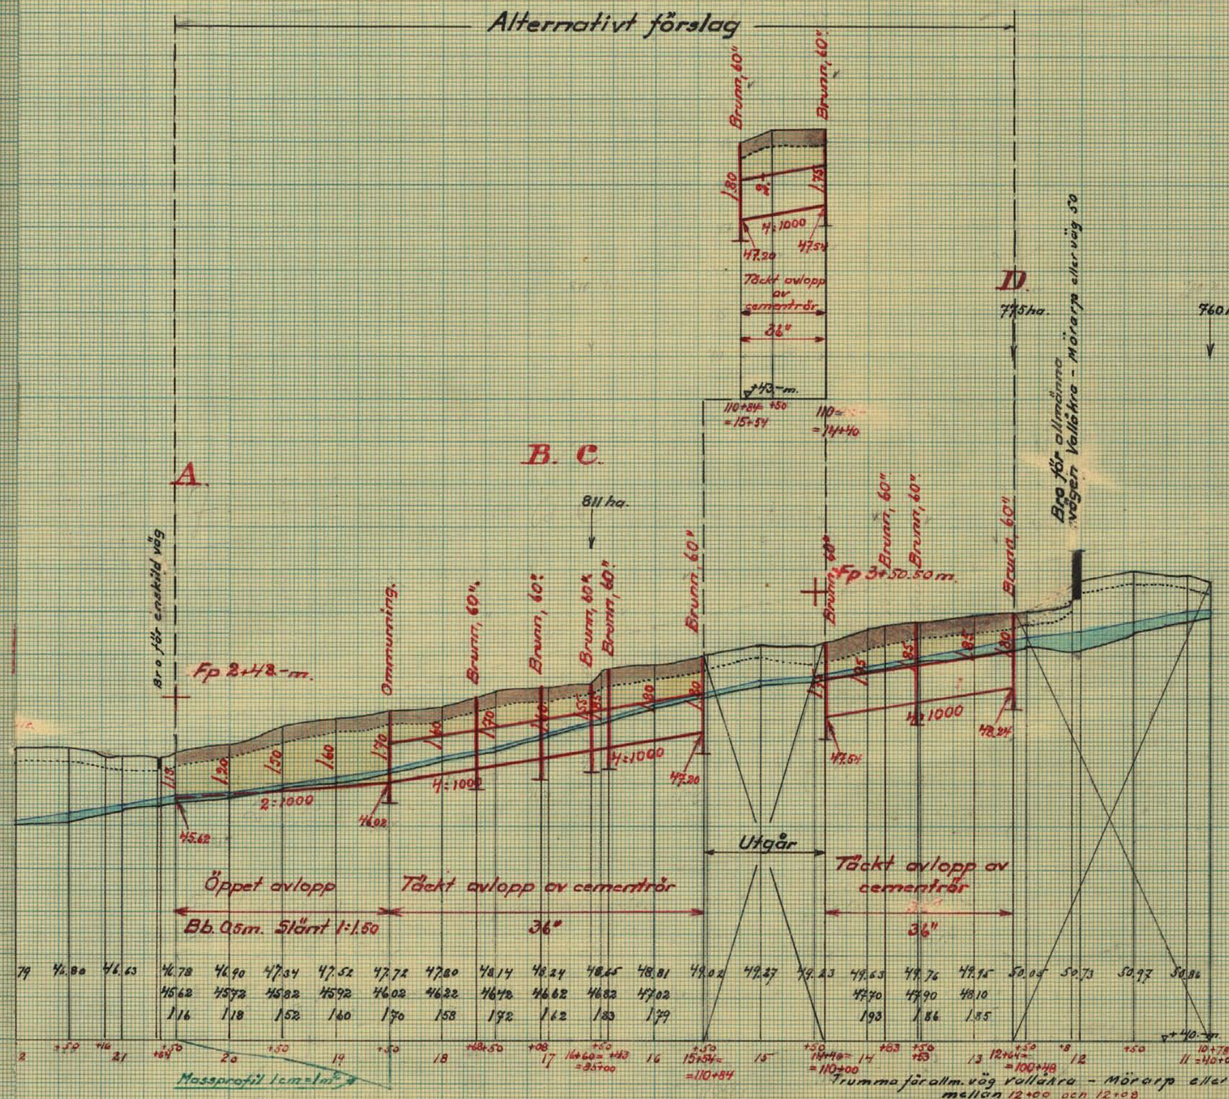

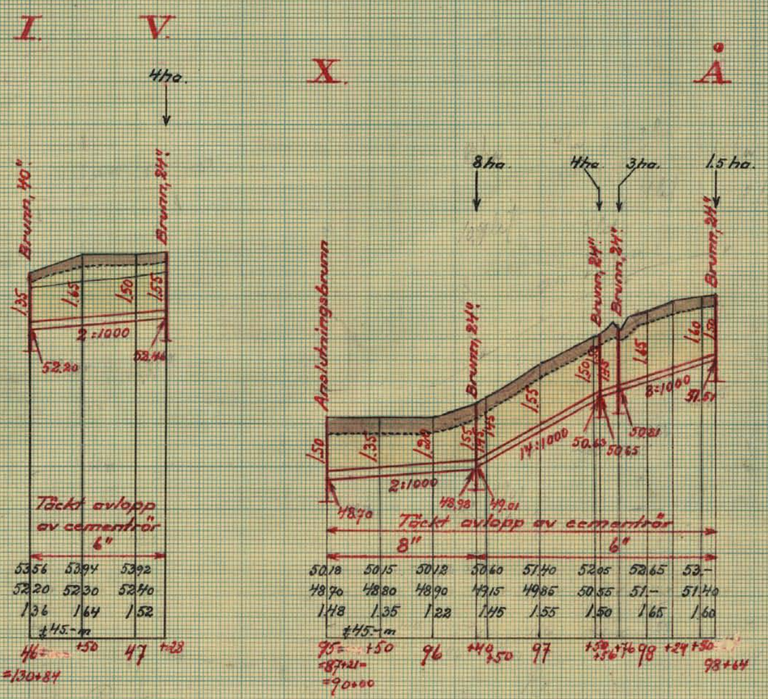

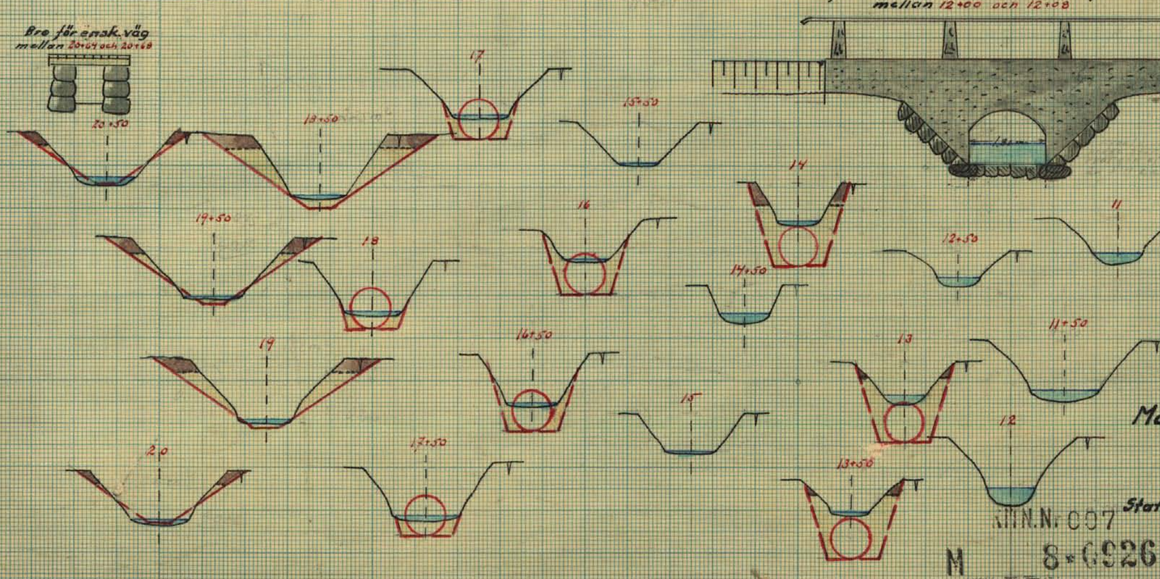

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i augusti 1948

Statens lantbruksingenjör.

M.N.N. 697


M 8·G926 2377-7

Dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948.

Typritningar för ommurning och brunnar.


Typritning för ommurning vid 12+64

Skala 1:50




Typritningar för brunnar med inre diameter av: 24" 32"


Skala 1:50



Typritning för brunnar med dagvatteninntag.

Skala 1:50

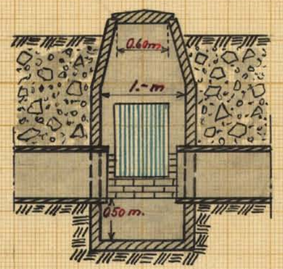





Typritningar för brunnar med inre diameter av:


40" 48"

Skala 1:50.

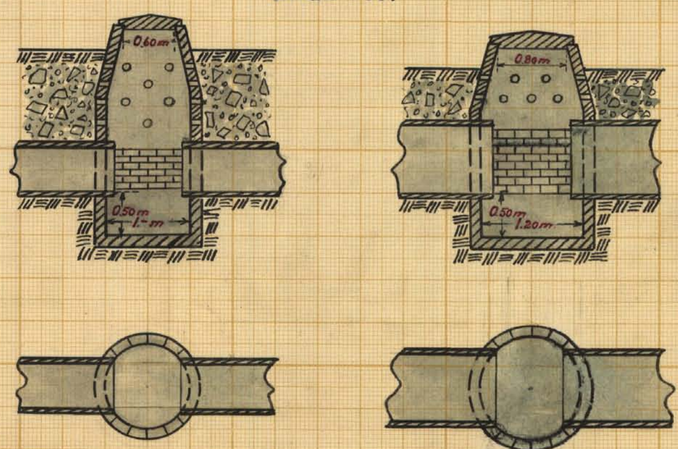



Skala 1:50



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Malmö i augusti 1948.

J.nr.N. 008

Statens lantbruksingenjör.

M 8-0926 2377-8

131

Ser. F XIII kornb
2377

M 8★0926

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
Hässlunda-Mörarp av år 1948
i Hässlunda och Mörarps socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1948.

1952
Landb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1949
DIARIE Nr
348

Protokoll, fört vid sammanträdet för syneförrättning enligt 10 kap. ratteulagen rörande förläggning av markerna till Hässlunda 25 och 37 m. fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län.

År 1948 den 17 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson i Bolchagen och Artur Olsson i Tjunneberga i Hässlunda folkskola för att enligt Länsstyrelsens, för förrättningsmannen utfärdade förordnanden (bil. 1, 2 och 3) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. ratteulagen rörande förläggning av markerna till Hässlunda 25 och 37 m. fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 22 maj 1948 översänt till pastorsämbetena i Hässlunda och Mörarps församlingar, hade anslagits för Hässlunda församling den 28 maj 1948 (bil. 4) och för Mörarps församling den 6 juni 1948 (bil. 5). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 24 maj 1948, varjämte en avskrift av kungörelsen översänts till Länsstyrelsen den 22 maj 1948. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 29 maj 1948 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 6).

Följande sakägare hade tillträdeskommit förklarats till förrättningen:

Lantbr. Herbert Andersson, Bjärsgård; äg. 3/8 mtl. Hässlunda 25' samt 1/8 mtl. Hässlunda 27' (lgf 8/4 1942 s 175). ✓

Lantbr. Johan Olsson, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 37^{20} (lgf. 11/10 1933 s 575). ✓

Trädgårdsdirektören John W. Jönsson, Åsarps plantskola; äg. 1/8 mtl. Åsarps 5^{2} (lgf. 22/5 1946 nr 524), avst. Hässlunda 37^{12} (lgf. 22/3 1944 s 183), avst. Hässlunda 37^{25} (lgf. 8/5 1940 s 267), avst. Hässlunda 37^{27} (lgf. 18/3 1936 s 146) och avst. Hässlunda 9^{2} (lgf. 22/12 1943 s 961). ✓

Lantbr. Eric Fredlund, Nygård; äg. avst. Hässlunda 37^{18} (lgf. 27/10 1943 s 830) och avst. Hässlunda 37^{19} (lgf. 1/3 1939 s 139). ✓

Lantbr. Arthur Lindell, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 37^{9} (lgf. 3/3 1937). ✓

Martin F. Stolts sterbhus, Möraryd 2; äg. 36/1000 mtl. Möraryd 2^{9} och 47/512 mtl. Möraryd 3^{49} (lgf 4/6 1913 s 462) genom Magne Stolt (bil. 9). ✓

Övriga sakägare:

Konsul Torsten Wulff, Helsingborg; äg 476/1000 mtl. Möraryd 2^{8} och 114/512 mtl. Möraryd 3^{48} (lgf. 18/3 1936 s 149). ✓

✓ Lantbr. Åke Hansson, Harahus; äg. avst. Hässlunda 37^{10} (lgf. i mars 1948).

✓ Lantbr. Uno Assarsson, Kronoborg; äg. 1/48 mtl. Assartorp 7^{20} (lgf. 9/2 1944 s 51).

✓ Lantbr. Edvin Svensson, Assartorp 7; äg. 1/48 mtl. Assartorp 7^{19} (lgf. 29/3 1944).

✓ Lantbr. Oskar Nilsson, Assartorp 7; äg. 1/96 mtl. Assartorp 7^{18} (lgf. 1/9 1942 s 349).

✓ Lantbr. Edvin Ederholm, Assartorp 7; äg. 1/96 mtl. Assartorp 7^{17} (lgf. 7/3 1945 s 152) genom lantbr. Magne Stolt (bil. 10).

~~Godsägaren Hildur Hallbeck, Ingebitads gård; äg. avst. Hässlunda 37^{3} (lgf. 17/5 1941 s 389).~~

✓ f. Lantbr. N. P. Rasmusson, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 37^{15} (lgf. 12/5 1930 s 321) och avst. Hässlunda 25^{4} (lgf. 2/10 1946 nr 309).

~~Hon Bodil Eriksson, Assartorp; äg. allt från Hässlunda 25^{1} försått område.~~

Murarem Hugo Johansson, Bunkeflohöjden; äg. ett från Hässlunda 25¹ frånsålt område. V

Chauffören Gunnar Olsson, Hässlunda; äg. ett från Hässlunda 25¹ frånsålt område. V

~~Husägaren Gunnar Olsson, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 25⁷ (lgf. för Lars Olsson 6/2 1935 § 971)~~ ej

Husägaren Alexander Lindgren, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 25⁶ (lgf. 6/2 1935 § 96). V

Trädgårdsmästaren Tage Hansson, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 25⁵ (lgf. 6/2 1935 § 95). V

Husägaren Svensund, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 25¹⁰ (lgf. 28/11 1945 § 1072). V

Chauffören Mauritz Månsson, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 25¹² (lgf. 6/11 1946 nr 451) samt avst. Hässlunda 25¹¹. V

Karl Nilsons Arvingar, Hässlunda; äg. avs. Hässlunda 25² (lgf. för Karl Nilsson 8/6 1891 § 298) genom fröken Anna Nilsson och handlanden William Nilsson. V

Husägaren Verner Dahlgren, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 9³ (lgf. 24/9 1941 § 546). V

✓ Kyrkvaktmästaren Harry Henningsson, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 9⁴ (lgf. 7/11 1945 § 979).

aj ~~Fru Augusta Olssons arrende, Hässlunda; äg. en från Hässlunda 9' såld mon ej avsöndrad lägenhet.~~

✓ Fru Anna Roos, Hässlunda; äg. 1/8 mtl. Hässlunda 9' (lgf. 22/3 1944 § 182) genom sonen Bertil Roos (bil. 11).

✓ Handlanden William Nilsson, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 25⁹ (lgf. 22/5 1935 § 384).

Hässlunda folkskolestyrelse, förande talan för de ✓ Hässlunda kommun tillhöriga områden och fastigheter, som ingå i Hässlunda skoldomt, genom folkskolläraren Ture Andersson (bil. 18).

Köpman Kurt Nilsson, Hässlunda, som är Hässlunda ✓ kommun arrenderar ett mindre område inom den kommunen tillhöriga delen av Hässlunda 37' genom fadern William Nilsson.

✓ Lantbr. Arnt Larsson och lantbr. Inge Larsson, Hässlunda; äg. tillsammans avst. Hässlunda 37¹⁴ (lgf. 19/6 1946 nr 626) genom Inge Larsson.

✓ Kyrkorådet i Ekeby, Hässlunda och Risekatslösa församlingars pastorat, förande talan för dels lönebostället 1 mtl. Hässlunda 10' dels Hässlunda prästgård genom lantbrukarna Prof Pettersson i Ekeby och Ernst Johansson i Hässlunda (bil. 12).

~~Lantbr. Nils Pålsson, Hässlunda; avv. lönebostället i mtl. Hässlunda 10.~~ ej

~~Godsägaren Eric Tornérhjelm, Stockholm; äg. 17/288 mtl. Hässlunda 12⁷ och 1/2 mtl. Hässlunda 18¹ (Lgf. 21/11 1934 § 709).~~ ej

Husägaren Nils Peter Nilsson, Hässlunda; äg. avst. Hässlunda 25⁸.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 13). ✓

Kungl. Telegrafverket genom linjeingenjören Bertil Möller (bil. 14–15). ✓

Sydsvenska Kraft aktiebolaget genom civilingenjören Anders Langsberg (bil. 16).

~~Malmö Energiförening.~~ ej

Patron Gunnar Nilsson för diknings företaget Hässlunda–Stockholm år år 1940. ✓

Bostadsnämndsordföranden Einar Malmström såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden (bil. 17).

§ 1.

Förrättningsmannen upplästa de ansökningar av juni 1941, den 20 januari 1945 och den 22 februari 1945 om förordnande för förrättningsman att handlägga ryttförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, som inlämnats till Länsstyrelsen, samt Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnanden den 23 juli 1941, den 22 januari 1945 och den 27 februari 1945. Då ansökningarna avsågo sträckning av i stort sett samma marken, skulle de förordnade förrättningarna handläggas som en gemensam förrättning.

§ 2.

Förrättningsmannen meddelade, att följande skulle anses som sökande till den gemensamma förrättningen:

Herbert Andersson, Bjersgård, som undertecknat ansökningen av juni 1941.

Erik Fredlund, Nygård, som övertagit den fastighet, för vilken Ernst Jönsson undertecknat ansökningen av juni 1941, och som för egen del undertecknat ansökningarna av den 20 januari 1945 och den 22 februari 1945.

Johan Olsson, Hässlunda, som undertecknat ansökningen av juni 1941.

John W. Jönsson, som för egen del undertecknat ansökningarna av juni 1941 och den 22 februari 1945 samt övertagit den egendom, för vilken Gunnar Stolt undertecknat ansökningen av juni 1941.

Arthur Lindell, som undertecknat ansökningen den 22 februari 1945 samt

Martin F. Stolts stortlus, för vilket Magne Stolt undertecknat ansökningen den 22 februari 1945 (bil. 7).

§ 3.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Code männen förklarade, att de, avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 4.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att vissa sakägare undertecknat förening med förklaring, att de gjorde gemensam sak med sökanden (bil. 8) och att de alltså nu skulle betraktas som sökande till förrättningen. De, som undertecknat föreningen, voro:

C. Tornerhjelm,
Magne Stolt,
Ake Hansson,
Inga Larsson,
Arthur Lindell,
A. C. Enderholm och
William Nilsson.

Av dessa hade Magne Stolt för Martin F. Stolts stärbhus och Arthur Lindell sedan undertecknat de ursprungliga anmälningarna om förrättningen.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de områden, som beröras av förrättningen, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilka olika sakägare påfordrat vid förrättningarna.

§ 7.

Sökandena och de, som förenat sig med dem, yrkade att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya avlopp i följande sträckningar:

Dikesstråckan B-C-D-E-F-G-H,
" C-X-Y,
" X-Z,
" X-Å,
" F-I-J-K-L-M-N-O-P,
" L-Ä-T,
" O-Q,
" N-R,
J-U och
J-V.

Dessutom borde det nuvarande flodditet uppgrävas merströms punkten B i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av ovanför liggande marker.

Samtliga nya avlopp borde utföras som täckta diken med undantag för dikesstråckan B-C-D.

§ 8.

Magnus Stolt ansåg, att alternativt förslag borde upprättas för torrläggning även av dikesstråckan B-C-D.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade förläggningsföretaget komma att beröra följande bråar och trummor för allmänna vägar:

1). Mellan avvägningspunkterna 12+08 och 12+00 korsar ett av de nya avloppen (dikesstråckan E-F) allmänna vägen från Valåkra till Mörarp eller väg 50. I korsningspunkten finnes nu en valvbro av natursten med 1.80 m. fri spännvidd. Bron har dock ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande mårkens förläggning, varför botten i bron måste sänkas. Nersänkningen av bron kunde lämpligen ske genom att i bron bygga en ny trumma av 1.- m. rör, som nerlades till tillräckligt djup och sedan kopplades till anslutningsbrunnar vid den nya trummans ändpunkter.

2). Mellan avvägningspunkterna 87+12 och 87+21 = = 90+00 = 95+00 korsar ett av de nya avloppen (dikesstråckan G-K) allmänna vägen från Valåkra till Mörarp eller väg 50. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 12" Höganasrör, som kan bibehållas oförändrad. Nya anslutningsbrunnar måste dock byggas vid trummans ändpunkter.

3). Vid avvägningspunkten 81+73 skall ett av de nya avloppen (dikesstråckan J-L) anslutas till nerströmssidan eller västra sidan av en 15" rörtrumma genom vägen från Tågarp till Mörarp eller väg 2. Ny brunn måste byggas i anslutningspunkten.

4). Mellan avvägningspunkterna 56+08 och 56+20 = 121+56 korsar ett av de nya avloppen (dikessträckan N-N) allmänna vägen från Tågarp till Mörarp eller väg 2. I korsningspunkten finnes nu en 18" rörbrumma, som kan bibehållas oförändrad. Nya anslutningsbrunnar måste dock byggas vid brummans ändpunkter.

5). Mellan avvägningspunkterna 67+16 och 67+24 korsar ett av de nya avloppen (dikessträckan O-P) allmänna vägen Frillesbad - Hässlunda - Bosarps eller väg 1174. I korsningspunkten finnes nu en 40" rörbrumma, som kan bibehållas oförändrad. Nya anslutningsbrunnar måste dock byggas vid brummans ändpunkter.

§ 10.

Ingenjören Simon Danielsson förklarade, att Vägförvaltningen skulle i egen regi utföra de arbeten för allmänna vägar som omnämnts i § 9 här ovan. Vägförvaltningen fordrade dock ersättning för arbetet med följande belopp:

1) För nya brumma mellan avvägningspunkterna 12+08 och 12+00 med anslutningsbrunnar 1400 kr.
2) För nya anslutningsbrunnar vid avvägningspunkterna 87+12 och 87+21 200 kr.

3). För ny anslutningsbrunn vid avvägnings-punkten 81+73 140 kr.

4). För nya anslutningsbrunnar vid avvägnings-punkterna 56+08 och 56+20 = 121+56 400 kr.

5). För nya anslutningsbrunnar vid avvägnings-punkterna 67+16 och 67+24 700 kr.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att ett av de nya avloppen (dikessträckan O-P) korsas av en telefonkabel, som ligger omedelbart nordvästra trumman för väg 1174 eller vid avvägningspunkten 67+16. Antagligen kunde kabeln skadeligen skadas.

§ 12.

Förrättningsmannen framhöll, att det i västra kanten vid avvägningspunkten 60+78 (dikessträckan N-O) finnes ett järnstativ för högspänd kraftledning. Antagligen kunde stativet skadas utan att förläggnings-arbetet hindrades. Stativet tillhör Sydsvenska Kraft AB.

§ 13.

Förrättningsmannen framhöll, att en kraft-ledningsstolpe vid avvägningspunkten 13+37, (dikessträckan C-D) måste flyttas i samband med förläggningsarbetet. Vidare blir det kanske nödvändigt att flytta eller omstaga några kraftledningsstolpar vid dikessträckan N-O-P. Samtliga stolpar tillhöra Skånska Elverksförening.

§ 14.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för kartläggning m.m. vid förrättssammanträdena belöpte till 599.41 kr, varav Eric Fredlund förskotterat 578.41 kr, Magnus Stolt 4.- kr och Herbert Andersson 17.- kr.

§ 15.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av företaget berörda jordbruksfastigheterna:

Brukare och fastighet.	Areal.
Torsten Wallt, Mörarp 2⁸ och 3⁴⁸	90 ha
Martin F. Stolts stubbus, Mörarp 2⁹ och 3⁴⁹	13 " 0
John W. Jönsson, Assartorp 5² samt Hässlunda 37¹², 37²⁵ och 37²⁷	40 " +
Uno Assarsson, Assartorp 7²⁰	39 " +
Edvin Svensson, Assartorp 7¹⁹	4 "
Oskar Nilsson, Assartorp 7¹⁸	2 "
Edvin Ederholm, Assartorp 7¹⁷	2 "
Ake Hansson, Hässlunda 37¹⁰	13 " 0
Eric Fredlund, Hässlunda 37¹⁸ och 37¹⁹	55 " —
Arthur Lindell, Hässlunda 37⁹	10 " 0
Hilding Hallbeck, Hässlunda 37³	90 " v
N. P. Rasmusson, Hässlunda 37¹⁵	21 " +
Johan Olsson, Hässlunda 37²⁰	11 " 0
Herbert Andersson, Hässlunda 25' och 27'	53 " —
Anna Roos, Hässlunda 9'	12 " 0
Knut och Inga Larsson, Hässlunda 37¹⁴	25 " +
Nils Pålsson, Hässlunda 10'	50 " —
Eric Tornérhjelm, Hässlunda 12⁷ och 18'	90 " v

§ 16.

Linjeingenjören Möller förklarade, att Telegrafverket skulle vidtaga de ändringar beträffande läget för den i § 11 här ovan

omnämnda telefonkabeln, som erfordrades för att förläggningsföretaget skulle kunna genomföras. Första revisionsingenjören, Kungl. Telegrafverket, Hälsingborg, måste dock i god tid underrättas, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

§ 17.

Civilingenjören Langsberg förklarade, att Sydsvenska Kraft Ab. skulle vidtaga de förstärkningsåtgärder, som eventuellt erfordrades för det i § 12 här ovan omnämnda stativet. Bolagets distriktskontor i Malmö måste dock i god tid underrättas, när företaget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra bolagets anläggningar.

§ 18.

Meddelades, att nymgången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet med början vid Hässlunda Prästgård.

§ 19.

Till protokollet antecknades, att dagens sammanträde utsetts att hållas å Henningssons kafé men flyttats till den mitt emot liggande folkskolan, när lokalerna i kafét ej voro tillräckliga.

§ 20

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme

att hållas i Hässlunda folkskola fredagen
den 20 augusti 1948 kl. 10.

Hässlunda den 17 juni 1948

På tjänstens vägnar:

C. A. Stall

Statens lantbruksingenjör.

Arthur Olsson
Hej tillsammans
Lede män.

År 1948 den 20 augusti inställde sig syns-
männen i Hässlunda folkskola för att åter
handlägga synsförrättningen. Följande sak-
ägare hade tillställts kommit:

V Lantbr. Herbert Andersson, Bjärsgård,
V " Johan Olsson, Hässlunda,
ej ~~Fastighetsägaren John W. Jönsson, Hässlunda~~
V Lantbr. Nils Fredlund, Nygård,
V " Arthur Lindell, Hässlunda
Martin F. Stolls stenbrus, Möcap, genom fullm.
Magn Stolt
V Konsul Torsten Wullt, Hälsingborg,
V Lantbr. Nils Hansson, Haralsus,
ej ~~" Arvo Axelsson, Kronoberg,~~
ej ~~" Edvin Svensson, Assaltorp,~~
V " Oskar Nilsson, Assaltorp,
ej ~~" Edvin Ekelundh, Assaltorp,~~
ej ~~Godsäg. Hilding Hallbeck, Ingelstads gård,~~
f. Lantbr. N. P. Rasmusson, Hässlunda,
~~Herr Bertil Eriksson, Assaltorp.~~
ej ~~Arrendat. Hugo Johansson, Bunkeltofta,~~
ej ~~Chaufför Gunnar Olsson, Hässlunda,~~
ej ~~Fastägaren Gunnar Olsson, Hässlunda,~~
V " Alexander Lundgren, Hässlunda,
ej ~~Trädgårdsm. Tage Hansson, Hässlunda,~~
ej ~~Fastägaren Sven Lund, Hässlunda~~

~~Brukspatron Hugo Nilsson, Kässlunda~~ ej
Karl Nilsons stenhuggeri, Kässlunda, genom handlanden William Nilsson ✓
~~Handl. Oscar Dahlgren, Kässlunda,~~ ej
~~Kyrkvaktmästaren Harry Henningsson, Kässlunda,~~ ej
~~Augusta Olssons pensionat, Kässlunda~~ ej

Fru Anna Roos, Kässlunda genom Julia Roos, ✓
Handlanden William Nilsson, Kässlunda, ✓
Kässlunda folkskolestyrelse genom folkskolestyrelsens ordförande Jure Andersson, ✓
Köpman Kurt Nilsson, Kässlunda, ✓
~~Handl. Knut Larsson, Kässlunda,~~ ej
~~Inga Larsson, Kässlunda,~~ ej
Kyrkvärdarna i Ekeby, Kässlunda och Pinkatorps församlingars pastorat genom kassaförvaltarna Bror Persson i Ekeby och Ernst Johnsson i Kässlunda ✓
~~Handl. Nils Pålsson, Kässlunda~~ ej
~~Bodarbetare Eric Svensk jalm, Gedsholm~~ ej
~~Handl. Nils Peter Nilsson, Kässlunda~~ ej
~~Vägförvaltningen genom länsingenjören Simon Danielsson,~~ ej
~~Kungl. Telegrafverket genom linjeingenjören Bertil Möller,~~ ej
~~Sydsvenska Kraftaktiebolaget genom civilingenjören Anders Langeberg~~ ej
~~Fortifikationsförvaltningen genom Einar Malmgren~~ ej

§ 21.

Protokollet för sammanträdet den 17 juni 1948 upplästes och godkändes.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § varslagen inlämnats yttrande från Vägförvaltningen (bil. 19-21).

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för förslagen till förslagets utförande. Förslagshandlingarna upplästes i vissa delar och bilades protokollet:

Värderingslängderna	bil. A, B och C.
Kostnadsförslagen	bil. D och E
Arbetsbeskrivningen	bil. F.

§ 24.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. G), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. H) upplästes.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att den med synemännens utlåtande missnöjde ägde detsamma bemöta genom besvär, som skulle ingivas till Södertörns Vattendomstol senast inom sextio dagar, räknas från den 20 augusti 1948.

§ 26.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretag.

§ 27.

Delägarna beslöto att ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag till kostnaderna för föreliggande utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Eric Fridlund, Nygård per Mörarp, och vid förfall för honom åt trädgårdsdirektören J. W. Jönsson, Asarps plantskola per Mörarp

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag från avdikningsanslaget,

att, om bidrag beviljades, å delägarnas vägnar dels avsluta kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna för bidragets tillbörliga förbindelser och revisioner.

§ 28.

Vissa delägare förklarade, att de även vilja ansöka om lån från Statens avdikningslånefond, varom särskild handling skulle upprättas.

§ 29.

Sedan delägarna förklarat sig bevilja att omedelbart utse styrelse, förrättades följande val.

Styrelse:

Lantbr. Eric Fridlund, Nygård per Mörarp, ordförande och verkställande ledamot,

Trädgårdsdirektören J. W. Jönsson, Asarps plantskola, Mörarp,

Lantbr. Magnus Skoglund, Mörarp nr 3 per Mörarp.

Styrelsesuppleanter:

Lantbr. Hubert Andersson, Björsgård, Mörarp,

Lantbr. Johan Olsson, Hässlunda, Mörarp.

Revisorer:
Handlanden William Nilsson, Kässlunda, Mörarp.
Lantbr. Arthur Lindell, Norregård, Mörarp
Revisorssuppleant:
Konsul Torsten Wulff, Hälsingborg

§ 30.

Uträlnades ersättningar åt skiftesgodemännen påkunda:

Hjalmar Andersson	30
Artur Olsson	40
Kronor	70.

§ 31.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplästes.

Kässlunda den 20 augusti 1948.

På tjänstens vägnar:
C.H. Nilsson

Såsom lantmäteriingenjör
Arthur Olsson Hjalmarsson
förre skiftesman

Ek.D. nr 20/607 1941.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 24/7 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till **lantbruksingenjören i Malmöhus län,** - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 juli 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson E. Wessman

Erhållet d. 18/9 - 41.

20

Ek. D. nr 607 år 1941

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 22. JULI 1941
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla om förrättande av delning av fastigheten Bjersgård nr 1 i Hässleholms stad och Hässleholms landskommun, tillhörande undertecknade Herbert Andersson, Ernst Jönsson och Johan Olsson, samt Gunnar Stalt.

Hässleholm i Juni 1941.

Herbert Andersson
Bjersgård

Ernst Jönsson *)
Hässleholm

Joh. Olsson
Hässleholm

Johan Mårtensson
Hässleholm
Johan Mårtensson.

Gunnar Stalt **)
Hässleholm

*) Adress för Ernst Fredlund, Bjersgård, Ernst Jönsson
gård Rosen Allmänna, telef Hässleholm 22

Delning beviljad genom beslut den
den 30/10 1941

**) Adress för Johan Jönsson, som är två personer

Ek.D. nr 4/720 1945.

134 / 1346 50 / 1116

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 26/1 1945.

Bil. 2.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län -, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 januari - - - - - - - 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Emottaget d. 26/1 - 45.

Gunnarsson

Allm. diarist nr ____
Kgs Länsstyrelse i Malmö
2 JAN. 1945
Landskontoret
4
720/45

Till Länsstyrelsen!

Undertecknad anhåller härmed vördsamt, att länsstyrelsen enl. gällande vattenlag förordnar lantbruksingenjör, för förrättning avseende torrläggning av mark, å min egendom Hässlunda 57 18 plus-dal 4 följande torde även berörs av företaget Hässlunda 10 prästlönebostället and. Nils Pålsson, Hässlunda 37 ägare Petter Larsson, Hässlunda 25 Bjärsgård ägare Herbert Andersson, Hässlunda 57 ägare Johan Olsson, Hässlunda 57 ägare John W Jönsson. Samtliga egendomar äro belägna inom Hässlunda socken.

Nygård pr Mörarp d 20-1-45

Eric Fredlund

Brukare Hässlunda 38.

x) Namn Fredlund kopia av Ernst Jönsson

Denna förrättning anser undertecknad onödig om ej 1976

10

Ek.D.nr /721-1945.

199 54 1945 1944

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 24
den 3/2 1945.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 februari 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Kvistberg

Erhållet d. 3/3 - 45

10 25

721

Länsstyrelsen i Malmöhus län
24 FEB. 1945
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus Län!

Undertecknade anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman, att enligt gällande vattenlag, handlägga syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande följande egendomar, Hästhunda 37 Nygård ägare Eric Forsblad Hästhunda 37, Artur Lindell, Hästhunda 38, John V Jönsson, Mörarp 2-5 Magne Stolt, egendomarna äro belägna inom Hästhunda o Mörarps socknar i Malmöhus Län. Av förrättningen torde även beröras följande egendomar Hästhunda 38, Åke Hansson samt Mörarpsgården ägare Konsul Wuldt.

Nygård pr Mörarp d 22-2-1945
Eric Forsblad
Delf Hästhunda 22

John V Jönsson
John V Jönsson

Artur Lindell

Magne Stolt
för Martin F. Hatts dödsbo
Delägare Mörarp 29 och 349

Bil. 4.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m.fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Henningssons kafé i Hässlunda torsdagen den 17 juni 1948 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker till Assartorp 5 och 7 samt Hässlunda 8,9, 10, 12, 18, 25, 27 och 37 i Hässlunda socken ävensom Mörarp 2 och 3 i Mörarps socken, dels allmänna vägarna Tågarp-Mörarp eller väg 2, Vallåkra-Mörarp eller väg 50 och Frillestad-Hässlunda-Bosarp eller väg 1174, dels dikningsföretaget "Hässlunda-Gedsholm av år 1940", dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget och Mörarps Energiförening tillhöriga kraftledningar, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel.

Malmö den 22 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hässlunda församling söndagen den 30 maj 1948 betygar:

Pastorsämbetet i HESELUNDA OCH RISEKATSLÖSA Adress: Mörarp

Hässlunda pr Mörarp den 8/6 1948

Nils Månsson

t. kommunalare

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Hässlunda församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 5.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m.fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Henningssons kafé i Hässlunda torsdagen den 17 juni 1948 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker till Assartorp 5 och 7 samt Hässlunda 8, 9, 10, 12, 18, 25, 27 och 37 i Hässlunda socken ävensom Mörarp 2 och 3 i Mörarps socken, dels allmänna vägarna Tågarp-Mörarp eller väg 2, Vallåkra-Mörarp eller väg 50 och Frillestad-Hässlunda-Bosarp eller väg 117, dels dikningsföretaget "Hässlunda-Gedsholm av år 1940", dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget och Mörarps Energiförening tillhöriga kraftledningar, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel.

Malmö den 22 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Mörarps församling söndagen den 6 juni 1948 betygar:

K. Andersson
Ilbde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Mörarps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Länsstyrelsen, Malmö.

Bil. 6.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Hässlunda församling, / kungörelse/	Mörarp	22/5 1948
Pastorsämbetet i Mörarps församling, / kungörelse/	"	" "
Nämndemannen Hjalmar Andersson, /god man/ Bokhagen,	"	" "
Lantbrukaren Arthur Olsson, /god man/ Sjunnetorp,	"	" "
Länsstyrelsen /avskr. av kungörelse/	Malmö	" "
Stiftsnämnden	Lund	29/5 "
Vägförvaltningen	Malmö	" "
Kyrkorådet i Ekeby, Hässlunda och Risekatslösa församlingars pastorat,	Ekeby	" "
Kyrkorådet i Hässlunda församling	Mörarp	" "
Folkskolestyrelsen i Hässlunda skoldistrikt	"	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket	Malmö	" "
Mörarps Energiförening	Mörarp	" "
Godsägaren Erik Tornérhjelm, Gedsholm,	Ekeby	" "
Lantbrukaren Herbert Andersson, Bjärsgård,	Mörarp	" "
Lantbrukaren Erik Fredlund, Nygård,	"	" "
" Johan Olsson, Hässlunda,	"	" "
Trädgårdsdirektören John W. Jönsson, Assartorps plantskola,	"	" "
Konsul Torsten Wullt,	Hälsingborg	" "
Martin F. Stolts sterbhus, Mörarp 2,	Mörarp	" "
Lantbrukaren Magne Stolt, " 2,	"	" "
" Uno Assarsson, Kronoborg,	"	" "
" Edvin Svensson, Assartorp 7,	"	" "
" Oscar Nilsson, Assartorp,	"	" "
" Edvin Cederholm, " ,	"	" "
" Åke Hansson, Harahus,	"	" "
" Arthur Lindell, Hässlunda,	"	" "
" N.P. Rasmusson, " ,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbrukaren Hjalmar Rasmusson, Hässlunda,	Mörarp	29/5 1948.
Godsägaren Hilding Hallbeck, Ingelstads gård,	Smedstorp	" "
Agronomen K. Engholm, Norregård,	Mörarp	" "
Lantbrukaren Knut Larsson, Hässlunda 37,	"	" "
" Inge Larsson, " 37,	"	" "
" Nils Pålsson, " 10,	"	" "
Fru Anna Roos, Hässlunda 9,	"	" "
Husägaren Verner Dahlgren, Hässlunda,	"	" "
Kyrkovaktmästaren Harry Henningsson, Hässlunda,	"	" "
Fru Augusta Olsson, Hässlunda 9,	"	" "
Handlanden William Nilsson, Hässlunda,	"	" "
Carl Nilssons sterbhus, Hässlunda,	"	" "
Chaufföen Mauritz Månsson, Hässlunda,	"	" "
Husägaren Sven Lund, Hässlunda,	"	" "
Trädgårdsmästaren Tage Hansson, Hässlunda,	"	" "
Husägaren Alexander Lundgren, Hässlunda,	"	" "
" Gunnar Olsson, Hässlunda,	"	" "
" Nils P. Nilsson, Hässlunda,	"	" "
Löjtnant Nils Wullt, Mörarpsgården,	"	" "
Köpman Kurt Nilsson, " ,	"	" "
Herr Bertil Eriksson, Assartorp,	"	" "
Muraren Hugo Johansson, Bunketofta,	Påarp	" "
Chaufföen Gunnar Olsson, Hässlunda,	Mörarp	" "
Sydsvenska Kraftaktiebolaget,	Malmö	" "
Ordf. i styrelsen för dikningsföretaget Hässlunda-Gedsholm av år 1940, patron Gunnar Nilsson, Gödstorps gård,	Mörarp	" "

Malmö den 29 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Länsmannens anmf. d 24/5 -48

Bil. 7.

Härmed beviljar jag tillstånd för min son Lantbrukaren Magne Stolt ~~tillstånd~~ att som sökande göra ~~göra~~ gemensam sak med sökandena i den förrättning som avser torrläggning av marker till Hässlunda n:r 37 uti Hässlunda socken Mörarp den 8/11 1946

Agnes Stolt

Namnteckningen vitsorda

Gunnar Bergkvist Johan Thornberg

Bil. 8.

Förening.

Härmed förklarar jag mig villig att göra gemensam sak med sökandena uti den förrättning, som avser förläggning av marker till Hässlunda n:r 25 o 37 m. fl. Lemman uti Hässlunda och Möraryds socknar.

Eksjö den

E. Tunelljelm.

Namnteckningen bitsordas:
Eric Jonsson Helge Jonsson

Magne Stolt
Möaryd 3/19 den 11/11 1946

Egenhändiga namnteckning bivaras
Gunnar Bengtsson Astrid Pålsson
Ake Larsson.

Egenhändiga namnteckningen gm bevittnas
Möaryd den 15 april 1948
Elof Nils Bjelfve Magne Stolt

Björkhagen per Hässlunda den 16 april 1948

Inge Larsson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Edwin Björkfjäll. Harriet Larsson

Hässlunda den 16 april 1948

Arthur Lindell

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Edwin Björkfjäll. Svea Lindell.

Åsarehyn per Hässlunda den 16 april 1948.

Hebe Axelsson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Edwin Björkfjäll Edvin Jönsson

Hässlunda den 26 april 1948.

Willi Lindell

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Edwin Björkfjäll.

Bil 9

FULLMAKT

för lantbrukare Magne Stolt, Mörarp, eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ..Mörarp. 2:9 och Mörarp 3:49. m.fl. hemman i ..... Mörarp. socken, Malmöhus län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

..Mörarp. den ....20/12....1946.

..Agnes Stolt..... .....Erik Stolt.....

.....Rut Stolt..... .....Gunnar Stolt.....


...Ebba Pålsson f. Stolt ....

Bevittnas:

Namn: Gottfrid Nilsson Namn: Alma Nilsson

Yrke: ..... Yrke: .....

Adress: Mörarp..... Adress: Mörarp.....

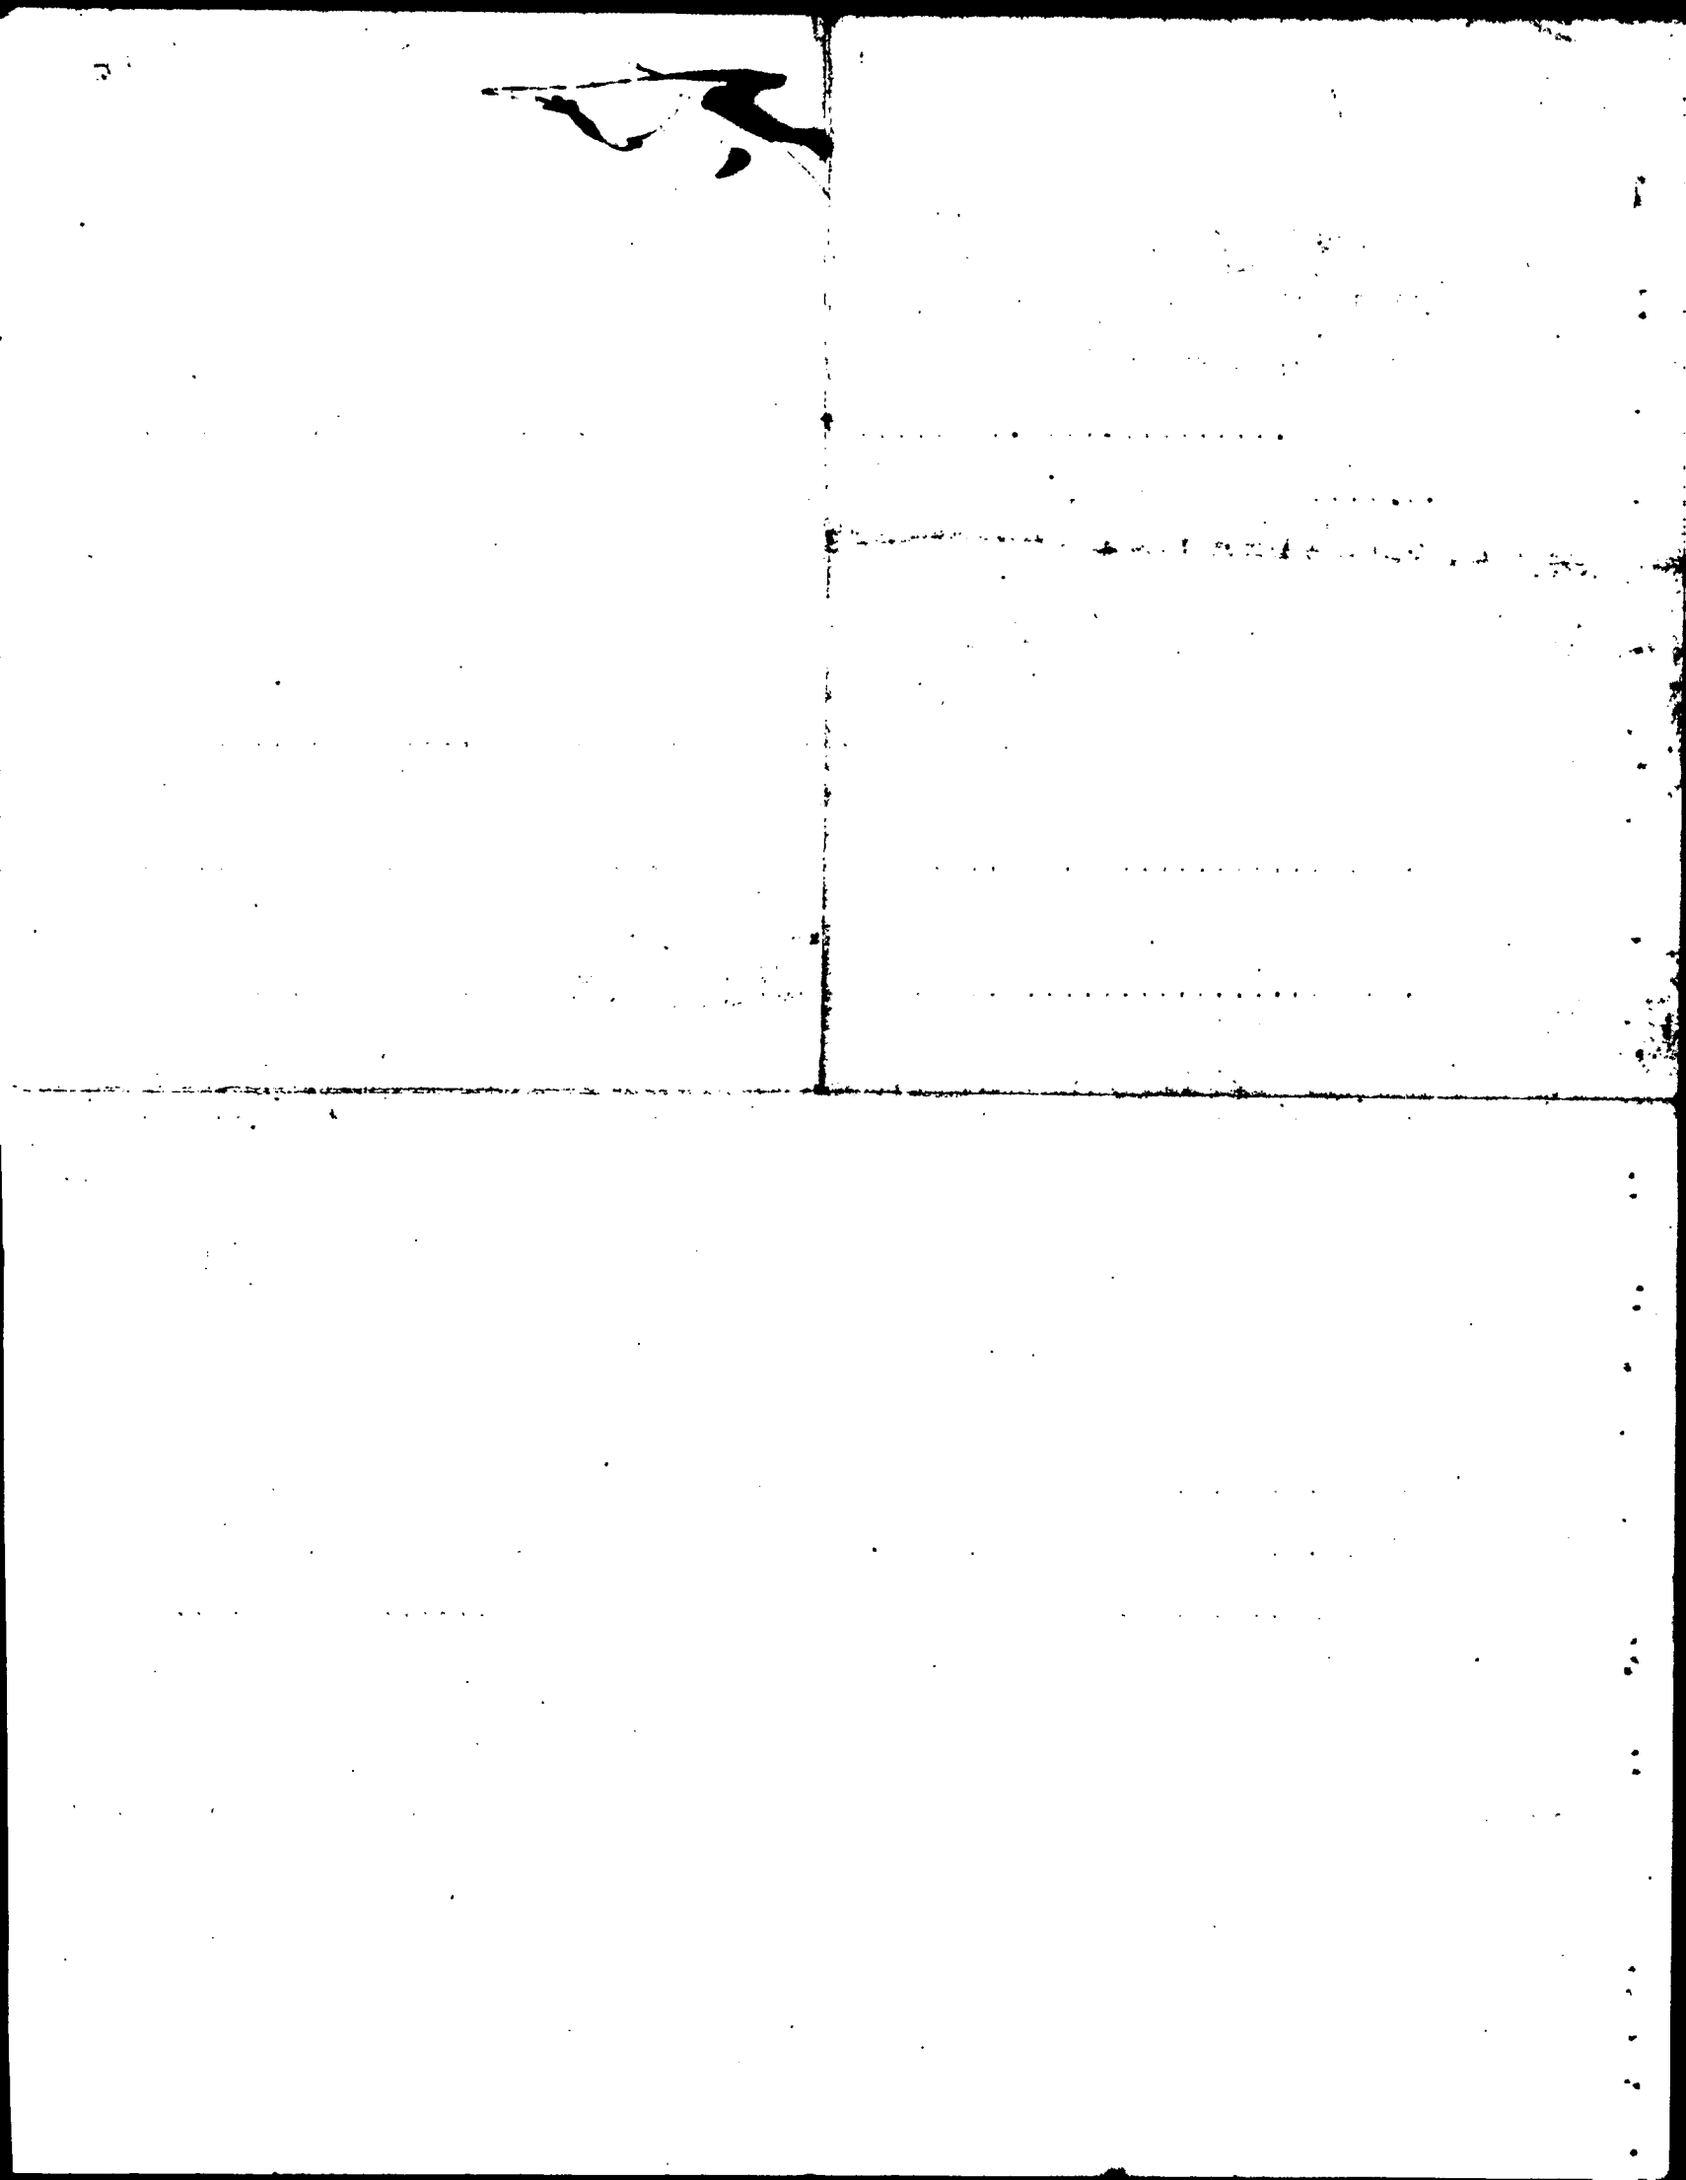

Bil 10 34

Tillmakt

för Magne Stolt att vid sammanträdet för syneförrättning den 17 juni i Hedblomska fära min talan

N. E. Lindström
Assessor 7 17

Bevittnas.

Edvin Jönsson Albin Larsson

Bil 1 35

Fullmakt

för min Son Bertil Roos att
vid sammanträde med Lantbruks-
nämnden föra min talan, och
finnes jag för gott vad han i denna
sak förliger gör och låter.

Fäästhunda den 17/6 1948

Anna Roos

Bevittnas

Joh. Olsson

Bengt Olsson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med pastoratskyrkorådet i Ekeby den 15 juni 1948.

Närvarande: undertecknad ordförande, från Ekeby herrar Bror Pettersson och B. Th. Lindehn. Från Hesslunda herrar Ernst Johansson och Hilding Johnsson. Från Risekatslösa herr Torsten Abrahamsson.

§ 1.

Till ombud för Ekeby pastoratskyrkoråd vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Hesslunda 25 m.fl. hemman den 17 juni 1948 kl. 10 i Hesslunda utsågos herrar Bror Pettersson Ekeby, och Ernst Johansson, Hesslunda.

§ 2.

Till justeringsmän utsågos herrar Bror Pettersson och B. Th. Lindehn.

Som ovan

B. Gynnerstedt

Justeras: Bror Pettersson B. Th. Lindehn.

Rätt utfraget betygar Ekeby den 17 juni 1948. B Gynnerstedt

Bil 13 37

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 2237-43/48

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m.fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar inom Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 juni 1948.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bil 14
38

TELEGRAFVERKET
INGENJÖRSKONTORET
Carlsgatan 2
HÄLSINGBORG
Sa/Bc

Fullmakt

för Linjeingenjör Bertil Möller, Hälsingborg, att föra telegrafverkets talan vid sammanträde den 17 juni 1948 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m.fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Hälsingborg den 2 juni 1948.

Sten Ahlbom

(Sten Ahlbom)
Förste Sektionsingenjör

Bevittnas:

E. Adelbarn

S. Sinn

A 4 tj.

Om det icke innebär någon olägenhet för Eder, äro vi tacksamma för Edert svar utskrivet på format A 4 eller annat standardformat ur A-serien.

Bil 15
39

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ

Ral/AE

Fullmakt

för förste sektionsingenjören Sten Ahlbom, Hälsingborg, eller den han i sitt ställe förordnar att föra telegrafverkets talan vid sammanträde den 17 juni 1948 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m fl hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 31 maj 1948.

Sten Ahlbom

Bevittnas:

Anton Planka ..... Bert Rosengren .....

Nr 2 tj. Db. I.

RS/Gbx

Bil 16
40

F U L L M A K T

för civilingeniör Anders Langsberg att vid syneförrättning den 17 juni 1948 i Hässlunda angående torrläggning av mark föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 16 juni 1948

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET

Bevittnas:

Bil 17

41

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
14/6 1948

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 973 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér genom länsstyrelsen i Malmö ..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning ~~avseende~~ enl. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m.fl. hemman i Hässlunda socken

kommer att äga rum å Henningssons kafé i Hässlunda torsdagen den 17 juni 1948 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet..., nämligen lönebostället Hässlunda nr 10

Det tillkommer Ekeby pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 11 juni 1948.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén

Lantbruksingenjör C.H. Wallér.

Bil. 18. 42

Utdrag ur protokpll vid sammanträde
med Hesslunda folkskolestyrelse
den 9 december 1946.

Närvarande: ledamöterna hrr Ture Andersson, Hilding Persson, Oskar Olsson, suppleanten hr Ernst Johansson, lärarekårens representant fr.Hulda Persson samt undertecknad.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos hrr Ture Andersson och Oskar Olsson.

§ 2.

Från lantbruksingenjören i Malmöhus Län hade inkommit en skrivelse med anmaning att utse en av skolstyrelsens ledamöter att såsom skolstyrelsens ombud närvara vid syneförrättning angående dikningsföretag, som också kommer att beröra skoltomterna och yrka på att ledning upptages i den utsträckning att nöjaktigt avlopp beredes för skolorna tillhörig mark.

Skolstyrelsen tog del av skrivelsen och utsåg till ombud att närvara vid ovannämnda syneförrättning folkskollärare Ture Andersson och som ersättare lantbrukare Hilding Persson.

— — — — — — — — — —

Hesslunda som ovan

Edvin Ekelund
Ordf.

Justerat: Ture Andersson Oskar Olsson

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i Hesslunda församling söndagen den 15/12 1946 betygar Edvin Ekelund, komminister.

Rätt utdraget betygar

Edvin Ekelund

Bil. 19.

Till

Vägförvaltningen, Malmö.

Ang. dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948 i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län. Då förslaget berör allmänna vägarna Tågarp-Mörarp eller väg 2, Vallåkra-Mörarp eller väg 50 och Frillestad-Hässlunda-Bosarp eller väg 1174, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Jag har i ärendet förhandlat med ingenjören Simon Danielsson.

Malmö den 26 juni 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7.

Broar och trummor för allmänna och enskilda vägar m.m.

Allmänna vägar.

1/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan E-F, korsar mellan avvägningspunkterna 12+08 och 12+00 allmänna vägen från Vallåkra till Mörarp eller väg 50. I korsningspunkten, som ligger c:a 850 m. söder vägskälet i Mörarp / vägarna 2 och 50/, finnes nu en valvbro med 1.80 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger på höjden + 49.15 m. och vägbanan över bron ungefär på höjden + 51.45 m. Bron har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste ombyggas. Ombyggnaden skall utföras på sådant sätt, att bottnen i den nuvarande bron uppgräves och sänkes, varefter en ny 100 cm /40"/ rörtrumma lägges genom bron. Den nya rörtrummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 48.63 m. och vid uppströmssidan på höjden + 48.65 m. Nya anslutningsbrunnar, utförda av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, skola vidare byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola kopplas dels den nya trumman, dels de nya anslutande rördiken, som dikningsföretaget skall utföra.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar och kopplingar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 1400 kr.

2/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-X, korsar mellan avvägningspunkterna 87+12 och 87+21 = 90+00 = 95+00 allmänna vägen från Vallåkra till Mörarp eller väg 50. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m. söder vägskälet i Mörarp / vägarna 2 och 50/, finnes nu en trumma av 30 cm. /12"/ Höganäsrör. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan den rensats och befriats från slam. Nya anslutningsbrunnar, utförda av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, måste dock byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola kopplas dels den nuvarande vägtrumman, dels de nya anslutande rördiken, som dikningsföretaget skall utföra.

De nya anslutningsbrunnarna med kopplingar samt rensningen av trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget

uppbära ersättning för arbetet med 200 kr.

3/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan J-U, skall vid avvägningspunkten 81+73 anslutas till nerströmssidan eller västra sidan av en 37.5 cm. /15"/ rörtrumma genom allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2. I anslutningspunkten, som ligger c:a 1700 m. sydost vägskälet i Mörarp /vägarna 2 och 50/, saknas f.n. anslutningsbrunn, varför en ny sådan måste byggas. Den nya brunnen skall utföras av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, och i densamma skall kopplas dels den nuvarande vägtrumman, dels det nya anslutande rördike, som dikningsföretaget skall utföra.

Den nya anslutningsbrunnen med kopplingar samt rensningen av den nuvarande trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 140 kr.

4/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan M-N, korsar mellan avvägningspunkterna 56+08 och 56+20 = 121+56 allmänna vägen från Tågarp till Mörarp eller väg 2. I korsningspunkten, som ligger c:a 2150 m. sydost vägskälet i Mörarp /vägarna 2 och 50/ och c:a 1000 m. norr vägskälet i Hässlunda / vägarna 2 och 1174/, finnes nu en 45 cm / 18"/ rörtrumma, som kan bibehållas oförändrad sedan den rensats och befriats från slam. Nya anslutningsbrunnar, utförda av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, måste dock byggas vid trummans ändpunkter. I de nya brunnarna skola kopplas dels den nuvarande trumman, dels de nya anslutande rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra.

De nya anslutningsbrunnarna med kopplingar samt rensningen av trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 400 kr.

5/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan O-P, korsar mellan avvägningspunkterna 67+16 och 67+24 allmänna vägen från Frillestad över Hässlunda till Bosarp eller väg 1174. I korsningspunkten, som ligger c:a 200 m. öster vägskälet i Hässlunda / vägarna 2 och 1174/, finnes nu en 100 cm / 40"/ rörtrumma. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan den rensats och befriats från slam. Nya anslutningsbrunnar, utförda av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, måste dock byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola kopplas dels den nuvarande trumman, dels de nya anslutande rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra.

De nya anslutningsbrunnarna med kopplingar samt rensningen av trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 700 kr.

Till ledning för Vägförvaltningen vid ombyggnad mellan avvägningspunkterna 12+08 och 12+00 / dikessträckan E-F/ av bron för vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50 lämnas härmed följande beskrivning på den i närheten av byggnadsplatsen liggande fixpunkt 3: " Mörarp 2^{9}, Martin F. Stolts sterbhus tillhörig gård, ladugårdsbyggnadens västra gavel, sockeln, 0.4 m. norr om sydvästra knuten; jst. + 50.50 m".

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen dels när Vägförvaltningen kan påbörja och senast bör hava färdigställt de arbeten, som beskrivits här ovan, dels när dikningsföretaget i egen regi eller genom entreprenör kommer att utföra sådana arbeten, som beröra allmänna vägar.

==========

Malmö i juni 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 2557-43/48

Till
Statens Lantbruksingenjör,
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 juni 1948 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 1 juli 1948.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

HH/EN

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd för alstringsbåtnad

med

ägobeskrivning och hävdeförteckning.

Anm. I kolumnen för "annan duglig mark" har införts arealerna för de områden, som endast vinna brukningsbåtnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mörarps s:n.					Avdelning 1.
Mörarp	8 2		476 1000		Torsten Wullt; arr. Nils Wullt
				1	Åker, lättlera
				2	Grav, imp.
				3	Åker, lättlera
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o högländ
					Summa
Mörarp	9 2		36 1000		Martin F. Stolts sterbhus; arr.
					Magne Stolt
				8	Åker, lättlera
				9	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 2.
Mörarp	9 2		36 1000		Martin F. Stolts sterbhus; arr.
					Magne Stolt.
				10	Åker, lättlera
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37						04	3400	1258	-	3600	1332	-	200	74	-
	41							3100	1271	-	3600	1476	-	500	205	-
	34							2900	986	-	3600	1224	-	700	238	-
	24							3400	816	-	3600	864	-	200	48	-
	41							3200	1312	-	3600	1476	-	400	164	-
						1	24									
1	77					1	28		5643	-		6372	-		729	-
	53				07			2700	1431	-	3600	1908	-	900	477	-
	53				07				1431	-		1908	-		477	-
			(B-båda areal 0.07)													
					09											
	26							2500	650	-	3600	936	-	1100	286	-
	35							2100	735	-	3600	1260	-	1500	525	-
	60							1800	1080	-	3600	2160	-	1800	1080	-
1	21				09				2465	-		4356	-		1891	-
			(B-båda areal 0.09)													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 3.
Mörarp	3 49		47/512		Martin F. Stolts sterbhus; arr.
					Magne Stolt.
				14	Åker, lättlera
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
					Summa
Hässlunda s:n.					
Assertorp	5 2		1/8		John W. Jönsson.
				18	Åker, lättlera
					Summa
					Avdelning 4.
Assertorp	7 20		1/48		Uno Assarsson
				19	Åker, lättlera
					Summa
Assertorp	7 19		1/48		Edvin Svensson
				20	Åker, lättlera
					Summa
Mörarps s:n.					
Mörarp	3 49		47/512		Martin F. Stolts sterbhus; arr.
					Magne Stolt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. — SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							1000	100	-	3600	360	-	2600	260	-
	25							1800	450	-	3600	900	-	1800	450	-
	26							1400	364	-	3600	936	-	2200	572	-
	27							1400	378	-	3600	972	-	2200	594	-
	88								1292	-		3168	-		1876	-
	04							700	28	-	3600	144	-	2900	116	-
	04								28	-		144	-		116	-
	11							3200	352	-	3600	396	-	400	44	-
	11								352	-		396	-		44	-
	20							3200	640	-	3600	720	-	400	80	-
	20								640	-		720	-		80	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				21	Åker, lättlera
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 5.
Mörarp	3 49		47/512		Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt.
				26	Åker, lättlera
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o , högländ
					Summa
Hässlunda s:n.					

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436907

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							2900	145	-	3600	180	-	700	35	-
	37							2900	1073	-	3600	1332	-	700	259	-
	32							2500	800	-	3600	1152	-	1100	352	-
	18							2900	522	-	3600	648	-	700	126	-
	23							2900	667	-	3600	828	-	700	161	-
1	15								3207	-		4140	-		933	-
	32							3200	1024	-	3600	1152	-	400	128	-
	20							2500	500	-	3600	720	-	1100	220	-
	78							2900	2262	-	3600	2808	-	700	546	-
	62							2900	1798	-	3600	2232	-	700	434	-
	31							2900	899	-	3600	1116	-	700	217	-
	53							3200	1696	-	3600	1908	-	400	212	-
	57							2900	1653	-	3600	2052	-	700	399	-
	54							3200	1728	-	3600	1944	-	400	216	-
	38							3200	1216	-	3600	1368	-	400	152	-
	56							3200	1792	-	3600	2016	-	400	224	-
							53									
4	81						53		14568	-		17316	-		2748	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Assertorp	7 19		1/48		Edvin Svensson.
				37	Åker, lättlera
				38	Grav, imp.
					Summa
Assertorp	7 18		1/96		Oscar Nilsson.
				39	Åker, lättlera
				40	D:o d:o
					Summa
Assertorp	7 17		1/96		Edvin Cederholm.
				41	Åker, lättlera
				42	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 6.
Hässlunda	37 10		avst.		Åke Hansson
				43	Åker, lättlera
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	Tomt
				47	Tomt och trädg.
				48	D:o högländ
				49	Åker, lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28						01	3200	896	-	3600	1008	-	400	112	-
	28						01		896	-		1008	-		112	-
	36							3200	1152	-	3600	1296	-	400	144	-
	33							3400	1122	-	3600	1188	-	200	66	-
	69								2274	-		2484	-		210	-
	29							2900	841	-	3600	1044	-	700	203	-
	35							3200	1120	-	3600	1260	-	400	140	-
	64								1961	-		2304	-		343	-
	08							1400	112	-	3600	288	-	2200	176	-
	31							1400	434	-	3600	1116	-	2200	682	-
	38							1800	684	-	3600	1368	-	1800	684	-
	01							2500	25	-	3600	36	-	1100	11	-
	25							2500	625	-	3600	900	-	1100	275	-
	10						05	3200	320	-	3600	360	-	400	40	-
1	13						05		2200	-		4068	-		1868	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mörarps s:n.					
Mörarp	8/2		476/1000		Torsten Wullt; arr. Nils Wullt
				50	Åker, lättlera
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
					Summa
Mörarp	9/2		36/1000		Martin F. Stolts sterbh.; arr. Magne Stolt.
				54	Åker, lättlera
				55	Grav, imp.
				56	Åker, lättlera
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	Tomt och trädgård
				60	Åker, lättlera
				61	D:o d:o
					Summa
Hässlunda s:n.					Avdelning 7.
Hässlunda	12/37		avst.		John W. Jönsson.
				62	Åker, lättlera
				63	D:o d:o

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. EKARA

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							1800	522	-	3600	1044	-	1800	522	-
	39							1400	546	-	3600	1404	-	2200	858	-
	38							1400	532	-	3600	1368	-	2200	836	-
	52							1800	936	-	3600	1872	-	1800	936	-
1	58								2536	-		5688	-		3152	-
	55							1400	770	-	3600	1980	-	2200	1210	-
							07									
	08							1000	80	-	3600	288	-	2600	208	-
	26							1800	468	-	3600	936	-	1800	468	-
	11							1000	110	-	3600	396	-	2600	286	-
	23							2500	575	-	3600	828	-	1100	253	-
	47							1000	470	-	3600	1692	-	2600	1222	-
	25							1000	250	-	3600	900	-	2600	650	-
1	95						07		2723	-		7020	-		4297	-
	17							1000	170	-	3600	612	-	2600	442	-
	47							1000	470	-	3600	1692	-	2600	1222	-
	64								640	-		2304	-		1664	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				64	Åker, lättlera
				65	D:o d:o
				66	Grav, imp.
				67	Åker, lättlera
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 8.
Hässlunda	12 37		avst.		John W. Jönsson.
				71	Åker, lättlera
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64								640	-		2304	-		1664	-
	51							1800	918	-	3600	1836	-	1800	918	-
	34							2100	714	-	3600	1224	-	1500	510	-
							03									
					91											
	46							2100	966	-	3600	1656	-	1500	690	-
	37							2100	777	-	3600	1332	-	1500	555	-
	27							1400	378	-	3600	972	-	2200	594	-
2	59				91		03		4393	-		9324	-		4931	-
		(β-bäck utgår 0,91)														
	19							1000	190	-	3600	684	-	2600	494	-
	45							700	315	-	3600	1620	-	2900	1305	-
				2	34											
	27							1400	378	-	3600	972	-	2200	594	-
	16							2100	336	-	3600	576	-	1500	240	-
	49							700	343	-	3600	1764	-	2900	1421	-
	27							500	135	-	3600	972	-	3100	837	-
	34							500	170	-	3600	1224	-	3100	1054	-
	34							1400	476	-	3600	1224	-	2200	748	-
	37							2100	777	-	3600	1332	-	1500	555	-
	40							700	280	-	3600	1440	-	2900	1160	-
3	28			2	34				3400	-		11808	-		8408	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				82	Åker, lättlera
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 9.
Hässlunda	37 19		avst.		Erik Fredlund
				85	Åker, lättlera
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	28			2	34				3400	-		11808	-		8408	-
	58							700	406	-	3600	2088	-	2900	1682	-
	35							1800	630	-	3600	1260	-	1800	630	-
				2	85											
4	21			5	19				4436	-		15156	-		10720	-
				(B-båtsareal 5,19)												
	07							2100	147	-	3600	252	-	1500	105	-
	08							1400	112	-	3600	288	-	2200	176	-
	30							2100	630	-	3600	1080	-	1500	450	-
	34							1000	340	-	3600	1224	-	2600	884	-
				6	80											
	28							2100	588	-	3600	1008	-	1500	420	-
	33							1000	330	-	3600	1188	-	2600	858	-
	20							2500	500	-	3600	720	-	1100	220	-
	25							1000	250	-	3600	900	-	2600	650	-
	50							1000	500	-	3600	1800	-	2600	1300	-
	32							2500	800	-	3600	1152	-	1100	352	-
				4	18											
	42							2100	882	-	3600	1512	-	1500	630	-
	55							1000	550	-	3600	1980	-	2600	1430	-
	51							1000	510	-	3600	1836	-	2600	1326	-
4	15			10	98				6139	-		14940	-		8801	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				100	Åker, lättlera
				101	D:o d:o
				102	D:o d:o
				103	D:o d:o
				104	D:o d:o
				105	Tomt och trädg. högländ
				106	Åker, lättlera
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
				110	D:o d:o
				111	Grav, imp.
				112	Åker, lättlera
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	37 9		avst.		Arthur Lindell.
				117	Åker, lättlera
				118	D:o d:o

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	15			10	98				6139	-		14940	-		8801	-
	48							2500	1200	-	3600	1728	-	1100	528	-
	46							1800	828	-	3600	1656	-	1800	828	-
	62							1000	620	-	3600	2232	-	2600	1612	-
	28							1000	280	-	3600	1008	-	2600	728	-
	20							2100	420	-	3600	720	-	1500	300	-
							24									
				6	-											
	15							2900	435	-	3600	540	-	700	105	-
	23							1000	230	-	3600	828	-	2600	598	-
	56							1400	784	-	3600	2016	-	2200	1232	-
	42							2500	1050	-	3600	1512	-	1100	462	-
							02									
				3	-											
	76							1800	1368	-	3600	2736	-	1800	1368	-
	88							1400	1232	-	3600	3168	-	2200	1936	-
	34							1000	340	-	3600	1224	-	2600	884	-
	29							2900	841	-	3600	1044	-	700	203	-
9	82			19	98		26		15767	-		35352	-		19585	-
				(8-bilen utgår 1938)												
	44							700	308	-	3600	1584	-	2900	1276	-
				5	-											
	44			5	-				308	-		1584	-		1276	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				119	Åker, lättlera
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	37 3		avst.		Hilding Hallbäck
				129	Åker, lättlera
					Summa
Hässlunda	37 15		avst.		N.P. Rasmusson; arr. Hjalmar Rasmusson.
				130	Åker, lättlera
				131	D:o d:o
				132	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44			5	-				308	-		1584	-		1276	-
	03							1800	54	-	3600	108	-	1800	54	-
	10							2100	210	-	3600	360	-	1500	150	-
	16							2900	464	-	3600	576	-	700	112	-
					06											
	42							1000	420	-	3600	1512	-	2600	1092	-
	34							2500	850	-	3600	1224	-	1100	374	-
				1	81											
	58							3200	1856	-	3600	2088	-	400	232	-
	34							1400	476	-	3600	1224	-	2200	748	-
	32							2100	672	-	3600	1152	-	1500	480	-
2	73			6	87				5310	-		9828	-		4518	-
				(B-väg areal 6.87)												
	08							3500	280	-	3600	288	-	100	8	-
	08								280	-		288	-		8	-
	28							3500	980	-	3600	1008	-	100	28	-
	32							3400	1088	-	3600	1152	-	200	64	-
	24							3500	840	-	3600	864	-	100	24	-
	84								2908	-		3024	-		116	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hässlunda	25 1		3/8		Herbert Andersson
				133	Åker, högländ
					Summa
					Avdelning 10.
Hässlunda	37 12		avst.		John W. Jönsson.
				134	Åker, lättlera
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	D:o d:o
				138	D:o d:o
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
				141	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	37 25		avst.		John W. Jönsson
				142	Åker, lättlera
				143	D:o d:o
				144	D:o d:o
				145	Grav, imp.
				146	Åker, lättlera
				147	D:o d:o
				148	D:o d:o

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							06									
							06									
	71							3400	2414	-	3600	2556	-	200	142	-
	43							2100	903	-	3600	1548	-	1500	645	-
	41							2500	1025	-	3600	1476	-	1100	451	-
	47							1800	846	-	3600	1692	-	1800	846	-
	30							1800	540	-	3600	1080	-	1800	540	-
	28							2100	588	-	3600	1008	-	1500	420	-
	43							2500	1075	-	3600	1548	-	1100	473	-
	30							3400	1020	-	3600	1080	-	200	60	-
3	33								8411	-		11988	-		3577	-
	28							2500	700	-	3600	1008	-	1100	308	-
	40							3200	1280	-	3600	1440	-	400	160	-
	10							1800	180	-	3600	360	-	1800	180	-
							03									
	40							2500	1000	-	3600	1440	-	1100	440	-
	30							2500	750	-	3600	1080	-	1100	330	-
	26							2500	650	-	3600	936	-	1100	286	-
1	74						03		4560	-		6264	-		1704	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				149	Åker, högländ
				150	D:o d:o
				151	D:o lättlera
				152	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	37 27		avst.		John W. Jönsson
				153	Åker, lättlera
				154	D:o d:o
				155	D:o d:o
				156	D:o , högländ
				157	Tomt och trädg. högländ
				158	D:o d:o
				159	Åker, lättlera
				160	D:o d:o
				161	D:o d:o
				162	Grav, imp.
				163	Åker, lättlera
				164	D:o d:o
				165	D:o d:o
				166	D:o d:o
				167	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74						03		4560	-		6264	-		1704	-
						1	68									
							02									
	39							3200	1248	-	3600	1404	-	400	156	-
	14							2900	406	-	3600	504	-	700	98	-
2	27					1	73		6214	-		8172	-		1958	-
	60							2900	1740	-	3600	2160	-	700	420	-
	74							2500	1850	-	3600	2664	-	1100	814	-
	23							3200	736	-	3600	828	-	400	92	-
	29						02									
							22									
	01							3400	34	-	3600	36	-	200	2	-
					15											
	15							2900	435	-	3600	540	-	700	105	-
	36							2500	900	-	3600	1296	-	1100	396	-
							03									
	45							1800	810	-	3600	1620	-	1800	810	-
	12							1800	216	-	3600	432	-	1800	216	-
	56							2900	1624	-	3600	2016	-	700	392	-
	04							2100	84	-	3600	144	-	1500	60	-
	86							2500	2150	-	3600	3096	-	1100	946	-
4	12				15				10579	-		14832	-		4253	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				168	Åker, lättlera
				169	D:o d:o
				170	D:o, högländ
					Summa
Hässlunda	37 20		avst.		Johan Olsson.
	–			171	Åker, lättlera
				172	D:o d:o
				173	D:o d:o
				174	D:o d:o
				175	D:o d:o
				176	Grav, imp.
				177	Åker, lättlera
				178	D:o d:o
				179	D:o d:o
				180	D:o d:o
				181	D:o d:o
				182	D:o d:o
				183	D:o d:o
				184	Tomt och trädg., högländ
				185	Åker, lättlera
				186	Grav, imp.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Överföres 436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	12				15		27		10579	-		14832	-		4253	-
	48							2500	1200	-	3600	1728	-	1100	528	-
	45							2900	1305	-	3600	1620	-	700	315	-
							66									
5	05				15		93		13084	-		18180	-		5096	-
				(13-hektar mark 0.15)												
					13											
	65							2500	1625	-	3600	2340	-	1100	715	-
	45							2500	1125	-	3600	1620	-	1100	495	-
	18							1800	324	-	3600	648	-	1800	324	-
	06							1800	108	-	3600	216	-	1800	108	-
							04									
	11							1400	154	-	3600	396	-	2200	242	-
	03							1000	30	-	3600	108	-	2600	78	-
	33							1000	330	-	3600	1188	-	2600	858	-
	73							2500	1825	-	3600	2628	-	1100	803	-
1	-							1400	1400	-	3600	3600	-	2200	2200	-
	38							1400	532	-	3600	1368	-	2200	836	-
					73											
							17									
	30							1000	300	-	3600	1080	-	2600	780	-
							04									
4	22				86		25		7753	-		15192	-		7439	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				187	Åker, lättlera
				188	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	18/37		avst.		Erik Fredlund.
				189	Åker, lättlera
				190	D:o d:o
				191	D:o d:o
				192	Grav, imp.
				193	Åker, lättlera
				194	D:o d:o
				195	D:o d:o
				196	D:o d:o
				197	D:o d:o
				198	Grav, imp.
				199	Åker, lättlera
				200	D:o d:o
				201	D:o d:o
				202	D:o d:o
				203	D:o d:o
				204	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	22				86		25		7753	-		15192	-		7439	-
	38							1000	380	-	3600	1368	-	2600	988	-
	24							1400	336	-	3600	864	-	2200	528	-
4	84				86		25		8469	-		17424	-		8955	-
				(B-bild mark 0,34)												
	76							2500	1900	-	3600	2736	-	1100	836	-
	84							1400	1176	-	3600	3024	-	2200	1848	-
	71							700	497	-	3600	2556	-	2900	2059	-
							02									
	39							1800	702	-	3600	1404	-	1800	702	-
					36											
	44							1800	792	-	3600	1584	-	1800	792	-
	33							1800	594	-	3600	1188	-	1800	594	-
	48							1800	864	-	3600	1728	-	1800	864	-
							04									
	58							2500	1450	-	3600	2088	-	1100	638	-
				1	20											
	17							2500	425	-	3600	612	-	1100	187	-
	24							1800	432	-	3600	864	-	1800	432	-
	24							1800	432	-	3600	864	-	1800	432	-
	46							1800	828	-	3600	1656	-	1800	828	-
5	64			1	56		06		10092	-		20304	-		10212	-
				(B-bild areal 1,56)												

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 11.
Hässlunda	37 20		avst.		Johan Olsson.
				205	Åker, lättlera
				206	D:o d:o
				207	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 12.
Hässlunda	37 18		avst.		Erik Fredlund
				208	Åker, lättlera
				209	D:o d:o
				210	D:o d:o
				211	D:o d:o
				212	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 13.
Hässlunda	37 18		avst.		Erik Fredlund
				213	Åker, lättlera
				214	D:o d:o
				215	D:o d:o
				216	D:o d:o
				217	D:o d:o
				218	D:o d:o

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436097

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							700	91	-	3600	468	-	2900	377	-
	54							2500	1350	-	3600	1944	-	1100	594	-
					13											
	67				13				1441	-		2412	-		971	-
				(B. Vårbo areal 0.13)												
	33							3200	1056	-	3600	1188	-	400	132	-
	21							1800	378	-	3600	756	-	1800	378	-
	22							1400	308	-	3600	792	-	2200	484	-
	40							2500	1000	-	3600	1440	-	1100	440	-
					19											
1	16				19				2742	-		4176	-		1434	-
				(B. Vårbo areal 0.19)												
	47							2500	1175	-	3600	1692	-	1100	517	-
	32							2500	800	-	3600	1152	-	1100	352	-
	18							2900	522	-	3600	648	-	700	126	-
	32							3200	1024	-	3600	1152	-	400	128	-
	24							2500	600	-	3600	864	-	1100	264	-
					41											
1	53				41				4121	-		5508	-		1387	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				219	Tomt och trädg., högländ
				220	Åker, lättlera
				221	D:o d:o
				222	D:o d:o
				223	D:o d:o
				224	D:o d:o
				225	D:o d:o
				226	D:o d:o
				227	D:o d:o
				228	D:o d:o
				229	D:o d:o
				230	Grav, imp.
				231	Åker, lättlera
				232	D:o d:o
				233	D:o d:o
				234	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	25 1		3/8		Herbert Andersson.
				235	Åker, lättlera
				236	D:o d:o
				237	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	53				41				4121	-		4408	-		1387	-
							38									
				1	33											
	24							2500	600	-	3600	864	-	1100	264	-
	35							2100	735	-	3600	1260	-	1500	525	-
	60							3400	2040	-	3600	2160	-	200	120	-
	45							3200	1440	-	3600	1620	-	400	180	-
	51							2500	1275	-	3600	1836	-	1100	561	-
	36							2100	756	-	3600	1296	-	1500	540	-
	26							2100	546	-	3600	936	-	1500	390	-
	40							3200	1280	-	3600	1440	-	400	160	-
	38							3200	1216	-	3600	1368	-	400	152	-
							07									
				6	67											
	46							3200	1472	-	3600	1656	-	400	184	-
	37							2900	1073	-	3600	1332	-	700	259	-
	28							2100	588	-	3600	1008	-	1500	420	-
6	19			8	41		45		17142	-		22284	-		5142	-
				(B-lägh anmt 8,41)												
	41							2900	1189	-	3600	1476	-	700	287	-
	24							2100	504	-	3600	864	-	1500	360	-
	38							2900	1102	-	3600	1368	-	700	266	-
1	03								2795	-		3708	-		913	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				238 a	Åker, lättlera
				239 a	D:o d:o
				239 b	D:o d:o
				240	D:o d;o
				241	D:o d:o
				242	D:o d:o
				243	D:o d:o
				244	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 14.
Hässlunda	25 1		3/8		Herbert Andersson
				245	Åker, lättlera
				246	D:o d;o
				247	D:o d:o
				248	D:o d:o
				249	D:o d:o
				250	D:o d;o
				251	D:o d:o
				252	D:o d:o
				253	D:o d:o
				254	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	03								2795	-		3708	-		913	-
					39											
	24							2500	600	-	3600	864	-	1100	264	-
	01							2500	25	-	3600	36	-	1100	11	-
	18							2100	378	-	3600	648	-	1500	270	-
	33							2100	693	-	3600	1188	-	1500	495	-
					74											
				1	58											
	07							3200	224	-	3600	252	-	400	28	-
1	86			2	71				4715	-		6696	-		1981	-
			(B. tillsammans 2.71)													
	22							3200	704	-	3600	792	-	400	88	-
	18							2900	522	-	3600	648	-	700	126	-
	04							2500	100	-	3600	144	-	1100	44	-
	05							2500	125	-	3600	180	-	1100	55	-
	22							2900	638	-	3600	792	-	700	154	-
	22							2900	638	-	3600	792	-	700	154	-
	33							3200	1056	-	3600	1188	-	400	132	-
	46							2500	1150	-	3600	1656	-	1100	506	-
	20							2500	500	-	3600	720	-	1100	220	-
	32							3200	1024	-	3600	1152	-	400	128	-
2	24								6457	-		8064	-		1607	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				255	Åker, lättlera
				256a	D:o d:o
				256b	D:o d:o
				257	D:o d:o
				258	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 15.
Hässlunda	25 1		3/8		Herbert Andersson
			-	259	Åker, lättlera
				260	D:o d:o
				261	D:o d:o
				262	D:o d:o
				263	D:o d:o
				264	D:o d:o
				265	D:o d:o
				266	D:o d:o
				267	D:o d:o
				268	D:o d:o
				269	Grav, imp.
				270	Åker, lättlera
				271	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	24								6457	-		8064	-		1607	-
	21							3200	672	-	3600	756	-	400	84	-
	18							2500	450	-	3600	648	-	1100	198	-
	04							2500	100	-	3600	144	-	1100	44	-
	41							2100	861	-	3600	1476	-	1500	615	-
	41							2500	1025	-	3600	1476	-	1100	451	-
3	49								9565	-		12564	-		2999	-
	25							3400	850	-	3600	900	-	200	50	-
	27							3100	837	-	3600	972	-	500	135	-
	21							3100	651	-	3600	756	-	500	105	-
	04							3100	124	-	3600	144	-	500	20	-
	02							2800	56	-	3600	72	-	800	16	-
	26							2800	728	-	3600	936	-	800	208	-
	37							2500	925	-	3600	1332	-	1100	407	-
	49							3400	1666	-	3600	1764	-	200	98	-
	34							3300	1122	-	3600	1224	-	300	102	-
	20							2500	500	-	3600	720	-	1100	220	-
							04									
	16							2200	352	-	3600	576	-	1400	224	-
	21							2800	588	-	3600	756	-	800	168	-
2	82						04		8399	-		10152	-		1753	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				272	Åker, lättlera
				273	D:o, lättlera
				274	D:o d:o
				275	D:o d:o
				276	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	av 25 1				Bertil Eriksson
				277	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	av 25 1				Hugo Johansson
				278	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	av 25 1				Gunnar Olsson
				279	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	25 7		avst.		Gunnar Olsson
				280	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	25 6		avst.		Alexander Lundgren
				281	Tomt och trädgård
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	82						04		8399	-		10152	-		1753	-
	36							2500	900	-	3600	1296	-	1100	396	-
	43							3300	1419	-	3600	1548	-	300	129	-
	09							3400	306	-	3600	324	-	200	18	-
	08							3100	248	-	3600	288	-	500	40	-
	08							2500	200	-	3600	288	-	1100	88	-
3	86						04		11472	-		13896	-		2424	-
	10							5000	500	-	8000	800	-	3000	300	-
	10								500	-		800	-		300	-
	10							5000	500	-	8000	800	-	3000	300	-
	10								500	-		800	-		300	-
	08							5000	400	-	8000	640	-	3000	240	-
	08								400	-		640	-		240	-
	09							5400	486	-	8000	720	-	2600	234	-
	09								486	-		720	-		234	-
	12							5500	660	-	8000	960	-	2500	300	-
	12								660	-		960	-		300	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hässlunda	25 5		avst.		Tage Hansson
				282	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	25 4		avst.		Nils P. Rasmusson
				283	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	25 10		avst.		Sven Lund
				284	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	25 12		avst.		Mauritz Månsson
				285	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	25 11		avst.		Mauritz Månsson
				286	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	25 2		avs.		Karl Nilssons sterbhus
				287	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	25 9		avst.		William Nilsson
				288	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	9 4		avst.		Harry Henningsson
				289	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	av 9 1				Augusta Olssons sterbhus

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							6000	480	-	8000	640	-	2000	160	-
	08								480	-		640	-		160	-
	08							5500	440	-	8000	640	-	2500	200	-
	08								440	-		640	-		200	-
	10							5500	550	-	8000	800	-	2500	250	-
	10								550	-		800	-		250	-
	08							5500	440	-	8000	640	-	2500	200	-
	08								440	-		640	-		200	-
	08							5500	440	-	8000	640	-	2500	200	-
	08								440	-		640	-		200	-
	13							5500	715	-	8000	1040	-	2500	325	-
	13								715	-		1040	-		325	-
	15							4700	705	-	8000	1200	-	3300	495	-
	15								705	-		1200	-		495	-
	05							5500	275	-	8000	400	-	2500	125	-
	05								275	-		400	-		125	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				290	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	9 3		avst.		Verner Dahlgren
				291	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	9 2		avst.		Johan W. Jönsson
				292	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	27 1		1/8		Herbert Andersson
				293	Åker, lättlera
				294	D:o d:o
				295	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	9 1		1/8		Anna Roos
				296	Åker, lättlera
				297	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 16.
Hässlunda	25 1		3/8		Herbert Andersson.
				238 b	Åker, lättlera
				298	D:o d:o
				299	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							6000	300	-	8000	400	-	2000	100	-
	05								300	-		400	-		100	-
	16							5500	880	-	8000	1280	-	2500	400	-
	16								880	-		1280	-		400	-
	25							5500	1375	-	8000	2000	-	2500	625	-
	25								1375	-		2000	-		625	-
	21							3300	693	-	3600	756	-	300	63	-
	14							3100	434	-	3600	504	-	500	70	-
	29							3300	957	-	3600	1044	-	300	87	-
	64								2084	-		2304	-		220	-
	50							3300	1650	-	3600	1800	-	300	150	-
	34							3100	1054	-	3600	1224	-	500	170	-
	84								2704	-		3024	-		320	-
				35												
	26							1000	260	-	3600	936	-	2600	676	-
	17							1000	170	-	3600	612	-	2600	442	-
	43			35					430	-		1548	-		1118	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				300	Åker, lättlera
				301	D:o d:o
				302	D:o , högländ
					Summa
Hässlunda	37 14		avst.		Knut och Inge Larsson.
				303	Åker, lättlera
				304	D:o d:o
				305	D:o d:o
				306	D:o d:o
				307	D:o d:o
				308	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 17.
Hässlunda	37 14		avst.		Knut och Inge Larsson
				309	Åker, lättlera
				310	D:o d:o
				311	Grav, imp.
				312	Åker, lättlera
					Summa
					Avdelning 18.
Hässlunda	37 14		avst.		Knut och Inge Larsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43				35				430	-		1548	-		1118	-
	23							1800	414	-	3600	828	-	1800	414	-
	29							2900	841	-	3600	1044	-	700	203	-
							38									
	95				35		38		1685	-		3420	-		1735	-
				(B-väst												
	50							2500	1250	-	3600	1800	-	1100	550	-
	04							1800	72	-	3600	144	-	1800	72	-
	17							2100	357	-	3600	612	-	1500	255	-
	25							2500	625	-	3600	900	-	1100	275	-
	72							2500	1800	-	3600	2592	-	1100	792	-
	14							3400	476	-	3600	504	-	200	28	-
1	82								4580	-		6552	-		1972	-
	55							2900	1595	-	3600	1980	-	700	385	-
	22							3200	704	-	3600	792	-	400	88	-
							08									
	35							3200	1120	-	3600	1260	-	400	140	-
1	12						08		3419	-		4032	-		613	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				313	Åker, lättlera
				314	D:o d:o
				315	D:o d:o
				316	D:o d:o
				317	D:o d:o
				318	D:o d:o
				319	D:o d:o
				320	D:o d:o
				321	D:o d:o
				322	D:o d:o
				323	D:o d:o
				324	D:o d:o
				325	D:o d:o
				326	D:o d:o
				327	D:o d:o
				328	Grav, imp.
				329	Åker, lättlera
				330	D:o d:o
				331	D:o d:o
				332	D:o d:o
				333	D:o d:o
				334	D:o d:o

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Överföres 436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							2500	950	-	3600	1368	-	1100	418	-
	30							3200	960	-	3600	1080	-	400	120	-
	63							2900	1827	-	3600	2268	-	700	441	-
	77							2900	2233	-	3600	2772	-	700	539	-
	49							3200	1568	-	3600	1764	-	400	196	-
	53							3200	1696	-	3600	1908	-	400	212	-
	42							2900	1218	-	3600	1512	-	700	294	-
	52							2900	1508	-	3600	1872	-	700	364	-
	28							3200	896	-	3600	1008	-	400	112	-
	34							3200	1088	-	3600	1224	-	400	136	-
	50							3200	1600	-	3600	1800	-	400	200	-
				3	54											
	35							3200	1120	-	3600	1260	-	400	140	-
	62							3200	1984	-	3600	2232	-	400	248	-
	32							2500	800	-	3600	1152	-	1100	352	-
							02									
	06							2500	150	-	3600	216	-	1100	66	-
	71							2500	1775	-	3600	2556	-	1100	781	-
	60							2900	1740	-	3600	2160	-	700	420	-
	45							3400	1530	-	3600	1620	-	200	90	-
				2	30											
	69							3200	2208	-	3600	2484	-	400	276	-
8	96			5	84		02	26851	-		32256	-		5405	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				335	Åker, lättlera
				336	D:o d:o
				337	Äng, odlm.
				338	Tomt och trädgård
				339	Åker, lättlera
				340	D:o d:o
				341	D:o d:o
				342	D:o d:o
				343	D:o d:o
				344	D:o d:o
				345	D:o d:o
				346	D:o d:o
				347	D:o d:o
				348	D:o d:o
				349	D:o d:o
				350	D:o d:o
				351	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	av 37[1]				Hässlunda kommun, skoltomt
				352	Åker, högländ
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖREBRO

436997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	96			5	84				26851	-		32256	-		5405	-
	25							3200	800	-	3600	900	-	400	100	-
	24							2500	600	-	3600	864	-	1100	264	-
			38					2500	950	-	3600	1368	-	1100	418	-
	48							2900	1392	-	3600	1728	-	700	336	-
				1	50											
	45							3400	1530	-	3600	1620	-	200	90	-
	04							3200	128	-	3600	144	-	400	16	-
	24							3200	768	-	3600	864	-	400	96	-
	24							2900	696	-	3600	864	-	700	168	-
	19							3200	608	-	3600	684	-	400	76	-
					01											
					96											
					36											
	35							3200	1120	-	3600	1260	-	400	140	-
	46							2500	1150	-	3600	1656	-	1100	506	-
	65							2500	1625	-	3600	2340	-	1100	715	-
	48							3200	1536	-	3600	1728	-	400	192	-
13	03		38	8	67		02		39754	-		48276	-		8522	-
				(B-Kåln anmt 8,67)												
							17									
							17									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hässlunda	1 9		1/8		Anna Roos
				353	Åker, lättlera
					Summa
Hässlunda	1 10		1		Ekeby m.fl. församlingars pastorat, löneboställe; arr. Nils Pålsson.
				354	Åker, lättlera
				355	D:o d:o
				356 a	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 19.
Hässlunda	1 10		1		Ekeby m.fl. församlingars pastorat, löneboställe; arr. Nils Pålsson.
				356 b	Åker, lättlera
				357	D:o d:o
				358	D:o d:o
				359	D:o d:o
				360	D:o d:o
				361	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							3200	1344	-	3600	1512	-	400	168	-
	42								1344	-		1512	-		168	-
	10							2900	290	-	3600	360	-	700	70	-
	39							3200	1248	-	3600	1404	-	400	156	-
				1	01											
	49			1	01				1538	-		1764	-		226	-
				(B-blätt 1.01)												
				1	50											
	69							2100	1449	-	3600	2484	-	1500	1035	-
	46							2900	1334	-	3600	1656	-	700	322	-
	41							2900	1189	-	3600	1476	-	700	287	-
					08											
	36							3200	1152	-	3600	1296	-	400	144	-
1	92			1	58				5124	-		6912	-		1788	-
				(B-blätt annat 1.58)												

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hässlunda	1 10		1		Ekeby m.fl. församlingars pastorat, prästgård
				362	Tomt och trädgård
				363	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	7 12		17/288		Erik Tornérhjelm
				364	Åker, lättlera
				365	D:o d:o
				366	D:o d:o
					Summa
Hässlunda	1 18		1/2		Erik Tornerhjelm
				367	Åker, lättlera
				368	D:o d:o
				369	D:o d:o
					Summa
					Avdelning 20.
Hässlunda	1 9		1/8		Anna Roos
				370	Åker, lättlera
				371	D:o , högländ
					Summa
Hässlunda	8 9		avst.		Hässlunda kommun, skoltomt.
				372	Tomt och trädgård

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. EKARA

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							4300	688	-	5000	800	-	700	112	-
	08							3800	304	-	5000	400	-	1200	96	-
	24								992	-		1200	-		208	-
	20							2900	580	-	3600	720	-	700	140	-
	28							2100	588	-	3600	1008	-	1500	420	-
	30							2900	870	-	3600	1080	-	700	210	-
	78								2038	-		2808	-		770	-
	25							2100	525	-	3600	900	-	1500	375	-
	20							2900	580	-	3600	720	-	700	140	-
	55							3200	1760	-	3600	1980	-	400	220	-
1	00								2865	-		3600	-		735	-
	63						2 79	2900	1827	-	3600	2268	-	700	441	-
	63						2 79		1827	-		2268	-		441	-
	15							4800	720	-	8000	1200	-	3200	480	-
	15								720	-		1200	-		480	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				373	Tomt och trädgård, högländ
					Summa
Hässlunda	Samf.				Hässlunda kommun; skoltomt
				374	Tomt, högländ
				375	D:o
					Summa
Hässlunda	8 1				Hässlunda kommun, skoltomt
				376	Tomt
					Summa
Hässlunda	av 37 1				Hässlunda kommun; skoltomt
				377	Tomt och trädgård
				379	Åker, lättlera
					Summa
Hässlunda	av 37 1				Hässlunda kommun; arr. Kurt Nilsson.
				378	Tomt och trädgård
					Summa
Hässlunda	37 14		avst.		Knut och Inge Larsson
				380	Åker, lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15						05		720	-		1200	-		480	-
	15						05		720	-		1200	-		480	-
	12						01	4800	576	-	8000	960	-	3200	384	-
	12						01		576	-		960	-		384	-
	11							4800	528	-	8000	880	-	3200	352	-
	11								528	-		880	-		352	-
	13							4000	520	-	8000	1040	-	4000	520	-
	07							2100	147	-	3600	252	-	1500	105	-
	20								667	-		1292	-		625	-
	16							3600	576	-	8000	1280	-	4400	704	-
	16								576	-		1280	-		704	-
	08							1800	144	-	3600	288	-	1800	144	-
	08								144	-		288	-		144	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Mörarps s:n.					Avdelning 1.
Mörarp	8 2		476 1000	1-7	Torsten Wullt; arr. Nils Wullt
D:o	9 2		36 1000	8,9	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
					Summa för avd. 1.
					Avdelning 2.
Mörarp	9 2		36 1000	10-13	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
					Summa för avd. 2.
					Avdelning 3.
Mörarp	49 3		47 512	14-17	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
Hässlunda s:n.					
Assartorp	2 5		1/8	18	John W. Jönsson e
					Summa för avd. 3.
					Avdelning 4.
Assartorp	20 7		1/48	19	Uno Assarsson e
D:o	19 7		1/48	20	Edvin Svensson
Mörarps s:n.					
Mörarp	49 3		47 512	21-25	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
					Summa för avd. 4.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 430997

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	77					1	28		5643	-		6372	-		729	-
	53				07				1431	-		1908	-		477	-
2	30				07	1	28		7074	-		8280	-		1206	-
1	21				09				2465	-		4356	-		1891	-
1	21				09				2465	-		4356	-		1891	-
	88								1292	-		3168	-		1876	-
	04								28	-		144	-		116	-
	92								1320	-		3312	-		1992	-
	11								352	-		396	-		44	-
	20								640	-		720	-		80	-
1	15								3207	-		4140	-		933	-
1	46								4199	-		5256	-		1057	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 5.
Mörarp	49/3		47/512	26-36	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
Hässlunda s:n.					
Assertorp	19/7		1/48	37,38	Edvin Svensson
D:o	18/7		1/96	39,40	Oscar Nilsson
D:o	17/7		1/96	41,42	Edvin Cederholm
					Summa för avd. 5
					Avdelning 6.
Hässlunda	10/37		avst.	43-49	Åke Hansson
Mörarps s:n					
Mörarp	8/2		476/1000	50-53	Torsten Wullt; arr. Nils Wullt
D:o	9/2		36/1000	54-61	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
					Summa för avd. 6.
Hässlunda s:n.					Avdelning 7.
Hässlunda	12/37		avst.	62-70	John W. Jönsson
					Summa för avd. 7.
					Avdelning 8.
Hässlunda	12/37		avst.	71-84	John W. Jönsson
					Summa för avd. 8.
					Avdelning 9.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436097

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	81						53		14568	-		17316	-		2748	-
	28						01		896	-		1008	-		112	-
	69								2274	-		2484	-		210	-
	64								1961	-		2304	-		343	-
6	42						54		19699	-		23112	-		3413	-
1	13						05		2200	-		4068	-		1868	-
1	58								2536	-		5688	-		3152	-
1	95						07		2723	-		7020	-		4297	-
4	66						12		7459	-		16776	-		9317	-
2	59				91		03		4393	-		9324	-		4931	-
2	59				91		03		4393	-		9324	-		4931	-
4	21			5	19				4436	-		15156	-		10720	-
4	21			5	19				4436	-		15156	-		10720	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hässlunda	37 19		avst.	85-116	Erik Fredlund
D:o	37 9		avst.	117--128	Arthur Lindell
D:o	37 3		avst.	129	Hilding Hallbäck
D:o	37 15		avst.	130--132	N.P. Rasmusson; arr. Hjalmar Rasmusson
D:o	25 1		3/8	133	Herbert Andersson
					Summa för avd. 9.
					Avdelning 10.
Hässlunda	37 12		avst.	134--141	John W. Jönsson
D:o	37 25		avst.	142--152	Dens.
D:o	37 27		avst.	153--170	Dens.
D:o	37 20		avst.	171--188	Johan Olsson
D:o	37 18		avst.	189--204	Erik Fredlund
					Summa för avd. 10.
					Avdelning 11.
Hässlunda	37 20		avst.	205--207	Johan Olsson
					Summa för avd. 11
					Avdelning 12.
Hässlunda	37 18		avst.	208--212	Erik Fredlund
					Summa för avd. 12.
					Avdelning 13.
Hässlunda	37 18		avst.	213--234	Erik Fredlund

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	82			19	98		26		15767	-		35352	-		19585	-
2	73			6	87				5310	-		9828	-		4518	-
	08								280	-		288	-		8	-
	84								2908	-		3024	-		116	-
							06									
13	47			26	85		32		24265	-		48492	-		24227	-
3	33								8411	-		11988	-		3577	-
2	27					1	73		6214	-		8172	-		1958	-
5	05				15		93		13084	-		18180	-		5096	-
4	84				86		25		8469	-		17424	-		8955	-
5	64			1	56		06		10092	-		20304	-		10212	-
21	13			2	57	2	97		46270	-		76068	-		29798	-
	67				13				1441	-		2412	-		971	-
	67				13				1441	-		2412	-		971	-
1	16				19				2742	-		4176	-		1434	-
1	16				19				2742	-		4176	-		1434	-
6	19			8	41		45		17142	-		22284	-		5142	-
6	19			8	41		45		17142	-		22284	-		5142	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Hässlunda	25 1		3/8	235-238a 239a-244	Herbert Andersson
					Summa för avd. 13.
					Avdelning 14.
Hässlunda	25 1		3/8	245--258	Herbert Andersson
					Summa för avd. 14.
					Avdelning 15.
Hässlunda	25 1		3/8	259--276	Herbert Andersson
D:o	av 25 1			277	Bertil Eriksson
D:o	av 25 1			278	Hugo Johansson
D:o	av 25 1			279	Gunnar Olsson
D:o	25 7		avst.	280	Gunnar Olsson
D:o	25 6		avst.	281	Alexander Lundgren
D:o	25 5		avst.	282	Tage Hansson
D:o	25 4		avst.	283	Nils P. Rasmusson
D:o	25 10		avst.	284	Sven Lund
D:o	25 12		avst.	285	Mauritz Månsson
D:o	25 11		avst.	286	Dens.
D:o	25 2		avs.	287	Karl Nilssons sterbhus
D:o	25 9		avst.	288	William Nilsson
D:o	9 4		avst.	289	Harry Henningsson
D:o	av 9 1			290	Augusta Olssons sterbhus
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	19			8	41		45		17142	-		22284	-		5142	-
1	86			2	71				4715	-		6696	-		1981	-
8	05			11	12		45		21857	-		28980	-		7123	-
3	49								9565	-		12564	-		2999	-
3	49								9565	-		12564	-		2999	-
3	86						04		11472	-		13896	-		2424	-
	10								500	-		800	-		300	-
	08								400	-		640	-		240	-
	09								486	-		720	-		234	-
	12								660	-		960	-		300	-
	08								480	-		640	-		160	-
	08								440	-		640	-		200	-
	10								550	-		800	-		250	-
	08								440	-		640	-		200	-
	08								440	-		640	-		200	-
	13								715	-		1040	-		325	-
	15								705	-		1200	-		495	-
	05								275	-		400	-		125	-
	05								300	-		400	-		100	-
5	15						04		18363	-		24216	-		5853	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Hässlunda	9 3		avst.	291	Verner Dahlgren
D:o	9 2		avst.	292	John W. Jönsson
D:o	27 1		1/8	293--295	Herbert Andersson
D:o	9 1		1/8	296, 297	Anna Roos
					Summa för avd. 15
					Avdelning 16.
Hässlunda	25 1		3/8	238 b 298--302	Herbert Andersson
D:o	37 14		avst.	303--308	Knut och Inge Larsson
					Summa för avd. 16.
					Avdelning 17.
Hässlunda	37 14		avst.	309--312	Knut och Inge Larsson
					Summa för avd. 17.
					Avdelning 18.
Hässlunda	37 14		avst.	313--351	Knut och Inge Larsson
D:o	av 37 1			352	Hässlunda kommun, skoltomt
D:o	9 1		1/8	353	Anna Roos
D:o	10 1		1	354--356 a	Ekeby m.fl. församlingars pastorat; löneboställe; arr. Nils Pålsson.
					Summa för avd. 18.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

436897

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	15						04		18363	-		24216	-		5853	-
	16								880	-		1280	-		400	-
	25								1375	-		2000	-		625	-
	64								2084	-		2304	-		220	-
	84								2704	-		3024	-		320	-
7	04						04		25406	-		32824	-		7418	-
	95				35		38		1685	-		3420	-		1735	-
1	82								4580	-		6552	-		1972	-
2	77				35		38		6265	-		9972	-		3707	-
1	12						08		3419	-		4032	-		613	-
1	12						08		3419	-		4032	-		613	-
13	03		38	8	67		02		39754	-		48276	-		8522	-
							17									
	42								1344	-		1512	-		168	-
	49			1	01				1538	-		1764	-		226	-
13	94		38	9	68		19		42636	-		51552	-		8916	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 19.
Hässlunda	10 1		1	356 b-361	Ekeby m.fl. församlingars pastorat, löneboställe, arr. Nils Pålsson
D:o	10 1		1	362-363	Ekeby m.fl. församlingars pastorat, prästgård
D:o	12 7		17/288	364-366	Erik Tornérhjelm
D:o	18 1		1/2	367-369	Dens.
					Summa för avd. 19.
					Avdelning 20.
Hässlunda	9 1		1/8	370,371	Anna Roos
D:o	9 8		avst.	372-373	Hässlunda kommun, skoltomt
D:o	samf.			374, 375	Dens. , skoltomt
D:o	8 1			376	Dens. , skoltomt
D:o	av 37 1			377, 379	Dens. , skoltomt
D:o	av 37 1			378	Dens; arr. Kurt Nilsson
D:o	37 14		avst.	380	Knut och Inge Larsson
					Summa för avd. 20.
					Summa för alla avdelningar.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436907

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	92			1	58				5124	-		6912	-		1788	-
	24								992	-		1200	-		208	-
	78								2038	-		2808	-		770	-
1	-								2865	-		3600	-		735	-
3	94			1	58				11019	-		14520	-		3501	-
	63					2	79		1827	-		2268	-		441	-
	15						05		720	-		1200	-		480	-
	12						01		576	-		960	-		384	-
	11								528	-		880	-		352	-
	20								667	-		1292	-		625	-
	16								576	-		1280	-		704	-
	08								144	-		288	-		144	-
1	45					2	85		5038	-		8168	-		3130	-
102	-	38	58	73		9	25		250968	-		379332	-		128364	-

Hässlunda den 20 augusti 1948.
Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Carl E. Nb
H.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Arthur Olsson					Löjtnanten
			Gode män.		

Bil. B.

Värderingslängd

för

brukningsbåtnad.

Socken, by och hemman	Registernr.	Mantal.	Ägofigurer, nr.	Ägares och arrendators namn.
1.	2.	3.	4.	5.
Mörarps socken.				Avdelning 1.
Mörarp	2 9	36/1000	8-9	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
				Summa
				Avdelning 2.
Mörarp	2 9	36/1000	10-13	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
				Summa
				Avdelning 6.
Mörarp	2 9	36/1000	54	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
Hässlunda socken.				
Hässlunda	37 10	avst.	43-45	Åke Hansson
				Summa
				Avdelning 7.
Hässlunda	37 12	avst.	62-65, 67-70	John W. Jönsson
				Summa
				Avdelning 8.
Hässlunda	37 12	avst.	71-84	John W. Jönsson
				Summa

Mark, som vinner bruknings-båtnad.	Brukningsbåtnadens värde.		Anmärkningar.
	per ha	per fastighet eller bruknings-del.	
Ha	Kr.	Kr.	
6.	7.	8.	9.
-.60	500.-	300.-	
-.60		300.-	
1.30	500.-	650.-	
1.30		650.-	
-.55	540.-	297.-	
-.77	500.-	385.-	
1.32		682.-	
3.50	600.-	2100.-	
3.50		2100.-	
9.40	270.-	2538.-	
9.40		2538.-	

1.	2.	3.	4.	5.	
				Avdelning 9.	
Hässlunda	19 37	avst.	85-104, 106-110, 112-116	Erik Fredlund	
Hässlunda	9 37	avst.	117-128	Arthur Lindell	
					Summa
				Avdelning 10.	
Hässlunda	12 37	avst.	134-141	John W. Jönsson	
Hässlunda	27 37	avst.	153-155 159-161 163-164	Dens.	
Hässlunda	20 37	avst.	171-175 177-183 185,187- -188	Johan Olsson	
Hässlunda	18 37	avst.	189-191 193-197 199-204	Erik Fredlund	
					Summa
				Avdelning 11.	
Hässlunda	20 37	avst.	205-207	Johan Olsson	
					Summa
				Avdelning 12.	
Hässlunda	18 37	avst.	208-212	Erik Fredlund	
					Summa
				Avdelning 13.	
Hässlunda	18 37	avst.	213-218 220-229 231-234	Erik Fredlund	
Hässlunda	1 25	3/8	235-238a 239a-243	Herbert Andersson	
					Summa
				Avdelning 16.	
Hässlunda	1 25	3/8	238 b, 298-301	Herbert Andersson	
Hässlunda	14 37		303-308	Knut och Inge Larsson,	
					Summa

6.	7.	8.	9.
29.80	120.-	3576.-	
9.60	110.-	1056.-	
39.40		4632.-	
3.33	400.-	1332.-	
2.80	260.-	728.-	
5.70	200.-	1140.-	
7.20	220.-	1584.-	
19.03		4784.-	
-.80	750.-	600.-	
-.80		600.-	
1.35	540.-	729.-	
1.35		729.-	
14.60	85.-	1241.-	
4.50	150.-	675.-	
19.10		1916.-	
1.30	520.-	676.-	
1.82	250.-	455.-	
3.12		1131.-	

1.	2.	3.	4.	5.
				Avdelning 18.
Hässlunda	14 37	avst.	313-327 329-337 339-351	Knut och Inge Larsson
Hässlunda	1 10	1	354-355 356 a	Ekeby m.fl. församlingars pastorat, löneboställe; arr. Nils Pålsson
				Summa
				Avdelning 19.
Hässlunda	1 10	1	356b-361	Ekeby m.fl. församlingars pastorat, löneboställe; arr. Nils Pålsson
				Summa
				Summa för alla avdelningar

6.	7.	8.	9.
21.60	195.-	4212.-	
1.50	170.-	255.-	
23.10		4467.-	
3.50	340.-	1190.-	
3.50		1190.-	
125.52		25719.-	

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Bil. C.

Sammandrag av värderingslängder

för

alstringsbåtnad och brukningsbåtnad.

Socken, by och hemman	Re-gister-nr.	Man-tal.	Ägofi-gurer, nr.	Ägares och arrendators namn.
1.	2.	3.	4.	5.
Mörarps s:n.				Avdelning 1.
Mörarp	8 2	476 1000	1-7	Torsten Wullt; arr. Nils Wullt
D:o	9 2	36 1000	8-9	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
				Summa
				Avdelning 2.
D:o	9 2	36 1000	10-13	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
				Summa
				Avdelning 3.
D:o	49 3	47 512	14-17	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt.
Hässlunda s:n.				
Assartorp	2 5	1/8	18	Johan W. Jönsson
				Summa
				Avdelning 4.
D:o	20 7	1/48	19	Uno Assarsson
D:o	19 7	1/48	20	Edvin Svensson
Mörarps s:n.				
Mörarp	49 3	47 512	21-25	Martin F. Stolts sterbhus;
				Överföres

Mark, som vinner båtnad			Mark, som ej vinner båtnad.	Värdet av båtnaden		
Endast alstrings-båtnad	Såväl alstrings som bruknings-båtnad.	Summa		Alstrings-båtnad.	Bruknings-båtnad	Summa
Ha	Ha	Ha	Ha	Kr.	Kr.	Kr.
6	7	8	9	10	11	12
1.77	- -	1.77	1.28	729.-	- -	729.-
- -	-.60	-.60	- -	477.-	300.-	777.-
1.77	-.60	2.37	1.28	1206.-	300.-	1506.-
- -	1.30	1.30	- -	1891.-	650.-	2541.-
- -	1.30	1.30	- -	1891.-	650.-	2541.-
-.88	- -	0.88	- -	1876.-	- -	1876.-
-.04	- -	0.04	- -	116.-	- -	116.-
-.92	- -	0.92	- -	1992.-	- -	1992.-
-.11	- -	-.11	- -	44.-	- -	44.-
-.20	- -	-.20	- -	80.-	- -	80.-
-.31		-.31		124.-		124.-

1	2	3	4	5
				Överfört
				arr. Magne Stolt
				Summa
				Avdelning 5.
Mörarp	3 49	47/512	26-36	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
Hässlunda s:n.				
Assertorp	7 19	1/48	37-38	Edvin Svensson
D:o	7 18	1/96	39-40	Oscar Nilsson
D:o	7 17	1/96	41-42	Edvin Cederholm
				Summa
				Avdelning 6.
Hässlunda	37 10	avst	43-49	Åke Hansson
Mörarps s:n.				
Mörarp	2 8	476/1000	50-53	Torsten Wullt; arr. Nils Wullt
D:o	2 9	36/1000	54-61	Martin F. Stolts sterbhus; arr. Magne Stolt
				Summa
Hässlunda s:n.				Avdelning 7.
Hässlunda	37 12	avst.	62-70	John W. Jönsson
				Summa
				Avdelning 8.
D:o	37 12	avst.	71-84	John W. Jönsson
				Summa

6	7	8	9	10	11	12
-.31		-.31		124.-		124.-
1.15		1.15		933.-		933.-
1.46		1.46		1057.-		1057.-
4.81		4.81	-.53	2748.-		2748.-
-.28		-.28	-.01	112.-		112.-
-.69		-.69		210.-		210.-
-.64		-.64		343.-		343.-
6.42		6.42	-.54	3413.-		3413.-
-.36	-.77	1.13	-.05	1868.-	385.-	2253.-
1.58		1.58		3152.-		3152.-
1.40	-.55	1.95	-.07	4297.-	297.-	4594.-
3.34	1.32	4.66	-.12	9317.-	682.-	9999.-
	3.50	3.50	-.03	4931.-	2100.-	7031.-
	3.50	3.50	-.03	4931.-	2100.-	7031.-
	9.40	9.40		10720.-	2538.-	13258.-
	9.40	9.40		10720.-	2538.-	13258.-

1	2	3	4	5
				Avdelning 9.
Hässlunda	19/37	avst	85-116	Erik Fredlund
D:o	19/37	avst.	117-128	Arthur Lindell
D:o	3/37	avst.	129	Hilding Hallbäck
D:o	15/37	avst.	130-132	N.P. Rasmusson; arr. Hjalmar Rasmusson
D:o	1/25	3/8	133	Herbert Andersson
				Summa
				Avdelning 10.
Hässlunda	12/37	avst.	134-141	Johan W. Jönsson
D:o	25/37	avst.	142-152	Dens.
D:o	27/37	avst.	153-170	Dens.
D:o	20/37	avst.	171-188	Johan Olsson
D:o	18/37	avst.	189-204	Erik Fredlund
				Summa
				Avdelning 11.
Hässlunda	20/37	avst.	205-207	Johan Olsson
				Summa
				Avdelning 12.
Hässlunda	18/37	avst.	208-212	Erik Fredlund
				Summa
				Avdelning 13.
Hässlunda	18/37	avst.	213-234	Erik Fredlund
Hässlunda	1/25	3/8	235-238a 239a-244	Herbert Andersson
				Summa

6	7	8	9	10	11	12
	29.80	29.80	-.26	19585.-	3576.-	23161.-
	9.60	9.60		4518.-	1056.-	5574.-
-.08		-.08		8.-		8.-
-.84		-.84		116.-		116.-
			-.06			
-.92	39.40	40.32	-.32	24227.-	4632.-	28859.-
	3.33	3.33		3577.-	1332.-	4909.-
2.27		2.27	1.73	1958.-		1958.-
2.40	2.80	5.20	-.93	5096.-	728.-	5824.-
	5.70	5.70	-.25	8955.-	1140.-	10095.-
	7.20	7.20	-.06	10212.-	1584.-	11796.-
4.67	19.03	23.70	2.97	29798.-	4784.-	34582.-
	-.80	-.80		971.-	600.-	1571.-
	-.80	-.80		971.-	600.-	1571.-
	1.35	1.35		1434.-	729.-	2163.-
	1.35	1.35		1434.-	729.-	2163.-
	14.60	14.60	-.45	5142.-	1241.-	6383.-
-.07	4.50	4.57		1981.-	675.-	2656.-
-.07	19.10	19.17	-.45	7123.-	1916.-	9039.-

1	2	3	4	5
				Avdelning 14.
Hässlunda	25 1	3/8	245-258	Herbert Andersson
				Summa
				Avdelning 15.
Hässlunda	25 1	3/8	259-276	Herbert Andersson
D:o	av 25 1		277	Bertil Eriksson
D:o	av 25 1		278	Hugo Johansson
D:o	av 25 1		279	Gunnar Olsson
D:o	25 7	avst.	280	Gunnar Olsson
D:o	25 6	avst.	281	Alexander Lundgren
D:o	25 5	avst.	282	Tage Hansson
D:o	25 4	avst.	283	Nils P. Rasmusson
D:o	25 10	avst.	284	Sven Lund
D:o	25 12	avst.	285	Mauritz Månsson
D:o	25 11	avst.	286	Dens.
D:o	25 2	avs.	287	Karl Nilssons sterbhus
D:o	25 9	avst.	288	William Nilsson
D:o	9 4	avst.	289	Harry Henningsson
D:o	av 9 1		290	Augusta Olssons sterbhus
D:o	9 3	avst.	291	Verner Dahlgren
D:o	9 2	avst.	292	John W. Jönsson
D:o	27 1	1/8	293-295	Herbert Andersson
D:o	9 1	1/8	296-297	Anna Roos
				Summa

6	7	8	9	10	11	12
3.49		3.49		2999.-		2999.-
3.49		3.49		2999.-		2999.-
3.86		3.86	-.04	2424.-		2424.-
-.10		-.10		300.-		300.-
-.10		-.10		300.-		300.-
-.08		-.08		240.-		240.-
-.09		-.09		234.-		234.-
-.12		-.12		300.-		300.-
-.08		-.08		160.-		160.-
-.08		-.08		200.-		200.-
-.10		-.10		250.-		250.-
-.08		-.08		200.-		200.-
-.08		-.08		200.-		200.-
-.13		-.13		325.-		325.-
-.15		-.15		495.-		495.-
-.05		-.05		125.-		125.-
-.05		-.05		100.-		100.-
-.16		-.16		400.-		400.-
-.25		-.25		625.-		625.-
-.64		-.64		220.-		220.-
-.84		-.84		320.-		320.-
7.04		7.04	-.04	7418.-		7418.-

1	2	3	4	5
				Avdelning 16.
Hässlunda	1 25	3/8	238 b, 298-302	Herbert Andersson
D:o	14 37	avst	303-308	Knut och Inge Larsson
				Summa
				Avdelning 17.
Hässlunda	14 37	avst	309-312	Knut och Inge Larsson
				Summa
				Avdelning 18.
Hässlunda	14 37	avst.	313-351	Knut och Inge Larsson
D:o	av 1 37	.	352	Hässlunda kommun, skoltomt
D:o	1 9	1/8	353	Anna Roos
D:o	1 10	1	354-356 a	Ekeby m.fl. församlingars pastorat, löneboställe; arr. Nils Pålsson
				Summa
				Avdelning 19.
D:o	1 10	1	356 b-361	Ekeby m.fl. församlingars pastorat, löneboställe; arr. Nils Pålsson
D:o	1 10	1	362-363	Ekeby m.fl. församlingars pastorat, prästgård
D:o	7 12	17/288	364-366	Erik Tornérhjelm
D:o	1 18	1/2	367-369	Dens.
				Summa

6	7	8	9	10	11	12
	1.30	1.30	-.38	1735.-	676.-	2411.-
	1.82	1.82		1972.-	455.-	2427.-
	3.12	3.12	-.38	3707.-	1131.-	4838.-
1.12		1.12	-.08	613.-		613.-
1.12		1.12	-.08	613.-		613.-
-.48	21.60	22.08	-.02	8522.-	4212.-	12734.-
			-.17			
-.42		-.42		166.-		168.-
	1.50	1.50		226.-	255.-	481.-
-.90	23.10	24.-	-.19	8916.-	4467.-	13383.-
	3.50	3.50		1788.-	1190.-	2978.-
-.24		-.24		208.-		208.-
-.78		-.78		770.-		770.-
1.-		1.-		735.-		735.-
2.02	3.50	5.52		3501.-	1190.-	4691.-

1	2	3	4	5
				Avdelning 20.
Hässlunda	9 1	1/8	370-371	Anna Roos
D:o	9 8	avst.	372-373	Hässlunda kommun, skoltomt
D:o	samf.		374-375	Dens: , skoltomt
D:o	8		376	Dens. , skoltomt
D:o	av 37 1		377,379	Dens. , skoltomt
D:o	av 37 1		378	Dens. , arr. Kurt Nilsson
D:o	37 14	avst.	380	Knut och Inge Larsson
				Summa
				Summa för alla avdelningar

6	7	8	9	10	11	12
-.63		-.63	2.79	441.-		441.-
-.15		-.15	-.05	480.-		480.-
-.12		-.12	-.01	384.-		384.-
-.11		-.11		352.-		352.-
-.20		-.20		625.-		625.-
-.16		-.16		704.-		704.-
-.08		-.08		144.-		144.-
1.45		1.45	2.85	3130.-		3130.-
35.59	125.52	161.11	9.25	128364.-	25719.-	154083.-

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Brutt enligt
B Lith 58.73

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Call Z. Uy
H

Bil. D.

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1											
2			Huvudavlopp.								
3			Dikessträckan A-B.								
4											
5	Schaktningsarbete m.m.										
6	20+50- -18+50	200	Schaktning, ngt. grusbl.								
7			lera m^3	100	2.50	250	-				
8											
9	18+50- -17+08	142	Schaktning, ngt. grusbl.								
10			lera m^3	230	2.25	517	50	767	50		
11											
12	Tills.	342 m.	Tills.	330 m^3							
13											
14	Ersättningar.										
15	För markförlust;										
16											
17	till ägaren av Mörarp 3 48		m^2	140	0.36	50	40				
18	" " av Mörarp 2 8		m^2	320	0.36	115	20				
19											
20	För intrång genom upplag;										
21	till ägaren av Mörarp 3 48		m^3	100	1.-	100	-				
22											
23	" " av Mörarp 2 8		m^3	230	1.-	230	-	495	60		
24	Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %							186	90	1450	-
25											
26			Dikessträckan B-C.								
27	Schaktningsarbete m.m.										
28											
29	17+08- -16+60= =85+00	48	Schaktning, ngt. grusbl.								
30			lera m^3	140	2.25			315	-		
31											
32	Tills.	48 m.	Tills.	140 m^3							
33											
34	Ersättningar;										
35	För markförlust;										
			Överföres					315	-	1450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					315	-	1450	-
		till ägaren av Mörarp 2 9 2 m	60	0.36	21	60				
		" " av Mörarp 2 8 2 m	60	0.36	21	60				
		För intrång genom upplag;								
		till ägaren av Mörarp 2 9 3 m	70	1.-	70	-				
		" " av Mörarp 2 8 3 m	70	1.-	70	-	183	20		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20%					51	80	550	-
		Dikessträckan C-D.								
		Schaktningsarbete m.m.								
16+60--15+54= =110+84	106	Schaktning, ngt. grusbl. lera 3 m	430	2.25	967	50				
110+84--110+00= =14+40	84	Schaktning, ngt. grusbl. lera 3 m	630	2.-	1260	-				
14+40--12+64= =100+48	176	Schaktning, ngt. grusbl. lera 3 m	970	2.25	2182	50				
							4410	-		
Tills.	366 m.	Tills. 2030 m 3 .								
		Ersättningar:								
		Ersättning för markförlust;								
		till ägaren av Mörarp 2 8 , Torsten Wullt 2 m	770	0.36	277	20				
		till ägaren av Mörarp 2 9 , Martin F. Stolts sterbhus 2 m	750	0.36	270	-				
		Överföres			547	20	4410	-	2000	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			547	20	4410	-	2000	-
		Ersättning för intrång genom upplag;								
		till ägaren av Mörarp 2 8								
		Torsten Wullt m3	1050	1.-	1050	-				
		till ägaren av Mörarp 2 9								
		Martin F. Stolts sterbhus m3	980	1.-	980	-				
		Ersättning till Mörarps Energiförening								
		för flyttning av en kraftlednings-								
		stolpe; förslagsvis			40	-	2617	20		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %					872	80	7900	-
		Dikessträckan D-E.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
100+48- -100+00= =12+08	48	Cementrör; 36" m	48	25.-	1200	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	48	9.50	456	-	1656	-		
		Tills. 48 m.								
		Diverse arbeten.								
		Ommurning av rörutloppet vid 100+48=								
		=12+64 samt stensättning av det öppna								
		avloppets botten och slänter; utföres								
		enl. typritning st.	1				350	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %					394	-	2400	-
		Överföres							12300	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							12300	-
		Dikessträckan E-F.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
12+08- -12+00	8	Den nuvarande bron mellan 12+08 och 12+00 för allm. vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50, utförd som valvbro av natursten, ombygges. I bron nersänkes en 100 cm. /40"/ kulvertledning, som förbindes med brons landfästen genom betonggjutning. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen			-	-				
12+00- -10+78= =40+00	122	Cementrör; 36" m	122	25.-	3050	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	122	8.25	1006	50	4056	50		
Tills.	130 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 60" med kopplingar; vid 11+35 och 10+78 = 40+00	st.	2	300	600	-			
		Anslutningsbrunnar vid nerströms-								
		Överföres				600	-	4056	50	12300 -

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			600	-	4056	50	12300	-
		och uppströmssidorna för allmänna								
		vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50;								
		vid 12+08 och 12+00. Utföras av Väg-								
		förvaltningen st.	2				600	-		
Ersättningar.										
		Ersättning till Vägförvaltningen för								
		ombyggnad av bron för allm.vägen								
		Vallåkra-Mörarp eller väg 50 samt								
		för nybyggnad av anslutningsbrun-								
		nar vid den ombyggda brons änd-								
		punkter					1400	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %							943	50	7000	-
		Dikessträckan F-G.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
10+78- -10+28	50	Cementrör; 32" m	50	21	1050	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	50	8.25	412	50				
10+28- -7+16	312	Cementrör; 32" m	312	21.-	6552	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	312	8.-	2496	-	10510	50		
Tills.	362 m.									
		Överföres					10510	50	19300	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					10510	50	19300	-
Diverse arbeten.										
		Brunn 60" med kopplingar; vid 9+92 st.	1	300	300	-				
		Brunnar 48" med kopplingar; vid 10+28, 8+30 och 7+16 st.	3	220	660	-	960	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							2529	50	14000	-
		Dikessträckan G-H.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
7+16--1+58	558	Cementrör; 32" m	558	21.-	11718	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	558	7.-	3906	-				
1+58--0+00	158	Cementrör; 28" m	158	17.-	2686	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	158	4.75	750	50	19060	50		
Tills.	716 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 48" med kopplingar; vid 5+75, 4+63, 4+16, 3+30 och 1+58 st	5	220	1100	-				
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 0+75, 0+54 och 0+00 st	3	160	480	-	1580	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							4159	50	24800	-
		Överföres							58100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							58100	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C-X.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
16+60= =85+00- -86+00	100	Cementrör; 12" m	✓100	5.-	500	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	100	3.40	340	-				
86+00- -87+12	112	Cementrör; 9" m	✓112	3.40	380	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	112	2.75	308	-				
87+12- -87+21= =90+00= 95+00	9	Den nuvarande trumman mellan 87+12 och 87+21 för allm. vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50, utförd av 12" Höganäsrör, bibehålles oförändrad. Trumman rensas och befrias från slam m	9	2.-	18	-	1546	80		
Tills.	221	m.								
Diverse arbeten.										
		Ommurning av rörutloppet vid 16+60 = = 85+00 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter;								
		Överföres					1546	80	58100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1546	80	58100	-
		utföres enligt typritning								
			st.	1	200	-				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 86+00								
		och 86+68	st.	2	70.-	-				
		Anslutningsbrunnar vid nerströms-								
		och uppströmssidorna av trumman								
		för allmänna vägen Vallåkra-Mörarp								
		eller väg 50; vid 87+12 och 87+21=								
		= 90+00=95+00. Utföras av Vägför-								
		valtningen.			-	-				
		Rothuggning och borttagning av träd								
		och buskar			30	-	370	-		
		Ersättningar:								
		Ersättning till Vägförvaltningen för								
		nya anslutningsbrunnar vid ner-								
		ströms- och uppströmssidorna av								
		trumman för allmänna vägen Vallåkra-								
		Mörarp eller väg 50					200	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %					383	20	2500	-
		Dikessträckan X-Y.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
87+21- -88+50	129	Cementrör; 9"	m	v129	3.40		438	60		
		Schaktning, stämpling, rör-								
Övf.	129	Överföres					438	60	60600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	129	Överfört			438	60			60600	-
		läggning, höljning m	129	3.25	419	25				
88+50- -89+08	58	Cementrör; 6" m	ν58	1.90	110	20				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	58	2.75	159	50	1127	55		
Tills.	187 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 87+70,								
		88+50 och 89+08 st.	3	70.-			210	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %							262	45	1600	-
		Dikessträckan X-Z.								
87+21= =90+00- -91+40	140	Cementrör; 6" m	140ν	1.90	266	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	140	2.75	385	-	651	-		
Tills.	140 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 24" med kopplingar; vid 91+40 st	1				70	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %							129	-	850	-
		Dikessträckan X-Å.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
87+21= =90+00= =95+00- -96+40	140	Cementrör; 8" m	ν140	3.-	420	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	140	3.-	420	-				
Övf.	140	Överföres			840	-			63050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	140	Överfört			840	-			63050	-
96+40--98+64	224	Cementrör; 6" m	v224	1.90	425	60				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	224	3.-	672	-	1937	60		
Tills.	364 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 96+40,								
		97+56, 97+76 och 98+64 st.	4	70.-			280	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %							432	40	2650	-
		Dikessträckan F-I.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
10+78==40+00--43+07	307	Cementrör; 21" m	v307	11.-	3377	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	307	6.-	1842	-				
43+07--45+00==130+00	193	Cementrör; 24" m	v193	13.50	2605	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	193	8.50	1640	50				
130+00--130+84==46+00	84	Cementrör; 24" m	v84	13.50	1134	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	84	10.50	882	-	11481	-		
Tills.	584 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 41+12,								
		42+10, 43+07, 44+28, 45+00=130+00								
		Överföres					11481	-	65700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					11481	-	65700	-
		och 130+84=46+00 st.	6	160	960	-				
		Brunn 40" med kopplingar och intag för								
		dagvatten vid 43+21 st	1	200.-	200	-				
		Rothuggning och borttagning av träd								
		och buskar			80	-	1240	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %					2579	-	15300	-
		Dikessträckan I-J.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
130+84--132+50	166	Cementrör; 24" m	v166	13.50	2241	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	166	9.-	1494	-				
132+50--132+77=48+36	27	Cementrör; 24" m	v27	13.50	364	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	27	9.-	243	-				
48+36--50+28=80+00	192	Cementrör; 21" m	v192	11.-	2112	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	192	6.50	1248	-	7702	50		
	Tills. 385 m.									
		Diverse arbeten.								
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 132+77=								
		= 48+36, 48+90, 49+88 och 50+28=								
		=80+00 st	4	160	640	-				
		Rothuggning och borttagning av träd								
		Överföres			640	-	23002	50	81000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			640	-	23002	50	81000	-
		buskar och stubbar			20	-	660	-		
Oförutsett och		arbetsledning c:a 20 %					1737	50	10100	-
		Dikessträckan J-K-L.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
50+28- -52+54	226	Cementrör; 18" m	226	8.25	1864	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	226	4.25	960	50				
52+54- -54+33= =70+00	179	Cementrör; 15" m	179	6.50	1163	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	179	3.25	581	75	4570	25		
Tills.	405 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 51+07,								
		51+95 och 52+54 st.	3	95.-	285	-				
		Brunn 48" med kopplingar; vid 54+33=								
		= 70+00 st	1		220	-				
		Rothuggning och borttagning av träd								
		och buskar			30	-	535	-		
Oförutsett och		arbetsledning c:a 20 %					1044	75	6150	-
		Dikessträckan L-M.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
54+33- -56+08	175	Cementrör; 15" m	175	6.50	1137	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
Övf.	175	Överföres			1137	50			97250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	175	Överfört			1137	50			97250	-
		läggning, höljning m	175	4.50	787	50	1925	-		
Tills.	175 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 32" med kopplingar; vid 55+50 st	1	95.-			95	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							430	-	2450	-
		Dikessträckan M-N.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
56+08--56+20==121+56	12	Den nuvarande trumman mellan 56+08 och 56+20 = = 121+56 för allm. vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2, utförd av 18" cementrör, bibehålles oförändrad. Trumman rensas och befrias från slam	12.-	2.-	24	-				
56+20==121+56--121+10	46	Cementrör; 15" m	46.-	6.50	299	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	46.-	5.50	253	-	576	-		
Tills.	58 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 32" med kopplingar; vid 121+10 st	1	95.-	95	-				
		Överföres			95	-	576	-	99700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			95	-	576	-	99700	-
		Anslutningsbrunnar vid nerströms- och uppströmssidorna av trumman för allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2; vid 56+08 och 56+20. Utföras av Vägförvaltningen					95	-		
		Ersättningar.								
		Ersättning till Vägförvaltningen för nya anslutningsbrunnar vid nerströms- och uppströmssidorna av trumman för allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2					400	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %					129	-	1200	-
		Dikessträckan N-O:								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
121+10--120+00==58+10	110	Cementrör; 15" m	110	6.50	715	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	110	5.75	632	50				
58+10--60+20	210	Cementrör; 15" m	210	6.50	1365	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	210	4.00	840	-				
60+20--60+34	14	Cementrör; 15" m	14	6.50	91	-				
		Schaktning, upptagning av befintlig 18" rörledning,								
Övf.	344	Överföres			3643	50			100900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	344	Överfört			3643	50			100900	-
		stämpling, rörläggning, höljning m	14	5.50	77	-				
60+34--61+28	94	Cementrör; 15" m	94	6.50	611	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	94	4.25	399	50				
61+28--63+58	230	Cementrör; 12" m	230	5.00	1150	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	230	3.25	747	50				
63+58--64+80==100+00	122	Cementrör; 12" m	122	5.-	610	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	122	3.25	396	50	7635	-		
Tills.	780 m.									
		Diverse arbeten.								
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 120+00= = 58+10, 59+00, 59+86, 60+87, 61+28 och 64+80=100+00 st.	6	95.-	570	-				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 62+38, 62+84, 63+23 och 63+58 st.	4	70.-	280	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			50	-	900	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20%					1715	-	10250	-
		Dikessträckan O-P.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
		Överföres							111150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							111150	-
64+80--67+16	236	Cementrör; 12" m	236	5.-	1180	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	236	3.-	708	-				
67+16--67+24	8	Den nuvarande trumman mellan 67+16 och 67+24 för allmänna vägen Frillestad-Hässlunda-Bosarp eller väg 1174, utförd av 40" cementrör, bibehålles oförändrad. Trumman rensas och befrias från slam m	8	3.-	24	-				
67+24--67+50	26	Cementrör; 12" m	26	5.-	130	-				
		Schaktning, upptagning av befintlig rörledning, stämpling, rörläggning,								
		diktning, höljning m	26	5.25	136	50	2178	50		
Tills.	270 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 65+21,								
		66+00, 66+70 och 67+50 st.	4	70.-	280	-				
		Anslutningsbrunnar vid nerströms- och								
		uppströmssidorna för allmänna								
		Överföres			280	-	2178	50	111150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			280	-	2178	50	111150	-
		vägen Frillestad-Hässlunda-Bosarp								
		eller väg 1174; vid 67+16 och 67+24.								
		Utföras av Vägförvaltningen			-	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			40	-	320	-		
		Ersättningar:								
		Ersättning till Vägförvaltningen för								
		nya anslutningsbrunnar vid ner-								
		ströms- och uppströmssidorna av								
		trumman för allmänna vägen Frille-								
		stad-Hässlunda-Bosarp eller väg 1174					700	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20%					501	50	3700	-
		Dikessträckan I-V.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
130+84= =46+00- -47+28	128	Cementrör; 6"	m	128	1.90		243	20		
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning	m	128	1.75		224	-	467	20
Tills.	128 m.									
		Diverse arbeten.								
		Brunn 24" med kopplingar; vid 47+28	st	1	70.-				70	-
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							112	80	650	-
		Dikessträckan J-U.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
50+28=	130	Cementrör; 8"	m	130	3.-		390	-		
Övf.	130		Överföres				390	-	115500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	130	Överfört			390	-			115500	-
=80+00- -81+30		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	130	2.50	325	-				
81+30- -81+73	43	Cementrör; 8" m	43	3.-	129	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	43	2.25	96	75	940	75		
Tills.	173 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 24" med kopplingar; vid 81+30 st	1	70.-	70	-				
		Anslutningsbrunn vid ner strömssidan								
		för allmänna vägen Tågarp-Mörarp								
		eller väg 2 vid 81+73. Utföres av								
		Vägförvaltningen.								
		Rothuggning och borttagning av träd								
		och buskar			30	-	100	-		
Ersättningar:										
		Ersättning till Vägförvaltningen för								
		ny anslutningsbrunn vid nerströms-								
		sidan av trumman för allmänna vä-								
		gen Tågarp-Mörarp eller väg 2					140	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %							219	25	1400	-
		Dikessträckan L-S.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
		Överföres							116900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							116900	-
54+33= =70+00- -72+72= =140+00	272	Cementrör; 9" m	272	3.40	924	80				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	272	3.75	1020	-	1944	80		
Tills.	272 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 71+78								
		och 72+72=140+00 st	2	70.-			140	-		
		Oförutsett och arbetsledning c:a 20%					415	20	2500	-
		Dikessträckan S-T.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
72+72= =140+00- -141+02	102	Cementrör; 9" m	102	3.40	346	80				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	102	3.50	357	-				
141+02- -143+27	225	Cementrör; 9" m	225	3.40	765	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, diktning,								
		höljning m	225	4.-	900	-				
143+27- -143+78	51	Cementrör; 8" m	51	3.-	153	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, diktning,								
		höljning m	51	4.50	229	50				
143+78- -144+62	84	Cementrör; 8" m	84	3.-	252	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
Övf.	462	Överföres			3003	30			119400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
Övf.	462	Överfört				3003	30			119400	-
		läggning, höljning	m	84	3.75	315	-				
144+62- -144+66	4	Cementrör; 8"	m	4	3.-	12	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, diktning, höljning	m	4	5.75	23	-				
144+66- -144+72= =77+22	6	Cementrör; 8"	m	6	3.-	18	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, diktning, höljning	m	6	4.50	27	-				
77+22- -77+81	59	Cementrör; 8"	m	59	3.-.	177	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, diktning, höljning	m	59	5.25	309	75				
77+81- -77+87	6	Cementrör; 8".	m	6	3.-	18	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, diktning,									
		höljning	m	6	5.75	34	50				
Tills.	537 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 141+02,									
		141+54, 141+92, 142+62, 143+27,									
		143+78, 144+23, 144+72=77+22 och									
		77+87	st	9	70.-	630	-	4567	55		
		Överföres						4567	55	119400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4567	55	119400	-
Oförutsett och arbetsledning c:a 20 %							932	45	5500	-
		Dikessträckan N-R.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
121+10= =56+82- -57+24	42	Cementrör; 6" m	42	1.90	79	80				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	42	1.25	52	50	132	30		
Tills.	42 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 24" med kopplingar; vid 57+24 st	1	70.-			70	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							47	70	250	-
		Dikessträckan O-Q.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
64+80= =100+00- -101+63	163	Cementrör; 8" m	163	3.-	489	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	163	6.25	1018	75				
101+63- -101+73	10	Cementrör; 8" m	10	3.-	30	-				
		Schaktnihg, stämpling,								
		rörläggning, diktning,								
		höljning m	10	7.75	77	50				
101+73- -102+08	35	Cementrör; 6" m	35	1.90	66	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	35	6.-	210	-	1891	75		
Tills.	208 m.	Överföres					1891	75	125150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1891	75	125150	-
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 101+06,								
		101+73 och 102+08	st	3	70.-	210	-			
		Rothuggning och borttagning av träd								
		och buskar				75	-	285	-	
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%								473	25	2650 -
					Summa kostnad				127800	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
342		Dikessträckan A-B				1450	-			
48		" B-C				550	-			
366		" C-D				7900	-			
48		" D-E				2400	-			
130		" E-F				7000	-			
362		" F-G				14000	-			
716	2012	" G-H				24800	-	58100	-	
		Sidoavlopp.								
221		Dikessträckan C-X				2500	-			
187		" X-J				1600	-			
140		" X-Z				850	-			
364		" X-Å				2650	-	7600	-	
584		" F-I				15300	-			
385		" I-J				10100	-			
Svf.1881		Överföres				25400	-	65700	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf. 1881		Överfört			25400	-	65700	-		
405		Dikesstr[illegible]kan J-K-L			6150	-				
175		" L-M			2450	-				
58		" M-N			1200	-				
780		" N-O			10250	-				
270		" O-P			3700	-				
128		" I-V			650	-				
173		" J-U			1400	-				
272		" L-S			2500	-				
537		" S-T			5500	-				
42		" N-R			250	-				
208	4929	" O-Q			2650	-	62100	-	127800	-
Summa	6941 m.				Summa kostnad				127800	-

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. E.

Alternativt förslag för dikessträckorna A-B, B-C och C-D.

Dikessträckan A-B.

Schaktningsarbete, rör m.m.

20+50- -18+50	200	Schaktning; ngt. grusbl.
Övf.	200	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	200	lera m^3	200	2.50	500	-				
18+50--17+08	142	Cementrör; 36" m	142	25	3550	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	142	5.50	781	-	4831	-		
Tills.	342 m.									
Diverse arbeten.										
		Ommurning av rörutloppet vid 18+50 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter till 2 m. längd st.	1	200.-	200	-				
		Brunnar 60" med kopplingar; vid 17+68 och 17+08 st.	2	300.-	600	-	800	-		
Ersättningar;										
		För markförlust; till ägaren av Mörarp 3:48 m^2	250	0.36	90	-				
		För intrång genom upplag; till ägaren av Mörarp 3:48 m^3	200	1.-	200	-	290	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							1179	-	7100	-
		Dikessträckan B-C.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
17+08--16+60= =85+00	48	Cementrör; 36" m	48	25.-	1200	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	48	5.50	264	-	1464	-		
Tills.	48 m.	Överföres					1464	-	7100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1464	-	7100	-
Diverse arbeten.										
		Brunn 60" vid 16+60=85+00	st	1	300		300	-		
Oförutsett och arbetsledning c:a 20%							336	-	2100	-
		Dikessträckan C-D.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
16+60= =85+00- -15+54= =110+84	106	Cementrör; 36"	m	106	25.-		2650	-		
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	m	106	10.50		1113	-		
15+54= =110+84- -110+00= =14+40	84	Cementrör; 36"	m	84	25.-		2100	-		
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	m	84	10.50		882	-		
110+00= =14+40- -12+64= =100+48	176	Cementrör; 36"	m	176	25.-		4400	-		
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	m	176	9.75		1716	-	12861	-
Tills.	366 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 60" med kopplingar; vid 16+43, 15+54=110+84, 14+40=110+00, 13+83 och 13+53	st.	5	300		1500	-		
		Brunn 60" med kopplingar; vid 12+64= =100+48 300 kr. Härifrån avgår kostnaderna för ommurning enligt huvudförslag med 200 kr. Återstår					100	-	1600	-
		Överföres							14461	- 9200 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					14461	-	9200	-
Oförutsett och		arbetsledning c:a 20%					2939	-	17400	-
				Summa kostnad					26600	-

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning. Bil. F.

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Huvudavlopp.				
				Dikessträckan A-B.				
20+50	-	0.95	0.50	3.35	1:1.50	45.82		Öppet avlopp hela sträckan. Fp. 2. S om Mörarps jv.st. I betongplint till kraftledningsstolpe vid järnvägens Ö sida, 31 m. S om korsningen mellan ägovägen från Mörarpsgården och järnvägen. Utmärkt med järndubb i kors i plintens Ö sida; jb + 48.- m.
20	50	1.-	"	3.50	"			
19+50	50	1.30	"	4.40	"			
19	50	1.40	"	4.70	"	2:1000		
18+50	50	1.50	"	5.-	"			
18	50	1.50	"	5.-	"			
17+50	50	1.70	"	5.60	"	46.42		
17+08	42	1.60	"	5.30	"	46.59		
Summa	342 meter.							
				Dikessträckan B-C.				
17+08	-	1.60	0.50	5.30	1:1.50	46.59		Öppet avlopp hela sträckan.
17	8	1.60	"	5.30	"	4:1000		
16+60= =85+00	40	1.55	"	5.15	"	46.78		
Summa	48 meter.							
				Dikessträckan C-D.				
16+60	-	1.55	0.50	5.15	1:1.50	46.78		Öppet avlopp hela sträckan.
16+50	10	1.85	"	6.05	"			
16	50	1.80	"	5.90	"	4:1000		
15+54= =110+ +84	46	1.80	"	5.90	"	47.20		
						4:1000		
Övf.	106							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	106					4:1000		
110+50	34	2.-	0.50	6.50	1:1.50			
110=14+40	50	1.80	"	5.90	"	47.54		Fp. 3 i stallbyggnad till fastigheten Mörarp 29, äg. Martin F. Stolts stbhs c:a 40 m. Ö om avvägningspunkten 14+16. Utmärkt med järhdubb i kors i grundmuren till V. gaveln; 0.40 m. N om SV knuten; jst + 50.50 m.
14	40	1.95	"	6.35	"			
13+50	50	1.85	"	6.05	"	4:1000		
13	50	1.85	"	6.05	"			
12+64=100+48	36	1.80	"	5.90	"	48.24		
Summa	366	meter.						
				Dikessträckan D-E.				
100+48	-	1.80				48.31		36" cementrör mellan 100+48 och 100=12+08.
						4:1000		
100=12+08	48	1.75				48.50		
Summa	48	meter.						
				Dikessträckan E-F.				
12+08	-	1.60				48.63		Nuv. bron mellan 12+08 och 12+00 ombygges. I bron nersänkes en 100 cm. /40"/ kulvertledning, som förbindes med brons landfästen genom betonggjutning. 36" cementrör mellan 12+00 och 10+78= = 40+00.
12	8	2.10				48.65		
11+50	50	2.15						
						3:1000		
11	50	1.90						
10+78=40+00	22	1.70				49.02		
Summa	130	meter.						
				Dikessträckan F-G.				
10+78	-	1.70				49.02		32" cementrör mellan 10+78 och 7+16.
10+50	28	1.90				3:1000		
Övf.	28							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	28							
10	50	2.05						Fp. 4 i loge till fastigheten Hässlunda 37:12, äg. John W. Jönsson, ca 46 m. V om avvägningspunkten 9+92. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till Ö gaveln, 2.-m S om NÖ knuten; jst + 52.95 m.
9+50	50	1.90						
9	50	1.95				3:1000		
8+50	50	1.90						
8	50	1.85						
7+50	50	1.80						
7+16	34	1.80				50.10		
Summa	362 meter.							
				Dikessträckan G-H.				
7+16	-	1.75				50.14		32" cementrör mellan 7+16 och 1+58.
7	16	1.70						
6+50	50	1.65				4:1000		
6	50	1.60						
5+50	50	1.80						
5	50	1.80				51.-		Fp. 5 i stallbyggnad till fastigheten Hässlunda 37:19, äg. Eric Fredlund, ca 92 m. V om avvägningspunkten 4+63. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till N gaveln, 0.50 m. V om NÖ knuten; jb + 55.28 m.
4+50	50	1.70						
4	50	1.70						
3+50	50	1.80				4:1000		
3	50	1.75						
2+50	50	1.85						
2	50	1.80						
1+58	42	1.80				52.37		
Övf.	558							

FLYGTRYCKSKA BOKTRYCKERIET SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	558							
1+58	-	1.75				52.40		28" cementrör mellan 1+58 och 0.
1+50	8	1.70						
1	50	1.65				7:1000		
0+50	50	1.60						
0	50	1.60				53.50		
Summa	716	meter.						
				Sidoavlopp.				
				Dikessträckan C-X.				
16+60= =85+00	-	1.35				47.-		12" cementrör mellan 16+60= = 85+00 och 86.
85+50	50	1.60				2:1000		
86	50	1.35				47.20		
86	-	1.30				47.25		9" cementrör mellan 86 och 87+12.
+50	50	1.70						
87	50	1.55				11:1000		
+12	12	1.35				48.48		
87+21= =90+00= =95+00	9	1.45				48.72		Nuv. trumman mellan 87+12 och 87+21=90+00=95+00 bibehålles oförändrad.
Summa	221	meter.						
				Dikessträckan X-Y.				
87+21	-	1.45				48.72		9" cementrör mellan 87+21 och 88+50.
87+50	29	1.25				1:1000		
88	50	1.15						
+50	50	1.60				48.85		6" cementrör mellan 88+50 och 89+08
Övf.	129					13:1000		

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	129					13:1000		
89	50	1.40						
89+08	8	1.40				49.60		
Summa	187	meter.						
				Dikessträckan X-Z.				
87+21= =90+00	-	1.45				48.75		6" cementrör mellan 87+21=90+ +00 och 91+40.
90+50	50	1.45				49.05		
91	50	1.40				12:1000		
+40	40	1.50				50.13		Fp. 8 i sten i gränsen mellan Hässlunda och Mörarps socknar, ca 50 m. S om avvägningspunkten 91+40. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst + 52.34 m.
Summa	140	meter.						
				Dikessträckan X-Å.				
87+21= =90+00= =95+00	-	1.50				48.70		8" cementrör mellan 87+21=90+ +00=95+00 och 96+40.
95+50	50	1.35						
						2:1000		
96	50	1.20						
+40	40	1.55				48.98		
+40	-	1.45				49.01		6" cementrör mellan 96+40 och 98+64.
+50	10	1.45						
97	50	1.55				14:1000		
+50	50	1.50						
+56	6	1.50				50.63		
+56	-	1.45				50.65		
98	44	1.65						
						8:1000		
+50	50	1.60						
Övf.	350							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	350					8:1000		
+64	14	1.50				51.51		
Summa	364	meter.						
				Dikessträckan F-I.				
10+78= =40+00	-	1.55				49.20		21" cementrör mellan 10+78= = 40+00 och 43+07.
						15:1000		
40+50	50	1.80				49.95		Fp. 4. Se sträckan F-G.
41	50	1.65						
+50	50	1.90				6:1000		
42	50	1.95						
+50	50	1.95						
43	50	2.-						
+07	7	1.95				51.49		
+07	-	1.90				51.55		24" cementrör mellan 43+07 och 45=130+00-130+84=46+00.
+50	43	2.15						
44	50	1.95				1.8:1000		
+50	50	2.15						Fp. 9. i ekonomibyggnad till fastigheten 37[27], äg. John W. Jöns son, ca 170 m. Ö om avvägningspunkten 44+28, mätt längs ägovägen. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till V gaveln; jb + 54.88 m.
45= =130+00	50	2.30				51.90		
130+50	50	2.10				1.8:1000		
130+84= =46+00	34	1.50				52.05		
Summa	584	meter.						
				Dikessträckan I-J.				
130+84	-	1.50				52.05		24" cementrör mellan 130+84 och 132+77 = 48+36.
131	16	1.80				1.8:1000		
Övf.	16							

426611

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	16							
+50	50	1.95				1.8:1000		
132	50	1.85						
+50	50	1.65						
132+77= =48+36	27	1.85				52.40 52.41		21" cementrör mellan 132+77= =48+36 och 50+28=80+00.
48+50	14	1.85						
49	50	2.-						
						3:1000		
+50	50	2.05						
50	50	1.85						
50+28= =80+00	28	1.80				52.98		
Summa	385	meter.						
					Dikessträckan J-K-L.			
50+28	-	1.70				53.05		18" cementrör mellan 50+28 och 52+54.
50+50	22	1.55				7:1000		
51	50	1.55						
51+07	7	1.55				53.60 53.61		
51+50	43	1.65						
52	50	1.75				8:1000		
+50	50	1.65						
+54	4	1.70				54.78		Fp. 10 i loge till fastigheten Hässlunda 37:18, äg. Eric Fredlund, ca 90 m. Ö om avvägningspunkten 52+38. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till V. gaveln; jst + 58.67 m.
+54	-	1.65				54.82		
						18:1000		
53	46	1.60				55.65		15" cementrör mellan 52+54 och 54+33=70+00.
Övf.	272					20:1000		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449193

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	272					20:1000		
+50	50	1.60						
54	50	1.45						
54+33= =70+00	33	1.55				58.31		
Summa	405	meter.						
				Dikessträckan L-M.				
54+33	-	1.50				58.34		15" cementrör mellan 54+33 och 56+08.
54+50	17	1.45				27:1000		
55	50	1.50				60.15		
						22:1000		
+50	50	1.70				61.25		
56	50	1.45				22:1000		Fp. 11 i stödjemur av betong ca 85 m. S om avvägningspunkten 56+08. Utmärkt med järndubb i kors å betongmurens översida; jb + 66.14 m.
+08	8	1.40				62.53		
Summa	175	meter.						
				Dikessträckan M-N.				
56+08	-							Nuv. trumman mellan 56+08 och 56+20=121+56 bibehålles oförändrad.
56+20= =121+56	12	1.25				62.71		15" cementrör mellan 56+20=121+56 och 121+10.
121+50	6	1.65				7:1000		
121+10	40	1.80				63.03		
Summa	58	meter.						
				Dikessträckan N-O.				
121+10	-	1.75				63.09		15" cementrör mellan 121+10 och 120=58+10-61+28.
121	10	1.85						
						6:1000		
120+50	50	1.70						
Övf.	60							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	60					6:1000		
120= =58+10	50	1.70				63.75 63.76		
58+50	40	1.75				6:1000		
59	50	1.90				64.30		
+50	50	2.05				6:1000		
+86	36	1.75				64.82 64.83		
60	14	1.65				5:1000		
+50	50	1.55						Fp. 12 vid avvägningspunkten 60+78 i betongplint till järnstativ för kraftledning. Utmärkt med järndubb i kors i plintens N sida; jb + 67.19 m.
+87	37	1.60				65.34		
61	13	1.75				5:1000		
+28	28	1.80				65.54 65.55		12" cementrör mellan 61+28 och 64+80 = 100+00.
+50	22	1.65						
62	50	1.50				9:1000		
+38	38	1.65				66.54 66.56		
+50	12	1.70						
63	50	1.65				12:1000		
+50	50	1.80						
+58	8	1.80				68.- 68.01		
64	42	1.75						
+50	50	1.65				7:1000		
64+80= =100+ +00	30	1.60				68.86		
Summa	780 meter.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan O-P.				
64+80	-	1.55				68.89		12" cementrör mellan 64+80 och 67+16 samt mellan 67+24 och 67+50.
65	20	1.60				3:1000		
+50	50	1.60						
66	50	1.55				69.25		
+50	50	1.50				7:1000		
67	50	1.85						
+16	16	1.80				70.06		Nuv. trumman av 40" rör mellan 67+16 och 67+24 bibehålles oförändrad. Fp. 14 i betongplint till varningsmärke för huvudled, ca 10 m V om avvägningspunkten 67+24. Utmärkt med järndubb i kors; jb. + 72.79 m.
+24	8	1.85				70.25		
						2:1000		
67+50	26	1.35				70.30		
Summa	270 meter.							
				Dikessträckan I-V.				
130+84= =46+00	-	1.35				52.20		6" cementrör mellan 130+84= 46+00 och 47+28.
46+50	50	1.65				2:1000		
47	50	1.50						
+28	28	1.55				52.46		
Summa	128 meter.							
				Dikessträckan J-U.				
50+28= =80+00	-	1.40				53.40		8" cementrör mellan 50+28 = = 80+00 och 81+73.
80+50	50	1.60				8:1000		
81	50	1.55						
+30	30	1.65				54.44 54.46		
+50	20	1.45				27:1000		
Övf.	150							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	150					27:1000		
+73	23	1.50				55.62		
Summa	173 meter.							
			Dikessträckan L-S.					
54+33= =70+00	-	1.40				58.50		9" cementrör mellan 54+33 = = 70+00 och 72+72= 140+00.
70+50	50	1.45						
71	50	1.50						
+50	50	1.65				22:1000		
72	50	1.75						Fp. 11 i stödjemur av betong ca 85 m. S om avvägningspunkten 56+08. Utmärkt med järndubb i kors å betongmurens översida; jb + 66.14 m.
+50	50	1.65						
72+72= =140+ +00	22	1.60				64.49		
Summa	272 meter.							
			Dikessträckan S-T.					
72+72= =140+00	-	1.55				64.55		9" cementrör mellan 72+72=140+ +00 och 143+27.
140+50	50	1.50				13:1000		
141	50	1.50				65.88		
+50	50	1.50				13:1000		
+92	42	1.55				67.05		
142	8	1.55						
+50	50	1.55				6:1000		
143	50	1.30						
+27	27	1.60				67.86		
Övf.	327							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	327							
+27	-	1.55				67.91		8" cementrör mellan 143+27 och 144+72=77+22-77+87.
+50	23	1.65						
144	50	1.70				8:1000		
+50	50	1.50						
144+72= =77+22	22	1.70				69.07		
144+72= =77+22	-	1.65				69.13		
77+50	28	1.85						
						15:1000		
+81	31	1.85						
+87	6	1.80				70.11		
Summa	537	meter.						
					Dikessträckan N-R.			
121+10= =56+82	-	1.50				63.44		6" cementrör mellan 121+10= = 56+82 och 57+24.
57	18	1.60				9:1000		
+24	24	1.35				63.82		
Summa	42 meter.							
					Dikessträckan O-Q.			
64+80= =100+00	-	1.60				68.90		8" cementrör mellan 64+80 = = 100+00 och 101+73.
						12:1000		
100+50	50	1.65				69.50		
101	50	1.80						Fp. 13=Huvudfix. I Ekonomiska Kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Hässlunda s:n angiven sålunda:"Hässlunda kyrka, i flat grundsten vid NV hörnet, 0.18 m. rakt V om detta hörn, kst. + 74.98 m".
						3:1000		
+50	50	2.35						
+73	23	2.35				69.87		
Övf.	173							

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	173							
+73	-	2.30				69.92		6" cementrör mellan 101+73 och 102+08.
102	27	2.05				3:1000		
102+08	8	1.95				70.02		
Summa	208	meter.						
				Sammandrag.				
				Huvudavlopp.				
342			Dikessträckan		A-B			
48				"	B-C			
366				"	C-D			
48				"	D-E			
130				"	E-F			
362				"	F-G			
716	2012			"	G-H			
				Sidoavlopp.				
221			Dikessträckan		C-X			
187				"	X-Y			
140				"	X-Z			
364				"	X-Å			
584				"	F-I			
385				"	I-J			
405				"	J-K-L			
175				"	L-M			
58				"	M-N			
Övf.	2519	2012						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.2519	2012							
780				Dikessträckan		N-O		
270				"		O-P		
128				"		I-V		
173				"		J-U		
272				"		L-S		
537				"		S-T		
42				"		N-R		
208	4929			"		O-Q		
Summa	6941 meter.							

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss dikessträcka lämnas särskilda föreskrifter här nedan. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Mellan avvägningspunkterna 15+54 = 110+84 och 110+00 = 14+40 skall avloppet upptagas i rak nyskärning.

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

3/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. ~~Följer avloppet gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.~~ Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.

4/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1.50 m: och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.50 m.

5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

6/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som

beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

8/ **Ommurningar skola** utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

13/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

16/ Fyllningen får ej innehålla sten.

17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från

brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

20/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brumnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovan - för tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunns-

delen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. G.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m.fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolutioner den 23 juli 1941, den 22 januari 1945 och den 27 februari 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m.fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län. Då förordnandena avse syneförrättningar röran-

de torrläggning av i stort sett samma områden, hava de förordnade förrättningarna sammanförts och handlagts vid en för alla gemensam syneförrättning. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 95 Vegeån, omfattar marker på båda sidorna om allmänna vägen från Tågarp till Mörarp eller väg 2. Det begränsas i väster av allmänna vägen från Vallåkra till Mörarp eller väg 50 och i söder av allmänna vägen från Frillestad över Hässlunda till Bosarp eller väg 1174. Inom området ligger Hässlunda kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffan-

de torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Assartorp 5 och 7 samt Hässlunda 9, 10, 12, 18, 25, 27 och 37 i Hässlunda socken ävensom Mörarp 2 och 3 i Mörarps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom större och mindre floddiken, vilka från trakten invid och väster om Hässlunda kyrka avleda vattnet norr ut förbi Mörarps järnvägsstation till Hasslarpsån eller Lillån, ett biflöde till Vegeån. De nuvarande avloppen hava dock ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, ej kunna rationellt täckdikas, och betydande områden översvämmas dessutom även vid normala flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankartor hava efter nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet /ritningarna 1-2/. Hela området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartorna. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över dels nuvarande avlopp, dels vissa nya dikessträckor, som under syneförrättningen påfordrats /ritningarna 3-7/. Ritningar till broar och trummor för allmänna och enskilda vägar, som beröras av företaget, återfinnas på profil- och sektionsritningarna till vederbörande dikessträckor.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska Kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Hässlunda socken beskrives

sålunda: " Hässlunda kyrka, i flat grundsten vid NV hörnet, 0.18 m. rakt V om detta hörn; kst + 74.98 m". Fixpunkten finnes utmärkt på plankartan ritning 2, där den betecknats Fp 13.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrläggningsföretaget följande avlopp och dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 20+50 söder ut till avvägningspunkten 17+08 i gränsen mellan fastigheterna Mörarp 2^{8} och 2^{9}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 17+08 söder ut till avvägningspunkten 16+60 = 85+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 16+60 = 85+00 söder ut till avvägningspunkten 12+64 = 100+48 i gränsen mellan Mörarps och Hässlunda socknar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket med undantag för sträckan 15+54 = 110+84-110+00 = 14+40, där avloppet skall upptagas i rak nyskärning. Hela dikessträckan skall utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 12+64 = 100+48 söder ut till avvägningspunkten 100+00 = 12+08 vid nerströmssidan av bron för väg 50.

Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 36" cementrör. Vid avvägningspunkten 12+64 = 100+48 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 12+08 söder ut till avvägningspunkten 10+78 = 40+00.

Delsträckan 12+08-12+00 omfattar bron för vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50. Den nuvarande bron skall ombyggas som 100 cm / 40"/ rörtrumma med anslutningsbrunnar. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 12+00-10+78 = 40+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 36" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 11+35 och 10+78 = 40+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 10+78 = 40+00 söder ut till avvägningspunkten 7+16. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 32" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 10+28, 9+92, 8+30 och 7+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 7+16 söder ut till avvägningspunkten 0+00, där ett täckt avlopp från dikningsföretaget "Hässlunda-Gedsholm av år 1940" tillstöter. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 32" och 28" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 5+75, 4+63, 4+16, 3+30, 1+58, 0+75, 0+54 och 0+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

8/ Diksesträckan C-X från avvägningspunkten 16+60 = 85+00 öster ut till och genom allmänna vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50 vid avvägningspunkten 87+21 = 90+00 = 95+00.

Delsträckan 16+60 = 85+00 - 87+12 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" och 9" cementrör. Vid avvägningspunkten 16+60 = 85+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 86+00 och 86+ + 68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 87+12-87+21 = 90+00 = 95+00 omfattar trumman för allmänna vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50. Den nuvarande trumman av 12" Höganäsrör skall bibehållas oförändrad men rensas och befrias från slam. Nya anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans ändpunkter. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.

9/ Diksesträckan X-Y från avvägningspunkten 87+21 = 90+00 = 95+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 89+08. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 87+70, 88+50 och 89+08 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Diksesträckan X-Z från avvägningspunkten 87+21 = 90+00 = 95+00 öster ut till avvägningspunkten 91+40. ~~Det nya avloppet skall upptagas till avvägningspunkten 91+40.~~ Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 91+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

ritningar.

11/ Dikessträckan X-Å från avvägningspunkten 87+21 = 90+00 = 95+00 söder och öster ut till avvägningspuhkten 98+64. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 96+40, 97+56, 97+76 och 98+64 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12/ Dikessträckan F-I från avvägningspunkten 10+78 = 40+00 öster och söder ut till avvägningspunkten 130+84 = 46+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket med undantag för sträckan 45+00 = 130+00-130+84 = 46+00, vilken skall upptagas i rak nyskärning. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 21" och 24" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 41+12, 42+10, 43+07, 43+21, 44+28, 45+00 = 130+00 och 130+84 = 46+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

13/ Dikessträckan I-J från avvägningspunkten 130+84 = 46+00 öster och söder ut till avvägningspunkten 50+28 = 80+00.

Delsträckan 130+84 = 46+00-132+77 = 48+36 skall upptagas i rak nyskärning medan delsträckan 132+77 = 48+36-50+28 = 80+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 24" och 21" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 132+77 = 48+36, 48+90, 49+88 och 50+28 = = 80+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

14/ Dikessträckan J-K-L från avvägningspunkten 50+28 = 80+00 söder ut till avvägningspunkten 54+33 = 70+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning

av 18" och 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 51+07, 51+95, 52+54 och 54+33 = 70+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

15/ Dikessträckan L-M från avvägningspunkten 54+33 öster ut till västra sidan av allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2 vid avvägningspunkten 56+08. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 55+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

16/ Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 56+08 öster och söder ut till avvägningspunkten 121+10 = 56+82.

Delsträckan 56+08-56+20 = 121+56 omfattar trumman för allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2. Den nuvarande trumman av 18" cementrör skall bibehållas oförändrad men rensas och befrias från slam. Nya anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans ändpunkter. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 56+20 = 121+56 $\overset{-121+10}{\sqrt{}}$ = 56+82 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 121+10 = 56+82 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

17/ Dikessträckan N-O från avvägningspunkten 121+10 = 56+82 öster och söder ut till avvägningspunkten 64+80 = 100+00.

Delsträckan 121+10 = 56+82-120+00 = 58+10 skall upptagas i rak nyskärning medan delsträckan 120+00 = 58+10-64+80 = 100+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket. Hela dikes-

sträckan skall utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 120+00 = 58+10, 59+00, 59+86, 60+87, 61+28, 62+38, 62+84, 63+23, 63+58 och 64+80 = 100+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

18/ Dikessträckan O-P från avvägningspunkten 64+80 = 100+00 söder ut genom allmänna vägen Frillestad-Hässlunda-Bosarp eller väg 1174 till avvägningspunkten 67+50 i gränsen mellan Hässlunda 10^{1} och 12^{7}.

Delsträckan 64+80 = 100+00-67+16 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skall byggas vid avvägningspunkterna 65+21, 66+00 och 66+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 67+16-67+24 omfattar trumman för allmänna vägen Frillestad-Hässlunda-Bosarp eller väg 1174. Den nuvarande trumman av 100 cm. /40"/ cementrör skall bibehållas oförändrad men rensas och befrias från slam. Nya anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans ändpunkter. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.

Delsträckan 67+24-67+50 skall upptagas i nyskärning 3 å 4 m. väster om den nuvarande rörledningen och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 67+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

19/ Dikessträckan I-V från avvägningspunkten 130+84 = 46+00 öster ut till avvägningspunkten 47+28. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 47+28 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

20/ Dikessträckan J-U från avvägningspunkten 50+28 = 80+00 öster ut till nerströmssidan av trumman genom allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2 vid avvägningspunkten 81+73. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 81+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Den nuvarande vägtrumman av 15" cementrör skall bibehållas oförändrad men rensas och befrias från slam. Ny anslutningsbrunn skall byggas vid trummans nerströmssida eller vid avvägningspunkten 81+73. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.

21/ Dikessträckan L-S från avvägningspunkten 54+33 = 70+00 söder ut till avvägningspunkten 72+72 = 140+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 71+78 och 72+72 = 140+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

22/ Dikessträckan S-T från avvägningspunkten 72+72 = 140+00 söder ut över avvägningspunkten 144+72 = 77+22 till avvägningspunkten 77+87. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör.

Delsträckan 141+02-143+78 skall läggas 4 å 5 m. väster om gränsen mellan Hässlunda 25^{1} och de från denna fastighet avstyckade tomterna.

Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 141+02, 141+54, 141+92, 142+62, 143+27, 143+78, 144+23, 144+72 = 77+22 och 77+87 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

23/ Dikessträckan N-R från avvägningspunkten 121+10 = 56+82 öster ut till

avvägningspunkten 57+24. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 57+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

24/ Dikessträckan O-Q från avvägningspunkten 64+80 = 100+00 väster och norr ut till avvägningspunkten 102+08.

Delsträckan 64+80 = 100+00-101+06 skall upptagas i nyskärning 2 à 3 m. söder om gränsen mellan Hässlunda $9\frac{1}{14}$ och $37\frac{14}{1}$, delsträckan 101+06-101+73 följa gränsen mellan Hässlunda $9\frac{1}{1}$ och $37\frac{1}{1}$ och delsträckan 101+73-102+08 upptagas i nyskärning 2 à 3 m. öster om skoltomten. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 101+06, 101+73 och 102+08 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Förrättningsmannen har även efter framställning av viss sakägare /förrättningsprotokollets § 8/ utarbetat alternativt förslag för utförande av dikessträckorna A-B, B-C och C-D som täckta avlopp. Förslaget framgår av ritning 7 samt av kostnadsförslaget bil. E. Kostnaderna enligt huvudförslaget /öppet avlopp/ hava beräknats till 9900 kr. och enligt alternativförslaget /täckt avlopp/ till 26600 kr. Då merkostnaderna enligt alternativförslaget alltså beräknats till 16700 kr. och då avloppet framgår i gränsen mellan två skilda brukningsdelar, kan det ej anses ekonomiskt försvarligt att utföra dikessträckorna A-B, B-C och C-D som täckta ledningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av

vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom platserna, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 8. På plankartorna /ritningarna 1-2/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 å 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

1/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan E-F, korsar mellan avvägnings-

punkterna 12+08 och 12+00 allmänna vägen från Vallåkra till Mörarp eller väg 50. I korsningspunkten, som ligger c:a 850 m. söder vägskälet i Mörarp /vägarna 2 och 50/, finnes nu en valvbro med 1.80 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger på höjden + 49.15 m. och vägbanan över bron ungefär på höjden + 51.45 m. Bron har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste ombyggas. Ombyggnaden skall utföras på sådant sätt, att bottnen i den nuvarande bron uppgräves och sänkes, varefter en ny 100 cm. /40"/ rörtrumma lägges genom bron. Den nya rörtrummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 48.63 m. och vid uppströmssidan på höjden + 48.65 m. Nya anslutningsbrunnar, utförda av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, skola vidare byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola kopplas dels den nya trumman, dels de nya anslutande rördiken, som dikningsföretaget skall utföra.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar och kopplingar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 1400 kr.

2/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-X, korsar mellan avvägningspunkterna 87+12 och 87+21 = 90+00 = 95+00 allmänna vägen från Vallåkra till Mörarp eller väg 50. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m. söder vägskälet i Mörarp /vägarna 2 och 50/, finnes nu en trumma av 30 cm. /12"/ Höganäsrör. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan den rensats och befriats från slam. Nya anslutningsbrunnar, utförda av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, måste dock byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola kopplas dels

den nuvarande vägtrumman, dels de nya anslutande rördiken, som dikningsföretaget skall utföra.

De nya anslutningsbrunnarna med kopplingar samt rensningen av trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 200 kr.

3/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan J-U, skall vid avvägningspunkten 81+73 anslutas till nerströmssidan eller västra sidan av en 37.5 cm. /15"/ rörtrumma genom allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2. I anslutningspunkten, som ligger c:a 1700 m. sydost vägskälet i Mörarp /vägarna 2 och 50/, saknas f.n. anslutningsbrunn, varför en ny sådan måste byggas. Den nya brunnen skall utföras av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, och i densamma skall kopplas dels den nuvarande vägtrumman, dels det nya anslutande rördike, som dikningsföretaget skall utföra.

Den nya anslutningsbrunnen med kopplingar samt rensningen av den nuvarande trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 140 kr.

4/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan M-N, korsar mellan avvägningspunkterna 56+08 och 56+20 = 121+56 allmänna vägen från Tågarp till Mörarp eller väg 2. I korsningspunkten, som ligger c:a 2150 m. sydost vägskälet i Mörarp /vägarna 2 och 50/ och c:a 1000 m. norr vägskälet i Hässlunda /vägarna 2 och 1174/, finnes nu en 45 cm. /18"/ rörtrumma, som kan bibehållas oförändrad sedan den rensats och befriats från slam. Nya anslutningsbrunnar, utförda av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, måste dock byggas vid trumman änd-

ändpunkter. I de nya brunnarna skola kopplas dels den nuvarande trumman, dels de nya anslutande rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra.

De nya anslutningsbrunnarna med kopplingar samt rensningen av trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 400 kr.

5/ Det nya täckta avloppet, dikessträckan O-P, korsar mellan avvägningspunkterna 67+16 och 67+24 allmänna vägen från Frillestad över Hässlunda till Bosarp eller väg 1174. I korsningspunkten, som ligger c:a 200 m.öster vägskälet i Hässlunda / vägarna 2 och 1174/, finnes nu en 100 cm/40"/ rörtrumma. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan den rensats och befriats från slam. Nya anslutningsbrunnar, utförda av betongrör av lämpliga dimensioner, med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten, måste dock byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola kopplas dels den nuvarande trumman, dels de nya anslutande rörledningar, som dikningsföretaget skall utföra.

De nya anslutningsbrunnarna med kopplingar samt rensningen av trumman skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 700 kr.

Till ledning för Vägförvaltningen vid ombyggnad mellan avvägningspunkterna 12+08 och 12+00 / dikessträckan E-F/ av bron för vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50 lämnas här följande beskrivning på den i närheten av byggnadsplatsen liggande fixpunkt 3; "Mörarp 2^{9}, Martin F. Stolts sterbhus tillhörig gård, ladugårdsbyggnadens västra gavel, sockeln, 0.4 m. norr om sydvästra knuten; jst + 50.50 m".

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen dels när Vägförvaltningen kan påbörja och senast bör hava färdigställt de

arbeten, som beskrivits här ovan, dels när dikningsföretaget i egen regi eller genom entreprenör kommer att utföra sådana arbeten, som beröra allmänna vägar.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Om någon vill bygga ny bro eller trumma över den öppna dikessträckan A-B-C-D,äger han därtill rätt under förutsättning att bron eller trumman bygges på sådant sätt,att den ej hindrar vattenframrinningen och ej heller äventyrar avloppets framtida bestånd. Ny trumma får ej utföras av mindre rör än 150 cm /60"/.

Mom. 8. Telefonledningar m.m.

Vid avvägningspunkten 67+16 /dikessträckan O-P/ korsas det nuvarande avledningsdiket av en telefonkabel. I samband med dikets uppgrävning och rörläggning måste kabelns läge möjligen ändras eller vissa åtgärder vidtagas för att skydda densamma, arbeten som det åligger Kungl. Telegrafverket att utföra utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören, Kungl. Telegrafverket, Hälsingborg, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Kraftledningar.

Sydsvenska Kraftaktiebolagets anläggningar.

Vid avvägningspunkten 60+78 / dikessträckan N-O/ står ett järnstativ för högspänd kraftledning, som möjligen måste omstagas i samband med flod-dikets uppgrävning. Omstagningen skall utföras av Sydsvenska Kraftaktiebolaget, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med belopp, som motsvarar bolagets självkostnader för detsamma.

~~Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Sydsvenska Kraft-aktiebolaget, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med belopp, som motsvarar bolagets självkostnader för detsamma~~

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Sydsvenska Kraft-aktiebolagets distriktskontor i Malmö när sådana arbeten komma att utföras, som beröra bolagets anläggningar.

Mörarps Energiförenings anläggningar.

I samband med dikningsföretagets utförande blir det möjligen nödvändigt att flytta eller omstaga ett mindre antal kraftledningsstolpar. Detta skall utföras av Mörarps Energiförening, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med belopp, som motsvarar föreningens självkostnader för detsamma.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Mörarps Energiförening, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra föreningens anläggningar.

Mom. 10. Träd och stängsel.

Träd utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flyt-
ta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer
stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial
säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna,
skall ersättning utgå med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförsla-
get bil. D. Ersättningarna, som uträknats i förhållande till den bort-
grävda markens areal och värde efter företaget, belöpa till 756 kr.

Under arbetets utförande kan det möjligen bliva nödvändigt att för-
skjuta sektionen och utvidga floddiket på annat sätt, än som framgår av
sektionsritningarna. I så fall skola ersättningarna för markförlust om-
räknas av lantbruksingenjören och de i kostnadsförslaget bil. D för viss
dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas i förhållande
till storleken av de arealer, som av olika fastigheter verkligen tagits
i anspråk för floddikets utvidgning.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed de öppna dikessträckorna skall er-
sättning utgå med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget bil.
D. Ersättningarna hava uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd,
med beaktande av olika svårigheter och kostnader för massornas utplane-
ring och bortforsling samt under antagande, att massorna uppläggas till
lika mängder på båda sidorna om det uppgrävda avloppet. De ersättnings-
belopp, som skola utgivas för intrång genom jordupplag, belöpa till 2500

kronor.

Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna kan det möjligen uppstå svårigheter att upplägga massorna på ovan angivet sätt, exempelvis om arbetet kommer att utföras med grävmaskin eller om man vill undvika att skada växande gröda på viss sida. Det blir då kanske nödvändigt att fördela massorna olika eller att upplägga alla massor på ena sidan. I så fall skola ersättningarna för intrång genom jordupplag omräknas av lantbruksingenjören och de i kostnadsförslaget för viss dikessträcka uträknade ersättningsbeloppen därefter jämkas i förhållande till storleken av de schaktmassor, som verkligen upplagts på varje fastighet.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas vid sidorna. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för viss jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning till Vägförvaltningen.

Till Vägförvaltningen skall utgå ersättning för nedan angivna arbeten med följande belopp:

a/ Ombyggnad av bro mellan avvägningspunkterna 12+08 och 12+00 /dikessträckan E-F/ för allmänna vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50 1400 kr.

b/ Rensning av rörtrumma mellan avvägningspunkterna 87+12 och 87+21 /dikessträckan C-X/ för allmänna vägen Vallåkra-Mörarp eller väg 50 samt nya anslutningsbrunnar 200 "

c/ Rensning av rörtrumma vid avvägningspunkten 81+73 /dikessträckan J-U/ för allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2 samt ny anslutningsbrunn 140 "

d/ Rensning av rörtrumma mellan avvägningspunkterna 56+08 och 56+20 = 121+56 /dikessträckan M-N/ för allmänna vägen Tågarp-Mörarp eller väg 2 samt nya anslutningsbrunnar 400 "

e/ Rensning av rörtrumma mellan avvägningspunkterna 67+16 och 67+24 /dikessträckan O-P/ för allmänna vägen Frillestad-Hässlunda-Bosarp eller väg 1174 samt nya anslutningsbrunnar 700 "

Tillsammans 2840 kr.

Ersättningen skall utbetalas så snart Vägförvaltningen utfört arbetet och detsamma blivit av lantbruksingenjören avsynat och godkänt.

5/ Ersättning till Sydsvenska Kraftaktiebolaget.

För omstagning av järnstativ vid avvägningspunkten 60+78 /dikessträckan N-O / skall dikningsföretaget utgiva ersättning, motsvarande bolagets självkostnader för arbetet.

6/ Ersättning till Mörarps Energiförening.

För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall dikningsföretaget utgiva ersättning, motsvarande föreningens självkostnader för arbetet.

7/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställd ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5% för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 127800 kr, däri inräknade kostnaderna för de nya avloppens utförande, diverse andra arbeten, ersättningar samt vissa tillägg för arbetsledning m.m. Vid utredning

rörande schaktmassornas storlek hava de efter sektionsritningarna teoretiskt beräknade massorna ökats med 15%.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. D/. Även kostnadsförslaget till det alternativa förslaget att utföra dikessträckorna A-B, B-C och C-D som täckta avlopp har bilagts förrättningshandlingarna/bil. E/.

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden är dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget. Resultatet av synemännens värdering av alstringsbåtnaden framgår av värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de av dikningsföretaget berörda fastigheterna.

Förutom alstringsbåtnad kommer en del fastigheter även att få en betydande brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avledningsdiken, som nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta

avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande avledningsdikenas hinder för brukningen, varierar mellan 1 kr. och 7 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastigheters marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden. Resultatet av synemännens värdering och beräkning av brukningsbåtnaden framgår av värderingslängden bil. B.

Sammandrag av värderingslängderna för alstringsbåtnad och brukningsbåtnad återfinnes i bil. C.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnes ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 20 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängderna bil. A och C, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-9 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1506 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2000 /1450+550/ kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 10-13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2541 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-X upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning

hava beräknats till 4500 /2500+2000/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 14-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1992 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan X-Y upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten X, för vilket kostnaderna beräknats till 600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2200 /1600+600/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 19-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1057 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan X-Z upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten X, för vilket kostnaderna beräknats till 600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1450 /850+600/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 26-42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3413 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan X-Å upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten X, för vilket kostnaderna beräknats till 600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250 / 2650+600/ kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägogigurerna 43-61 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9999 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12300 / 10300+2000/ kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 62-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7031 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torr-

läggning hava beräknats till 9500 /7000+2500/ kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 71-84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13258 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 5000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 19000 / 14000+5000/ kr.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 85-133 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 28859 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 7000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 31800 /24800+7000/ kr.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 134-204 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 34582 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-I-J upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 5000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 30400 /25400+5000/ kr.

För att avdelning 11, som omfattar ägogigurerna 205-207 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1571 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-V upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 4500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5150 / 650+4500/ kr.

För att avdelning 12, som omfattar ägofigurerna 208-212 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2163 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan J-U upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten J, för vilket kostnaderna beräknats till 3000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning

hava beräknats till 4400 /1400+3000/ kr.

För att avdelning 13, som omfattar ägofigurerna 213-238 a och 239 a--244 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9039 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna J-K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten J, för vilket kostnaderna beräknats till 4500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10650 /6150+4500/ kr.

För att avdelning 14, som omfattar ägofigurerna 245-258 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2999 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L- S upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2700 / 2500+200/ kr.

För att avdelning 15, som omfattar ägofigurerna 259-297 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7418 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan S-T upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten S, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8000 / 5500+2500/ kr.

För att avdelning 16, som omfattar ägofigurerna 238 b och 298-308 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4838 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna L-M-N upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4050 / 3650+400/ kr.

För att avdelning 17, som omfattar ägofigurerna 309-312 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 613 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-R upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torr-

läggning hava beräknats till 1750 /·250+1500/ kr.

För att avdelning 18, som omfattar ägofigurerna 313-356 a med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13383 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan N-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11750 /10250+1500/ kr.

För att avdelning 19, som omfattar ägofigurerna 356 b - 369 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4691 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan O-P upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till 800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500 /·3700+800/ kr.

För att avdelning 20, som omfattar ägofigurerna 370-380 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3130 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan O-Q upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till 800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3450 kr/ 2650+800/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget området framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1506	A-B-C	2000	1.3280212
2.	2541	C-X	2500	0.9838646
3.	1992	X-Y	1600	0.8032128
4.	1057	X-Z	850	0.8041627
5.	3413	X-Å	2650	0.7764430
6.	9999	C-D-E	10300	1.0301031

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7.	7031	E-F	7000	0.9955909
8.	13258	F-G	14000	1.0559662
9.	28859	G-H	24800	0.8593506
10.	34582	F-I-J	25400	0.7344861
11.	1571	I-V	650	0.4137492
12.	2163	J-U	1400	0.6472491
13.	9039	J-K-L	6150	0.6803849
14.	2999	L-S	2500	0.8336112
15.	7418	S-T	5500	0.7414397
16.	4838	L-M-N	3650	0.7544439
17.	613	N-R	250	0.4078303
18.	13383	N-O	10250	0.7658970
19.	4691	O-P	3700	0.7887444
20.	3130	O-Q	2650	0.8466453

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
154083	127800	0.8294231

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1506	2000	1.3280212

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2.	2541	4500	1.7709563
3.	1992	2200	1.1044176
4.	1057	1450	1.3718070
5.	3413	3250	0.9522414
6.	9999	12300	1.2301230
7.	7031	9500	1.3511591
8.	13258	19000	1.4330969
9.	28859	31800	1.1019092
10.	34582	30400	0.8790700
11.	1571	5150	3.2781667
12.	2163	4400	2.0342117
13.	9039	10650	1.178228
14.	2999	2700	0.9003001
15.	7418	8000	1.0784578
16.	4838	4050	0.8371227
17.	613	1750	2.8548124
18.	13383	11750	0.8779795
19.	4691	4500	0.9592837
20.	3130	3450	1.1022364

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	4047	4500	1.1119347

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-3	6039	6100	1.0101010
1-4	7096	6950	0.9794250
1-5	10509	9600	0.9135027
1-6	20508	19900	0.9703530
1-7	27539	26900	0.9767965
1-8	40797	40900	1.002525
1-9	69656	65700	0.9432066
1+6	11505	12300	1.0691003
1+6-7	18536	19300	1.0412170
1+6-8	31794	33300	1.0473674
1+6-9	60653	58100	0.9579081
1+6-7+10	53118	44700	0.8415226
1+6-7+10-11	54689	45350	0.8292343
1+6-7+10+12	55281	46100	0.8339212
1+6-7+10-12	56852	46750	0.8223105
1+6-7+10-13	65891	52900	0.8028410
1+6-7+10-14	68890	55400	0.8041805
1+6-7+10-15	76308	60900	0.7980814
1+6-7+10-16	81146	64550	0.7954797
1+6-7+10-17	81759	64800	0.7925732
1+6-7+10-18	95142	75050	0.7888209
1+6-7+10-19	99833	78750	0.7888173
1+6-7+10-20	102963	81400	0.7905753
1+6-7+10-18+20	98272	77700	0.7906626

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+6+7+10-13+16-20	92546	73400	0.7931190
1+6+7+10-13+16-18	84725	67050	0.7913838
1+6+7+10-13+16-19	89416	70750	0.7912454
2-3	4533	6100	1.3456871
2-4	5590	6950	1.2432915
2-5	9003	9600	1.0663112
3-4	3049	3050	1.0003279
3-5	6462	5700	0.8820798
1-7	27539	26900	0.976796
1-7+10	62121	52300	0.841905
1-7+10-11	63692	52950	0.831344
1-7+10-12	65855	54350	0.825298
1-7+10-13	74894	60500	0.807808
1-7+10-14	77893	63000	0.808801
1-7+10-15	85311	68500	0.802944
1-7+10-16	90149	72150	0.800341
1-7+10-17	90762	72400	0.797690
1-7+10-18	104145	82650	0.793605
1-7+10-19	108836	86350	0.793395
1-7+10-20	111966	89000	0.794884

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1, 6-7 och 10-19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 99833 kr. påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 78750 kr.

Dessa avdelningars relativa kostnader belöpa alltså till 0.7888173.

Avdelningarna 2-5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9003 kr. påföras kostnaderna för avlopp över eget område eller 7600 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.8441630.

Avdelning 20 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3130 kr. påföres kostnaderna för avlopp över eget område eller 2650 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.8466453.

Avdelningarna 8 och 9 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 42117 kr. påföras kostnaderna för avlopp över eget område - återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning - eller 38800 kr. Dessa avdelningars relativa kostnader belöpa alltså till 0.9212432.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. H/. I längdens kolumn 15 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare eller brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med "sök".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. F och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda ar-

betare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade samt på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ De öppna dikessträckornas dagbredd vid olika punkter skall beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla

6/ Vid övergång från brantare till flackare sidolutning skall ändringen utföras successivt på sätt närmare framgår av profilritningarna och bestämmelserna i detta utlåtande.

7/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6" - 9" 15 kg, 10"-12" 16 kg. 15" 17 kg, 18" 19 kg. 21" 22 kg, 24" 25 kg, 28" 30 kg, 32" 35 kg. och 36" 40 kg.

8/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

9/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej

uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

10/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna somm villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas i förhållande till de beräknade kostnader, med vilka fastigheterna inom dikningssamfälligheten skola deltaga i kostnaderna för samma dikessträckornas första utförande eller efter de fördelningstal, som återfinnas i fördelningslängden bil. I. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minst skada och intrång för de jordägare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas såsnart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna dikessträckorna nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 20. Fixpunkter.

Huvudfix / = fixpunkt 13/. I Ekonomiska Kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Hässlunda socken angiven sålunda: "Hässlunda kyrka, i flat grundsten vid N.V. hörnet, 0.18 m. rakt V om detta hörn, kst. + 74.98 m".

Vid undersökningarna hava ett flertal nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankartorna som profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1 vid Mörarps järnvägsstation. I elevatorränna av betong, murens översida, sydöstra hörnet. Utmärkt med järndubb i kors; jb. + 47.00 m.

Fixpunkt 2 söder om Mörarps järnvägsstation. I betongplint till kraftledningsstolpe vid järnvägens östra sida, 31 m. söder om korsningen mellan ägovägen från Mörarpsgården och järnvägen. Utmärkt med järndubb i kors i plintens östra sida; jb. + 48.00 m.

Fixpunkt 3 i stallbyggnad till fastigheten Mörarp 2^{9}, äg. Martin F. Stolts sterbhus, c:a 40 m. öster om avvägningspunkten 14+16. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till västra gaveln; 0.40 m. norr om sydvästra knuten; jst. + 50.50 m.

Fixpunkt 4 i loge till fastigheten Hässlunda 37^{12}, äg. John W. Jönsson, c:a 46 m. väster om avvägningspunkten 9+92. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till östra gaveln, 2.00 m. söder om nordöstra knuten; jst. + 52.95 m.

Fixpunkt 5 i stallbyggnad till fastigheten Hässlunda 37^{19}, äg. Erik Fredlund, c:a 92 m. väster om avvägningspunkten 4+63. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till norra gaveln, 0.50 m. väster om nordöstra knuten; jb + 55.28 m.

Fixpunkt 6 i gränsen mellan Hässlunda 37^{9}, 37^{3} och 37^{15}. Utmärkt med järnrör i betongplint c:a 30 m. söder om avvägningspunkten 0+00. På järnröret + 55.50 m.

Fixpunkt 7 i brunn till rörledning, c:a 80 m. söder om avvägningspunkten 0+00. Utmärkt med kors på den översta brunnsringens översida; + 56.135 m.

Fixpunkt 8 i sten i gränsen mellan Hässlunda och Mörarps socknar, c:a 50 m. söder om avvägningspunkten 91+40. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. + 52.34 m.

Fixpunkt 9 i ekonomibyggnad till fastigheten Hässlunda 37^{27}, äg. John W. Jönsson, c:a 170 m. öster om avvägningspunkten 44+28, mätt längs ägovägen. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till västra gaveln; jb. + 54.88 m.

Fixpunkt 10 i loge till fastigheten Hässlunda 37^{18}, äg. Erik Fredlund, c:a 90 m. öster om avvägningspunkten 52+38. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till västra gaveln; jst. + 58.67 m.

Fixpunkt 11 i stödjemur av betong c:a 85 m. söder om avvägningspunkten 56+ + 08. Utmärkt med järndubb i kors å betongmurens översida; jb. + 66.14 m.

Fixpunkt 12 vid avvägningspunkten 60+78 i betongplint till järnstativ för kraftledning. Utmärkt med järndubb i kors i plintens norra sida; jb. + 67.19 m.

Fixpunkt 13. Se huvudfix.

Fixpunkt 14 i betongplint till varningsmärke för huvudled, c:a 10 m. väster om avvägningspunkten 67+24. Utmärkt med järndubb i kors; jb. + 72.79 m.

Fixpunkt 15 vid avvägningspunkten 143+27 i gränsen mellan Hässlunda 25^{1}, 25^{10} och 25^{12}. Utmärkt med järnrör i betongplint; på röret + 29.38 m.

Fixpunkt 16 utmärkt med järnrör i betongplint, i gränsen mellan Hässlunda 27^{1}, 9^{9} och 9^{2} vid avvägningspunkten 77+81. Utmärkt med järnrör i betongplint; på röret + 72.26 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse

en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två styrelsesuppleanter, två revisorer och en revisorssuppleant. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Hässlunda och Mörarps kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 231.12 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 kroha 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Hässlunda-Mörarp av år 1948". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26 Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden.

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Bil. H.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mörarps s:n.				
476/1000	8 2	V a	Mörarp ; Torsten Wullt, arr.				
			Nils Wullt		1-7,50-53	B	
36/1000	9 2	V	D:o ; Martin F. Stolts				
			stbhs, arr. Magne Stolt	sök.	8,9,54-61	L,B	
					10-13		
47/512	49 3	V	D:o ; Martin F. Stolts stbhs,				
			arr. Magne Stolt	sök.	14-17, 21-36	L, B	
			Hässlunda s:n.				
1/8	2 5	V a	Assartorp; John W. Jönsson	sök.	18	B	
avst	12 37	V	Hässlunda; Dens.	sök.	62-70 134-141	L,B	
					71-84		
avst.	25 37	V	D:o ; Dens.	sök.	142-152	L,B	
avst.	27 37	V	D:o ; Dens.	sök.	153-170	L,B	
avst.	2 9	V ej	D:o ; Dens.	sök.	292	ej	
1/48	20 7	V a	Assartorp; Uno Assarsson		19	B	
1/48	19 7	V a	D:o ; Edvin Svensson		20,37,38	B	
1/96	18 7	V a	D:o ; Oscar Nilsson		39,40	B	
1/96	17 7	V a	D:o ; Edvin Cederholm	sök.	41,42	B	
avst.	10 37	V	Hässlunda; Åke Hansson	sök.	43-49	L,B	
avst.	19 37	V	D:o ; Erik Fredlund	sök.	85-116	L,B	
avst.	18 37	V	D:o ; Dens.	sök.	189-204 208-234	L,B	

Överföres

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Del. kostn.	Del. kostn.	Del. kostn.	Del. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.7888173	0.8441630	0.8466453	0.9212432			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14		15	16	17		18
3881.-	3061.40						3061.40	2.395	✓		a
5371.-	4236.74										
2541.-		2145.02					6381.76	✓ 4.994	✓ L	1	
5557.-		4691.01					4691.01	✓ 3.670	✓ L	1	
116.-		97.92					97.92	0.077	✓		a
11940.-	9418.48										
13258.-				12213.84			21632.32	✓ 16.927	✓ L	10	
1958.-	1544.51						1544.51	✓ 1.209	✓ L	10	
5824.-	4594.07						4594.07	✓ 3.595	✓ L	10	
625.-	493.01						493.01	0.386	✓		tmt
44.-		37.14					37.14	0.029	✓		a
192.-		162.08					162.08	0.127	✓		a
210.-		177.28					177.28	0.139			a
343.-		289.55					289.55	0.227	✓		a
2253.-	1777.21						1777.21	✓ 1.391	✓ L	2	
23161.-				21336.91			21336.91	✓ 16.695	✓ L	3	
20342.-	16046.12						16046.12	✓ 12.556	✓ L	3	
97616.-	41171.54	7600.-		33550.75			82322.29	64.417			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
avst.	37 9	√	Hässlunda ; Arthur Lindell	sök √	117-128	L.B	
avst.	37 3	√a	D:o ; Hilding Hallbäck		129	B.	
avst.	37 15	√a	D:o ; N.P. Rasmusson, arr. Hjalmar Rasmusson		130-132	B.	
avst.	25 4	√e	D:o ; N.P. Rasmusson		283	"	
avst.	37 20	√	D:o ; Johan Olsson	sök √	171-188 205-207	L,B	
3/8	25 1	√	D:o ; Herbert Andersson	sök.	235-276 298-302	L.B	
1/8	27 1	√	D:o ; Dens.	sök √	293-295	L.B	
av	25 1	√	D:o ; Bertil Eriksson		277	"	
av	25 1	√	D:o ; Hugo Johansson		278	"	
av	25 1	√	D:o ; Gunnar Olsson		279	"	
avst.	25 7	√	D:o ; Gunnar Olsson		280	"	
avst.	25 6	√	D:o ; Alexander Lundgren		281	"	
avst.	25 5	√	D:o ; Tage Hansson		282	"	
avst.	25 10	√ e	D:o ; Sven Lund		284	"	
avst.	25 12	√	D:o ; Mauritz Månsson		285	"	
avst.	25 11	√	D:o ; Dens.		286	"	
avs.	25 2	√	D:o ; Karl Nilssons stbhs		287	"	
avst.	25 9	√	D:o ; William Nilsson	sök.	288	"	
avst.	9 4	√	D:o ; Harry Henningsson		289	"	
av	9 1	√	D:o ; Augusta Olssons stbhs		290	"	
			Överföres				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.7888173	0.8441630	0.8466453	0.9712432			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14		15	16	17		18
97616.-	41171.54	7600.-		33550.75			82322.29	64.417			
5574.-				5135.01			5135.01	✓ 4.018	✓	5	
8.-				7.37			7.37	0.006	✓		a
116.-				106.87			106.87	0.084	✓		a
200.-	157.76						157.76	0.123	✓		Kmt
11666.-	9202.34						9202.34	✓ 7.201	✓	4	
10490.-	8274.69						8274.69	✓ 6.475	✓	6	
220.-	173.54						173.54	✓ 0.136	✓	6	
300.-	236.65						236.65	0.185	✓		Kmt
300.-	236.65						236.65	0.185	✓		Kmt
240.-	189.32						189.32	0.148	✓		Kmt
234.-	184.58						184.58	0.144	✓		Kmt
300.-	236.65						236.65	0.185	✓		Kmt
160.-	126.21						126.21	0.099	✓		Kmt
250.-	197.21						197.21	0.154	✓		Kmt
200.-	157.76						157.76	0.123	✓		Kmt
200.-	157.76						157.76	0.123	✓		Kmt
325.-	256.37						256.37	0.201	✓		Kmt
495.-	390.46						390.46	0.305	✓		Kmt
125.-	98.60						98.60	0.077	✓		Kmt
100.-	78.88						78.88	0.062	✓		Kmt
129119.-	61526.97	7600.-		38800.00			107926.97	84.451			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
avst.	9 3	vej	Hässlunda ; Verner Dahlgren		291	vj	
1/8	9 1	v	D:o ; Anna Roos		296,297 353	L, B	
					370,371		
avst.	37 14	v	D:o ; Knut och Inge Larsson	sök	303-351	L, B	
					380		
1	10 1	va	D:o ; Ekeby m.fl. försam- lingars pastorat, lönebo- ställe; arr. Nils Pålsson		354-361	B	
1	10 1	vej	D:o ; Ekeby m.fl. försam- lingars pastorat, prästgård		362,363	j	
17/288	12 7	v	D:o ; Erik Tornérhjelm	sök v	364-366	B	
1/2	18 1	v	D:o ; Dens.	sök v	367-369	B	
avst.	9 8	vej	D:o ; Hässlunda kommun, skoltomt		372,373	j	
samf.		vej	D:o ; Dens., skoltomt		374,375	j	
	8	vej	D:o ; Dens. skoltomt		376	j	
av	37 1	vej	v D:o ; Hässlunda kommun, skoltomt		377,379	j	
av	37 1	vej	D:o ; Dens. arr. Kurt Nilsson		378	j	
				Summa			

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.7888173	0.8441630	0.8466453	0.9212432			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14		15	16	17		18
129119.-	61526.97	7600.-		38800.00			107926.97	84.451			
400.-	315.53						315.53	0.247	✓		Kont
488.-	384.94										
441.-			373.37				758.31	0.593	✓	1	7
15774.-	12442.80										
144.-			121.92				12564.72	9.832	✓	8	9
3459.-	2728.52						2728.52	2.135	✓		a
208.-	164.07						164.07	0.128	✓		Kont
770.-	607.39						607.39	0.475	✓		a
735.-	579.78						579.78	0.454	✓		a
480.-			406.39				406.39	0.318	✓		Kont
384.-			325.11				325.11	0.254			Kont
352.-			298.02				298.02	0.233	✓		Kont
625.-			529.15				529.15	0.414	✓		Kont
704.-			596.04				596.04	0.466	✓		Kont
154083.-	78750.-	7600.-	2650.-	38800.-			127800.-	100.-			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmen likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

437141

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. I.

Längd för fördelning av kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll.

			Fördelningstal i %
Dikessträckan A-B-C-D-E.			
Mörarp	8 2	; Torsten Wullt, arr. Nils Wullt	24.889
D:o	9 2	; Martin F. Stolts stbhs. arr. Magne Stolt	34.445
Hässlunda	12 37	; John W. Jönsson	26.217
D:o	10 37	; Åke Hansson	14.449
		Summa	100.000
Dikessträckan E-F.			
Hässlunda	12 37	; John W. Jönsson	88.483
D:o	27 37	; Dens.	11.517
		Summa	100.000
Dikessträckan F-G.			
Hässlunda	12 37	; John W. Jönsson	87.242
D:o	19 37	; Erik Fredlund	12.758
		Summa	100.000
Dikessträckan G-H.			
Hässlunda	19 37	; Erik Fredlund	78.834
D:o	9 37	; Arthur Lindell	20.706
D:o	3 37	; Hilding Hallbäck	0.029
D:o	15 37	; N.P. Rasmusson arr: Hjalmar Rasmusson	0.431
		Summa	100.000

			Fördelningstal i %
Dikessträckan F-I.			
Hässlunda 37 25	; John W. Jönsson		10.095
D:o 37 27	; Dens.		24.757
D:o 37 18	; Erik Fredlund		9.250
D:o 37 20	; Johan Olsson		55.898
		Summa	100.000
Dikessträckan I-J.			
Hässlunda 37 18	; Erik Fredlund		100.000
		Summa	100.000
Dikessträckan J-K-L.			
Hässlunda 37 18	; Erik Fredlund		50.908
D:o 25 1	; Herbert Andersson		49.092
		Summa	100.000
Dikessträckan L-M.			
Hässlunda 25 1	; Herbert Andersson		54.181
D:o 37 14	; Knut och Inge Larsson		45.819
		Summa	100.000
Dikessträckan M-N-O+N-R.			
Hässlunda 37 14	; Knut och Inge Larsson		96.754
D:o 10 1	; Ekeby m.fl. församlingars pastorat, löneboställe; arr. Nils Pålsson		3.246
		Summa	100.000
Dikessträckan O-P.			
Hässlunda 10 1	; Ekeby m.fl. församlingars pastorat,		

			Fördelningstal i %
		löneboställe; arr. Nils Pålsson	63.480
Hässlunda	10 1	; Ekeby m.fl. församlingars pastorat, prästgård	4.434
D:o	12 7	; Erik Tornérhjelm	16.416
D:o	18 1	; Dens.	15.670
		Summa	100.000

Dikessträckan O-Q.

Hässlunda	9 1	; Anna Roos	14.089
D:o	37 14	; Knut och Inge Larsson	4.601
D:o	9 8	; Hässlunda kommun, skoltomt	15.336
D:o	samf.	; Dens. d:o	12.268
D:o	8	; Dens. d:o	11.246
D:o	av 37 1	; Dens. d:o	19.968
D:o	av 37 1	; Dens. arr. Kurt Nilsson	22.492
		Summa	100.000

Dikessträckan L-S.

Hässlunda	25 1	; Herbert Andersson	100.000
		Summa	100.000

Dikessträckan S-T.

Hässlunda	9 2	; John W. Jönsson	8.964
D:o	25 4	; N.P. Rasmusson	2.868
D:o	25 1	; Herbert Andersson	25.966
D:o	27 1	; Dens.	3.155
D:o	av 25 1	; Bertil Eriksson	4.303
		Överföres	45.256

			Fördelningstal i %
		Överfört	45.256
Hässlunda	av 25 1	; Hugo Johansson	4.303
D:o	av 25 1	; Gunnar Olsson	3.442
D:o	25 7	; Gunnar Olsson	3.356
D:o	25 6	; Alexander Lundgren	4.303
D:o	25 5	; Tage Hansson	2.295
D:o	25 10	; Sven Lund	3.586
D:o	25 12	; Mauritz Månsson	2.868
D:o	25 11	; Dens.	2.868
D:o	25 2	; Karl Nilssons stbhs	4.661
D:o	25 9	; William Nilsson	7.099
D:o	9 4	; Harry Henningsson	1.793
D:o	av 9 1	; Augusta Olssons stbhs	1.434
D:o	9 3	; Verner Dahlgren	5.737
D:o	9 1	; Anna Roos	6.999
		Summa	100.000

Dikessträckan J-U.

Hässlunda 37 18	; Erik Fredlund	100.000
	Summa	100.000

Dikessträckan I-V.

Hässlunda 37 20	; Johan Olsson	100.000
	Summa	100.000

Dikessträckan C-X.

Mörarp 2 9	; Martin F. Stolts stbhs, arr.	
	Magne Stolt	85.801
	Överföres	85.801

		Fördelningstal i %
Överfört		85.801
Mörarp 49 3	; Martin F. Stolts stbhs, arr. Magne Stolt	14.199
Summa		100.000

Dikessträckan X-Y.

Mörarp 49 3	; Martin F. Stolts stbhs, arr. Magne Stolt	93.880
Assartorp 2 5	; John W. Jönsson	6.120
Summa		100.000

Dikessträckan X-Z.

Mörarp 49 3	; Martin F. Stolts stbhs, arr. Magne Stolt	88.101
Assartorp 20 7	; Uno Assarsson	4.369
D:o 19 7	; Edvin Svensson	7.530
Summa		100.000

Dikessträckan X-Å.

Mörarp 49 3	; Martin F. Stolts stbhs, arr. Magne Stolt	78.683
Assartorp 19 7	; Edvin Svensson	3.701
D:o 18 7	; Oscar Nilsson	6.690
D:o 17 7	; Edvin Cederholm	10.926
Summa		100.000

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Com H:n
C.E.B

Handlingar

till

dikningsföretaget

Hässlunda-Mörarp av år 1948

i Hässlunda och Mörarps socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1948.

Innehåller 231 sidor.

Härtill hör 8 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 11:72/48.

ARVODESRÄKNING

Förrättningsnummer 11/46 ls.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Hässlunda-Mörarp av år 1948 /Hässlunda/ i Hässlunda och Mörarps socknar,

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Malmöhus län.

Åtgärden omfattar tiden 1/8 1946 - 30/9 1948.

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN 1949
DIARIENr
SAK Nr

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 161.11 ha.				
910 *kr för* 140 *ha och* 4.- *kr för varje ha däröver*	998	-		
1.4 *% av* 127800 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	1789	20		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			2787	20
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
Alternativt förslag.				
~~2. Täckdikningsplaner.~~				
1948. 1-4/6, 26/6 ; 5 dagar à 15 kr.	75	-		
22/6 ; 1 dag à 20 kr.	20	-		
2-3/7, 19/8 ;16.5 timmar à 2.50 kr.	41	25	136	25
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			2923	45

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2923	45 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består till helt övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
~~a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;~~				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
1948 f) Arbetsritningar, 10-11/9, 13-14/9; 18 timmar à 1.50	-	-		
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ~~xxxxx~~ har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				✓
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				✓
1948 Sept. 1 extra avskrift av synehandlingarna; 219--85 = 134 sidor à 75 öre	100	50	✓ 100	50
Summa kronor:			3023	95 ✓

Anmärkningar: Då avsevärd tid åtgått dels för uppmätning av den areal, som endast erhåller brukningsbåtnad, dels för brukningsbåtnadens uppskattning, har all av företaget berörd inägojord medräknats vid uppsättning av arvodesräkningen.

Ett exemplar av denna räkning har den 20/12 1948 ~~xxxxxxxxxxxx~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Eric Fredlund, Nygård, Hörarp
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Malmö den 31 December 1948

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 28/11 49 av

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Igelösa-Svenstorp av år 1949"

i Igelösa och Odarslövs socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1949.

Innehåller 93 sidor.

Härtill hör 6 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m. fl. byarna i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län.

År 1949 den 6 september inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Ingve Andersson i Östergård och Edvin Jönsson i Kåstads boställe å Svenstorps gårdskontor för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1-4) handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m. fl. byarna i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 22 juni 1949 översänt till pastorsämbetena i Igelösa och Odarslövs församlingar, hade anslagits för Igelösa församling den 24 juni 1949 (bil. 5) och för Odarslövs församling likaledes den 24 juni 1949 (bil. 6). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 28 juni 1949, varjämte en avskrift av densamma översänts till Länsstyrelsen den 22 juni 1949. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 2 juli 1949 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning (bil. 7) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillträdeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Friherre Pierre-Gabriel Gyllenbrok, Björnstorp, äg. med fideikommissrätt 6 4/5 mtl. Svanstorp med Munkarp 1', 1/2 mtl. Odarslöv Västra 2^2 och 1/2 mtl. Odarslöv Västra 6^2 i Odarslövs socken samt 1/2 mtl. Igelösa 2', 1/2 mtl. Igelösa 6', 1/2 mtl. Igelösa 7', 1/4 mtl. Igelösa 9

och 1/4 mtl. Igelösa 15 i Igelösa socken, genom
godsförvaltaren Gustaf Wihlborg (bil. 12).

Av övriga sakägare och omlud.

Örtofta pastorat, i förändelsen för prästlönehemmanet
1/1 mtl. Igelösa 1 i Igelösa s:n genom
länsombudet Johan Christensson, Igelösa nr 8
(bil. 8 och 9). v

Adarslövs församling, i förändelsen för den Adars-
lövs kyrka tillhöriga fastigheten Adarslöv-
Västra 7 (ett torp) i Adarslövs s:n, genom
kommunisten C.G. Dagerdahl (utan förändrande). v

Länsbr. Tage Landberg, Igelösa; arr. prästlöne-
hemmanet 1/1 mtl. Igelösa 1. v

Länsbr. Olof Andersson, V. Adarslöv; arr. dels den
Adarslövs kyrka tillhöriga fastigheten Adarslöv-
Västra 7, dels från Svenstorps fideikommiss
Adarslöv-Västra 6[2] samt del av Igelösa 15
och del av Svenstorp 1. v

~~Länsbr. Albert Persson, Västergård; arr. Adarslöv-~~
~~Västra 2[2].~~ ej

~~Länsbr. Lars-Erik Svensson, Igelösa; arr. del av~~
~~Igelösa 15 samt 1/2 mtl. Igelösa 6.~~ ej

Såsom konsistoriombud och ombud för Skiftsnämnden i Lund kommunisten C.G. Dagerstam (bil. 10 och 11).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1-4).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller själv i jävsförhållande till nu varande sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planritningar över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påräknats vid förrättningarna.

§ 5.

Godsförvaltaren Wihlborg framhöll, att vissa marker under Svendorps fideikommiss voro i stort behov av förbättrad torrläggning, gällande detta ej blott jord, som brukades under Svendorps huvudgård, utan även jord till vissa från fideikommisset utarrenderade fastigheter. Den av hans huvudman, friherre Gyllenhaals, tvegående

syneförrättningen avsåge tvenläggning av 3 olika områden inom fideikommissets gränser, varför de planerade dikningsförslagen lämpligen kunde kallas förslag 1, förslag 2 och förslag 3. Wihlborg ytrade att följande nya dikesträckor skulle utföras för de olika förslagen.

För förslag 1 dikesträckan A-Aa-B-C eller sträckan 2+00-11+45.

För förslag 2 dikesträckan C-F eller sträckan 40+50-49+07.

För förslag 3 dikesträckan G-H-J-K-L eller sträckan 50+50-70+89.

§ 6.

Ombudet för Örtofta pastorat, herr Johan Christensson, ytrade med instämmande av konsistorieombudet, kommunister C.G. Dagerdahl, att förslag 1 skulle utsträckas åt söder och österut samt även omfatta fördjupning av förläggning av dikesträckan C-D eller sträckan 11+45-14+70.

§ 7.

Upplystes att kostnaderna för handläggning m.m. vid förrättningarna beröpte till 660 kr.

§ 8.

Meddelades att syneförrättningen komme att fortsättas omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande

att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Svensdorps gårdskontor tisdagen den 11 oktober 1949 kl. 10.

Svensdorp den 6 september 1949.

På tjänstens vägnar:
E. H. Nilsson
Notarie Lantbruksingenjör.

Georg Andersson
Ordf.

Å 1949 den 11 oktober inställde sig synemännen på Svensdorps gårdskontor för fortsatt handläggning av syneförrättningen.

Följande sakägare och ombud hade tillställekommit.

Fideikommissarien Hans-Gabriel Gyllenkrok genom godsförvaltaren Gustaf Wihlborg,
~~Östofta pastorat genom kyrkoherden Johan Ekenstierna.~~
~~Östofta församling genom~~

~~Lantbr. Tage Sandberg, Tjelösa,~~
~~" Olof Andersson, V. Odaröd,~~
~~" Albert Persson, Svabagård~~
~~" Sven Erik Svensson, Tjelösa~~
~~Konsistorienombudet, kommunicerade L.G. Dagerstam.~~

§ 10.

Protokollet för sammanträdet den 6 september 1949 upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, varefter förslagshandlingarna bilades protokollet;

värderingslängderna	bil. Aa - Ad
kostnadsförslagen	bil. Ba - Bd
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 12.

Avgavs styrmännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängderna upplästes (bil. Ea - Ec).

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till dikesläggningsföretag.

§ 14.

Delägarna överenskomna att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsförvaltaren Gustaf Wikelborg, Björnstorp, och vid förfall för honom åt fröken Thure-Gabriel Gyllenhjelm, Björnstorp;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statens medgivande till bidrag,

att, då delägarnas vägnar dels avsluta kontakt med Lantbruksstyrelsen om

arbetets utförande, dels underlättna för bidragets tillbörliga användande erforderliga provisioner.

§ 15.

Till styrelseman för alla företag utsågs godsförvaltaren Gustaf Wilhelm Wilborg, Björndorp.

§ 16.

Upplystes att ingen av de i företagets ingående fastigheterna eller bruknings-delarna hade mindre åkerareal än 35 ha.

§ 17.

Utbetalades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Ingve Andersson	30 kr.
Edvin Jönsson	30 kr.
Summa	60 kr.

Ersättningarna utbetalades av godsförvaltaren Wilborg.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vä Ingatorp den 11 oktober 1949.

Vid justeringen:

E.A. Wallin

Ingve Andersson

Edvin Jönsson

Ek.D.nr 727 1945.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret den 10/10 1945

8

Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Expedierad den 10/10 1945

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L/ME

60
727 45
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Bil. 2

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå Lantbruksingeniören i Malmöhus län C.H.Wallér, Malmö, såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Igelösa 1, Munkarp-jord, kallad "Svenstorps gård", Igelösa socken, Malmöhus län.

Malmö den 22 september 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson.

Hjalmar Nilsson.

Bengt Lanke.

Ek.D. nr 60/727 år 1945.

Bil. 3. 10

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. 1 Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 19 september 1945.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

Bil. 7.

11

60

Aktbil. ..... till skr. 1927 år 19 45

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Ink. 19 SEP. 1945

Lantbruksnämnden

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Svenstorp fideikommiss lydande egendom i Igelösa socken:

Igelösa 1, Munkarp-jord, kallad "Svenstorps gård"

Möjligen kommer även andra marker att beröras av förrättningen, men torde detta först under förrättningens handläggning närmare kunna angivas.

Björnstorp den 15 september 1945

Th. G. Gyllenhaal

Innehavare av Björnstorps & Svenstorps fideikommiss

Bil. 5.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m.fl. hemman i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Svenstorps gårdskontor pr Örtofta tisdagen den 6 september 1949 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Igelösa nr 1-17 i Igelösa s:n samt Svenstorp med Munkarp nr 1 och V. Odarslöv nr 1, 2, 6 och 7 i Odarslövs socken, dels dikningsföretagen "Igelösa-Tågerup av år 1933" och "V. Odarslöv-Hoby av år 1943", dels en Örtofta-Igelösa Kraft A.B. tillhörig kraftledning.

Malmö den 21 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Igelösa församling fredagen den 24 juni 1949 betygar:

C. G. Sayerstam
Kronbrevbärare

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Igelösa församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 6.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m.fl. hemman i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Svenstorps gårdskontor pr Örtofta tisdagen den 6 september 1949 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Igelösa nr 1-17 i Igelösa s:n samt Svenstorp med Munkarp nr 1 och V. Odarslöv nr 1, 2, 6 och 7 i Odarslövs socken, dels dikningsföretagen "Igelösa-Tågerup av år 1933" och "V. Odarslöv-Hoby av år 1943", dels en Örtofta-Igelösa Kraft A.B. tillhörig kraftledning.

Malmö den 21 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Odarslövs församling första-dagen den 24 juni 1949 betygar:

PASTORSÄMB. I IGELÖSA-ODARSLÖV ADR. ÖRTOFTA

C. G. Dahlstrand
Kommunalstyr

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Odarslövs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 7.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Igelösa församling /kungörelse/	Örtofta	22/6 1949
Pastorsämbetet i Odarslövs församling /kungörelse/	"	" "
Lantbr. Yngve Andersson / god man/ Östragård,	"	" "
Lantbr. Edvin Jönsson / god man/ Håstads boställe,	Stångby	" "
Länsstyrelsen, /avskr. av kungörelse/	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskr. av kungörelse/	Lund	" "
Kyrkorådet i Örtofta m.fl. församlingars pastorat,	Örtofta	2/7 "
Kyrkorådet i Odarslövs församling	"	" "
Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok	Björnstorp	" "
Lantbr. Tage Sandberg, Igelösa,	Örtofta	" "
" Albert Persson, Västragård,	Stångby	" "
" Olof Andersson, V. Odarslöv,	Örtofta	" "
" Sven-Erik Svensson, Igelösa,	"	" "
Ordf. i styrelsen för Örtofta-Igelösa Kraft A.B., landstingsman Sigurd Nilsson, Igelösa gård,	"	" "

Malmö den 2 juli 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 8. 15

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/8 1949

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1191 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m.fl. hemman i Igelösa socken och Odarslövs socken

kommer att äga rum å Svenstorps gårdskontor pr Örtofta tisdagen den 6 september 1949 kl. 10

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet..., nämligen lönebostället Igelösa 1[1] i Igelösa socken och kyrkohemmanet Odarslöv Västra 7[1] i Odarslövs socken

Det tillkommer Örtofta pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället samt Odarslövs församling att tala och svara för kyrkohemmanet.

Komministern C.G. Dagerstam, Örtofta,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorialombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 5 augusti 1949.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostämma med Örtofta m.fl.församlingars pastorat den 17 dec.1948.

§3.

Till ombud vid de ekonomiska besiktningar och övriga förrättningar, som under år 1949 kan komma att hållas å pastoratets löneboställen och prästgårdar utsågos ----------, för Igelösa nr.1 lantbrukare Johan Christensson med lantbrukare Carl Persson som suppl. ----------.

S.o.

Einar Wenemark

Justerat:

Erik Mohlin Axel Andersson

Protokolljusteringen i laga ordning anslagen i pastoratets kyrkor den 26 dec.1948, betygar E.Wenemark, p.l.

Avskriftens riktighet, betygar

Örtofta den 12 augusti 1949.

E. Wenemark

kyrkostämmans ordf.

Ang.sammanträde å Svenstorps gårdskontor tisdagen den 6 september 1949 kl.10 rörande torrläggning av marker till Igelösa nr.1 m.fl.hemman i Igelösa socken och Odarslövs socken.

Bil. 17.

LUNDS STIFT + STIFTSNÄMNDEN I LUND

Resolution.

Herr komministern C.G. Dagerstam .....

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning. Lund den 15 juli 1949.

.....

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Hjalmar Nilsson

Eric Witthoff

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr .....

.....

.....

Bil. 11.

Ink. till Lunds Stiftsnämnd
1949 den 17 Dnr 1191
Beslut den

Avskrift.

Lantbruksingenjören
i
Malmöhus län
Malmö

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m.fl. hemman i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Svenstorps gårdskontor pr Örtofta tisdagen den 6 september 1949 kl. 10.00. Då förrättningen berör dels lönebostället Igelösa 1[1] i Igelösa socken, dels den Odarslövs församling tillhöriga fastigheten Odarslöv Västra 7[1] i Odarslövs socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända en avskrift av kungörelsen angående syneförrättningen.

Malmö den 22 juni 1949.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m.fl. hemman i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Svenstorps gårdskontor pr Örtofta tisdagen den 6 september 1949 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Igelösa nr 1-17 i Igelösa s:n samt Svenstorp med Munkarp nr 1 och V. Odarslöv nr 1, 2, 6 och 7 i Odarslövs socken, dels dikningsföretagen "Igelösa-Tågerup av år 1933" och "V. Odarslöv-Hoby av år 1943", dels en Örtofta-Igelösa Kraft A.B. tillhörig kraftledning.

Malmö den 21 juni 1949.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Allm.d. 27/60.

Vidimeras

och översändes till stiftsnämnden i Lund för kännedom. Malmö i landskontoret den 29 juni 1949.

På tjänstens vägnar:

I. Lindblad

Bilaga 12

FULLMAKT

för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1941 i Igelösa och Odarslövs socknar av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp den 12-9 1949.

T. H. G. Gyllenstierna

Innehavare av Björnstorps och Svenstorps Fideikommiss.

Bevittnas:

Åke Jönsson A. Hansson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. Aa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Företag 1.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 1.										
Igelösa socken.										
Igelösa 2 1, ½ mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lerbl. sand	1				96	1900	2500	600	576	-
" "	2 a				51	1100	2500	1400	714	-
" "	2 b				62	1100	2500	1400	868	-
" "	3				60	1900	2500	600	360	-
" "	4				21	1000	2500	1500	315	-
" "	5				30	900	2500	1600	480	-
A- summa				3	20				3313	-
Totalsumma kronor									3313	-
Igelösa 7 1, ½ mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	6		14			3200	4000	800	112	-
" "	7		24			2400	4000	1600	384	-
" "	8		23			2700	4000	1300	299	-
" "	9		24			2700	4000	1300	312	-
" "	10		23			2700	4000	1300	299	-
" "	11		32			3400	4000	600	192	-
Överföres		1	40						1598	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	40						1598	-
Åker, lättlera	12		14			3200	4000	800	112	-
" "	13		14			2800	4000	1200	168	-
" "	14		34			2600	4000	1400	476	-
" "	15		31			2600	4000	1400	434	-
" "	16		15			2800	4000	1200	180	-
A- summa		2	48						2968	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	6-16	2	48							
	17	2	31	✓						
	18	8	68	✓						
B-summa		13	47					300	4041	-
Totalsumma kronor									7009	-
Avdelning 2.										
Igelösa socken.										
Igelösa 1:1, 1 mtl.										
Prästlönehemman till Örtofta pastorat, arr. Tage Sandberg.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	19		25			2800	4000	1200	300	-
Överföres			25						300	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			25						300	-
Åker, lättlera	20		32			3600	4000	400	128	-
" "	21		24			2800	4000	1200	288	-
" "	22		54			3200	4000	800	432	-
" "	23		47			3600	4000	400	188	-
" "	24		32			3200	4000	800	256	-
" "	25		18			3200	4000	800	144	-
" "	26		58			3000	4000	1000	580	-
" "	27		13			3600	4000	400	52	-
A- summa		3	03						2368	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	19-26	2	90							
"	28		68							
"	29		49							
"	30	3	72							
B- summa		7	79					300	2337	-
Totalsumma kronor									4705	-
Sammandrag.										
Avdelning 1.										
Igelösa 2 1/8 mtl.										
Thure Gabriel Gyllenkrok	1-5			3	20				3313	-
Överföres				3	20				3313	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				3	20				3313	-
Igelösa 7 1/2 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok	6-16	2	48						7009	-
Summa för avdelning 1		2	48	3	20				10322	-
Avdelning 2.										
Igelösa 1 1/2 mtl.										
Prästlönehemman till Örtofta pastorat, arr. Tage Sandberg	19-27	3	03						4705	-
Summa för avdelning 2		3	03						4705	-
Summa för hela företaget		5	51	3	20				15027	-
Summa alstringsbåtnad									8649	-
Summa brukningsbåtnad									6378	-

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukestyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Bil. Ab.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Företag 2.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Odarslövs socken.										
Svenstorp med Munkarp 1 1,										
6 5/4 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, lättlera	31				45	1500	2500	1000	450	-
Skog, vinner ej båtnad	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Åker, lättlera	33		17			2000	4000	2000	340	-
" "	34		17			2000	4000	2000	340	-
" "	35		22			2000	4000	2000	440	-
" "	36		55			2800	4000	1200	660	-
" "	37		16			3200	4000	800	128	-
" "	38		20			3200	4000	800	160	-
" "	39		23			2800	4000	1200	276	-
" "	40		19			3600	4000	400	76	-
" "	41		30			2400	4000	1600	480	-
" "	42		83			3200	4000	800	664	-
" "	43		56			2800	4000	1200	672	-
" "	44		36			2800	4000	1200	432	-
" "	45		53			3200	4000	800	424	-
" "	46	1	07			2800	4000	1200	1284	-
A- summa		5	54		45				6826	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	37-46	4	43							
"	47	3	93	✓						
"	48	8	90	✓						
B- summa		17	26					200	3452	-
Totalsumma kronor									10278	-
Sammandrag.										
Svenstorp med Munkarp 1:1,										
6 4/5 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok	31,									
	33-46	5	54		45				10278	-
Summa		5	54		45				10278	-
Summa alstringsbåtnad									6826	-
Summa brukningsbåtnad									3452	-

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nu-varande	bli-vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Bil. Ac.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Företag 3.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 3.										
Odarslövs socken.										
Svenstorp med Mumkarp.1 1.,										
6 4/5 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	49		51			3400	4000	600	306	-
" "	50		36			2800	4000	1200	432	-
" "	51		50			2800	4000	1200	600	-
" "	52		39			2800	4000	1200	468	-
" "	53		23			2600	4000	1400	322	-
" "	54		29			2400	4000	1600	464	-
A - summa		2	28						2592	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	49-52	1	76					150	264	-
"	53-54		52					100	52	-
"	55	5	40	v				100	540	-
"	56	7	06	v				150	1059	-
"	57	7	14	v				150	1071	-
B - summa		21	88						2986	-
Totalsumma kronor									5578	-
Igelösa socken.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Igelösa 9 1/4 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	58	1	57			3600	4000	400	628	-
" "	59	1	54			3200	4000	800	1232	-
" "	60		93			3200	4000	800	744	-
" "	61		46			3000	4000	1000	460	-
A - summa		4	50						3064	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	58-61	4	50							
"	62		14	V						
"	63		03	V						
"	64	4	51	V						
B - summa		9	18					150	1377	-
Totalsumma kronor									4441	-
Igelösa 6 1/2 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok,										
arr. Sven-Erik Svensson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	65		48			2600	4000	1400	672	-
" "	66		45			2400	4000	1600	720	-
A - summa			93						1392	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	65-66		93							
"	67	1	14	✓						
B - summa		2	07					100	207	-
Totalsumma kronor									1599	-
Igelösa 15 1, 1/4 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr.										
Sven-Erik Svensson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	68		32			3000	4000	1000	320	-
" "	69		34			2800	4000	1200	408	-
" "	70		32			2600	4000	1400	448	-
" "	71		36			2400	4000	1600	576	-
A - summa		1	34						1752	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	68-71	1	34							
"	83	2	38	✓						
B - summa		3	72					100	372	-
Totalsumma kronor									2124	-
Igelösa 15 1, 1/4 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok,										
brukas under Svenstorps gård.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	72		32			2600	4000	1400	448	-
" "	73		38			2600	4000	1400	532	-
" "	75		20			3400	4000	600	120	-
A - summa			90						1100	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	72-73		70							
"	75		20							
"	82	4	28							
B - summa		5	18					100	518	-
Totalsumma kronor									1618	-
Igelösa 15 1, 1/4 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok,										
arr. Olof Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Äng, odlm., lättlera	74				67	2600	4000	1400	938	-
" " "	76				15	2200	4000	1800	270	-
" " "	77				07	2200	4000	2000	140	-
" " "	78				11	2600	4000	1400	154	-
" " "	79				01	1800	4000	2200	22	-
" " "	80				09	2000	4000	2000	180	-
Överföres				1	10				1704	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
580945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				1	10				1704	-
Tomt och trädgård	81				05	2400	4000	1600	80	-
A - summa				1	15				1784	-
Totalsumma kronor									1784	-
Odarslövs socken.										
Odarslöv Västra 7 1.										
Odarslövs kyrka, arr. Olof Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	84		04			2200	4000	1800	72	-
A - summa			04						72	-
Totalsumma kronor									72	-
Avdelning 4.										
Odarslövs socken.										
Odarslöv Västra 7 1.										
Odarslövs kyrka, arr. Olof Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	85		29			3200	4000	800	232	-
A - summa			29						232	-
Totalsumma kronor									232	-
Svenstorp med Munkarp 1 1.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
6 4/5 mtl., Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Olof Anders-son.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	86		05			3600	4000	400	20	-
A - summa			05						20	-
Totalsumma kronor									20	-
Odarslöv Västra 6 2, ½ mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Olof Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	87		43			2600	4000	1400	602	-
" "	88		42			3200	4000	800	336	-
" "	89		34			2800	4000	1200	408	-
" "	90		32			2800	4000	1200	384	-
" "	91		32			2600	4000	1400	448	-
" "	92		25			2800	4000	1200	300	-
" "	93		17			2800	4000	1200	204	-
" "	94		17			2600	4000	1400	238	-
" "	95		04			2500	4000	1500	60	-
" "	96		08			3600	4000	400	32	-
Överföres		2	54						3012	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	54						3012	-
Åker, lättlera	97		18			3000	4000	1000	180	-
" "	98		24			3000	4000	1000	240	-
" "	99		25			2600	4000	1400	350	-
" "	100		14			2500	4000	1500	210	-
" "	101		31			3200	4000	800	248	-
" "	102		34			3000	4000	1000	340	-
" "	103		40			2800	4000	1200	480	-
" "	104		02			2600	4000	1400	28	-
" "	105		09			3000	4000	1000	90	-
A - summa		4	51						5178	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	88-105	4	08							
"	106	7	71	V						
"	107	2	30	V						
"	108	6	42	V						
"	109	-	80	V						
"	110	-	29	V						
B - summa		21	60					250	5400	-
Totalsumma kronor									10578	-

Odarslöv Västra 2^{2}, ½ mtl.

Thure-Gabriel Gyllenkrok,

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
arr. Albert Persson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	111		59			3400	4000	600	354	-
" "	112		94			3200	4000	800	752	-
A - summa		1	53						1106	-
Totalsumma									1106	-
Sammandrag.										
Avdelning 3.										
Odarslövs socken.										
Svenstorp med Munkarp 1 1,										
6 4/5 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok	49-54	2	28						5578	-
Igelösa socken.										
Igelösa 9 1, 1/4 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok	58-61	4	50						4441	-
Igelösa 6 1, ½ mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Sven-Erik Svensson	65-66	-	93						1599	-
Igelösa 15 1, 1/4 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Sven-Erik Svensson	68-71	1	34						2124	-
Igelösa 15 1, 1/4 mtl.										
Thure-Gabriel Gyllenkrok,										
Överföres		9	05						13742	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		9	05						13742	-
brukas under Svenstorps gård	72,73,75		90						1618	-
Igelösa 15/1, 1/4 mtl. Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Olof Andersson	74, 76-81			1	15				1784	-
Odarslövs socken. Odarslöv Västra 7/1, Odarslövs kyrka, arr. Olof Andersson	84		04						72	-
Summa för avdelning 3		9	99	1	15				17216	-
Avdelning 4. Odarslövs socken. Odarslöv Västra 7/1. Odarslövs kyrka, arr. Olof Andersson	85		29						232	-
Svenstorp med Munkarp 1/1, 6 4/5 mtl. Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Olof Andersson	86		05						20	-
Odarslöv Västra 6/2, ½ mtl. Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Olof Andersson	87-105	4	51						10578	-
Odarslöv Västra 2/2, ½ mtl.										
Överföres		4	85						10830	-

VÄRDERINGSLÄNG

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	85						10830	-
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Albert Persson	111-112	1	53						1106	-
Summa för avdelning 4		6	38						11936	-
Summa för hela företaget		16	37	1	15				29152	-
Summa alstringsbåtnad									18292	-
Summa brukningsbåtnad									10860	-

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Bil. Ad.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag av värderingslängder för alla företag.										
Företag 1		5	51	3	20				15027	-
" 2		5	54		45				10278	-
" 3		16	37	1	15				29152	-
	Summa	27	42	4	80				54457	-
				Summa alstringsbåtnad					33767	-
				Summa brukningsbåtnad					20690	-

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 1.								
		Dikessträckan A-Aa-B.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
2+00--4+00==30+00	200	Upprensning av det nuvarande floddiket m	200	1.-	200	-				
30+00--32+00==6+88	200	Cementrör; 15" m	200	6.50	1300	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna med grästorv, höljning m	200	3.00	600	-	2100	-		
Tills.	400 m.									
Diverse arbeten.										
		Ommurning av rörutloppet vid 4+00==30+00 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st	1		250	-				
		Brunn 32" med kopplingar; vid 32+00==6+88 st	1		95	-	345	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							455	-	2900	-
		Dikessträckan B-C.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
		Överföres							2900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								2900	-
6+88- -7+50	62	Cementrör; 15"	m	62	6.50	403	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	62	4.50	279	-				
7+50- -8+91	141	Cementrör; 15"	m	141	6.50	916	50				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	141	3.00	423	-				
8+91- -10+04	113	Cementrör; 15"	m	113	6.50	734	50				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	113	2.50	282	50				
10+04- -11+45	141	Cementrör; 15"	m	141	6.50	916	50				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	141	2.25	317	25	4272	25		
Tills.	457 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 7+									
		+74, 8+91, 9+55, 10+04, 10+74									
		och 11+45	st	6	95.-			570	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%								1057	75	5900	-
		Dikessträckan C-D.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
11+45- -13+27	182	Cementrör; 15"	m	182	6.50	1183	-				
Övf.	182	Överföres				1183	-			8800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	182	Överfört			1183	-			8800	-
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	182	1.75	318	50				
13+27-	143	Cementrör; 15" m	143	6.50	929	50				
-14+70		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	143	2.00	286	-	2717	-		
Tills.	325 m.									
		Diverse arbeten.								
		Brunnar 32" med kopplingar vid 12+00,								
	12+53,	12+87 och 13+27 st.	4	95.-	380	-				
		Rivning av ommurning vid 14+70 för								
		dikningsföretaget Igelösa-Tåge-								
		rup av år 1933, brunn 32" med								
		kopplingar st.	1	120.-	120	-	500	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%					683	-	3900	-
							Summa kostnad		12700	-
		Sammandrag.								
400		Dikessträckan A-Aa-B					2900	-		
457		" B-C					5900	-		
325	1182	" C-D					3900	-	12700	-
Summa	1182 m.						Summa kostnad		12700	-

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller.

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 2.									
		Dikessträckan E-F.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
40+50- -41+00	50	Upprensning av det nuvarande floddiket	m	50	1.-	50	-				
41+00- -42+72	172	Schaktning, lerblandad sand	m^3	300	3.-	900	-				
42+72- -44+08	136	Cementrör; 15"	m	136	6.50	884	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	136	4.75	646	-				
44+08- -44+66	58	Cementrör; 12"	m	58	5.00	290	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	58	4.50	261	-				
44+66- -46+96	230	Cementrör; 10"	m	230	3.85	885	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	230	2.00	460	-				
46+96- -48+72	176	Cementrör; 8"	m	176	3.00	528	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	176	1.75	308	-				
48+72- -49+07	35	Cementrör; 8"	m	35	3.00	105	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	35	4.-	140	-	5457	50		
Tills.	857 m.	Överföres						5457	50		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.		Överfört					5457	50		
		Diverse arbeten.								
		Ommurning av rörutloppet vid 42+72 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter. Utföres enl. typritning	st.	1	250.-	250 -				
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 44+08 och 44+58	st.	2	95.-	190 -				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 44+66 45+38, 45+52, 46+96, 48+50 och 49+07	st.	6	70.-	420 -	860	-		
		Ersättningar.								
		Ersättning för markförlust; till ägaren av Svenstorp med Munkarp 1, Thure-Gabriel Gyllenkrok	m^2	200	0.30	60 -				
		Ersättning för intrång genom upplag; till ägaren av Svenstorp med Munkarp 1:1, Thure-Gabriel Gyllenkrok	m^3	300	0.50	150 -	210	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%					1272	50	7800	-
					Summa kostnad				7800	-

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Bc.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Företag 3.								
		Dikessträckan G-H.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
50+50--50+78	28	Upprensning av det nuvarande floddiket m	28	0.50	14	-				
50+78--51+50	72	Cementrör; 15" m	72	6.50	468	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	72	1.50	108	-				
51+50--53+66	216	Cementrör; 18" m	216	8.25	1782	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	216	2.75	594	-				
53+66--55+32	166	Cementrör; 18" m	166	8.25	1369	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	166	2.00	332	-				
55+32--56+36	104	Cementrör; 15" m	104	6.50	676	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	104	2.00	208	-	5551	50		
Tills.	586 m.									
Diverse arbeten.										
		Ommurning av rörutloppet vid 50+78 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1		250	-				
		Överföres			250	-	5551	50		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				250	-	5551	50		
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 51+50,									
		52+50, 53+66, 54+75, 55+32 och									
		56+36	st.	6	95.-	570	-	820	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%								1128	50	7500	-
		Dikessträckan H-I-K.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
56+36--57+88	152	Cementrör; 15"	m	152	6.50	988	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	152	1.75	266	-				
57+88--60+10	222	Cementrör; 15"	m	222	6.50	1443	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	222	2.25	499	50				
60+10--61+55==90+55	145	Cementrör; 15"	m	145	6.50	942	50				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	145	2.00	290	-				
61+55--62+70	115	Cementrör; 15"	m	115	6.50	747	50				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	115	4.00	460	-	5636	50		
Tills.	634 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 57+88,									
		Överföres						5636	50	7500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal		Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					5636	50	7500	-
58+70, 59+38, 60+10, 61+55=90+55,										
62+63 och 62+70		st.	7	95.-			665	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							1298	50	7600	-
		Diksesträckan K-L.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
62+70- -63+73= =92+47	103	Cementrör; 15"	m	103	6.50	669	50			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	103	2.50	257	50			
63+73- -64+50	77	Cementrör; 12"	m	77	5.00	385	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	77	1.50	115	50			
64+50- -65+00	50	Cementrör; 12"	m	50	5.00	250	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	50	3.00	150	-			
65+00- -65+90	90	Cementrör; 12"	m	90	5.--	450	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	90	2.--	180	-			
65+90- -66+50	60	Cementrör; 12"	m	60	5.-	300	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	60	4.-	240	-			
66+50- -67+90	140	Cementrör; 12"	m	140	5.-	700	-			
Övf.	520	Överföres				3697	50		15100	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	520	Överfört				5043	60			15100	-
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	140	2.75	385	-				
67+90 - -68+80	90	Cementrör; 12"	m	90	5.00	450	-				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	90	1.75	157	50				
68+80- -69+84	104	Cementrör; 9"	m	104	3.40	353	60				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	104	1.50	156	-				
69+84- -70+66	82	Cementrör; 9"	m	82	3.40	278	80				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	82	4.00	328	-				
70+66- -70+84	18	Cementrör; 9"	m	18	3.40	61	20				
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, höljning	m	18	2.00	36	-	5903	60		
Tills.	814 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 63+									
		+73 och 68+80	st.	2	95.-	190	-				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid									
		64+20, 64+70, 65+90, 67+16, 67+									
		+41, 67+90, 68+45, 69+50, 69+84,									
		Överföres				190	-	5903	60	15100	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			190	-	5903	60	15100	-
70+60,	70+66 och 70+84	st.	12	70.-	840	-				
		Rivning av ommurning vid 68+80 för								
		dikningsföretaget V. Odarslöv-Ho-								
		by av år 1943			25	-	1055	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m.c:a 20%					1341	40	8300	-
					Summa kostnad				23400	-
		Sammandrag.								
586		Dikessträckan G-H					7500	-		
634		" H-I-K					7600	-		
814	2034	" K-L					8300	-	23400	-
Summa	2034	m.			Summa kostnad				23400	-

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Calc. HE/H

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Bil. Bd.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag av kostnadsförslag för alla företag.								
	1182	Företag 1					12700	-		
	857	" 2					7800	-		
	2034	" 3					23400	-	43900	-
Summa	4073	meter.			Summa kostnad				43900	-

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar;

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning.

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
	meter						
							Företag 1.
				Dikessträckan A-Aa-B.			
2+00	-	0.85	1.-	3.55	1:1.50	16.90	Upprensning av nuv. floddiket mellan 2+00 och 4+00=30+00.
+50	50	0.95	"	3.85	"		
3+00	50	0.95	"	3.85	"	1:1000	
+50	50	1.25	"	4.75	"		
4+00= =30+00	50	1.35	"	5.05	"	17.10	
4+00= =30+00	-	1.15				17.30	15" cementrör mellan 4+00= = 30+00 och 32+00=6+88.
30+50	50	1.20				10:1000	
31+00	50	1.35				18.30	
+50	50	1.40				18:1000	
32+00= =6+88	50	1.45				20.10	
Summa	400 meter.						
				Dikessträckan B-C.			
							Fixpkt. 1. + 21.55 m.
6+88	-	1.30				20.23	15" cementrör mellan 6+88 och 11+45.
7+00	12	1.60					
+50	50	1.45				14:1000	
Övf.	62						

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	62					14:1000	
8+00	50	1.35					
+50	50	1.45					
+91	41	1.60				23.07	
+91	-	1.50				23.14	
9+00	9	1.45					
+50	50	2.40				18:1000	
10+00	50	1.50					
10+04	4	1.50				25.18 25.20	
10+50	46	1.45					
11+00	50	1.75				24:1000	
+45	45	1.55				28.58	
Summa	457	meter.					
				Dikessträckan C-D.			
11+45	-	1.55				28.60	15" cementrör mellan 11+45 och 14+70
+50	5	1.60					
12+00	50	1.75				9:1000	
+50	50	1.70					
13+00	50	1.60					
Övf.	155						

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	155					9:1000	
+27	27	1.60				30.24	
+27	-	1.50				30.27	
+50	23	1.50					
14+00	50	1.80				10:1000	
+50	50	1.70					Fixpkt. 2. + 34.80 m.
+70	20	1.65				31.70	Huvudfix + 36.31 m.
Summa	325 meter.						
			Sammandrag.				
	400		Dikessträckan A-Aa-B				
	457			"	B-C		
	325			"	C-D		
Summa	1182 meter.						
							Företag 2.
			Dikessträckan E-F.				
40+50	-		0.5		1:1.25	23.10	Upprensning av nuv. flod-diket mellan 40+50 och 41+00.
41+00	50	1.40	"	4.-	"	5:1000	Öppet avlopp mellan 41+00 och 42+72. Fixpkt. 3. + 30.67 m.
+50	50	1.35	"	3.90	"		
Övf.	100						

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	100					5:1000	
42+00	50	1.65	0.5	4.65	1:1.25		
+50	50	1.40	"	4.-	"		
+72	22	1.70	"	4.75	"	24.21	
+72	-	1.60				24.33	15" cementrör mellan 40+72 och 44+08.
43+00	28	1.45					
+50	50	1.35				6:1000	
44+00	50	1.50					
44+08	8	1.60				25.15	
44+08	-	1.50				25.27	12" cementrör mellan 44+08 och 44+66.
+50	42	1.70				15:1000	
+66	16	1.95				26.14	Fixpkt. 4. + 28.92 m.
+66	-	2.-				26.19	10" cementrör mellan 44+66 och 46+96.
45+00	34	1.80				15:1000	
+38	38	1.90				27.27	
+50	12	1.95					
46+00	50	2.10				9:1000	
+50	50	2.05					
+96	46	1.60				28.69	
Övf.	646						

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
		meter						
1	Övf.	646						
2	+96	-	1.50				28.76	8" cementrör mellan 46+96 och 49+07.
3								
4	47+00	4	1.40					
5								
	+50	50	1.70					
6							11:1000	
7	48+00	50	1.95					
8								
	+50	50	2.20					
9								
10	49+00	50	2.30					
11								
	+07	7	2.10				31.08	
12								
13	Summa	857	meter.					
14								
								Företag 3.
15								
16				Dikessträckan G-H.				
17								
	50+50	-						Upprensning av nuv. flod-
18								diket mellan 50+50 och 50+78.
19	+78	28	3.35				28.89	15" cementrör mellan 50+78 och 51+50.
20								
	51+00	22	3.10				55:1000	
21								
22	+20	20	2.50				31.20	
							15:1000	
23	+50	30	2.35				31.65	
24								
25	+50	-	2.25				31.75	18" cementrör mellan 51+50 och 55+32.
26								
	52+00	50	2.20					
27							5:1000	
28	+50	50	2.10					
29	Övf.	200						

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
Övf.	200						
53+00	50	2.15					
+50	50	1.60				5:1000	
54+00	50	1.40					
+50	50	1.45					
55+00	50	1.45					
+32	32	1.60				33.66	
+32	-	1.55				33.68	15" cementrör mellan 55+32 och 56+36.
+50	18	1.50					
56+00	50	1.35				12:1000	Fixpkt. 5. + 37.67 m.
+36	36	1.40				34.93	
Summa	586 meter.						
					Dikessträckan H-I-K.		
56+36	-	1.40				34.93	15" cementrör mellan 56+36 och 62+70.
+50	14	1.35					
57+00	50	1.45				19:1000	
+50	50	1.60				37.10	
58+00	50	1.40				26:1000	
+50	50	1.80					
Övf.	214						

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd (meter)	Djup (meter)	Bottenbredd (meter)	Dagbredd (meter)	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
1	Övf.	214						
2								
3	59+00	50	1.60					
4							26:1000	
	+50	50	1.75					
5								
6	60+00	50	1.90					
7	+10	10	2.-				43.86	
8								
9	+10	-	1.95				43.93	
10	+20	10	2.10					
11								
12	+50	30	1.45					
13	61+00=	50	1.40				18:1000	
14	=90+00							
15	61+50	50	1.40					
16								
17	61+55= =90+55	5	1.45				46.54 / 46.55	
18							10:1000	
19	62+00	45	1.40				47.-	
20								
	+50	50	1.30				20:1000	Fixpkt. 6. + 50.04 m.
21								
22	+63	13	1.40				48.26	
23	62+63	-	1.35				48.28	
24							14:1000	
25	+70	7	1.50				48.38	
26	Summa	634	meter.					
27								
28				Dikessträckan K-L.				
29								

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						
62+70	-	1.50			48.38		15" cementrör mellan 62+70 och 63+73=92+47.
63+00	30	1.40			14:1000		
+50	50	1.40			49.50		
					22:1000		
63+73= =92+47	23	1.45			50.01		12" cementrör mellan 63+73= =92+47 och 68+80.
63+73= =92+47	-	1.35			50.11		
64+00	27	1.40					
					22:1000		
+50	50	1.30					
+70	20	1.45			52.24		
+70	-	1.40			52.28		
65+00	30	1.35			34:1000		
+50	50	1.65			55.-		
66+00	50	1.60					
+50	50	1.40			16:1000		
67+00	50	1.85					
+16	16	1.70			57.66		
+16	-	1.65			57.69		
+50	34	1.35			12:1000		
+90	40	1.50			58.58		
Övf.	520						

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd m	Anmärkningar
		meter						
1	Övf.	520						
2								
3	+90	-	1.45			58.62		
4	68+00	10	1.35			23:1000		
5								
6	+50	50	1.50					
7	+80	30	1.70			60.69		
8								
9	+80	-	1.65			60.72		9" cementrör mellan 68+80 och 70+84.
10	69+00	20	1.55					
11						14:1000		
12	+50	50	1.55					
13	69+84	34	1.55			62.18		
14						62.20		
15	70+00	16	1.60					
16						5:1000		
17	70+50	50	1.65					
18	+84	34	1.70			62.70		
19								
20	Summa	814	meter.					
21	-							
22					Sammandrag.			
23		586		Dikessträckan	G-H			
24		634		"	H-I-K			
25								
26		814		"	K-L			
27	Summa	2034	meter.					
28								
29								

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 83 n.
4. 1947. 9 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112147

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd m	Anmärkningar
	meter						

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika å båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen alltid skall utföras så, att det nygrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan större brytpunkter. I krökar skall avloppet utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i den mån det är möjligt.

2/ Schaktmassorna skola å dikessträckan E-42+72 inom Företag 2 uppläggas på avloppets högra sida. I övrigt skola massorna i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna av det nya avloppet.

3/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1.- m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan det nya avloppets sida och jordvallens bas skall lämnas en frikant av minst 0.5 m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan

avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0.50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

6/ Ommurningar skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, kraftledningar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruks-ingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

12/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

13/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör-strängen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

15/ Fyllningen får ej innehålla sten.

16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entrepre-nören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställ-ning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller ar-rendator.

18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola åter-

ställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

19/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

20/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

21/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund

av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfodrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

24/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas,

och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m.fl. hemman i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Igelösa nr 1 m.fl. hemman i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 2.5 km. norr och öster om Odarslövs kyrka och c:a 2 km. sydost Örtofta station vid järnvägen Malmö-Eslöv. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Igelösa nr 1, 2, 6, 7, 9 och 15 i Igelösa socken samt Odarslöv Västra nr 2, 6 och 7 och Svenstorp med Munkarp nr 1/i Odarslövs socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en

del mindre öppna floddiken, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankartor hava efter nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet / ritningar 1-2/. Hela området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats / ritningarna 3-6/. Typritningar för brunnar och ommurningar återfinnas på ritning 4.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Igelösa socken angives sålunda: "Igelösa kyrka, i grundsten vid tornets NV. hörn, 0.30 m. N om knuten; kst. + 36.31".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrläggningsområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i tre mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Företag 1, Företag 2 och Företag 3. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skola för de tre företagen följande nya avlopp utföras.

Företag 1.

1/ Dikessträckan A-Aa-B från avvägningspunkten 2+00 söder ut till avvägningspunkten 6+88 = 32+00.

Delsträckan 2+00-4+00 = 30+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 1.- m. bottenbredd och

med slänterna i lutning 1:1.50.

Delsträckan 4+00 = 30+00-32+00 = 6+88 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 4+00 = 30+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 6+88 = 32+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 6+88 = 32+00 söder och öster ut till avvägningspunkten 11+45. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 7+74, 8+91, 9+55, 10+04, 10+74 och 11+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 11+45 söder och öster ut till avvägningspunkten 14+70. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 12+00, 12+53, 12+87, 13+27 och 14+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 2.

4/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 40+50 väster ut till avvägningspunkten 49+07.

Delsträckan 40+50-42+72 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25.

Delsträckan 42+72-44+66 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 42+72 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 44+08, 44+58 och 44+66 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 44+66-49+07 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 45+38, 45+52, 46+96, 48+50 och 49+07 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Företag 3.

5/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 50+50 väster och söder ut till avvägningspunkten 56+36. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" och 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 50+78 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och/slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 51+50, 52+50, 53+66, 54+75, 55+32 och 56+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan H-I-K från avvägningspunkten 56+36 väster och söder ut till avvägningspunkten 62+70.

Delsträckan 56+36-61+55 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 57+88, 58+70, 59+38, 60+10 och 61+55 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 61+55-62+70 skall upptagas i nyskärning och utföras som

täckt ledning av 15" cementrör, Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 62+63 och 62+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan K-L från avvägningspunkten 62+70 väster och söder ut till avvägningspunkten 70+84. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15", 12" och 9" cementrör, Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 63+73, 64+20, 64+70, 65+90, 67+16, 67+41/67+90, 68+45, 68+80, 69+50, 69+84, 70+60, 70+66 och 70+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom platserna, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 4. På plankartorna /ritningar 1-2/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrätt-

ningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 à 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avl opp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg,

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med uppgrävningen för dikessträckan G-H inom Företag 3 måste möjligen en kraftledningsstolpe vid avvägningspunkten 55+80 omstagas eller flyttas. Det skall åligga Örtofta-Igelösa Kraftaktiebolag, som äger kraftledningen, att utföra detta arbete i egen regi. Bolaget äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med belopp, som motsvarar bolagets

självkostnader.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Örtofta-Igelösa Kraftaktiebolag när sådana arbeten komma att utföras, som beröra bolagets anläggningar.

Mom. 9. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 40+50-42+72 inom Företag 2, skall ersättning utgå. Ersättningsbeloppet, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och värde, belöper till 60 kr.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan 40+50-42+72 inom Företag 2 skall ersättning utgå. Ersättningsbeloppet, som uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd och svårighetsgraden för deras utplanering, belöper till 150 kr.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av avloppet kommer dock schaktmassor att ånyo uppläggas. Den skada och det intrång, som därigenom uppkommer för jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning till Örtofta-Igelösa Kraftaktiebolag.

För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall dikningsföretaget utgiva ersättning, motsvarande bolagets självkostnader för arbetet.

5/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och vär-

derad.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de tre företagen hava beräknats till respektive 12700 kr, 7800 kr. och 23400 kr., tillsammans 43900 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil, Ba, Bb, Bc och Bd/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för i de tre dikningssamfälligheterna ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap, 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer flertalet fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avledningsdiken, som nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande avledningsdikenas hinder för brukningen, varierar mel-

lan 2 kr. och 8 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna /bil, Aa, Ab, Ac och Ad/.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Företag 1.

Nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar äro betydande och förhållandena alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden / bil. Aa/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10322 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-Aa--B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8800 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 19-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4705 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4100 /3900+200/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	10322	A-Aa-B-C	8800	0,852548
2.	4705	C-D	3900	0,828905

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap, 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad,	Rel. kostnad.
15027	12700	0.845145

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel, kostnad.
1.	10322	8800	0,852548
2.	4705	4100	0,871413

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnadsfördelningslängd för Företag 1 återfinnes i bil. Ea.

Företag 2.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna skola alltså fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd för Företag 2 återfinnes i bil. Eb.

Företag 3.

Nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar äro betydande och förhållandena alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap, 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två avdelningar på sätt närmare framgår

av värderingslängden /bil. Ac/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 49-84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17216 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I-K upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15100 kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 85-112 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11936 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8600 /8300+300/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3.	17216	G-H-I-K	15100	0,877091
4.	11936	K-L	8300	0,695375

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
29152	23400	0,802689

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3.	17216	15100	0,877091
4.	11936	8600	0,720509

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda:

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 11936 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 8600 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,720509.

Avdelning 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17216 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 14800 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper altså till 0,859665.

Kostnadsfördelningslängder hava upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ea, Eb och Ec/. I längdernas kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagen tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare eller brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnader, som äro gemensamma för de tre företagen såsom förrättningskostnader och kostnader för företagens administration m.m. skola fördelas med 30 % på Företag 1, 20 % på Företag 2 och 50 % på Företag 3.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap, 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att de tre företagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styresman inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagens utförande påbörjas, skola desamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbets-

givare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla.

6/ Vid övergång från brantare till flackare sidolutning skall ändringen utföras successivt på sätt närmare framgår av profilritningarna och bestämmelserna i detta utlåtande.

7/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm, av rörets längd: 6" - 9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg, 28" 30 kg, 32" 35 kg, och 36" 40 kg.

8/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

9/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej

uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

10/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

Då de tre företagen slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av styresmannen. Företagen skola anses färdigställda, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för de tre företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas /bil. Ea,Eb och Ec / kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styresmannen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det

blivit i erforderlig grad renat.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas såsnart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna dikessträckorna nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol:

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava ett flertal fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankartorna som profilritningarna. Närmare beskrivning över fixpunkterna återfinnas i bil. F.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

Varje företag skall utse en styresman, som väljes av delägarna. Sty-

resmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att för varje företag särskilt föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Igelösa och Odarslövs kyrkor, dels genom annons i minst en avortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen

utgå med 81.69 kr, varav 22.54 kr. belöpa på Företag 1, 15.42 kr. på Företag 2 och 43.73 kr. på Företag 3. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förrättningsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Igelösa-Svenstorp av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras på adress Björnstorp
Björnstorps och Svenstorps godskontor och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Företag 1.									
Igelösa socken.									
Igelösa 2[1], 1/2 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok	S.								
Avd. 1.		3313	-			2799	97	22,047	/.
Igelösa 7[1], 1/2 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok	S.								
Avd. 1.		7009	-			5923	62	46,643	/.
Igelösa 1[1], 1 mtl.									
Prästlönehemman till Örtofta pastorat, arr: Tage Sandberg	S								
Avd. 2.		4705	-			3976	41	31,310	2
Summa		15027	-			12700	-	100,000	

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33

Bil. Eb.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Företag 2.									
Odarslövs socken.									
Svenstorp med Munkarp 1[1],									
6 4/5 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok	S.	10278	-			7800	-	100,000	/
Summa		10278	-			7800	-	100,000	

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	precent		
1	2	3		4		5		6	7	
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Bil. Ec.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Företag 3.									
Odarslövs socken.									
Svenstorp med Munkarp 1[1],									
6 4/5 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok	S.								
Avd. 3.		5578	-			4795	21	20,492	/
Svenstorp med Munkarp 1[1],									
6 4/5 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok	S.								
arr: Olof Andersson									
Avd. 4.		20	-			14	41	0,062	/
Odarslöv Västra 7[1]									
Odarslövs kyrka,									
arr: Olof Andersson									
Avd. 3.		72	-	61	89				
Avd. 4.		232	-	167	15	229	06	0.979	% Cu
Odarlsöv Västra 6[2], 1/2 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok	S.								
arr: Olof Andersson									
Avd. 4		10578	-			7621	55	32,571	/
Odarslöv Västra 2[2], 1/2 mtl.									
Överföres		16480	-			12660	23	54,104	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		16480	-			12660	23	54,104	
Thure-Gabriel Gyllenkrok,	S.								
arr: Albert Persson									
Avd. 4.		1106	-			796	88	3,406	/.
Igelösa socken.									
Igelösa 9[1], 1/4 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok	S.								
Avd. 3.		4441	-			3817	77	16,315	/
Igelösa 6[1], 1/2 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok,	S.								
arr: Sven Erik Svensson									
Avd. 3.		1599	-			1374	61	5,874	/.
Igelösa 15[1], 1/4 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok,	S.								
arr: Sven Erik Svensson									
Avd. 3.		2124	-			1825	93	7,803	/.
Igelösa 15[1], 1/4 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok,	S.								
brukas under Svenstorps									
gård									
Avd. 3.		1618	-			1390	94	5,944	/.
Överföres		27368	-			9332	73	93,446	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		27368	-			9332	73	93,446	
Igelösa 15[1], 1/4 mtl.									
Thure-Gabriel Gyllenkrok,	S.								
arr: Olof Andersson									
Avd. 3		1784	-			1533	64	6,554	1.
Summa		29152	-			23400	-	100,000	

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33

Bil. R.

Beskrivning över fixpunkter.

Huvudfix. I Ekonomiska Kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Igelösa socken angiven sålunda: "Igelösa kyrka. I grundsten vid tornets nordvästra hörn 0.20 m. norr om knuten, kst. + 36.31 m.

Vid undersökningarna hava 7 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankartorna som profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I rågången mellan Igelösa 7^{1} och 2^{1}, c:a 46 m. öster om avvägningspunkten 6+88=32+00, mätt längs rågången. Utmärkt med grov järndubb i översidan av betongplint, som utgör gränsmärke; jb. + 21.55 m.

Fixpunkt 2. I uthus till Igelösa 1^{1}. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till norra långsidan, 0.75 m. från nordöstra knuten och 0.18 m. under sockelns överkant; jst. + 34.80 m.

Fixpunkt 3. I Svenstorps slott, södra vinkelbyggnaden. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till östra gaveln, 0.52 m. från sydöstra knuten och 0.14 m. över marken; jst. + 30.67 m.

Fixpunkt 4. I högra slänten av det västra diket till enskild väg, c:a 50 m. nordost avvägningspunkten 44+66, mätt längs vägen. Utmärkt med järndubb i kors i översidan till betongplint, c:a 0.70 m. under markplanet; jb. + 28.92 m.

Fixpunkt 5. I f.d. Ålderdomshemmet, c:a 85 m. sydost avvägningspunkten 56+36. Utmärkt med järndubb i kors å norra gaveln, 0.20 m. från nordvästra knuten och 0.35 m. över marken; jst. + 37.67 m.

Fixpunkt 6. I arbetarebostad, c:a 45 m. norr avvägningspunkten 62+50. Utmärkt med järndubb i kors i grundmur till östra gaveln, 3.07 m. från nordöstra knuten och 0.20 m. över marken; jst. + 50.04 m.

Fixpunkt 7. I Odarslövs kyrka, norra korets nordvästra hörn. Utmärkt med koppardubb i flat grundsten, 0.20 m. från hörnet; kst. + 62.84 m.

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

237/52

M 6.0927

FÖRETAG: IGELÖSA - SVENSTORP

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 4 september 1952
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 15.410/
» en första rensning ..... » - kr. 15.410/
Lån till företagets utförande ..... kr. 30.680/

152/52

Skuldförbindelse överlämnad
till Bkda Krang
den 4/12 1952
godkänd den 9/12 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1952
DIARIE Nr 2068
SAK Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 september 1952 till

DIKNINGSFÖRETAGET IGELÖSA - SVENSTORP AV ÅR 1949 i Torns kommun, Malmöhus län,/

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtontusenfyrahundratio (15.410)*/ kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiotusensexhundraåttio (30.680)**/ kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ båda intressenter ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

*/ Statsbidraget minskat till 14.080 kr. genom Lantbruksstyrelsens beslut den 16.12.52

**/ Lånet " " 28.030 " " " " 16.12.52

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
" 401449 "

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stjärnorp den 11 nov. 1952.

Gustaf Wiberg

Att Godsägaren Gustaf Nikelborg, Björnhorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallén
Lantbruksingenjör
Helsö

Adress Helsö

A. Lööby
Godsägare
Björnhorp

Adress Björnhorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 december 1952.

Sven Weimarck

Martin Liggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1952
DIARIE Nr J 2068
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Torns kommun, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Förtroendeman: Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp.

Arbetsplanen fastställd den 4 september 1952. Godk. SLUT 10 DEC. 1952

Ändring medgiven den LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 15410 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 30680 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 11/12 1959.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1954.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 11/11 1952, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Föreslås att företaget godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Företag 1	12111,54 kr.
" 2	8074,75 "
" 3	22092,05 "
Summa	42278,34 kr.

Då statsunderstödet beviljades, beräknades företagets kostnader sålunda:

Företag 1	13411,54
" 2	8274,75
" 3	24592,05
Summa	46278,34

De verkliga kostnaderna hava alltså blivit på företag 1 1300 kr, för företag 2 200 kr. och för företag 3 2500 kr. eller tillsammans 4000 kr. lägre än de beräknade. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 13 november 1952.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208750

	Sidey	Lön
Bev.	15410 ✓	30680 ✓
Minskat till	14080 ✓	28030 ✓
Tidigare utbetalt	—	—
Kan utbetalas	14080	28030

Avskrift.

J 2068/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 4 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 30,680 kr, vilket belopp denna dag minskats till 28,030 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET IGELÖSA - SVENSTORP AV ÅR 1949 i Terns kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Igelösa socken		
Igelösa	1^1	prästlönehemman till Örtofta pastorat.
-"-	2^1	Thure-Gabriel Gyllenkrok
-"-	6^1	Densamme
-"-	7^1	Densamme
-"-	9^1	Densamme
-"-	15^1	Densamme
Odarslövs socken		
Odarslöv Västra	2^2	Thure-Gabriel Gyllenkrok
-"- -"-	6^2	Densamme

Svenstorp med Munkarp 1[1] Thure Gabriel Gyllenkrok

Stockholm den 16 december 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 88/46 *Litt.* 11:8/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB. 1950
DIARIE Nr 142
SAK Nr

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/11 1948-31/11 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 110,53 ha.				
710 *kr för* 100 *ha och* 5 *kr för varje ha däröver*	765	-		
1,6 *% av* 43900 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	702	40	1467	40
2 *% av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1467	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1467	40 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
En extra avskrift av synehandlingarna; 86 sid.				
à 75 öre			64	50 ✓
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för (extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			1531	90 ✓

Särskilda anteckningar: Då avsevärd tid åtgått för uppmätning av den areal, som endast erhåller brukningsbåtnad /78,31 ha/ samt för utredning rörande brukningsbåtnaden, har all av företaget berörd areal medräknats.

Räkningen är utställd i Malmö den 19 januari 19 50.

Ett exemplar av densamma har den 23/1 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Bestyrkes: K. A. Nilsson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 4/9 19 51 av [signature]

131

Ser. E XIII komb
2377

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS 1949
DIARIE Nr J 1517
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 8*0926

Betänkande

Dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948

i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruks-

ingenjör C.H.Wallér.

Protokoll

Hässlunda - Mörarps bef.
bef. lantbr. Eric Fredlund Nygård, Mörarp
Ans. landtr (nåv s.f. godkänts) gjorde utförandet o. rensning fullt. bidr. 50910 kr och lån 70590 kr till Luggude Härads Spars.

ORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1952
DIARIE NR 01037
SAK I ör

...tning ...

...örarp av år 1948 i Mörarps kommun,
socken och län)

bef

Ordf. i styrelsen: [illegible]
[illegible]: Lantbrukaren Eric Fredlund, Nygård per Mörarp

BESLUT
DEN 15 AUG 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 3 juni 1952.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 50910 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 70590 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 20 oktober 1956.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1952.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 9 juli 1952, har befunnits, att företaget färdigställts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen samt att även en första rensning av avloppen utförts. Föreslås att företaget godkännes.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda.

Kostnader för utförandet	126300.- kr.
" för 1:sta rensningen av avloppen	1600.- "
Förrättningskostnader	3961.13"
Summa	131861,13kr.

Då arbetsplanen fastställdes beräknades kostnaderna för utförandet till 127800 kr.

125752:82 + 1527:04

Malmö den 14 juli 1952.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206750

Avskrift.

J 1037/52.

SL/IB

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Sedan Lantbrukssstyrelsen genom beslut den 3 juni 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 70.590 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET HÄSSLUNDA-MÖRARP AV ÅR 1948 i Mörarps kommun, Malmöhus län, får Lantbrukssstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Mörarps kommun		
Häsalunda socken		
Häsalunda	9[1]	Anna Roos
"	25[1]	Herbert Andersson
"	27[1]	Densamme
"	37[9]	Artur Lindell
"	37[10]	Åke Hansson
"	37[12]	John W. Jönsson
"	37[14]	Knut Larsson, Inge Larsson
"	37[18]	Eric Fredlund
"	37[19]	Densamme
"	37[20]	Johan Olsson
"	37[25]	John W. Jönsson
"	37[27]	Densamme
Mörarps socken		
Mörarp	2[9]	Martin F. Stolts sterbhus

Hörarp 5[49] Martin F. Stolts sterbhus

Stockholm den 15 augusti 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS 1949
DIARIE NR J 1517
SAK Nr

Härmed får jag vördsamt anhålla att Kungl.Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av dikningsföretaget Hässlunda- Mörarp av år 1948 i Hässlunda och Mörarps socknar,Malmöhus län.

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Einer Svedlund

Genom beslut den 3 juni 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 127.279:86 kr., till företaget beviljat bidrag med 50.914 ~~kr.~~ och lån med 70.590:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten R. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS. 1949
DIARIE Nr U 1517
SAK Nr

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948 i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman~~: / ~~Ende intressent~~: } Lantbr. Eric Fredlund, Nygård, Mörarp.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 23 juli 1941. Förrättningen avslutad den 20 augusti 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 8 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 20 oktober 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 154083.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 133361.13 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning; 2.- à 3.- kr/ m^3.

Cementrör 36" 25 kr. 32" 21 kr, 28" 17 kr, 24" 13.50 kr. 21" 11 kr. 18" 8.25 kr, 15" 6.50 kr, 12" 5.- kr, 9" 3.40 kr, 8" 3.- kr. och 6" 1.90 kr/ m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget.	121664	-	6136	-	3961	13	131761	13	1600.-	133361	13
Den del, vartill statsunderstöd kan utgå; 95.440%	116116	12	5856	20	3780	50	125752	82	1527.04	127279	86

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a
7. 1946. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	160	73	0	38	161	11			0	133361	13	830		
Den del, vartill statsunderstöd kan utgå	158	05	0	38	158	43	146876	-	0	127279	86	800	1/3	42420

Anm. I arealen ingår 58.73 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Av bidraget belöper omkring 41910 kr. på företagets utförande och omkring 510 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	137002	-	89.292	117652	15	2/3	78440
Låntagarnas andel i bidraget 41910 kr, 100x89.292 / 95.440 =							
= 93.558 %				39210	16		
				78441	99		

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring /alstringsbåtnad och brukningsbåtnad/. I förhållande till åbyggnaderna äro de berörda markerna till dessa jordbruksfastigheter välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas. I företaget ingår även ett flertal fastigheter, vilka genom företagets utförande komma att beredas båtnad av annat slag än jordförbättring. Till sistnämnda fastigheter föreslås ej statsunderstöd.

Såsom framgår av i förrättningsprotokollets § 15 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen 10 ha eller mindre endast vid 4 av de av företaget berörda jordbruksfastigheterna. Av båtnaden belöper omkring 4 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är påbörjat och utfört till omkring 5 %. Såvitt det kunnat ut-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

rönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 42420 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 78440 kronor.

Statsunderstöd har icke tillstyrkts till den kostnad, som belöper på ägofigurerna 277-292, 362-363 och 372-379, enär torrläggningen av dessa ägofigurer, som utgöras av tomtmark, icke avser sådant ändamål, vartill enligt gällande bestämmelser statsunderstöd kan utgå.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts mot förrättningen.

" 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3, ansökning om lån.

" 4, fastighetsförteckning.

" 5, förteckning över fastigheter, till vilka tillstyrkes bidrag och lån.

" 6, förteckning över fastigheter, till vilka tillstyrkas endast bidrag.

" 7, förteckning över fastigheter, till vilka statsunderstöd ej tillstyrkes.

" 8, sammandrag av andelstal.

" 9, sammanställning av förrättningskostnader.

" 10, fullmakt för lantbrukaren Magne Stolt.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 8 mars 1949.

Bengt Lanke

C.H.Wallér.

Bilaga 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Hässlunda 25 och 37 m.fl. hemman i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län.

År 1948 den 17 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson i Bokhagen och Artur Olsson i Sjunnetorp i Hässlunda folkskola ==========

§ 27.

Delägarna beslöto att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Eric Fredlund, Nygård per Mörarp, och vid förfall för honom åt trädgårdsdirektören J.W. Jönsson, Assartorps plantskola per Mörarp,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag från avdikningsanslaget,

att, om bidrag beviljades, å delägarnas vägnar dels avsluta kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna för bidragets utbekommande erforderliga förbindelser och rekvisitioner.

==========

§ 29.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, företogs följande val.

Styrelse:

Lantbr. Eric Fredlund, Nygård per Mörarp, ordförande och verkställande ledamot,

Trädgårdsdirektören J.W. Jönsson, Assartorps plantskola, Mörarp,

Lantbr. Magne Stolt, Mörarp nr 3 per Mörarp.

Styrelsesuppleanter:

Lantbr. Herbert Andersson, Bjärsgård, Mörarp,

Lantbr. Johan Olsson, Hässlunda, Mörarp.

Revisorer:

Handlanden William Nilsson, Hässlunda, Mörarp.

Lantbr. Arthur Lindell, Norregård, Mörarp.

Revisorssuppleant:

Konsul Torsten Wullt, Hälsingborg.

==========

Hässlunda den 20 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Arthur Olsson Hj. Andersson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bilaga 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Hässlunda- Mörarp av år 1948 i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Vi uppdraga åt Lantbrukaren Eric Fredlund, Nygård Jpcn Mörarp och vid förfall för honom åt Trädgårdsdirektören J. H. Jönsson, Assartorps plantskola Jpcn Mörarp att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån samt att, om lån beviljas, å våra vägnar dels avsluta kontrakt med Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna skuldförbindelse rörande lånets återbetalning, dels underteckna för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Hässlunda den 20 augusti 1948.

1. Martin F. Stolbrandhus
Jm. Magnus Stolt.

2. Åke Hansson

3. Eric Fredlund

4. J. H. Olsson

5. Arthur Lindell

6. Herbert Andersson

Berittuas:
C. G. Nilsson
Lantbruksingenjör
Malmö

Fritz Andersson,
Jordbrukare,
Mörarp.

7. Anna Roos.

8. Inge Larsson.

9. Knut T. Larsson.

Berittuas
Eric Fredlund
Magnus Stolt

10. John D. Jönsson

Berittuas
Eric Fredlund
Magnus Stolt

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948 i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Hässlunda socken.

Hässlunda	9 1	1/8	mtl.	;✓Anna Ross
"	25 1	3/8	"	;✓Herbert Andersson
"	27 1	1/8	"	;✓ Dens.
"	37 9	avst.		;✓Artur Lindell
"	37 10	"		;✓Åke Hansson
"	37 12	"		;✓John W. Jönsson
"	37 14	"		;✓Knut och Inge Larsson
"	37 18	"		;✓Eric Fredlund
"	37 19	"		;✓ Dens.
"	37 20	"		;✓Johan Olsson
"	37 25	"		;✓John W. Jönsson
"	37 27	"		;✓ Dens.

Mörarps socken.

Mörarp	2 9	36/1000	mtl.	;✓Martin F. Stolts sterbhus
"	3 49	47/512	"	;✓ Dets.

Malmö i februari 1949.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

5.5.52

Bilaga 5.

Förteckning över fastigheter, till vilka tillstyrkes bidrag och lån.

Hässlunda s:n.

Hässlunda	9 1	1/8 mtl.	; Anna Roos	0.593 %
"	25 1	3/8 "	; Herbert Andersson	6.475 %
"	27 1	1/8 "	; Dens.	0.136 %
"	37 9	avst.	; Artur Lindell	4.018 %
"	37 10	"	; Åke Hansson	1.391 %
"	37 12	"	; John W. Jönsson	16.927 %
"	37 14	"	; Knut och Inge Larsson	9.832 %
"	37 18	"	; Erik Fredlund	12.556 %
"	37 19	"	; Dens.	16.695 %
"	37 20	"	; Johan Olsson	7.201 %
"	37 25	"	; John W. Jönsson	1.209 %
"	37 27	"	; Dens.	3.595 %

Mörarps s:n.

Mörarp	2 9	36/1000 mtl.	; Martin F. Stolts sth.	4.994 %
"	3 49	47/512 "	; Dets.	3.670 %
			Summa	89.292 %

Malmö i februari 1949.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

Förteckning över fastigheter, till vilka tillstyrkes endast bidrag.

Hässlunda s:n.

Assartorp	5 2	1/8	mtl.	John W. Jönsson	0.077 %
	7 17	1/96	"	Edvin Cederholm	0.227 "
	7 18	1/96	"	Oskar Nilsson	0.139 "
	7 19	1/48	"	Edvin Svensson	0.127 "
	7 20	1/48	"	Uno Assarsson	0.029 "
Hässlunda	10 1	1	"	Prästlönehemman	2.135 "
	12 7	17/288	"	Erik Tornérhjelm	0.485 "
	18 1	1/2	"	Dens.	0.454 "
	37 3	avst.		Hilding Hallbäck	0.084 "

Mörarps s:n.

Mörarp	2 8	476/1000	mtl.	Torsten Wullt	2.395

Summa 6.148 %

Malmö i februari 1949.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Förteckning över fastigheter, till vilka statsunderstöd ej tillstyrkes.

Hässlunda s:n.

Hässlunda av 8		Skoltomt	0.233 %
av 9 1		Augusta Olssons sth.	0.062 "
9 2	avst.	John W. Jönsson	0.386 "
9 3	"	Verner Dahlgren	0.247 "
9 4	"	Harry Henningsson	0.077 "
9 8	"	Skoltomt	0.318 "
10 1		Prästgård	0.128 "
av 25 1		Bertil Eriksson	0.185 "
av 25 1		Hugo Johansson	0.185 "
av 25 1		Gunnar Olsson	0.148 "
25 2	avs.	Karl Nilssons sth.	0.201 "
25 4	avst.	N.P. Rasmusson	0.123 "
25 5	"	Tage Hansson	0.099 "
25 6	"	Alexander Lundgren	0.185 "
25 7	"	Gunnar Olsson	0.144 "
25 9	"	William Nilsson	0.305 "
25 10	"	Sven Lund	0.154 "
25 11	"	Mauritz Månsson	0.123 "
25 12	"	Dens.	0.123 "
av 37 1		Skoltomt	0.414 "
av 37 1		Kurt Nilsson	0.466 "
	samf.	Skoltomt	0.254 "
		Summa	4.560 %

Malmö i februari 1949.

C.H.Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 8.

Sammandrag av andelstalen för i dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av År 1948 i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län ingående fastigheter.

Fastigheter, till vilka tillstyrkes bidrag och lån	89.292 %	
Fastigheter, till vilka tillstyrkes endast bidrag	6.148 "	95,440 %
Fastigheter, till vilka ej tillstyrkes statsunderstöd		4,560 "
	Summa	100.- %

Malmö i februari 1949.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 9.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948 i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter		
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Syneförrättning; arvodesräkning						3023	95	v
		11:72/48								
		Hantlangning; förrättningsprotokol-								
		let § 14						599	41	v
		Skiftesgodemän; förrättningsproto-								
		kollet § 30						70	-	v
		Annons med kungörelse om sammanträde						33	25	
		Bevis att besvär mot förrättningen en								
		anmälts						3	40	
		Vattendomstolsavgift						231	12	v
						Summa		3961	13	v

Malmö i februari 1949.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Bilaga 10.

Avskrift.

Fullmakt

för lantbrukare Magne Stolt, Mörarp, eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Mörarp 2 9 och Mörarp 3 49 m.fl. hemman i Mörarps socken, Malmöhus län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mörarp den 20/12 1946.

Agnes Stolt

Axel Stolt

Estrid Pålsson
f. Stolt.

Eric Stolt

Gunnar Stolt

Bevittnas:

Namn: Gottfrid Nilsson
Adress: Mörarp.

Namn: Alma Nilsson
Adress: Mörarp.

Vidimeras ex officio:

O.B. Nilsson


Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 augusti 1948 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Hässlunda-Mörarp av år 1948 i Hässlunda och Mörarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 december 1948.

Ex officio:

Inge Lekman

(Inge Lekman).



Stämpel kr. 3:--.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län, Malmö.

Rec 3:-

223
321

FÖRETAG: HÄSSLUNDA-MÖRARP / M 8•0926

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C. H. Wallér
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 3 juni 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 50.300
» en första rensning ..... » 610 kr. 50.910
Lån till företagets utförande ..... kr. 70.590

131
52

Skuldförbindelse överlämnad
till Lm Kranz
den 6.8 1952
godkänd den 10/8 1952.

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1952
DIARIE NR 1037
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juni 1952 till
DIKNINGSFÖRETAGET HÄSSLUNDA-MÖRARP AV ÅR 1948 i Mörarps kommun,
Malmöhus län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtiotusenniohundratio (50.910) kronor, varav till företagets utförande femtiotusentrehundra (50.300) kronor och till en första rensning av avloppen sexhundratio (610) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjuttiotusenfemhundranittio (70.590) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hässlunda den 9 juli 1952

Erik Fredlund

Lantbrukare.

Hässlunda 37 i Mörarps kommun.

Att lantbrukaren Eric Fredlund, Hässlunda 37 i Mörarps kommun

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. A. Nelbi

Adress Lantbruksingeniör. Malmö.

Edvin Fredlund

Adress Mörarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 augusti 1952.

Sven Wennberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.
