



Akt nr:

P-E1a-0384

AU\$P-E1a-0384

113
27

P 2•0384

37.

5111

KONTRAKT.

25 FEB. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för
utdikning av sankar och frostförändrade marker tillhörande 3/64 och 3/16
mantal Lilla Hyndarp i Mårdaklevs socken av
ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ett tusenniohundratio
(1.910) kronor att utgå från statens avdikningsanslag, har undertecknad,
~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~
~~man för företaget,~~ *ensamman delägare i företaget,* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~
och förbinda oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

L^a Hyndarp för Märdaklev den 10 Januari 1928.

L. J. Larsson
ägar af 3/4 mtl L^a Hyndarp

J. Andersson
Kommisjärare

Att

L. J. Larsson och J. Andersson bära i Hyndarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Goda Axell

Adress Piöngöras Märdaklev

Adress Mattias Hagman

Hyndarp Märdaklev

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november

1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 mars 1928.

Ark. M. Larsson

M. J. Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts värdiga
brev den 25 november 1927 fastställd
5111 till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 december 1927.

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
25 FEB. 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Värnamo

Landlingar,

ex officio

Kj. Brännvall

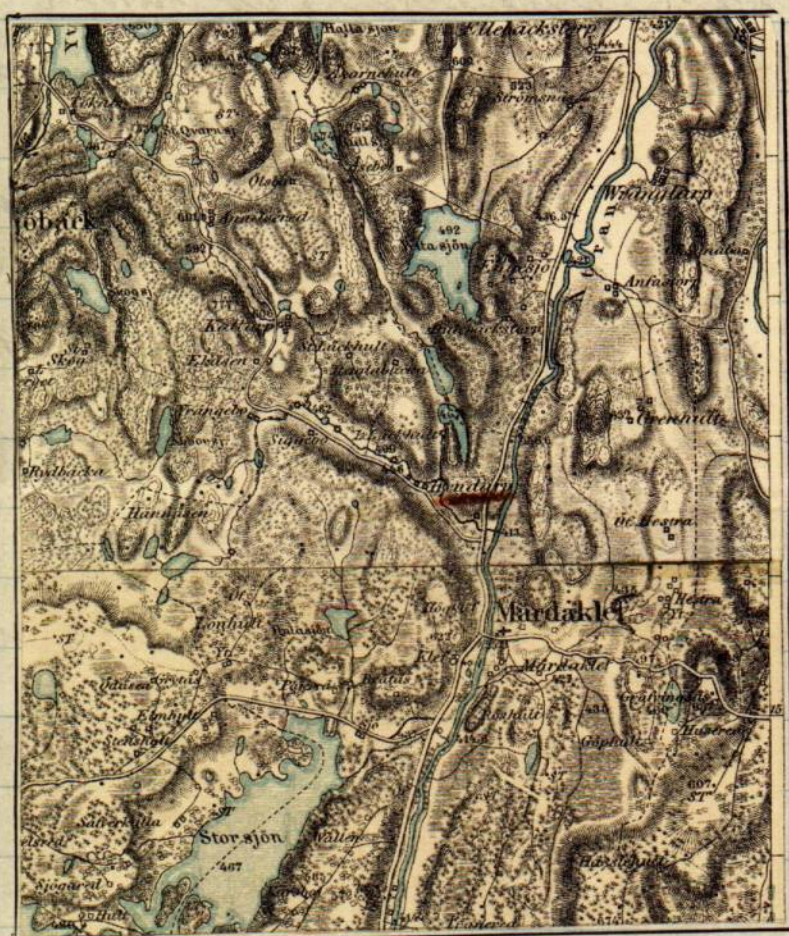
angående utdikning av samka och
fastfärande marker tillhörande

$\frac{3}{64}$ och $\frac{3}{16}$ mttb. L^a Flyndarp,

uti Mårdakters socken, Kinds härad

av Åsbobergs län;

upprättade för sökande av statsanslag år 1926.

Oversikts karta*Skala = 1:100 000*

Med anledning där-
av att S. J. Larsson, ägare
av $\frac{3}{4}$ mtl. L^a Llyndarp, och
Johan Andersson, ägare av
 $\frac{3}{16}$ mtl. L^a Llyndarp i Mädda-
klens socken, Kinds härad
av Söderbys län önska
komma i åtnjutande av an-
slag ur statens ardlösnings-
anslag till utdikning av
sanka och prestförande
onacker inom sina hem-
man får undertecknad
statens lantbrukingenjör
efter på grund av Kungl.
Lantbruksstyrelsens för-
ordnande - den 9^{de} och
11^{te} Juni 1926 förestagen
undersökning på stället
avgiva följande, av plan
och profilitningar jämte
andra handlingar åtföljda
förslag och

Betänkande

Ardlösningsom-
rådets läge, be-
skaffenhet, m. m.

Ardlösningsområdet är beläget
omkring 2 km. norr om Mädda-
klens Sockens kyrka.

Ardlösningsområdet utgöres
huvudsakligen av trevne torvmossor
delvis bevädda med buskar o träd,
odikade och med alltför otillräckligt
avlopp samt av något åkerjord.
Hela ardlösningsområdet är ytterst

försumpat och i stort behov av torrläggning.

Nr tabell, Bil. litt. A framgår att utom sökandena blott T. M. Ström Hula-bäckstorp - Nygård har en obetydlig nytta av företaget. Någon uppskattning av jordens värde före och efter företagets utförande har ej företagits.

Nr. Beskrivningen har föreskrivet sammandrag utfärdat över den vattensjuka marken tabell a, Bil. litt. B.

I samma Bilaga litt. B har i tabell b sammanförts sökandenas kostnader samt anslagsbelopp.

Vattensamling.

Vattensamlingsområdet är ej område avdiktat större än att dikenans dimensioner kunna föreslås efter praktiskt bedömande utan särskilda beräkningar. Bottenbredden har överallt föreslagits till 0.3 m. utom mellan pålarna 1+24-5+68, där den föreslagits till 0.5 m. Sidolutningen har överallt föreslagits till 1:1.0. Bottenlutningen är överallt god.

Vid arbetets utförande skall iakttagas:

att dikesjorden skall läggas till hälften å vardera sidan att den ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 m. och ej uti sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen, dock å högst 50 m:s inbördes avstånd för ryttvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas

så, att den ej får brantare sidolutning än 1:1,0 mot dike.

Slinder mot
företaget

Laga hinder mot företaget kan ej föreligga, då diken öfverallt ligga på sökandenas mark, utom i den sträcka av 20 meter vid punkten D, där diket följer gränsen till en av. fr. L^a Flyndarp, som äges av Ernst Ström.

Denne har emellertid liksom tredje delägaren i allmänningen till L^a Flyndarp, Emil Norén, lämnat tillstånd för sökandena att utföra dikningsarbetet i deras mark se Bil. litt. G.

Statsunderstött
företag i när-
heten

Sylikt företag finnes vid Grenhult, men har ej beröring med i-frågavarande.

Arbetstid.

Företaget synes kunna utföras på 3 år

Kostnad och

statsunderstöd

Jordförbättringsvärde har såsom ovan nämnts ej beräknats, men kostnaden för arddikningen beräknad efter ett dagsverkspris av 6- kr. belöper sig på 3.680. - kr. och förädlingskostnaden på 156.67 kr. eller sammanlagt 3.836.67 kr.

St. företags hela areal 10.50 hektar, äger sökandena 10,38 ha, och är företaget ansett att helt utföras av sökandena ensamma, varför i statsanslag ur statens arddikningsanslag kan erhållas 1.278.89 kr.

Åtföljande
handlingar

Detta betänkande åtföljes av:
1^o Ett band handlingar inne-

hållande förutsett detta betänkomde:

- a) en översiktskarta;
- b) tabellariskt sammandrag över området, Bil. litt. A;
- c) sammandrag av ägobeskrivningen samt kostnader och anslagsbelopp, Bil. litt. B;
- d) kostnadsförslag, Bil. litt. C;
- e) arvodesräkning, Bil. litt. D;
- f) ägobeskrivning, Bil. litt. E;
- g) grävningsskista, Bil. litt. F;
- h) medgivande från icke sökande till sökanden att utföra dikningsarbetet — Bil. litt. G.

2^o Ritningar à 2 blad.

Förord.

Så företaget blir till stor nytta för sökandena dels genom frostländighetens minskande för bringliggande åkerjord, dels därigenom att de så småningom kunna uppodla sina mossar får jag i underdanighet hemställa

att största möjliga anslag ur statens ordningsanlag må beviljas till utdikning av ifrågasvarande sankar och frostspridande marker tillhörande $\frac{3}{64}$ och $\frac{3}{16}$ omt. L^a Flyndarps uti Mårdahlens socken, Rinds härad av Ålvsborgs län

Halmstad i dec. 1926

Sjalmar Grönvall

Bil. litt. A

Tabell

	Hela avdikningsam- rådet				Anslagsförbrukningens andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Här ar	Kr öre	Här ar	Kr öre	Här ar	Kr öre	Här ar	Kr öre
I sitt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	1	31			1	31,-		
mosse och mosslagg	9	19			9	07		
Summa:	10	50			10	38		
Genom de föreslagna avdik- ningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	1	31			1	31		
mosse ö mosslagg (förbättrad)	9	19			9	07		
Summa:	10	50			10	38		

Bil. litt. B

Tabell a

Beskrifning öfver vattenskadad mark tillhörig nedan-
stående anslagsökande tillhörigt hemman

Hemmanets Litt. och Nr.	Mth.	Hemmans och innehavares namn.	Real							
			åker		Till odling förest. onack		annan onack		Summa	
			Flak	ar	Flak	ar	Flak	ar	Flak	ar
B	3/16	L ^a Flyndarp Johan Andersson		49.5			6	86	7	35.5
A	3/64	L ^a Flyndarp S. J. Larsson		81.5			1	10	1	91.5
C		fö allm. till " Desamma					1	11	1	11
		Summa:		131-			9	07 $\frac{1}{2}$ -	10	38

Bil. till B

Tabell b

utvisande anslagsökvandens andel i kostnader och anslagsbelopp.

Medlemmans och innehavares namn	Årg. fig. nr.	Deltager i kostnaden för								Summa		Anslag	
		dihet A-G-H		dihet A-B		dihet B-C-D-E + C-F		betänkan det		kostnad			
		Kr	öu	Kr	öu	Kr	öu	Kr	öu	Kr	öu		
L ^a Flyndarp Johan Andersson	{ 2-15 samf för 27-29	165	-	-	-	2.280	-	104	09	2.549	09	849	90
L ^a " S. J. Larsson	16-26	165	-	1.070	-	-	-	52	58	1.287	58	429	19
Summa:		330	-	1.070	-	2.280	-	156	67	3.836	67	1.278	89

Supris = 6.-hr.

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete och jordmän	Pris	Kostnad		Summa	
				à kr.	kr	au	kr	au
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>A; Vattenavledning och dikning:</u>								
<u>Sikessträckan A-B.</u>								
1+24-2	76	30	kbm. leeb. grus med ngt. sten	1.50	45	-		
2		30	" torvjord med rötter	0.60	18	-		
2-3+50	150	150	l.m. ränsving i torvjord	0.50	75	-		
3+50-6	250	100	kbm. torvjord	0.50	50	-		
		120	" torvjord med spsten	2.50	300	-		
		70	" lera	0.90	63	-		
		80	" lera ngt. spsten	2.75	290	-		
4+10		1	st. vägrumma vattenöppning-0.8x4					
			längd = 4.m; enl. ritning		200	-	971	-
			Tillägges för oförutsedda fall, m. m. ca 10% av förestående				99	-
			<u>Sa Kronor:</u>				1.070	-
<u>Sikessträckan B-C-D:</u>								
6-17+90	154	1.130	kbm. torvjord med rötter	0.60	678	-		
		100	" stonb. grus	1.80	180	-	858	-
			Tillägges ca 10%				82	-
			<u>Sa Kronor:</u>				940	-
<u>Sikessträckan D-E:</u>								
17+90-20+50	260	630	kbm. torvjord med rötter	0.60	378	-		
		40	" stonb. grus	1.80	72	-	450	-
			Tillägges ca 10% av förest.				50	-
			<u>Sa Kronor:</u>				500	-
<u>Sikessträckan E-F:</u>								
14+30-13+26	466	1.270	kbm. torvjord med rötter	0.60	762	-	762	-
			Tillägges ca 10% av förest.				78	-
	1356	3750	<u>Sa Kronor</u>				840	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Sikessträckan I-H:</u>					
a-b+82	¹³⁵⁶ 182	³⁷⁵⁰ 500	hbm. torvjord med rötter	0.60			300	-
	¹⁵³⁸	⁴²⁵⁰	Tillägges 10% av förestående				50	-
			<u>Sä Kronor:</u>				330	-
			<u>Sammandrag:</u>					
			<u>Sikessträckan A-B:</u>				1070	-
		Ja	B-C-D				940	-
		Ja	D-E				500	-
		Ja	E-F				840	-
		Ja	F-H				330	-
			<u>Sä Kronor:</u>				3680	-
B;			<u>Förelämningskostnader:</u>					
			ent. arvodesräkningen.				156	67
			<u>Summa Kronor:</u>				3836	67

Halmstad 1 december 1926

Hjalmar Grönvall

Notis

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.836 kronor 67 öre
Stockholm den 27 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidmuns

ex officio

Hj. Grönvall

Bil till D.

Brooderäkning

enl. nedanstående §§ uti lantbruksingenjörstämman
av den 31 dec. 1920.

§ 13	29 fig. à 0.05	kr. 1.45	
	• 10.50 har à 0.10	" 1.05	
§ 14		" 1.50	
§§ 20 ö 21	0.5 km. à 3.50	}	" 9.25
	1.5 " à 3.-		
§§ 22 ö 23		" 2.85	
§ 24		" 2.-	
§§ 25 ö 26	2 km. à 3.50	" 7.-	
§ 27		" 2.47	
§ 28		" 5.-	
§ 29		" 9.43	
§ 40		" 16.57	
§ 41	2 st. översiktskartor à 4 kr.	" 8.-	
§ 43	betänkandet 4 sidor à 3 kr.	" 12.-	
§ 44	tabeller 1/2 dag	" 6.-	
	undersökning, avvägning, m.m.		
	L. 9 ö 10/6 1926 1 1/2 dag	" 18.-	
§ 49		" 15.70	
§ 52		" 12.90	
§ 55	avskrift av alla handl. 18 sidor à 0.75 kr	" 13.50	
	Inbindning	" 3.-	
	Uppsättande av ansökningar ö skrivelser	" 9.-	
	<u>Sä Kronor:</u>	<u>156.67</u>	

Ulmestad den 23 Mars 1927

Ljälmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Klander talan kan föras inför Tammeryö
Lärodsrätt inom tre (3) månader à dato.

Ägobeskrivning

Bil. litt. E.

Littera i hufvud	Mantal	Hemmans och ägares namn samt ägoslag	Areal			
			äker		äng & annan mark	
			Flak	ar	Flak	ar
1	2	3	4	5	6	7
C		<u>Dulabäckstorp - Nygård J. M. Ström</u>				
	1	mosse				12
		Summa:				12
B	3/16	<u>L: Flyndarp Johan Andersson</u>				
	2	mosse, torv				25
	3	"				60
	4	" "				25
	5	" "				21
	6	" "			3	03
	7	" "				13
	8	" "				16
	9	" "				13
	10	" "				58
	11	äker		11		
	12	" "		09		
	13	" "		15		
	14	" "		14.5		
	15	mosse				1 52
		Summa:		49.5	6	26
A	3/64	<u>L: Flyndarp S. J. Larsson</u>				
	16	mosse, torv.				88
	17	äker på lera		04		
	18	" "		12		
	19	" "				
	20	" "		03.5		
	21	" "		04.		
		Transport		13		
				36.5		88.

Halmstad i december 1926
Hjalmar Grönwall

Bil. litt. F.

Grävningslista

Läge	Längd	Styr	Botten bredd	Styr bredd	Sido lutning		Ännmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meter						
	Sekt			A - G - B - C - D - E.			
1+24		0.95	0.5	2.40	1:1.0		Flep. vid 1+25 ligger 7.87 m. över jämförelseplanet och 0.45 m. över nya botten.
1+35	11	1.45	"	3.40	"		
1+50	15	1.25	"	3.00	"		
2	50	1.50	"	3.50	"		
2+50	50	2.10	{ Rännning mellan 2 - 3+50				
3	50	2.35					
3+50	50	2.30	{ 0.5	{ 5.10	{ 1:1.0		
3+72	22	1.90	"	4.30	"		
3+85	13	1.90	"	4.30	"		
3+93	8	1.40	"	3.30	"		
4	7	1.55	"	3.60	"		
4+50	50	1.20	"	2.90	"		Flep. vid 4+72 ligger 10.02 m. över jämförelseplanet och 1.70 över nya botten
5	50	1.35	"	3.20	"		
5+50	50	1.30	"	3.10	"		
5+68	18	0.90	{ 0.3	{ 2.30 2.10	"		
6	32	1.00	"	2.30	"		
6+64=13	64	0.90	"	2.10	"		
13+25	25	1.60	"	2.70	"		
13+50	25	1.20	"	2.70	"		
13+65	15	1.40	"	3.10	"		
13+80	15	1.20	"	2.70	"		
14	20	1.30	"	2.90	"		
14+30	30	1.45	"	3.20	"		
14+50	20	1.50	"	3.30	"		
15	50	1.60	"	3.50	"		
15+50	50	1.30	"	2.90	"		

1	2	3	4	5	6	7	8
15+80	30	1.50	0.3	3.30	1:1,0		Jordbro mellan 15+80 och 16
16	20	1.50	"	3.30	"		
16+50	50	1.50	"	3.30	"		
17	50	1.30	"	2.90	"		
17+25	25	1.40	"	3.10	"		
17+50	25	1.30	"	2.90	"		
17+90	40	1.25	"	2.80	1:1,0		
18+10	20	1.30	"	2.90	"		
18+50	40	1.50	"	3.30	"		
18+75	25	1.50	"	3.30	"		
18+96	21	1.50	"	3,30	"		
19+50	54	1.50	"	3.30	"		
19+75	25	1.50	"	3.30	"		Fick. vid 19+85 ligger 16.00 m. över jämförelseplanet och 2.20 m. över nya botten
20	25	1.50	"	3.30	"		
20+50	50	1.50	"	3.30	"		
Diket C - F:							
14+30		1.20	0.3	2.70	1:1,0		
a	60	1.60	"	3.50	"		
b	30	1.50	"	3.30	"		
9	50	1.50	"	3.30	"		
9+50	50	1.55	"	3.40	"		
10	50	1.60	"	3.50	"		
10+50	50	1.50	"	3.30	"		
11	50	1.45	"	3.20	"		
11+50	50	1.55	"	3.40	"		
12	50	1.50	"	3.30	"		
12+26	26	1.35	"	3.00	"		
Diket G - H:							
a		1.00	0.3	2.30	1:1,0		
a+25	25	1.50	"	3.30	"		
a+50	25	1.50	"	3.30	"		

1	2	3	4	5	6	7
b	50	1.65	0.3	3.60	1:1.0	
b+50	50	1.55	"	3.40	"	
b+82	32	1.20	"	2.70	"	

Halmstad i december 1926
Hjalmar Grönvall

Bil. litt. J.

Härmed lämna vi vårt medgivande
att vår granne J. A. Andersson utföra diknings-
arbete å vår mark så långt han behöver för torv-
läggning av sin mosse.

Hulabäckstorp den 9^{de} Juni 1926.

Ernst Birger Ström

J. M. Ström

Emil Naren

Egenhändiga namnteckningar intyga

Bror Johansson

L. J. Larsson

Nygården

Slid

Hlyndarps Mårdakler

Förelämnat 18 sidor avskrift

vidimmas

ex officio

Hj. Cronwall

Undertecknade ha denna dag på uppmaning af S. J. Larsson
i Uppsala påtagit besiktning af honom utförd delnings-
arbeten i $\frac{3}{4}$ och $\frac{3}{16}$ rutt S. J. Larsson i Månsklips socken af S. J. Larsson.
Såsom han för tvilita arbeten samt påtagit och teckningar
för utvärdering af ånarna och jordfästen som utgjorde af
Stadens lantbruksingenjör S. J. Larsson i Uppsala under
år 1926 och statsbidrag under år 1927 november månad blivit
beräknad för nämnda intyga:

att diket A - B som är utloppsdikey är utförd från och från
färdigt från S. J. Larsson på # 4 öfver utloppsdikey från tem-
manet och skentrumma inf. teckning färdig förutom hand-
rälsena som skola anbringas för nämnda stenpälarna;

att diket sträckan S - H är färdig

Och på vi nämnda teckningar af S. J. Larsson i Uppsala
för lyfta och utvärdera honom tillkommande andel i stats-
bidraget samt ansvaret för att nämnda jämvel återstående
arbeten i diket sträckan A - B blifva färdiga utförda.

Klef i Uppsala för Månsklips 22/11/1928
Gustaf Kler Carl Larsson

Egentliga nämndens
berättelse

Gustaf Larsson

M. Larsson

150
200
30
330
156.67
866.67

3836.67 = 23%

sum 43%

Att hemmansägarna Gustaf Kieve i Klev och Carl Larsson i
Stora Hyndarp, båda Mårdaklevs socken, var för sig äro fullt veder-
häftiga för fullgörande av den förbindelse de här ovan sig iklätt,
betygar. Östra Tranemo i Tranemo landsfiskalskontor den 26 janua-
ri 1928.

I tjänsten:

W. J. J. J. J.

Lösen en krona.

*Upplyst af Skatteförvaltare
Carl Larsson*

Östra Tranemo

W. J. J. J. J.

Komis är verkställt avseende av torrläggnings-
företag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 5 Juli 1933.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 DEC. 1933

Företagets namn: Utdräsning av sankta och frostfria
marker, tillhörande $\frac{3}{4}$ och $\frac{3}{16}$ odl Lilla Nyndarp i Mär-
dabörens socken av Årlandsborgs län.

Plan fastställt den 25 November 1927;

Statshirag nr Statens avdräkningsanslag = 1.910 kr.;

Kontrakt antaget den 7 Mars 1928;

Fastställt arbetet till den 1 September 1931;

Förlängt arbetet till den 1 September 1933;

Egenskapsintressenter: Anders Persson i Lilla Nyndarp
och Adolf Larsson ilän.

Avseende verkställas av 1^{ste} Assistenten Eric

Arsonius den 17 November 1933

Företagets befärens därtill vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
och tinstyrkes till godkännande.

Kalmar den 25 November 1933

Hjalmar Brander

Statens lantbruksingenjör



Stämpel = En (1) Krona.
