



Akt nr:

R-E1a-0965

AU\$R-E1a-0965

vit.
ed. 45

78
44

DIARIE N: 25080
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1945

R 2*0965
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juli 1944 till
Lövvassa dikningsföretag av år 1942 i Beatebergs socken av
SKARABORGS LÄN

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or cancellation.]

1/2 huvud

beviljat statsbidrag med tretusensjuttio (3.070) x)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har
undertecknad ende intressent i
~~undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman~~
~~för företaget,~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å~~
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder mig.
~~oss~~

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
x) Minskat till 1.110 kr av Lantbruksstyrelsen den 16 juni 1953.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Länna Beateberg den 1 juli 1945

Oscar Holmgren

Att

Pers Oscar Holmgren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Ericsson

Johan Johansson

Adress

Arnäs Beateberg

Adress

Linna Beateberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 juni 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIENr 21989
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1943

R 2.1965

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Lövvassa dikningsföretag av år 1942"
i Beatebergs socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1942 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid synförvärt-
ning enligt vattenlagen
för förslagsning av
mark, tillhörande
Lövassa i Beatebergs
socken, Skaraborgs
län.

Den 19 November 1941 i Lövassa.

Närvarande: Under tecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förättningsman; samt följande
sakkämare:

Folkan den Oscar Holmgren saken ägare av
Lövassa 3'.

Skaraborgs länns östra värdistrikt genom
skogsbetsens ordförande Axel Andersson,

§ 1
Uppställes det för förättningsmannen
utskäddade förskedokumentet, som hade lydelse
enligt lant. A.

§ 2
Något jäv emot förättningsmannen
kunde icke utträttas.

§ 3
Förelades den vid förundersökning en
uppskattade nivåkartan över det vatten-
besvärade området samt profil över av-
loppen därifrån.

§ 4
Folkan den yrkade på i frågavarande
avlopps fördjupning och igentäggning med

för i största möjliga omfattning, så att
marken må kunna anläggas enligt
fördelningsplan, som är under upprättande.

§ 5

Beträffande de båda av förslaget
närvarande genomloppen genom allmän väg vid
A⁵ och H meddelades, att en förfärdlig
genomlopp med all sannolikhet byggts
före år 1880.

Vägsstyrelsen yrkade att ställa på veck-
ställa nödigt kompletteringsarbete på
företagets behörighet. Härefter hade söanden
inlett att invända.

§ 6

Då företaget ej kunde tänkas bevisa
någon annan än söanden och väg-
styrelsen och dessa voro om de-
ningens utförande ense, yrkade sö-
anden att föraktningen skulle hand-
läggas på billigaste sätt och utan
biträde av gode män.

§ 7

Som intet vidare fanns att till
protokollet uttala påklarades
sammanträdet upplöst med till-
räkna givande, att sedan delnings-
slaget upprättats, föraktningen skulle
avslutas i föraktningens kantz
i skara torsdagen den 29 jan. 1942. Hand-
läggning och ritning rörande företaget skulle
därefter förvaras hos söanden.

Ort och

Att som oron
 i tjänsten
 J. Beresfallin

Den 29 januari 1942 i Skara
Närvarande: Förrättningsmannen.

§ 8
 För protokollet togs förrättningsmannens
 ståtande, som hade lydelse enligt bil. F.

§ 9
 Förklarades förrättningen avslutad och sam-
 manträdet upplöst.

Ort och tid som oron
 i tjänsten
 J. Beresfallin

Bil. A.

D. o. V. D. 31-117
1941




Förordnande.


Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 juni 1941.

På länsstyrelsens vägnar:


Einar Johnson.


Elias Brandel.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

N. o. V. A. nr 31-117
1941



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Lövvassa

m.fl. hemman i

Beatebergs

socken av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
för mig.

Skara den 10 juni

1941

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få 2 härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande mtl.

Lövassa 3' i Beateborgs socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Piden 20 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress Lövassa

pr Beateborg

Telefon: Beateborg 12

Lövassa

den

28/5

19 41

Oscar Holmgren

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skaraborgs län Östra Vågdistrikt (3 stycken)

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Beatsbergs socken.</u>					
Lövsåsen	31		1		Oskar Holmgren
				1	åker, mylla på sand
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	äng " "
				10	åker " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	äng " "
				14	åker, sandmylla på lera
				15	" " "
				16	äng, mylla på sand
				17	åker. " "
				18	" sandmylla på lera
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	äng " "
					Överskrift


1	2	3	4	5	6
					Överför
				25	äng, mylla på sand
				26	åker, - " -
				27	" - " -
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
949	100								5708 20			11674 -			596580	
	34							400	136 -		1000	340 -		600	204 -	
24								530	127 20		•	240 -		470	112 80	
53								430	227 90		•	530 -		570	302 10	
1026	134								6199 30			12784 -			6584 70	

LX

Skara den 29 jan. 1942.

I tjänsten.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,


att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätare försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl, att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Skara den 29 jan. 1942.

I tjänsten:



Kostnadsförslag.

Bil. D.


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		I <u>Diket A - A - B - C .</u>								
33-32+66	34	Morän	m	15	1:50	22 50				
32+66- -32+30	36	8" rör med frakt	m	36	1:90	68 40				
32+30-30	230	6" - " -	"	230	1:30	299 --				
32+66- -32+30	36	Grävn.,läggn. o.återf.	"	36	1:--	36 --				
32+30-30	230	- " -	"	230	0:65	149 50				
32+61- -32+66	5	Rörets främre gm landsv. st	st	5	7:--	35 --				
32+66		Täckdikesöga	"	1	15:--	15 --				
32+30		Brunn typ B, d=0,45 m	"	1	18:--	18 --				
30		" " A, d=0,45 m	"	1	37:--	37 --	680	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					69	60	750	--
		I <u>Diket B - B .</u>								
35-35+70	70	4" rör med frakt	m	70	0:65	45 50				
		Grävn.,läggn. o.återf.	"	70	0:55	38 50				
35+70		Brunn typ A, d=0,37 m	st	1	30:--	30 --	114	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					16	--	130	--
		I <u>Diket D - E - F - G - H - I - K .</u>								
3-1	200	Lera	m	265	1:--	265 --				
1-5+85	185	"	"	175	1:--	175 --				
1-7+16	316	8" rör med frakt	"	316	1:90	600 40				
7+21-8+62	141	8" - " -	"	141	1:90	267 90				
1-7+16	316	Grävn.,läggn. o.återf.	"	316	0:85	268 60				
7+21-8+62	141	- " -	"	141	0:95	133 95				
1		Rörlöpp enl. ritn.	st	1	35:--	35 --				
0		Brunn typ C, d=0,45 m	"	1	27:--	27 --				
5+85		" " B, d=0,45 m	"	1	18:--	18 --				
		Överföres				1387.00 1790 85			880	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört				1389 -- 1790 85			880	--
7+16 7+21 8+12 8+62			2 4	37:--	74 -- 148 --	1463 -- 1938 85			1600	✓
		Brunn typ A, d=0,45 m st					137 -- 181 15		2130	--
		Arbetsledning o. oförutsett								
		<u>Diket F - F.</u>								
25-25+64	64	6" rör med frakt m	64	1:30	83	20				
		Grävn.,läggn. o. återf. "	64	0:90	57	60				
25+64		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	37:--	37	--	177	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					22	20	200	--
		<u>Diket I - I.</u> utgår								
20-21+37	137	3" rör med frakt m	137	0:45	61	65				
		Grävn.,läggn. o. återf. "	137	0:75	102	75				
21+37		Brunn typ A, d=0,37 m st	1	30:--	30	--	194	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					25	60	220	--
		<u>Diket L - M - N - O.</u>								
43+38-42+20	118	Sandblandad lera m	170	1:10	187	--				
42+20-40	220	15" rör med frakt m	220	5:--	1100	--				
		Grävn.,läggn. o. återf. "	220	1:20	264	--				
42+20		Rörutlopp enl. ritning st	1	25:--	25	--				
40		Slamficka enl. " " 1	20:--	20	--	157 -- 1596 --			210	
		Arbetsledning o. oförutsett					23 164 --		1760	--
		<u>Diket M - M.</u> utgår								
55-56	100	3" rör med frakt m	100	0:45	45	--				
		Grävn.,läggn. o. återf. "	100	0:55	55	--			2010	✓
					100	--			5180	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört				100 --			2010 --	
									5180 --	
55		Täckdikesöga st	1	10:-	10	--				
56		Brunn typ A, d=0,37 m "	1	30:-	30	--	140	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					20	--	160	--
		<u>Diket N - N. I</u> utgår								
50-50+83	83	3" rör med frakt m	83	0:45	37	35				
		Grävn., lägn. o. återf. "	83	0:55	45	65				
50		Täckdikesöga st	1	10:-	10	--				
50+83		Brunn typ A, d=0,37 m "	1	30:-	30	--	123	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	--	140	--
		<u>Diket P - R - S.</u> utgår								
61+62- -61+42	20	Morän m	20	2:--	40	--				
61+42- -60+88	54	8" rör med frakt m	54	1:90	102	60				
60+88-60	88	6" - " - "	88	1:30	114	40				
61+42- -60+88	54	Grävn., lägn. o. återf. "	54	1:20	64	80				
60+88-60	88	- " - "	88	1:10	96	80				
61+42		Täckdikesöga st	1	15:-	15	--				
		Brunn typ A, d=0,45 m "	2	37:-	74	--	507	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					52	40	560	--
		<u>Slutsumma kronor</u>							2010 --	6040 --

Skara den 29 januari 1942.

I tjänsten:



VÄGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.

17

Bil. E.


Till Statens Lantbruksingeniör Sven Hallin,

S k a r a.

Beträffande "Lövvassa dikningsföretag av år 1942".


Mot de av Eder föreslagna åtgärderna för vatten-
avledning genom allmänna vägen Beateberg - Gammalrud
i Beatebergs socken och Skaraborgs läns östra vägdist-
rikt har jag intet att erinra.

Mariestad den 3 februari 1942.



A. Westgren.

Utdrag ur planen för:


Lövvassa dikningsföretag av år 1942.




A A' B

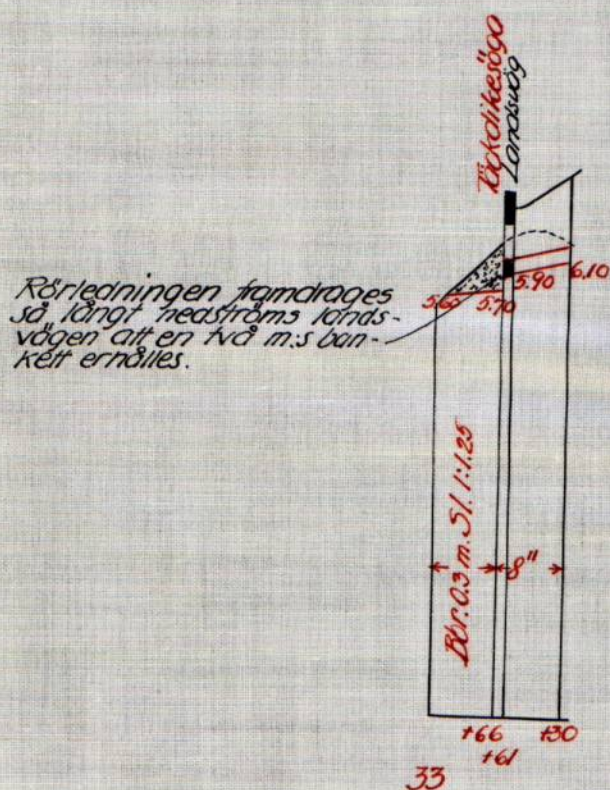

Stensättning till en längd av en meter nedströms löddsvägen



Översiktskarta.

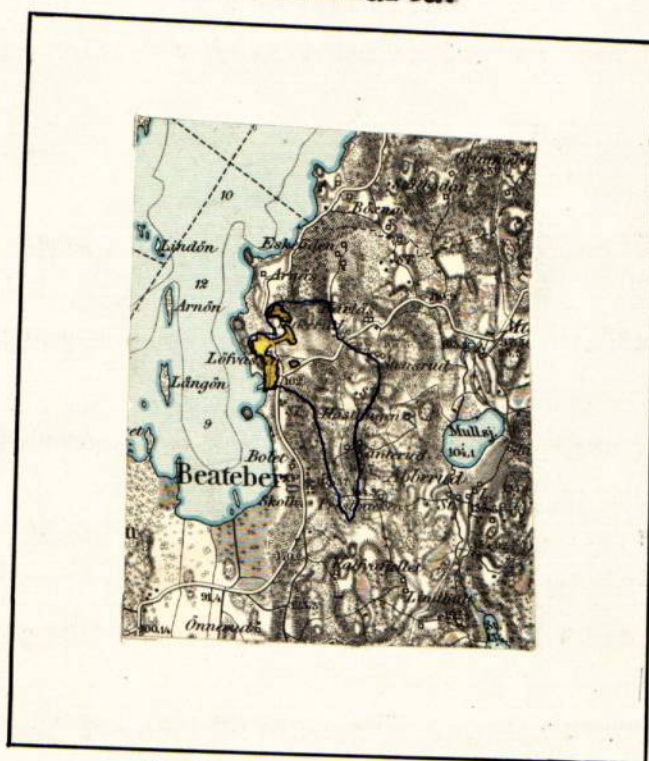

Skala 1:100 000.

Bil. F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lövvassa i Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av fyra olika avlopp med sidogrenar genom och från vatten-skadade marker, belägna omkring 2 km. norr om Beatebergs kyrka inom Vätterns nederbördsområde i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. I enlighet med sökandens önskemål och då härför i 10 kap. 35 § andra stycket angivna förutsättningar äro för handen, har syneförrättningen rörande företaget handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vatten-skadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C, E - F - G - H - I - K, L - M - N - O och P - R - S för de

olika huvudavloppen samt $B - B^I$, $F - F^I$, $I - I^I$, $M - M^I$ och $N - N^I$ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Kostnaderna för syneförrättningen och för företagets utförande och underhåll skola gäldas av sökanden ensam såsom ende intressent i företaget.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckorna A - B och G - H - I korsar allmänna vägen Beateberg-Gammelrud. Trumman vid A^I är för grund och måste för den skull kompletteras med ett djupare liggande rör vid sidan. Rörets framdragande genom vägen skall ombestyras av Skaraborgs läns östra vägdistrikts styrelse men betalas av företaget efter självkostnadspris så snart arbetet färdigställts. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom tre veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. Trumman vid H är i befintligt skick tillräcklig för den avsedda torrläggningen, men skall medelst tvänne brunnar anslutas till den rörledning, som skall utföras ovanför och nedanför denna trumma. Detta anslutningsarbete skall utföras genom företagets försorg. Vid utförandet av alla arbeten, som beröra allmän väg skola av vägingenjören i länet utfärdade föreskrifter noggrannt iakttagas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får för-
rättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, ut-
föras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i
detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst
0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,
icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-
nets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som upp-
fylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs in-
träffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntföränd-
ringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år
1952;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Lövvassa dikningsföretag av år 1942".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 29 januari 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 14
1941		Avvägning.				
sept. 5		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 1: <i>Turritning av begränsningskurva i tråk</i>	1/4	12,-	3 -	
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		9 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 43 ar,	27 0,05		1 35	
		har	11 60 0,10		1 16	2 51
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	27	0,04		1 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	54	0,06	3 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	27	0,12	3 24	14 98
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,5	3,-	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,7	3,50	5 95	7 45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0,15	15	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	12	0,25	3 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 15
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1,3	6,00	7 80	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	22 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		0,03		
		Överföres				85 61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 61
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		J —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp		1.7 4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 04	15 34
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5 3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		3/4 12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning		1 1/2 12,00	18 —	
		slamficka		1/4 12,00	3 —	30 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			164 95
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 43 ar ägofigurer	st.	27 0.07	1 89	
		har	11.60 0.14	1 62		
		Överföres			10 51	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 51	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	70	0,02	1 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52	0,05	2 60	16 26
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.3	5.-	1 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.7	6.-	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 15	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					17 85	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 46	13 39
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka „	2 1/2	12,00		30 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	21	0,55	11 55	11 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						75 20
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandel jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 50	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
						10 50
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				164 95
		Lösen för kopior och avskrifter				75 20
		Övriga förrättningskostnader				10 50
						250 65
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Wadbo
Skara

den 29 jan. 1942

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19

1944
bidr.

J 343/52

SL/AP

Lantbrukaren Bernhard Holmgren,
Lövassa,
Beateberg.

Ang. LÖVVASSA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942 i Beatebergs
socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid
för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att -
såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid
må utsträckas till den 1 september 1952.

Lantbruksstyrelsen har en gång tidigare medgivit förlängning
i den kontrakterade arbetstiden. Styrelsen förutsätter att
på allvar vidtager åtgärder för
att ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ att slutföra arbetet inom
den sålunda utsträckt tiden. Om företaget icke helt eller
i på lämpligt sätt begrundad omfattning färdigställts till
nämnda tidpunkt avser Lantbruksstyrelsen att indraga det be-
viljade statsbidraget.

Ytterligare upplysningar kunna erhållas från vederbörande
lantbruksingenjörskontor.

Stockholm den 13 maj 1952.


Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

78
44



Nr. 22. Fnr. 9/46.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 13 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ende intressent i "Lövvassa dikningsföretag av år 1942"
i Beatebergs socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förläng-
ning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den
1 sept. 1953.

Företaget är utfört till c:a 50 procent, men har icke kunnat fullbordas
på grund av brist på arbetskraft för dikningsarbete. En stor del av företaget
har utförts med egen arbetskraft, men sjukdom jämte bristen på arbetskraft
även inom lantbruk har varit orsaken till fördröjningen. År 1951 avled förre
ägaren till Lövvassa gård, min bror Oscar Holmgren, och gården har försålts
till undertecknad, ^{Bernhard}~~Herbert~~ Holmgren, och jag har för avsikt att så snart de
ekonomiska omständigheterna tillåter snarast fullborda dikningsföretaget.

Lövvassa, Beateberg den 25 jan. 1952.

Bernhard
(~~Herbert~~ Holmgren)

Bernhard Holmgren

*Ende int. end. kontet
- Oscar Holmgren*

V.L 1.12.52.

Excerpt.

Lövassa dikningsföretag av år 1942.

Beräkning av kostnader för utförandet med hänsyn till avvikelser
från fastställd arbetsplan enligt kostnadsföreläget å - priser.

Beräknad arbets- och materialkostnad för utförandet	6.040:- kr
Avgår ej utförda diken: A - A ¹ - B - C (750:- kr),	
B - B ¹ (130:- kr), H - J - K (520:- kr), J - J ¹ (220:- kr),	
N - O (1.550:- kr), M - M ¹ (160:- kr), N - N ¹ (140:- kr) och	
P - R - S (560:- kr)	<u>4.030:- kr</u>
<u>Avgår summa kronor 2.010:-</u>	

Kostnads sammendrag.

Utförda diken: D - E - F - G - H (1.600:- kr), F - F ¹	
(200:- kr) och L - M - N (210:- kr)	2.010:- kr
Kostnad för synförrättningen	250:65 "
" " utredning ang. statsunderstöd	<u>30:15 "</u>
<u>Summa kronor 2.290:80</u>	

Skara den 20 januari 1953.

(Oven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Concept.

Lövvasse dikningsföretag av år 1942.

Beräkning av båtnedsminskning på grund av avvikelser från fastställd arbetsplan.

Total båtnad		6.584:70 kr
Båtnaden avgår helt å fig. 1 - 5	936:50 kr	
" " " " " 6 - 11	841:20 "	
" " " " " 16, 17 o. 19	339:60 "	
" minskas " " 18, 20 o. 22	1.286:-- "	
" avgår helt " " 21	78:40 "	
" " " " " 25 - 27	618:90 "	4.100:60 kr
<u>Avgår summa kronor</u>		<u>2.484:10 "</u>

Kvarstående båtnad

Båtnaden å fig. 12 - 15	1.817:10 kr
" " " 18, 20 o. 22	511:60 "
" " " 23 o. 24	<u>155:40 "</u>
Summa kronor	2.484:10

Skara den 20 januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RAPPORT

78
44
LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MRS 1953

DIARIE Nr J 573

SAK Nr.

över verkställd avsyningFöretag: "Lövvassa dikningsföretag av år 1942" i Beatebergs socken

(namn, socken och län)

av Skaraborgs län

BESLUT

DEN 16 JUN 1953

~~Företagsstyrelsen:~~~~Företagsstyrelsen:~~

Ende intressent: }

Lantbr. Bernhard Holmgren,

Lövvassa, Beateberg

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 25 juli 1944

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.070:- kronorLån från statens avdikningslånefond - kronorArbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till


Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1952Vid förrättningen, som verkstälts av assistent Stig Lundblad

den 10 december 1952, har befunnits att dikena D - E - F - G - H, F - F¹ och L - M - N voro utförda enligt den fastställda arbetsplanen. Övriga diken voro ej utförda och anhålles utgå ur arbetsplanen.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha för de utförda dikena uppgått till de beräknade. Räntor och styrelsearvode ha ej utgått.

Skara den 20 januari 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BESLUT

DEN 16 JUN 1953

I

Lövvassa dikningsföretag av år 1942 LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS 1953
DIARIE Nr 573
SAK Nr

Beräkning av kostnader för utförandet med hänsyn till avvikelser
från fastställd arbetsplan enligt kostnadsförslaget å - priser.

Beräknad arbets- och materialkostnad för utförandet	6.040:- kr
Avgår ej utförda diken: A - A ¹ - B - C (750:- kr),	
B - B ¹ (130:- kr), H - J - K (520:- kr), J - J ¹ (220:- kr),	
N - O (1.550:- kr), M - M ¹ (160:- kr), N - N ¹ (140:- kr) och	
P - R - S (560:- kr)	4.030:- kr
	<u>Avgår summa kronor 2.010:-</u>

Kostnadssammandrag.

Utförda diken: D - E - F - G - H (1.600:- kr), F - F ¹	
(200:- kr) och L - M - N (210:- kr)	2.010:- kr
Kostnad för syneförrättningen	250:65 "
" " utredning ang. statsunderstöd	30:15 "
	<u>Summa kronor 2.290:80</u>

Skara den 20 januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

BESLUT
DEN 16 JUN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS 1953
DIARIE Nr 573
SAK Nr

Lövvassa dikningsföretag av år 1942.


Beräkning av båtnadsminskning på grund av avvikelser från fastställd
arbetsplan.

Total båtnad		6.584:70 kr
Båtnaden avgår helt å fig. 1 - 5	936:50 kr	
" " " " " 6 - 11	841:20 "	
" " " " " 16, 17 o. 19	339:60 "	
" minskas " " 18, 20 o. 22	1.286:-- "	
" avgår helt " " 21	78:40 "	
" " " " " 25 - 27	618:90 "	4.100:60 kr
<u>Avgår summa kronor</u>		<u>2.484:10 "</u>

Kvarstående båtnad

Båtnaden å fig. 12 - 15	1.817:10 kr
" " " 18, 20 o. 22	511:60 "
" " " 23 o. 24	<u>155:40 "</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>2.484:10</u>

Skara den 20 januari 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BESLUT
DEN 16 JUN 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS 1953
DIARIE Nr J 573
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende intressent i "Lövvassa dikningsföretag av år 1942" i Beatebergs socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna, vilka framgå av lantbruksingenjör Sven Hallins avsyningsbevis av den 20 januari 1953.

Förutvarande ägare till Lövvassa 3¹ Oskar Holmgren avled år 1951 och hans hustru Anna-Lisa Holmgren har den 5 sept. 1951 sålt gården till undertecknad. Efter ^{sist-} nämnda datum har intet arbete utförts inom rubricerade företag.

Lövvassa pr Beateberg den 9-3 1953.

Bernhard Holmgren

(Bernhard Holmgren)

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Johan Johansson

Anna Johansson

RAPPORT

78
44

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr 377
SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning

*Bernh ans d.
8.7.52*

Företag: "Lövvassa dikningsföretag av år 1942" i Beatebergs socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län

Godförsynanden: }
Borsandenmanx }
Ende intressent: }

Bernhard Holmgren,

Lövvassa, Beateberg.

BESLUT
DEN 16 JUN 1953

Arbetsplanen fastställd den 25 juli 1944

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.070:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952.

Vid förrättningen, som verkstälts av Assistent Stig Lundblad

den 10 dec. 1952, har befunnits att diken A - B - C - D - E - F - G - H, F - F^I och L - M - N voro utförda enligt fastställd arbetsplan. Övriga diken voro ej utförda och anhålles utgå ur arbetsplanen.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Avsyningshandlingar ligga i avvaktan på ansökan om ändring i arbetsplan och komma snarast att översändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Skara den 15 dec. 1952.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

78/44 *bedr*

3.070 -

fil.



BESLUT
DEN 17 APR 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm 16.

Undertecknad, såsom ordförande i "^{v)}Lövassa dikningsföretag av år 1942" i Beatebergs socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt an-
hålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda
tiden till den 1 sept. 1951.

Företaget, vilket är utfört till c:a 50 %, har inte kunnat full-
bordats inom föreskriven tid, beroende på i orten rådande brist på
arbetskraft för dikningsarbete. Stor del av företaget har utförts
med egen arbetskraft, men sjukdom jämte bristen på arbetskraft även
inom lantbruk har även detta varit orsaken till fördröjningen.

^{v)}
Lövassa pr Beateberg den 11 jan. 1951.

Oscar Halmgren

Ordf.

25080
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. NOV. 1945

k 2-0965

R 2-0965

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Lövvassa dikningsföretag av år 1942"

i Beatebergs socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1942

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

att dikena A-A^I, B-C, B-B^I, Y-Y^I, M-M^I,
N-N^I och P-R-L samt sträporna H-H^I och N-6
må utgå ur den fastställda arbetsplanen. Sels och
minskat statsbidraget från 3.070 kronor till 1.110 kronor.

Hockholm den 16 juni 1953.

Enligt uppdrag
E. Engström.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denne dag fastställd till efterrättelse vid ar-
betets utförande.

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Lövvassa
dikningsföretag av år 1942" i Beatebergs socken av Skaraborgs
län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 2 km. norr om Beatebergs
kyrka och anges å översiktskartan i synhandlingarna med gul
färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har
upprättats vid av undertecknad handlagd, den 29 januari 1942
avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har
ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsan-
slaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslåne-
fonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått
till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro när-
mare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, för-
bättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruks-

Lantbruksstyrelsen har dels medgivit,
(Forts. se föregående sid.)

ingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1952.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. c/

Statsunderstöd. Företaget berör endast en delägare och denne har ingivit ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag. Lån sökes ej. Bifogade tabell /bil. d/ utvisar bl.a. beräknat bidragsbelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3,070:-- kronor från statens avdikningsanslag.

Företaget avser att bereda avlopp för redan planerad täckdikning, varför dess utförande kan väntas medföra omedelbar skördeökning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad
plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Arvodesräkningar /bil. e ^{I-II} /.

Skara i juni 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnads sammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	6 040:--	²⁰¹⁰ 6 040:--
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	250:65	
" " utredningen angående statsun- derstöd	30:15	280:80
	<u>Summa kronor</u>	^{2 290:80} <u>6 320:80</u>

Skara i juni 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 6,320 kronor 80 öre.*

*Stockholm den 25 juli 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmer Forsman.*

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 29 januari 1942 avslutad laga syneförrättning angående
företag, avseende torrläggning av mark tillhörande Lövvassen
i Beatebergs socken, Skaraborgs län; det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 9 april 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel _____ 1:--

Summa kronor 1:75

REDOGÖRELSE

Bil. 6.

för "Lövvassa diknings- företag av år 1942"
i Beatebergs socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	10,26	har
Äng och odlingsmark	1,34	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	11,60	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har
" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 6584:70 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 6040:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand o. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 29 jan. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oskar Holmgren.

Adress: Lövvassa, Beateberg.

Anm.:

Skara den 3 mars 1942.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	10,26	1,34	11,60	6320:80	6584:70	0,96
Summa	10,26	1,34	11,60	6320:80	6584:70	
			Skara i juni 1942. I tjänsten: Sven Hallin. Statens lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1	3 ¹		<u>Beatebergs socken.</u>							
			Lövvassen	Oskar Holmgren	10	26	1	34	11	60
				<u>Summa</u>	10	26	1	34	11	60

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till.....

Lövåsa dikningsföretag av år 1942
inom Beateberg socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	" 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2.00 + 0.40	" 12:-	2	40
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	" 12:-	6	-
§ 49. Kopja av plankartan å väv	sid. 1 à 3.	3	-
§ 52. " " profiler och sektioner			
§ 53. " " bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synhandlingar och be- tänkande m. m. sidor 5	0.55 "- 0:75	2	75
Inhäftning av handlingar		1	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		30	15

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Vadsko*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 18 juni 1942

Jren Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Sturges
