



Akt nr:

P-E1a-0176

AU\$P-E1a-0176

23

P

3*0176

D. 920

4419

KONTRAKT.

H. Landtbruksstyrelsen

Den 29 APR 1915

Sedan Kungl. Maj:t den

19 juni 1914

i och för

utdikning af frostspridande marker, tillhö-
rande hemmanen Hälskult och Backabo
i Hälsviks socken,

Älsborgs län,

enligt af Landbruksingenjören B. H. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Fretusens och hvaras betro (3.560:-)
kronor (den för endast kostnadsutläggningen afredda delar af)
den för endast kostnadsutläggningen afredda delar af
fråhållmännen af dikningsanslaget för år 1914,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

~~valda direktion,~~ i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi ~~för egen~~
~~del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1
juni 1915 — och fullbordadt inom den 1 juli 1915 —
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma,
äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, *sjutusenettusend-*
katullior (7.130) Kronor, 78 öre, skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Hälsnutt den *29 Oktober 1914*

Jöns Paulson
Anders Salomonsson
F. W. Larsson

Att

Jäns Paulsen Anders Palmvassan och
J. W. Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

..... som ofvan.

Wilhelm Löder

adress: Källnäs Kallsjöholm

Jenny Johanson


adress: Källnäs Kallsjöholm

Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni
1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 18 augusti 1915

Wilhelm Löder

Olof Gustafsson

P 3*0176

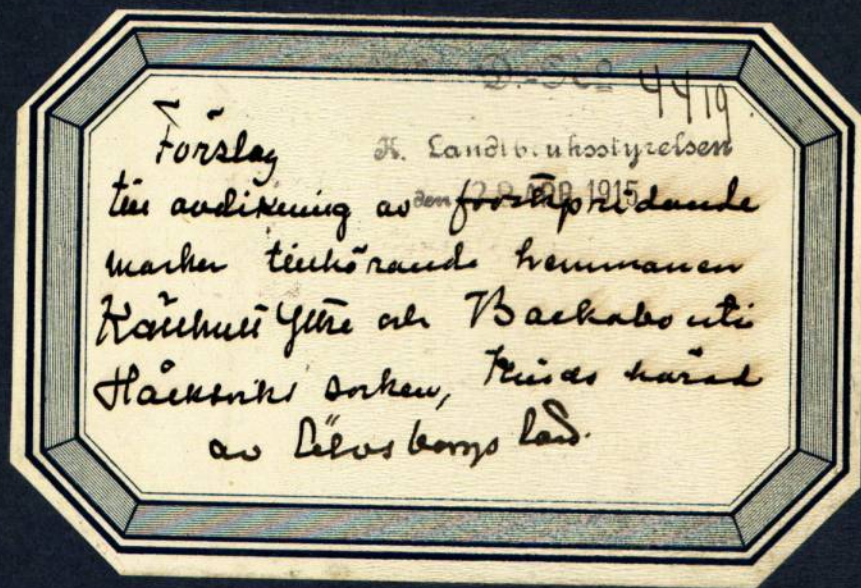



beskrift.

Följande den arbetsplan, som av Kungl. Majt. den 19 juni 1914 fastställs, med vilken än, sträckan 0-19 av diket & samt diket & upp-
togs med sidobekantning ej beräknas än 1:1, och sträckan 19-6 av diket a, diket
a samt sträckan 61-79 av diket 0 upptogs med ~~ej mindre~~ sido-
bekantning ej beräknas än 1:1,5; samt än, därest jorden ännu i de öfriga
dikena, den sidobekantningen föreslås beräknas än 1:1, skenue vilk utfo-
randet inte sig vara ansevärda än i förslaget angående, att
dikensslättarna giva en mindre bekantning, som av Kungl.
Majt. och Vattenbyggnadsstyrelsen kan komma att medgivas;
samt med rättighet till ändring enligt anteckning under
Kostnadsförslaget. Stockholm den 2 sept. 1914.

Frida af Wijkström. J. G. Leiman.

Utdienerat el. affierat

Förslag

till avdikning av frostspridande mossmarker, tillhörande hem-
manen K ä l l h u l t Nedre eller Yttre samt B a c k a b o
uti Håcksviks socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsens under år 1911 förordnat mig
att verkställa undersökning samt upprätta förslag till avdik-
ning av frostspridande mossar tillhörande hemmanen Källhult,
Nedre eller Yttre samt Backabo uti Håcksviks socken av Älvs-
borgs län, har sådan undersökning verkställts under slutet av
år 1911, varefter sammanträde för avdikningsfrågan ägt rum under år
1912.

Av denna avdikningsfråga beröras:

1/4 mtl.	Källhult Nedre el. Yttre.....	ägare: F.W. Larsson
1/8 "	Källhult D:o D:o	" Jöns Pålsson
1/8 "	Backabo	" Anders Samuelsson.

Sedan intressenterna förklarat, att de till detta frostavdiknings
företags utförande i underdånighet ämnade söka erhålla anslag

utan återbetalningsskyldighet, får jag för sådant ändamål, jäm-
likt föreskrifterna ~~ixingensexdikning~~ förnyade instruktionen
för statens lantbruksingenjörer den 11 februari 1896, härmed
avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande beskrivning

Avdikningslägenheten är belägaeg i södra ändan av Håcksviks socken intill sjön Spaden och sålunda mot Smålandsgränsen, helt nära bygdevägen från Håcksvik in åt Småland.

Anledningen

till vattenskadan

och frostländigheten.

Anledningen till vattenskadorna och frostländigheten är att söka däri, att mossarne fullständigt sakna avdikning och att vattnet från den ovanför liggande lilla sjön Tolen i enoreglerad bäck-rännil försumpar vissa sträckor av mossarne.

Arealer

och jordmän.

Mossarne innehålla:

till Källhult, F.W.Larsson..... 28,38 h:ar

"	Die	Jöns Pålsson	3,62	"
---	-----	--------------------	------	---

" Backabo, And. Samuelsson 8,06 "

Summa: ... 20,96 h:ar

samt å icke sökandes mark 1,47 "

Tillsammans: 41,53 hektar.

Jordmänen består över allt av hög vitmossse på mossterv. Vitmos-
sans djup överstiger oftast en meter och hela mossdjupet över-
stiger oftast 3,00 m., utom där gruskullar här och där närma sig
mossytan.

Samtliga ~~maskiner~~^{maskiner} äro fullständigt odugliga till odling.

Avkastning

och jordvärden.

De ifrågavarande mossarne giva för närvarande icke någon som helst avkastning, - ej heller kan man beräkna, att de efter avdikningens utförande skola giva någon uppskattningsbar avkastning. Något jordförbättringsvärde kan det därför ej här bliva tal om.

Kostnadsförslag.

Under bil. litt. B bifogas beräkning av kostnaden för ifrågavarande avdikning uppgående för själva dikningen till 7533,00 kronor och för förrättningen till Su..... 86,78 "

Summa: 7618,78 kronor.

Härav kommer på Källhult, F.W. Larsson 5266,00 kronor

på Källhult, Jöns Pålsson 807,00 "

och på Backabo, Anders Salomonsson 1460,00 "

Summa: 7533,00 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för denna avdikning är endast föga större än själva avdikningslägenheten, varför någon särskild beräkning av tillrinnande vattenmängd pr sekund icke synes vara av nöden.

Lutningar och dimensioner.

Bottenlutningarna bliva över allt goda.

Normaldjup för dikena är föreslaget till 1,80 m. med minskning där terrängen eller jordmånen så föranleder.

Sidelutning är föreslagen till 1:05, men i grusskärningar till 1:1,0.

Bootenbredden är föreslagen till 0,30 m.

Diket "a" får följa den naturliga bäcken från sektion n:o 17 ned till diket "a", sekt. n:o 73. Bäckens frångång visserligen i många krokar, men innehar tillräckligt djup och, som å ritningen synes, mycket starkt fall.

Breär.

Några brobyggnader förekomma icke.

Avdikningens

effekt.

Gemom denna avdiknings utförande torrläggas de ifrågavarande mossarne nödtorftigt. Deras frostalstrande ägenskap kommer att minskas till fördel för c:a 20 h:ar åkerjord i deras omedelbara närhet samt för stora arealer bärande skogsmark.

Avikningens

laglighet.

Mot denna avdiknings utförande möter intet laga hinder.

Anledning har icke förefunnits, att för detta företag hålla sådan syneförrättning, som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, - däremot hava intressenterna i dikningsföretaget förenat sig om, att utföra avdikningen i överensstämmelse med det fastställda förslaget samt att svara för avdikningens utförande och dikenas underhåll var och en inom sitt ägeområde.

Angränsande jordägare hava förklarat, att de intet hava att invända mot att dikning företages i gränslinierna mot deras hemman, ej håller mot att den lilla sjön Tolen något sänkes, en sänkning, som för övrigt icke är absolut nödvändig, då man mycket väl kan låta diket litt. "g" sluta några meter nedanför sjön, om man så vill.

Då inga av de föremål eller omständigheter, vilka i Kungl. Kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot medgivande av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., av detta avdikningsföretag beröras, har anledning saknats sådant tillstånd söka.

Arbetets

utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom fyra år, efter sedan anslag utan återbetalningsskyldighet till detsamma ~~maximalt~~ beviljats, och torde det beviljade anslaget under sådana förhållanden böra utgå med c:a 1/4 om året, så att

första fjärdedelen får lyftas, när vederbörligt kontrakt om arbetets utförande blivit underskrivet och godkänt.

Liknade

med statsmedel

undersött företag

i närheten.

Närmaste med statsmedel understödda liknade företag torde vara vid Klägghult uti Kalvs socken samt vid Barnarp uti Håcksviks socken. Flere andra företag från denna del av länet ligga hos Kungl. Majt. för prövning.

Tillstyrkande.

Då denna ifrågavarande frostavdikning är för delägarne i densamma av synnerligt stor nytta och av stor nytta för orten, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att till företaget måtte få beviljas anslag utan återbetalningsskyldighet ur allmänna avdikningsanslaget, - och till hälften av den beräknade kostnaden, eller alltså till avrundat 3800,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000, -

2:o) Ägobeskrivning, bil. litt. A, -

3:o) Kostnadsförslag, bil. litt. B, -

4:o) Protokoll och Förening rörande företagets utförande, bil.
litt. C.

5:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil. litt. D, -

6:o) Medgivande från angränsande jordägare, bil. litt. E, -

7:o) Plankarta i ett blad, -

8:o) Profilritningar i två blad.

Vänersborg den 1 mars 1914.

Ex officio:

Brn Eric Hildstrand.

Utdimaras ex officio

Erik Hildstrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Agobiskriking och H.äpelförbrukning öfver frost- spridda och marker till hemmanen Hållmatt och Barkabo uti H.äpelsviks socken, Vinds härad af Elfsborgs län; år 1912											
Hö. För. N:o	Hemmanen och ägar- namn samt markernas naturliga beskaffenhet		Areal H:ar	Summa areal H:ar							
1	2		3	4	5	6			7		
entl. Hållmatt, F. H. Larsson											
1	Hvitmaske		2	70							
2	"		1	18							
3	"		-	61							
4	"		-	81							
5	"		-	19							
6	" Skogbärande		-	75							
7	"		-	20							
8	"		1	34							
9	"		-	32							
10	"		-	45							
11	"		-	50							
12	"		-	77							
13	"		1	50							
14	"		2	92							
15	"		3	27							
16	"		3	14							
17	"		2	48							
18	"		3	05							
19	"		2	20							
			Summa	28	38						
entl. Barkabo, Aud. Salomonsson											
20	Hvitmassa		-	42							
21	"		1	94							
22	"		1	82							
23	"		-	56							
	transport.		4	74	28	38					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	2		3 4	5 6					7		
	transport		4 74	28 38							
24	Britmasser		- 61								
25	.		2 71								
	² Häckst	Summa		8 06							
	~~Barkabo~~ Jöns Pålsson										
26	Britmasser		2 66								
27	.		- 96								
	Summa			3 62							
	Mark lvars ägarer										
	deltagar i förtaget										
28	Britmasser		- 10								
29	.		- 15								
30	.		- 94								
31	.		- 28								
	Summa			1 44							
	Summa Arsal			41 53							

Länshuset den 22 mars 1912
 P. Emil Bildstrand.

Uddimmar ex officio.
 Bildstrand

Kostnadsförslag för anordning av frästspårar i massar i Långåsen-
och Hummaus Kalkhult och Backa uti Kärksviks socken av Skönsborgs län.

längd sträcka	längd m.	hög m.	bred m.	arbeten	hög m.	ä kr.	Kostnad	Slutsumma
1/2 riket litt. a.					S.L. 1:1			
0	1.20	0.30	2.70					
-1	100	1.50	1.80	masssten	220 164	0.50	110 82	-
				grus	5	0.80	4	-
-31	40	1.50	1.80	masssten	110 63	0.50	55 31	50
-2	600	1.70	2.00	"	180 106	"	90 53	-
-3	100	1.85	2.15	"	370 212	"	185 106	-
-4	100	1.65	1.95	"	360 207	"	180 103	50
-44	60	1.65	1.95	"	200 112	"	100 56	-
-5	40	1.65	1.95	"	130 74	"	65 37	-
-57	27	1.50	1.80	"	80 46	"	40 23	-
-6	73	1.60	1.90	"	210 120	"	105 61	-
-38	36	1.75	2.05	"	120 69	"	60 34	50
-7	64	1.70	2.00	"	220 129	"	110 64	50
-8	100	1.80	2.10	"	350 206	"	175 103	-
-d	50	1.65	1.95	"	180 101	"	90 50	50
-c	50	1.60	1.90	"	150 69	"	75 34	50
				grus o. sten	5	0.80	4	-
-9	20	1.55	1.85	masssten	58 45	0.50	29 22	50
				grus o. sten	2	0.80	1	60
-52	75	1.60	1.90	masssten	220 152	0.50	110 76	-
-10	25	1.50	1.80	"	70 50	"	35 25	-
-11	100	1.25	1.65	"	250 145	"	125 72	50
-12	100	1.85	2.15	"	310 180	"	155 90	-
-46	50	1.30	1.60	"	150 88	"	75 44	-
-13	50	1.70	2.00	"	130 106	"	65 52	50
				grus	10	0.80	8	80
-a	63	1.10	1.40	masssten	150 138	0.50	75 69	-
				grus	10	0.80	8	40
1363				Tept			1320 30 2137 10	

Lägn stadska o. nr.	Längd m.	Öpp m.	Inda botten dagur m.	Arbete	Kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
1363				tept.			2137 10 1920 30	
-14	37	1.80	0.30	3.90 masstorn	1:1	90 60 0.50	45 30 -	
				grus		54 290 0.80	4 3 20	
-15	100	1.35	3.8 7.65	masstorn		167 0.50	145 80 50	
				grus		10 4 0.80	8 7 20	
-19	77	1.50	0.30 3.90 4.60 3.60 4.80	masstorn	1:15	150 166 0.50	90 83 -	
				sand.		6 0.60	3 60	
-16	23	1.40	4.50 3.40	masstorn		57 70 0.50	25 20 -	
				sand		35 29 0.60	21 17 40	
-17	100	1.30	4.20 3.20	masstorn		110 176 0.50	55 89 -	
				sand		210 86 0.60	126 51 60	
-6	68	0.90	3.00 2.10	masstorn		140 120 0.50	70 60 -	
				sand.		10 0.60	6 -	
Summa Kostnad							2735 70 1741 80 274 30 177 20	3010
Liuäggs 107. tie förstärkt								
Summa Kostnad 1949								
2½ direkt lita. b.								
19.		1.50	0.30	3.20				
-20	100	1.70	2.00	masstorn		227 0.50	113 50	
				grus o. sten		6 0.80	4 80	
-48	50	1.80	2.10	masstorn		103 0.50	51 50	
-21	50	1.20	1.50	"		81	40 50	
-22	100	1.60	1.90	"		142	71 -	
-23	100	1.80	2.10	"		196	98 -	
-50	100	1.80	2.10	"		108	54 -	
-24	50	1.90	2.20	"		114	57 -	
-25	100	1.80	2.10	"		227	113 50	
-26	100	1.80	2.10	"		216	108 -	
-27	100	1.80	2.10	"		216	108 -	
800.				tept			819 80	

längd sträcka m.	längd längd m.	hög hög m.	längd längd m.	längd längd m.	längd längd m.	arbets	tab.	ä	Kostnad	Summa
800						tekt.			819 80	
-45	54	1.75	0.30	2.05		massstora	114	0.50	57 -	
-28	46	1.80	"	2.10		"	97	"	48 50	
-29	100	1.70	"	3.70		"	275	"	137 50	
						grus	3	0.80	2 40	
-30	100	1.60	"	3.50		massstora	300	0.50	150 -	
						grus	22	0.80	17 60	
-31	100	1.50	"	1.80		massstora	229	0.50	113 50	
						grus	4	0.81	3 20	
1200									Sum 1349 50	
						tieläggis 10% tie förläggis			135 50	
						Summa Kostnad			1485 -	
						3) diket lica. c.				
44		1.65	0.30	1.95						
-45	127	1.75	"	2.05		massstora	269	0.50	134 50	
						tieläggis 10% tie förläggis			13 50	
						Summa Kostnad			148 -	
						4) diket lica. d.				
4		1.65	0.30	1.95						
-32	100	1.65	"	1.95		massstora	186	0.50	93 -	
-33	100	1.80	"	2.10		"	201	"	100 50	
-34	100	1.50	"	1.80		"	187	"	93 50	
-35	50	1.05	"	1.25		"	62	"	31 -	
350									Sum 318 -	
						tieläggis 10% tie förläggis			32 -	
						Summa Kostnad			350 -	
						5) diket lica. e				
36		1.50	0.30	3.30						
-33	60	1.80	"	2.10		massstora	120	0.50	60 -	
						grus o. sten	25	1	25 -	
60									134 -	
						tekt.			81	

längd sträcka m.	längd m.	djup m.	bredd m.	längd m.	arbete	helt m.	å kr.	Kostnad	Summa
	60				lyst.			⁸⁵ 157	-
-37	100	1.50	0.30	3.20	mosstorn	236	0.50	118	-
					gus o. stin	7	1	7	-
						8a		²¹⁰ 269	-
								26	-
	160				tiwägges 107. tiw fönstäcker			26	-
					Summa Kostnad				230
									285 -
					6) diket lita. f.				
41		1.65	0.30	1.95					
-42	100	1.65	.	1.95	mosstorn	186	0.50	93	-
-43	100	1.65	.	1.95	.	186	.	93	-
-44	80	1.65	.	1.95	.	149	.	74 50	-
						8a		260 50	-
	280				tiwägges 107. tiw fönstäcker			25 50	-
					Summa Kostnad				286 -
					7) diket lita. g.				
38		1.75	0.30	^{3.81} 2.05		1:1			
-39	100	1.75	.	^{3.81} 2.05	mosstorn	360	0.50	180	-
						206		103	-
-40	100	1.50	.	^{3.30} 1.80	.	320		160	-
						182		91	-
						8a		³⁴⁰ 194	-
	200				tiwägges 107. tiw fönstäcker			25	-
					Summa Kostnad				375
									213 -
					8) diket lita. h.				
25		1.80	0.30	2.10					
-55	100	1.75	.	2.05	mosstorn	211	0.50	105 50	-
-56	100	1.50	.	1.80	.	182	.	91	-
-57	50	1.50	.	1.80	.	79	.	39 50	-
						8a		236	-
	250				tiwägges 107. tiw fönstäcker			24	-
					Summa Kostnad				260 -

längd sträcka m.	längd djup m.	längd djup m.	längd djup m.	längd djup m.	arbets	kr.	kr.	Kostnad	Summa
9) direkt litt. i									
25-		1.80	0.30	2.10					
-54	+6	1.80	.	2.10	massstora	99	0.50	49 50	
-53	100-	1.40	"	1.70	"	178.	"	89 -	
-8	100-	1.80	"	2.10	"	178.	"	89 -	
								8- 227 50	
246					tilläggs 10% till försläande			22 50	
					Summa Kostnad				250 -
10) direkt litt. k.									
50.		1.80	0.30	2.10					
-51	100-	1.60	"	1.90	massstora	196.	0.50	98 -	
-52	60.	1.60	"	1.90	"	106.	"	53 -	
								8- 151 -	
160					tilläggs 10% till försläande			15 -	
					Summa Kostnad				166 -
11) direkt litt. l.									
22		1.60	0.30	1.90					
-49	108-	1.40	"	1.70	massstora	171	0.50	85 50	
-11	100-	1.35	"	1.65	"	126.	"	68 -	
								8- 153 50	
208-					tilläggs 10% till försläande			15 50	
					Summa Kostnad				169 -
12) direkt litt. m.									
48		1.80	0.30	2.10					
-47	115-	1.80	.	2.10	massstora	248.	0.50	124 -	
-46	100-	1.30	"	1.60	"	170.	"	85 -	
								8- 209 -	
215					tilläggs 10% till försläande			21 -	
					Summa Kostnad				230 -

[illegible]

längd sträcka o. nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	dag m.	arbete	kub. m.	ä. kr.	kostnad	Summa
	830				Tryst. tilläggs 107. till försläande			979 75 ~~784 35~~ 1,00 2-	
					Summa kostnad			78 45	1080 -
					15% direkt litt. a'				863 -
61		1.25	0.30	4.35 ~~3.60~~		1.15			
-73	80	1.00	.	3.60 ~~4.60~~	massstorr o. sand	2.10 ~~1.57~~	0.60	126 ~~94~~ 20	
					tilläggs 107. till försläande			14 ~~9~~ 80	140
					Summa kostnad				104 -
					16% av förädlingskostnaden				
					5 dagar 4.50 - 22.50 karta med uträkning 41.53 hvar ä 0.40 16.61,- profilen med kostnadsförslag 6676 m. ä 0.007 46.69				85 78
					Sammandrag				
1768					1% direkt litt a			3010 ~~1949~~	-
1200					2% " " b			1485	-
137					3% " " c			148	-
250					4% " " d			350	-
160					5% " " e			230 ~~285~~	-
280					6% " " f			286	-
200					7% " " g			375 ~~213~~	-
250					8% " " h			~~260~~	-
246					9% " " i			250	-
160					10% " " k			166	-
208					11% " " l			169	-
215					12% " " m			230	-
582					13% " " n			775	-
830					14% " " o			1080 ~~863~~	-
6587					Tryst.			4429 ~~8554~~	-

		Kostnad	Summa
6587	trykt	8554	
80	15% diktat litt. a'	7429	
		140	
6667		104	8694.
		~~7533~~	
	16% av förrättningskostnaden		8578
	Totalsumma Kostnad		761878

Bånersborg den 22 Mars 1914
 Per Erik Karlsson

Vidimeras ex officio:

anskrift

Boresenfeldt

Summa kostnad, 8694 kr., minskad, sedan å priserna synes vara höga
 med c:a 20 % till 7000 kronor

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för ordningsarbetet

kr 7000 -

förslaget upprättande

130 78

Summa

7130 78

och äga intressenterna rätt att förstå att utslutet diktat till kr
 och att minskad kostnaden till sträckan 19-kr av diktat a och
 diktat O' till 9,30 m. Stockholm den 2 September 1914.

Harry Lennander.

ef. Byråingenjör.

Vidimeras ex officio:

Boresenfeldt

Skrift.

Kostnadsfördelning för avskrivning av fastspredande mossar tillhörande
hemmanen Källhult och Barkabo i Hålsjö socken av Åkersborgs län.

Hemman och ägarers namn	Åkerssträcka	Åkers littera börsta	%	Kostnad	Summa
<u>Källhult Yttre</u>	38 - 6	a		1180 30	
<u>F. V. Larsson</u>	1/2 av 38 - 44	a		77 75	
	9 - 45	b		876 80	
	1/2 av 45 - 28	b		24 25	
	1/2 av diket	c		67 25	
	hela diket	h		236 -	
	" "	i		227 50	
	" "	k		151 -	
	" "	l		153 50	
	" "	m		209 -	
	" "	n		704 50	
	" "	o		784 55	
	" "	a'		94 20	
				4786 60	
<u>Källhult</u>	Samt 10% tillägg		69 17	479 40	5266 -
<u>Barkabo Jöns</u>	1/2 av	Summa		-	5266 -
<u>Pålsson</u>	1/2 av 0 - 44	a		218 -	
	1/2 av 45 - 28	b		24 25	
	28 - 31	b		424 20	
	halva diket	c		67 25	
				733 70	
	Samt 10% tillägg			73 30	
		Summa	107 17	-	807 -
<u>Barkabo Au.</u>	1/2 av 0 - 38	a		295 75	
<u>Orrs Salomonsson</u>	hela diket	d		318 -	
	" "	e		259 -	
	" "	f		260 50	
	" "	g		194 -	
				1327 25	
	Samt 10% tillägg			132 75	
<u>Källhult</u>		Summa	1958 7	-	1460 -
<u>Barkabo</u>					7533 -

Redimans affär
Barkabo

Barkabo den 22 mars 1912.

Börj Emil Kildström.

Protokoll fört vid sammanträde rörande avdikning av frestspridande messar tillhörande hemmanen Källhult Yttre och Backabo uti Näsaviks socken av Kinds härad av Älvsbergs län.

År 1912, den 28 mars, inställde sig undertecknad vid Källhult, klockan 9,30 f.m. och antecknades därefter som följer.

§1.

Närvarande vare utom undertecknad, F.W. Larssen samt Jöns Pålsson i Källhult och Anders Salemnssen i Backabo.

§2.

Förrättningsmannen överlämnade ritningar med kostnadsförslag för denna avdiknings verkställande och intressenterna medförde och avlämnade förbindelse från grannarne i Messabo, Påvarp och Fröstenshult, att dessa intet hade att erinra mot den föreslagna dikningens utförande.

§3.

Härefter enades intressenterna om bilagde förening, vilken av dem genast underskrevs.

§4.

Att justera detta protokoll utsågs Jöns Pålsson i Källhult och Anders Salemnssen i Backabo, varefter sedan arvedesräkning överlämnats sammanträdet förklarades avslutat.

Källhult Yttre den 28 mars 1912

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Justerat:

Jöns Paulsson

Anders Salemnssen

Hidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade överenskomma härmed om följande rörande avvikning av frestspridande messar tillhörande hemmanen Källhult Uttre och Backabo uti Håcksviks socken av Älvsbergs län.

1:o) Vi godkänna den av förrättningsmannen, lantbruksingeniör Hildebrand, upprättade plankartan över dessa messar samt från densamma uträknade arealen.

2:o) Vi godkänna det av samme förrättningsman upprättade förslaget till avvikningen och förbinda oss att, vid arbetets utförande, densamma noggrant följa.

3:o) Vi godkänna den av lantbruksingeniör Hildebrand upprättade kostnadsfördelningen.

4:o) Var och en av oss svarar för arbetets utförande inom egna äger samt i gränslinier enligt förslagets kostnadsfördelning.

5:o)

5:o) Hela dikningsarbetet skall vara färdigt fullbordat inom fyra år efter sedan anslag utan återbetalningsskyldighet till dess utförande beviljats.

6:o) Vi överenskomma, att till detta arbetes utförande söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel; och utse vi Jöns Pålsson i Källhult och Anders Salemnsson i Backabo att å våra vägnar ingå med sådan ansöknings samt befullmäktiga vi även samma personer att de beviljade statsmedeln å alla våra vägnar lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta.

7:o) den uppkastade dikesfjorden får ej läggas närmare de nygrävda dikenens kanter än 0.50 m.

Vi förbinda oss att, vid behov, de uppgrävda diken ränna och underhålla, var inom sitt område.

8:e) Förrättningskostnaden delas oss emellan enligt kostnadsfördelningens procentlängd.

Sålunda överenskommet bekräfta vi med våra egenhändiga namnteckningar. Källhult den 28 mars 1912.

Anders Salemensson Jöns Paulsen F.W. Larssen.

Ovanstående egenhändiga namnteckningar intygas

ex officio:

Bror Emil Hildebrand,

Utdieneras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma
med Håcksviks församling i sockenstugan tors-
dagen den 21 mars 1912.

§ 6.

Sedan Ägarne till hemmanen Andlarp, Ekedal, Skyarp, Backabo och
Yttre Källhult inom denna socken hit anmält, att de ärnade av-
dika dem tillhörande frostspridande marker samt att de för detta
ändamål även ärnade i underdånighet söka erhålla anslag utan
återbetalningsskyldighet av statsmedel, beslöt stämman såsom sin
åsikt uttala, att dessa avdikningsföretag vore till stor nytta
för orten genom frostländighetens minskande.

Är och dag som ovan

B.V.Johansson.

Justerat:

H.Andén.

J.B.Johansson.

Uppläst i Håcksviks kyrka söndagen den 25 mars 1912 av:

A.F.Löfman.

Rätt utdraget betygar:

B.N.Johansson.

Stäm.Ordf.

Vidimeras ex officio:

Bernhard Lindstrand

Undertecknade ägare till hemmanen Mossebo, Fröstenshult och På-
varp uti Häcksviks socken av Älvsborgs län förklara härmed, att
vi intet hava att erinra mot att ägarne till Backabo och Käll-
hult uti samma socken avdika dem tillhöriga mossar enligt av
lantbruksingeniör Hildebrand detta år upgjort förslag, därvid en
del diken äro lagda uti gränslinierna mot våra hemman och att
sjön Tolens vattentya något sänkes, försäkras,
Källhult den 21 mars 1912.

Karl Hansson, Mossebo.

L. J. Mårtensson, Påvarp.


E. A. Hanzén, Fröstenshult.

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:

L. G. Andersson, Landboarp.

S. Andersson, Landboarp.

Vidimeras ex officio:

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read "Brothman". The signature is written in a cursive, flowing style with a prominent vertical stroke at the end.

Godkänt den 30 oktober 1922

117/14

Boris

3-902

14609

Antagna 1922

Landbruksstyrelsen

nr 6 OKT 1922

öfver verkställd afgräning af vattenafgräning och afdik-
ningsarbete enligt förordnande af Kongl. Landbruks-
styrelsen den 15 februari 1922 angående det företag, som afser
afdikning af fastförände marker till Källhult och
Bäckabo i Hålsjöviks socken, Malmö län.

Planen fastställd den 19 juni 1914

Statsunderstödd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1914 är an-
slag 3560-kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 augusti 1915

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1919; förlängd till den 1/7 1922

Öfver af understödenad den 29 september 1922

verkställd afgräning af öfver angifna arbete har det-
samma befunnits utförd i öfverensstämmelse med
den slutligen fastställda arbetsplanen, därför fö-
retaget i dess helhet förordas till god-
kännande.

Källhult den 29 september 1922

Marsson
Landbruksingenjör



P. M.

D. N:o
17952

för utbetalande av statsbidrag

.21

Företag: Utd. av festspr. marker, lindh.
hem: en Källrud av Backebo i Flaksjö
N: av Älsborgs län

Arb. plan: 19 juni 1914

Kontrakt: 18 aug. 1915

Börjas:

Fullbordas: 1 juli 1922

Statsbidrag: 3.560. —

Län.

Beräkn. kostn.: 7.130:78 ✓


Uttag av statsbidrag: 2.450 ✓ av län.

Utfört arbete enligt Carlson den 17/12 1921
6630:78 kr. = ~ 93%

0.94 · 3560 = 3350
2450
900

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 900 kr.
län kr.

Stockholm den 11/1 1922



117 / 14

5-90 17952

Inform. HCC

H. Landbruksstyrelsen

21 DEC. 1921

B E V I S

Över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1921 angående det företag, som avser utdikning av frostspridande marker, tillhörande hemmanen Källhult och Backabo i Håksviks socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 19 juni 1914.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1914 års anslag 3.560:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 augusti 1915.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1919.

Förlängd arbetstid till den 1 juli 1922.

Vid av undertecknad den 17 december 1921 verkställd besiktning av arbetena för nämnda företag befunnos samtliga diken uppgrävda, men förefunnos här och var i botten och slänter utskjutande stenar och stubbar, dikesjorden låg på vissa sträckor för nära dikeskanterna och saknade genomstick för dagvattnet, och ett par dikessträckor voro så deformerade att en restauration syntes nödvändig.

Kostnaden för dessa bristers avhjälpande skattades till 500:- kronor.

Halmstad den 19 december 1921.

W. Carlsson
ens lantbruksingeniör.

Statens lantbruksingeniör.



P. M.

D. N:o $\frac{14677}{20}$

för utbekommande av statsbidrag

Titel: utd. av frostspridande marker, liuh.
hem: en Kålhult och Backabo i Hälsnings
av Ålvsborgs län

Arb. plan: 19 juni 1914

Kontrakt: 18 aug. 1915

Börjas:

Fullbordas: 1 juli 1922

Anslag: 3.560:-

Län:

Beräkn. kostn.: 7.130:78

Uttag: 1.650:-

Utfört arbete enligt Carlson den 16/12 1920

4080:78 kr. = ~ 57%

$$\begin{array}{r} 0.68 \cdot 3560 = 2450 \\ 1650 \\ \hline 800:- \end{array}$$

Tillstyrkes till utbetalning län _____ kr.
anslag 800:- kr.

Stockholm den 7/1 1921

[Signature]

den 22 DEC. 1920.

Vid denna dag verkställd besiktning af
arbetena för utdickning af fastspändarna
tillhörande hemmanen Källhult och Backa
bo i Håstasviks socken, Älsborgs län, för
hvilket förtogs Kungl. Majt den 19 juni 1914.
fastställt plan, befunnos nedanstående dispo-
sitioner uppräpade sedan besiktningstillfället
år 1916, nämligen

Af diket B. str. 24-25

" " " " 45-28

" C

" " g " 38-39

" R

" L

Kostnad enligt förslaget
ställdes besiktning.

Per: 113.50

" 48.50

" 134.50

" 180 -

" 151 -

" 153.50

781 -

För iförntredde fall m.m. tillagt 20%

79 -

Kronor 860.-

Vid arbetoplans fastställande
har kostnaden nedprutats med 20% = kr 160.

Samma fastställd kostnad. kronor: 700 -

För
Källhult den 16 december 1920

+ eult. bet. den 20/12 1916

3 380.78

4 080.78

P. Karlsson
Länns landbruksingenjör.



12/55/16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: ^{apn.} ~~utred af förförslaget~~, Län. hem^{te} Kostnads
och Beräkning: Hållnings^{te} af
Län.

Arb. plan: 19/6. 14.

Kontrakt: 18/8. 15.

Börjas: -

Fullbordas: 1/7. 19.

Anslag: 3.560.-

Län: -

Beräkn. kostn.: 7.130.78.

Uttag: 850.-

Utfört arbete enligt Caran 20/12. 16 - 3.380.78 kr. ~ 27%.

$\frac{47.3560}{100} - 850 = \sim 800 -$

Tillstyrkes till utbetalning 800. — kr.

Stockholm den 1 febr. 1917.
P. M.



4419.
D. 200
H. Landbruksstyrelsen
den 29 APR. 1915

I n t y g.

På begäran får jag härmed intyga, att vid det frostdikningsarbet vid hemmanen K ä l l h u l t Y t t r e och B a c k a b o uti Häcksviks socken av Älvsborgs län, till vilket Kungl. Majt. genom nädigt brev den 19 juni 1914 anvisat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av 3560,00 kronor, är färdiggrävt hela diket litt. "a" enligt det första förslaget, samt att arbete för närvarande pågår med breddning av detta dike enligt den fastställda planen. Jag anser mig därför kunna tillstyrka, att till sökanden nu genast må av det beviljade anslaget utbetalas 1000,00 kronor.
Vänersborg den 25 april 1915.

Bror E. Hildebrand

850.-

D. 920

4419.

H. Landbruksstyrelsen

den 29 APR. 1915

Till arbetsledare vid utdikning af frostspridande marker tillhörande hemmanen Källhult och Backabo i Håcksviks socken af Älfsborgs län utsågs Jöns Paulsson i Källhult, som åtog sig detta uppdrag.
