Akt nr:

R-E1a-0175

AU$R-E1a-0175

D.-N:o 13373
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 AUG. 1924

196 161.9

R 1*0175

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 oktober 1923 för uppgrävning av den s.k. Valstadsbäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker, tillhörande Gärdagården och Valstads kyrkoherdeboställe i Valstads socken samt Backgården, Storegården, Hångsdala kyrkoherdeboställe och Kullagården i Hångsdala socken av

SKARABORGS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg den 24 juli 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tvåtusenåttahundratrettio/2.830/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med niohundrafyrtio/940/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, ha de undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 9 maj 1914 och den 27 juni 1924, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälla alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1928 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Folkabo den 30 juni 1924

Sanfrid Gustafsson Gottfrid Ljungman

Vilas Johansson

Att Sanfrid Gustafsson, Gottfrid Ljungman och Vilas Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Knut Ohlsson G Dahlgren

Adress: Folkabo Adress: Folkabo

Med stöd av Kungl. brevet den 20 oktober 1923 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 oktober ***19*** 24.

Gustaf Gustafsson Albert Smith

föredragande

Avskrift R 1:0175 1140/23

R 1:0175

D:no 11982

Tillkom hos Kungl. Lantbruks-
styrelsen den 27 juli 1922

Komb 196/1923

10.

Betänkande

angående upprättning av den s.k.

Hvalstadobäcken

i ändamål att tarrläggs vattenskadade
marker tillhörande Gädeqården, Backegården
m.fl. hemman uti Hvalstads och Klöngs-
dala socknar Vartofta härad och Skaraborgs
län; avgivet för statsbidrags sökande år 1917
av Gustaf Sjöberg, Statens lantbruksingeniör

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 20 oktober
1922 fastställd lag efterrättelse vid arbetets
utförande med tillägg dels att intressenterna
skola ombygga den i företaget ingående bygd-
evägsbron i enlighet med av tillförord-
nade distriktsingeniör G. Berg i mars
1919 till brobyggnaden ifrågavarande upprättad rit-
ning dels att erforderliga arbeten inom
Tidaholm-Vartofta järnvägs område skola
på intressenternas bekostnad utföras på
sätt som med hänsyn till trafiksäkerheten
föreskrives, av vederbörande banchef dels
och att ecklesiastika boställets Klöngsdala
prästgård ej skall äga rätt till delaktig-

rat i beviljade läne- och bidragsbelopp.

Stockholm den 16 november 1925
på Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Lenitz

Betänkande

angående beslutad uppgrävning av Kvalstad-
bäcken i och för torrläggning av vattensjuka
marker inom Hemmanen Gårdsgården, Backgården, Namn
Storegården m fl uti Kvalstad och Kängstorp, sock-
nar av Vartofta härad och Skaraborgs län, avgivet
för sökande av bidrag och lån av statsmedel
år 1917.

Ifrågavarande marker äro belägna strax Läge
väster om Kvalstads kyrka. I övrigt hän-
visas angående läget till bilagde över-
siktskarta, där avdikningsområdet är inlagt
med gul färg.

Företaget avser att genom förbättring Ändamål
och utvidgning av den s. k. Kvalstadsbäcken
möjliggöra en effektiv torrläggning av här-
varande vattenskadade marker genom
täckdikning.

Då intressenterna i företaget ej kun- Läge syne
de enas om avdikningens utförande- förrättningen

begärdes lagd syn, vilken underteckned å Konungens Befallningshavande förordnade / se synehandlingarne Bilaga Litt A / av den 25 november 1912 handlade och avslutade vid sammanträde hos Sten Hammarberg å Gårdsgården i Tollabo den 9 maj 1914.

Avskrift av de vid synneförrättningen upprättade handlingarne jämte 1 blad ritningar bifogas / Bilaga Litt A /

Missnöje mot förrättningen har ej, såsom av närslutna diarieblad / Bilagan Litt B / framgår, anmälts, varför angående arbetets utförande m.m. skall vid synemännens utlåtande bero.

Arealen

Den å plankarten upplagna markens areal utgår enligt den vid lagd synneförrättningen upprättade arealförteckningen och jordtaxeringslängden / Jag 18-24 / 14 har 22 ar, varav 22 har 92 ar åker med förbättringsvärde, 15 har 16 ar förbättringsvärderad äng samt 8 har 14 ar impediment eller jord, som av synemännen ej ansetts draga någon nytta av förrättningen.

Jordmånen

Jordmånen är å området lägre delar av dyartad beskaffenhet och utgöres i övrigt av lermylla, alltid på botten av något stenbunden lera. Jordmånen lämpar sig väl för odling av vilka som helst av våra allmänna åkerbruksväxter.

Vattenavledningen

För att ernå det åsyftade ändamålet med avdikningen

är nödvändigt att de nu befintliga avloppet regleras och given sådana dimensioner som i det upprättade förslaget äro föreskrivna.

Detta avlopp är i avdikningsområdet betecknat med A-B-C-D-E

Vattensamlingsområde m. m.

Vattnet måste kunna avföras på ett nederbördsområde på ungefär 1000 har, vilket med för trakten kända nederbördsförhållanden motsvarar en avrinningsmängd av högst 0.8 kubikmeter i sekunden.

Diktets bottenbredd har föreslagits till 0.5 meter och dess sidolutning till 1:1.25. Minsta bottenlutningen förekommer i diktets nedersta del och utgör 0.85:1000.

Med användande av Gangaiellet och Kutters formel för beräknandet av vattnets framströmningshastighet, kommer den blivande vattenhöjden i denna del av diket att överstiga 0.85 meter.

Vid nämnda vattendjup skulle diket nämligen kunna avföra 0.82 sm³.

Där, såsom vid stentrummor, sidomurarne göras lodräta, får bottenbredden ej göras mindre än 1.55 meter.

Djupet i diket har bestämts för en effektiv torrläggning av sökanden tillhörig mark.

Vid avdikningsföretagets utarbetande har jag funnit,

att för torrläggning av den sökandens tillhöriga marken, diket endast skulle behöva upptagas till i förslaget angivna punkten B.

Då emellertid en sådan reglering av bäcken ej skulle medföra avsevärd fördel för större delen av invid densamma belägna marker, ha sysemännen i enlighet med den mellan flera av intressenterna ingångna föreningen bestämt en reglering av vattendraget å hela sträckan A–E.

Dikets dimensioner äro förövrigt i meternått angivna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskilt häröver upprättade specifikationen över grävningsarbetena i pos 29–30 ||.

Brobyggnader

Över de i förslaget ingående brobyggnaderna äro ritningar upprättade.

Å dikessträckan A–B erfordras fördjupning av landsvägsbron vid 2+55 enligt förslagsritning samt byggande av en ägovägsbro vid 6 enligt ritning.

Järnvägstrummorna vid 11+80 utgöras av dubbeltrummor med vardera hållande 1 meters vattenöppning. Dessa trummor hålla tillräckligt djup.

Tillstånd från det allmänna, sida erfordras för ändringsarbeten å allmänna vägbron vid 2+55.

Kostnaden för vattenavledningen

Den beräknade kostnaden för avdikningens åstadkommande med bro-byggnader och järdläsen framgår av den specificerade kostnadsberäkningen, som finnes å sid 26-27 i specialbeskrivningarne.

Ett sammandrag därav vore följande

Kostnadsberäkning

Längd	Arbete jordmån m.m.	Antal	á kostnad	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
	Kanalen A-B-C-D-E						
	Kanalsträckan A-B						
	Sprängning o schaktning av berg och sten	55	10.-	550	00		
	Schaktning av dy och stenbunden lera	610	0.80	488	00		
	Fördjupning av vägbron vid 2+55			100	00		← se nedan
	Byggnad av ägovägsbro vid C enl ritning			75	00		
	För oförutsedda fall, arbetstillägg m.m. tillägges ca 10% av föregående summor			158	00		
	Fardersättningar enl fardersättningslängder						
620	längden			64	00	1430	00

						1230	00
Transport							
Kanalsträckan B-6-0-E							
	Schaktning av dy ö lera med ringat sten	1660	080	1328	00		
	Schaktning av dy ö lera med mycket sten	300	1 00	300	00		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% av förestående summor			247	40		
860	Fördelsättningar enl fördelsättningslängden			124	60	2000	00
			Kronor			3230	00
	Kostnaden för lagd syne förrättningen					337	12
				Summa Kronor		3567	12
Tillkommer för ökade kostnader för ombyggnad av bron vid 2+55						285	00
				Summa		3852	12

3852 12

Betänkande 83.43

Den jordförbättring, som genom avdikningen skulle ernås, är av synemännen uppskattad i se synehandling dag 18–24/ till 8102 Kronor vilket motsvarar ett ökat jordvärde av ca 225 Kronor pr har

3955 55

Tillägges omk. 40% av arbetskattningen 1335 00

5270:55

Jämföres den uppskattade jordförbättringen med förestående kostnad för dess ernående så finner man, att värdet med den första överskjuter den senare med Kronor 1534,88 vilka tillsammans utgöra vinsten av företaget, eller med andra ord, de beräknade kostnaderna utgöra 44% av det uppskattade jordförbättringsvärdet.

Av syneprotokollets bilaga Kit 2 framgår, att de flesta intressenterna

i förslaget genom förening överens-
kommit / en av intressenterna har
i särskild skrivelse biträtt förening-
en Bil litt C / om förslagets utförande
och att därtill söka bidrag av statsmedel.

Sökandenas andelar i gemensamma kostnader m. m.

Genom utdrag från lagfarna äganderätts-
handlingarna äro i efterstående ta-
bell sammanförda de respektive
sökandenas andelar i det föreliggande
förslaget

Tabell I

	Kännetecken å kartan	Sockenen, byn eller fastighetens namn	Jordägarens eller innehavarens namn	Areal: åker	Areal: äng och odlingsbar mark	Areal: skogbevuxen mark	Bärkraftiga utgifter	Bärkraftiga inkomster	Driftsgemenskapsavgift för vattenavledningsföretaget		Bidrag	Kanal
									Kr	öre	Kr	Kr
		Hvalstad 1:6										
A		Hvalstads prästgård	(K A Dahlgren)	15.16	2.43	3.06	9204.50	5311.50	3893 -	1327	-	161 99
B		Gårdsfl	4 3/4 J Hammenberg	0.85	1.58	-	1228 -	639 -	589	353	-	24 50
		Hängsdala 1:4										
C		~~Jordtjänen~~	~~J Johansson~~									
			(Bil litt C)									
D		Störegfl	5/16 Albert Åsberg		3.09	-	1071 -	618	453	181	-	18 85
E		Backafl	1/4 Clas Johansson	4.08	-	-	1905.	816	1089	435	-	45 30
			Summa	20.09	7.10	3.06			6024	3444	47	250 64

		8345	3778 54
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:			
för vattenavledningen	5270 Kronor	55 öre	
för odling och tegdikning	1046 "	- "	
Summa	6316 Kronor	55 öre	

	944 60	2833 94

varav sökandenas vattenavledningskostnad
3.778 kronor 54 öre

Stockholm den 16 november 1923

På Kungl Lantbruksstyrelsens
vägnar

Albert Smith

Av förestående tabell framgår att sökandenas

andel av den i förslaget ingående och förbättrade marken utgår 19 har 87 ar åker och 11 har 76 ar äng och odlingsmark

Sökandenas andelar i kostnaderna utgöra:

Arbetskostnader	~~2794.—~~
Syneförrättningskostnader	~~285.—~~ 298.81
Kostnader för kartor och handlingar m.m. för sökande av bidrag och lån av statsmedel	83.43
Sammanlagda kostnader till vilka bidrag och lån sökas utgöras av kronor	~~3175.99~~
	~~3460.99~~

Av samma tabell synes att jordförbättringen å sökandenas marker skulle uppgå till 7174.50 kronor jämföres denna summa med ovan angivna kostnader, finner man, att de senare utgöra 44.5 % av den förra. Sålunda ett fördelaktigt ekonomiskt resultat.

Odlingsmark

Enligt tabell I innehava sökandena 11 har 76 ar oodlad mark. Denna utgöres av lättare lerjord av ungefär enahanda beskaffenhet som förutvarande åkerjord. Där en del av odlingsmarken ock är något stenbunden, bär den särskiljas så till, att denna något steniga odlingsmark drager en högre odlingskostnad. Till uppodling får jag sålunda föreslå ägofigurerna N:r 24. 92 ~~44 45 46 47~~ 134 och 135 tillsammans 5.74 har, som bär kunna upptagas

får c:a 100 kr pr har, ~~Uppodlingen av dessa marker~~ dessutom ägofigurerna N:r 17, 18, 19, 20, 21, 93, 94, ~~114 119 120~~ 133 och 136, tillsammans 3.36 har, och som draga en odlingskostnad av c:a 200 kronor pr har.

Uppodlingen av dessa marker skulle efter den angivna odlingskostnaden pr har komma att gå till omkring 1700 kronor. Denna ökade kostnad skulle ej inverka till nackdel på fäbolagets ekonomiska utbyte, ty äng och odlingsmark, som åvalts ett blivande värde av 400 kronor/odlingskostnad 1700 kr/ skulle efter uppodlingen i likhet med gammal åkerjord av samma beskaffenhet få ett värde av 500 kr pr har. Liknande blir förhållandet med äng eller odlingsmark, som åvalts ett blivande värde av 300 kronor med 200 kronors odlingskostnad. Efter uppodlingen kostar jorden tillsammans 500 kronor, vilket även här är värdet å jämbördig förutvarande åkerjord.

Tegdikning

Förutom detta huvudavlopp kräves visserligen att för markens fullständiga torrläggning de befintliga tegdikena fördjupas eller ännu bättre att marken täckdikas, men denna åtgärd må liksom jordens brukning ej uppställas såsom tvång, utan överlämnas åt jordägarens egen försiktighet.

Eftersom laga syneförrättningen redan vunnit laga kraft, samt tillstånd från det allmännas sida vunnits i Bil Lit D:s och Skara Domkapitel i bilaga till E samt i synehandlingarne sub II godkänt de gjorda överenskommelserna om företagets utförande kan något lagligt hinder ej föreligga eller uppstå mot företagets utförande. Hinder mot företaget

Vad själva utförandet angår, hänvisas till det vid syneförrättningen upprättade förslaget samt till de därvid i syneinstansens ~~protokoll~~ utlåtande gjorda bestämmelserna. Utförande

I något liknande företag understött med statsmedel har ej någon till detta företag härande mark ingått, men samtidigt med detta har av undertecknad upprättats förslag till vattenavledning å ett intill liggande område näml. igen "Grunnsvad Ulastergården m.fl. i Hvalstads och Sunbo socknar" till vilket företags utförande man har för avsikt att söka bidrag av statsmedel. Liknande företag.

Då företaget utan tvivel kommer att medföra stora ekonomiska fördelar för samtliga intressenterna däri, vill jag på det livligaste förorda, att sökandenes ansökan bifalles på så sätt, att 1/3 av de beräknade kostnaderna för vattenavledningens utförande m.m. lämnas Tillstyrkande

dem från allmänna dikningsanslaget och återstående delen såsom lån ur odlingslånefonden.

Arbetsplan

På grund av förslagets mindre omfång anser jag att arbetena bör medhinnas på ett år.

Tabell II

	Hela avdikningsområdet				Sökandens andel			
	Areal		värde		Areal		värde	
	har	ar	kr	öre	har	ar	kr	öre
I sitt nuvarande skick:								
Åker som kommer att förbättras	23	14	7189	50	20	09	6122	50
Äng och odlingsmark annan jord	13	16	2406	50	7	10	2126	50
Summa	36	30	9596	00	27	19	8249	00
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma områdes tal:								
Åker, förbättrad genom torrläggningen	23	14	12850	00	20	09	11092	00
" jämte äng o odlingsmark	7	10	4331	50	7	10	4331	50
Äng, förbättrad genom torrläggningen	6	06	574	50				
annan jord								
Summa	36	30	17698	00	27	19	15423	50
I bästa uppt. ej förb. mark	7	92			7	61		
Totalsumma	44	22			34	80		

Skövde den 24 juli 1922

Gustaf Sjöberg
statens kulturtekniker

Rätt avskrivet, bekräftar
Emil Nilsson
Folkhabo

Gunnar Dahlgren
Folkhabo

Afskrift N:o 2.

R 1·0175

D.-N:o 13373
Inhem. till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 AUG. 1924

Lånat
den

Lbratn 1044.

196/23
Kmb

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande


Gärdsgården, Hångsdala i Hvalstads prest-
boställe m. fl. gårdar uti Hvalstads i Hångsdala sn
af Vartofta härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913-14.

af

Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

Öfversiktskarta

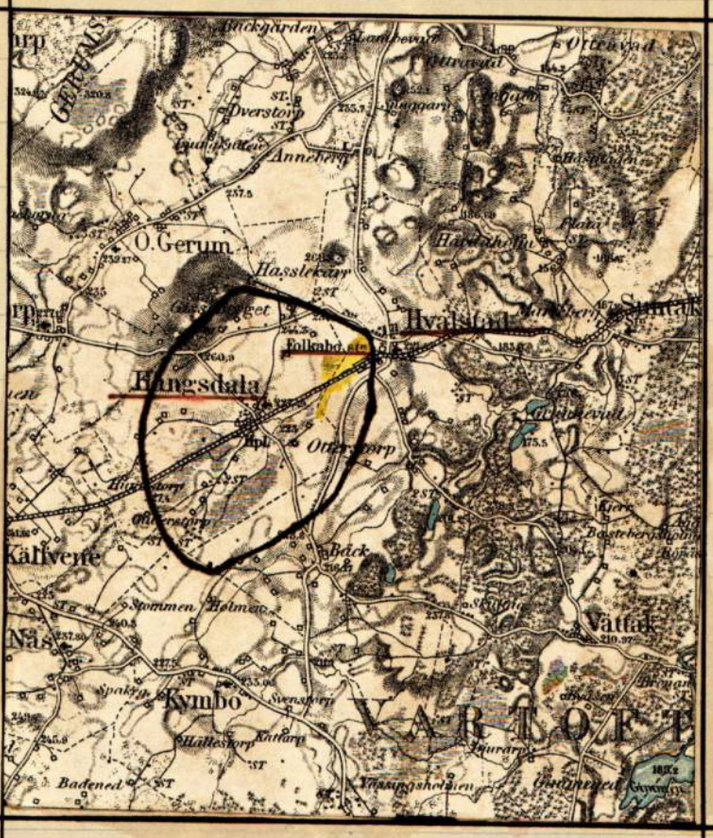

Att ovanstående översiktskarta är lika den karta, som är bilagd betänkandet angående den s. k. Hvalstadsbäckens uppgrävning inom Hvalstads och Hängsdala socknar, Vartofta härad Skaraborgs län, betygar

Falköping den 20 okt 1924

Knut Ahlsson G Dahlgren

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträden under lagasyneförrättning angående uppgräfning af d. ö. k. Hvalstads bäcken i dess lopp genom Gärdagården, Hängsdala och Hvalstads prestboställe m. fl. gårdar uti Hvalstads och Hängsdala socknar af Warfvila härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 30 oktober inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör hos Ken Hammarberg å Gärdagården i Tolkebo för att på grund af Kronungen Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt A) hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående uppgräfning af vissa delar af d. ö. k. Hvalstads bäcken i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande Gärdagården, Hängsdala prestgård, Hvalstads prestgård m. fl. hemman inom Hvalstads och Hängsdala socknar uti Warfvila härad och Skaraborgs län.

Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt B) och därjämte tillgifna kallelser (Bilaga Litt C) hade sakegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade, förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen Fredrik Olander i Bosgården Hvalstads och Herman Klingberg Hängsdala, dessutom följande personer sig infunnit:

Sökanden till förrättningen:

Kn Hammarberg för 4 3/4 mtl. Gärdagården

och af öfrige intressenter:

Kyrkoherden K. A. O. Dahlgren såsom innehafvare af Hvalstads prestgård

såsom arrendator af dr Sanfrid Gustafsson

Kyrkoherden S. J. Selander såsom innehafvare af

Hängsdala prestgård
Ivar Gustafsson såsom arrendator af dr dr
Herr kontraktsprosten P. Holm såsom allmänt ombud
för de ecklesiastika boställena enligt förordnande
(Bilaga Litt D)
Olas Johansson för 1/4 mtl. Bachgården i Hängsdala
Albert Åsberg " 5/16 mtl. Stridegården dr
Olas Gustafsson " 3/16 " dr dr
Carl Dahlén " 3/4 " Kullagården o Brohsgården dr
Trafikchefen Erik Stenhammar såsom ombud för
Vidarholms Järnväg enl. fullmakt (Bilaga Litt. E.)

2§.

Det af Kommungen Befallningshafvande i ämnet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig då i något jäfsförhållande till någon af delegarne.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande kunde synemännen ej förebigga.

5§.

Förrättningsmannen meddelade, att han redan låtit verkställa de förberedande undersökningarne för företaget till vattenafledningens uppgrundi, hvarvid den vattensjuka marken äfven blifvit afvägd och å karta affattad. Den sålunda upprättade kartan förelades de närvarande och uppmanades dessa att nu framställa de påståenden och yrkanden angående vattenafledningsföretaget, som de kunde anse sig böra göra.

6§.

Sökanden till förrättningen förklarade att hans afsikt med densamma vore att få vattenståndet i den så kallade Hvalstadsbäcken så regleradt, att han kunde tvenlägga sina marker till lagenligt djup af 1,2 mtr. och att kostnaden häför som för kanalens framtida underhållet bleve fördeladt på dem, som däraf kunde hafva nytta och yrkade han, att denna utredning måtte af synemännen verkställas.

7§.

Elas Gustafsson anmäg sig ej hafva någon nytta af tvenläggningen, hvarföre han yrkade blifva befriad ifrån allt deltagande i kostnaderna för densamma. Härinstämde äfven Albert Åsberg, Elas Johansson, Emil Dahlén och ombudet för Vallsta - Tidaholmsjärnväg.

8§.

Då öfverenskommelse angående förslagets utförande ej kunde åvägabringas förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och att de redan efter sammanträdets slut skulle begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i beaktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 i 41§§.

9§.

Då ingenting vidare förekom upplästes dagens protokoll och lämnades utan anmärkning, hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande att nästa sammanträde skulle hållas på samma plats och å tid, som genom kungörelse i socknekyrkorna komme att delgifvas.

Ort och tid som ofvan Ex officio

Gustaf Sjöberg.

10§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter föreskrivne syneman för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan, och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

Sten Stenmerberg
Kontraktsprosten G. Helin såsom allmänt ombud
Kyrkoherden K. A. O. Dahlgren för Hvalstads prestgård
Olas Johansson
Albert Åsberg
Olas Gustafsson
Trafikchefen Erik Stenhammar för Tidaholms järnväg.

11§.

Det af förrättningsmannen sedan föra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenledningen utförande m. m. föreläses delegarne och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

12§.

Till arbetsdirektion utsågos Sten Stenmerberg, Olas Johansson och Ragnfrid Gustafsson samt såsom suppleant Albert Åsberg.

13§.

Till sådan syssloman som omförmäles i dikningslagen 74§ valdes Olas Gustafsson.

14§.

Att mottaga och förvara till förslaget hörande handlingar uppdrogs åt Sten Stenmerberg på Gårdagården.

15§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de

närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökandena.

16§.

Sedan större delen af delegarne ingicks förening om vattenafledningsföretagets utförande i enlighet med förslaget alternativ II. Föreningen bilades detta protokoll (Bilaga Litt F).

17§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt G.)

18§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 ö 52§§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Vartofta häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

19§.

Sedan dagens protokoll blifvit upplåst och lämnad utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Gärdagården den 9 maj 1914.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

H. Klingberg. Fredrik Olander.

Bilaga Litt A.
D. ö. W. Dm. No 12-3
1912

Resolution.

Landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg, vardet härigenom förordnad att, däröst laga hinder ej möter, den i bilagda an-

ökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; Åliggande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt till mig sända bevis.

Karlstad, i Landshöfdingeämbetet, den 25 November 1912.

T. De Geer.

Ludv. Almqvist.

Stämpel Tre kronor.

D. och W. Dm. N:o 12-3
1912

Ank. d. 21 okt. 1912 till
Skaraborgs läns landskansli
Den 26/10 kungj.

Till
Kronofogden Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af den s. k. Hvalstadsbäcken i ändamål att förbättra vattenskadade marker tillhöriande Tolkabs m. fl. hemman uti Hvalstad och Långsdala socknar och Varbolts härad.

Närmaste järnvägsstation är Tolkabs.

Meddelanden angående förrättningen ställes till fastägaren B. G. Hammerberg under adress Liggetorp Lovene.

Uppgift på öfrige delegare, hvilka anses böra af förrättningsmannen kallas, finnes å omstående sida Liggetorp gps.

Lofvene den 17 oktober 1912

B. G. C. Hammerberg

Sten Stommerberg.

Bilaga Litt B.

Stämningsbesvär

Bilaga Litt C.

Stallebev.

Bilaga Litt D.

Till Kontraktsprosten Herr P. Melin.

Nästdagen den 20 innevarande oktober kl. ½ 3 e. m. kommer allmänt sammanträde att hållas hos Fastsägaren Sten Stommerberg i Folkabo Gärdagården i och för tillämnad uppgrävning af den s. k. Hvalstadsbäcken i ändamål att förlägga vattenskadade mader, tillhörande Gärdagården, Backgården m. fl. hemman i Hvalstads och Hängsdala socknar. Och som detta företag äfven kommer att beröra Hvalstads och Hängsdala prästboställen, vill Domkapitlet härigenom förordna Eder eller den Ni uti Eder ställe sätter att såväl vid nu utsatta sammanträdet som ock, om så erfordras, framledes under förrättningens fortgång i egenskap af allmänt ombud bevaka dessa boställens rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 8 oktober 1913

E. Wennerantz
Nils Nilén

Sven Dahlgren
R. Larsson

N. G. Tingvist G. F. Groth. L. A. Cederbom

C. G. Drakenberg.

Bilaga litt C.

Fullmakt för Trafikchefen Erik Stenhammar vid Tidaholms Järnväg att vid Intressenternas i Hvalstads bäckens sänkning sammanträden utföra vår talan, gällande vi ombudets lagliga åtgärder.

Tidaholm den 15 oktober 1913

Tidaholms Järnvägsaktiebolag

Gunnar Hellgren

Bevittnas:
Ruben Lindblad
Birger Larsson.

Bilaga litt F.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Joh. Hammerberg: Gårdagården Tolkabo angående uppgrävning af d. ö. fl. Hvalstadsbäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Gerdagården, Backgården m. fl. hemman uti Hvalstads och Klängsdala socknar Vartofta härad och Skaraborgs län; den 9 maj 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnde fastighet har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelser träffats.

1:a) Förena vi oss om fastigheten och förbinda oss att genom ge-

mensamt arbete eller kostnad utföra desamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget Alternativ II dock med iakttagande af de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2:o/ Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3:o/ Uppdraga åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kung. Maj:t med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingenjören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utbetala det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delegare som ej sökt odlingslån utdebitera och uppbära på dem hvilande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner

lämpligast samt tillse att det utföres i full
överensstämmelse med den fastställda planen.
4de) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räken-
skaper öfver af dem omhänderhafda medel samt
därför redovisa minst en gång om året vid all-
mänt sammanträde med delegarne eller inför af
dem utsedde revisorer.
5te) För besvär och omkostnader för fullgörandet af
ett uppdrag eger arbetsdirektionens medlemmar
rätt uppbära skälig ersättning äfvensom att på
gemensam bekostnad anlita sakkunnig person,
då så i ett eller annat fall anses behöfligt.
6te) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som under-
stödes af minst två närvarande medlemmar.
Frågor som anses af större vikt hänskjutas till
behandling vid allmänt sammanträde med delägarna.
7e) Att besluta i gemensamma ärenden kallas del-
ägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skrift-
ligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut.
Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträ-
de röstas två och en delegare efter sin andel i föreläget och
afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.
Frånvarande medlemmar få nöja sig med de
närvarandes beslut, men eger rätt att bevaka sin
rätt genom befullmäktigadt ombud.
8e) Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid
allmänt sammanträde snarast möjligt.
9e) Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldig-
heter eger arbetsdirektionen på laglig väg och på den
försumliges bekostnad söka komma däför.

Sam. Nahn ombud för ecklesiastika boställena
H. A. V. Dahlgren innehafvaren af Hvalstads prästgård
Hen V. Hammerberg Gårdsgården
Albert Åsberg Stregården
Blas Johansson Backgl.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad samt vitsordad af oss vitsordad intygas.

Gustaf Sjöberg.

H. Klingberg Fredrik Olander.

Bilaga Litt. G.

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående uppgräfning af d. s. k. Hvabladsbäcken i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande Gårdagården och Hvablads prestgård uti Hvablads socken samt Hångsdala prestgård, Hullagården, Stonegården och Backgården uti Hångsdala socken alla inom Bartofta härad af Skaraborgs län.

Företaget, som afser att genom reglering af vattenståndet i den så kallade Hvabladsbäcken möjliggöra en fullständigare torrläggning af omkring denna belägna marker tillhörande ofvannämnda hemman och gårdar, är att anse såsom vattenafledning och att handföra under de i dikningslagen 2 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom mätning å karta affattad och har därvid begränsningslinnan tagits så att nedom denna belägen mark först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1/2 mtr.

För att ernå det åsyftade ändamålet måste i första hand bäcken uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner, att den ej blott kan mottaga och afföra det tillströmmande vattnet så att öfversvämningar

förebyggas utan äfven hålla vattenståndet väsentligt sänkt under vår- och sommarmånaderna, så lägt under makytan, att jordens ytterligare torrläggning genom täckdikning kan möjliggöras.

Vid bestämmandet af kanalens läge å marken har i regel bäckens gamla lopp följts, dock har afvikelse härifrån gjorts dels å sträckan mellan afvägningspunkten 11+33 och 11+80, där den bör flyttas in till vägången mellan järnvägsområdet och Hängsdala prestgård, likväl med bibehållandet af dess läge å den senares markområde, och dels å sträckan 12+90 till 13+65, där den bör förläggas i vägången mellan Hängsdala prestgård och Gårdagården.

Kanalens läge å marken är å planchetten utmärkt med dubbla röda linier och till profilritningarne svarande röda littera.

Vid afdikningsföretagets utarbetande har det visat sig, att för torrläggning af den närmaste tillhöriga marken, kanalen endast behöfver uppgräfvas till den å förslaget angifna punkten B, men då en sådan reglering af bäcken ej skulle medföra någon afsevärd fördel för större delen af den invid densamme belägna marken, har förrättningsmännen utarbetat ett alternativt förslag till den tillämnade afdikningen, i hvilket alternativ I endast afser den mindre uppgräfningen mellan punkterna B - E och alternativ II en reglering af vattendraget å hela sträckan A - E, genom hvilket senare en fullständig torrläggning skulle ernås.

Vid bestämmandet af kanalens dimensioner har i båda fallen hänsyn tagits till såväl de framrinnande vattenmängdernas storlek och jordarternas sammanhållningsförmåga som till en effektiv torrläggnings ernående och har med anledning däraf för kanalen föreslagits en bottenbredd af 0,5

mbr. och en sidolutning af 1:1,25.

Dimensionerna äro för öfrigt i meltermått angifna å profil- och sektionsritningarna samt i den särskilda häröfver upprättade gräfningslistan, och skall arbetet i enlighet därmed utföras.

För bedömandet af företagets ekonomiska tillvägagångssätt såsom till ledning för bestämmande af eventuela skadeersättningar är en specificerad kostnadsberäkning upprättad öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalens upptagande eller utvidgning med 0,6 meter resp. på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synenämnden bestämts att utgå i enlighet med den föreslagna tillhörande jordersättningslängden.

Denna ersättning skall innan arbetet börjar å hans mark erläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig, är han själf delegare i företaget skall ersättningen räknas honom till godo vid dikningskostnadernas fördelning.

Jordegaren eger rätt disponera den jord som blifvit upptagen på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens tillvaratagande skada vållas, äro dikningspliktige skyldige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den upptagna dikesjordens tillvaratagande kan förorsakas, få synenämnden bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af tremne ojäfviga personer, af hvilka jordegare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillhåller den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedda marken, som jordbankarne upptaga, och använder det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medföljt företaget och dess utförande har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torläggningen, och har därför sådan jordvärdering som föreskrifves i gällande dikningslag, af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torläggningen äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit att hvarje enskild jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förbättringskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, hvarje enskild jordegare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i jorduppskattningslängden i procent är angifven, och i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utförandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delegarne, har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningsområden, mellan hvilka på

grund af höjd – och bidningsförhållanden sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin tvarläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att såvidt möjligt vara ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks tvarläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delegare för hvilka en viss kanalsträckas uppförande är nödvändig och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delegare inom sektionen, efter den uppskattade jordförbättringen storlek.

Om någon eller några delegare i den ena sektionen funnits hafva nytta af dikning äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med ﬁnt påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning återfinnes speciﬁcerad i den härofver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på båt sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskild dikessträcka uträknats, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och däreffter har beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i den afdikningssamfällighet, som innefattas af förslaget i sin helhet.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas nygräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhållet bestämma och föreskrifva.

att där kanalen går i sågång skall den upptagas lika på bvardera grannens mark där ej annorlunda är bestämt, och den upptagna dikesjorden, så vidt möjligt är fördelas lika på båda sidor, är väg anlagd på ena sidan sågången skall diket dock tagas åt andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de upptagna jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning emot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50 meter för afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon af delegarna det fordrar samt med tvänne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att däest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändringar i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast två år efter arbetet tagit sin början.

Sökanden vare skyldige att vid förrättningen afstundande försköttera förrättningskostnaderna i enlighet med till honom öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtlige delägare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Med hänvisning till den af syneмännen verkställda värdering af jordens förbättring lämna de, de i jordabalken 7 § gjorda yrkandena utan afseende.

Slutligen få syneмännen i enlighet med den mellan flera delegare ingångna förteningen bestämma att arbetet skall utföras i enlighet med förslagets alternativ II.

Gärdagården den 9 maj 1914.

Gustaf Björg

H. Klingberg Fredrik Olander.

Egobeskrifning, Arealförteckning

och

Jorduppskattningslängd

Öfver vattenskadad mark tillhörande Föragården, Bach-gården m. fl. hemman uti Hvabslads och Hängdala socknar, Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid lagasyneförrättning åren 1913-1914.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade: blifvande värdet utgör Kr.	Uppskattade: blifvande värdet utgör öre	Uppskattade: närvarande värdet utgör Kr.	Uppskattade: närvarande värdet utgör öre	Förbättringen utgör Kr.	Förbättringen utgör öre	Summa uppskattade: blifvande värdet Kr.	Summa uppskattade: blifvande värdet öre	Summa uppskattade: närvarande värdet Kr.	Summa uppskattade: närvarande värdet öre	Summa förbättring Kr.	Summa förbättring öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Hvabslads prästgård																				
1	åker		12			550	400	150					18	-							
2	"		13			"	"	"					19	50							
3	"		15			"	"	"					22	50							
4	"		14			"	"	"					21	-							
5	"		13			"	"	"					19	50							
6	"		07			"	"	"					10	50							
7	"		06			"	"	"					9	-							
8	"		10			"	"	"					15	-							
9	"		09			550	450	100					9	-							
10	"		07			"	"	"					9	-							
11	"		08			"	"	"					8	-							
12	"		07			"	"	"					7	-							
13	"		07			"	"	"					7	-							
14	"		06			"	"	"					6	-							
15	"		06			"	"	"					6	-							
16	"		05			"	"	"					5	-							
17	äng		63			250	200	50					31	50							
18	"		27			"	"	"					13	50							
	Transp.	2	37										237	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	37										237	-							
19	äng		36			250	200	50					18	-							
20	"		40			300	200	100					40	-							
21	"		07			"	"	"					7	-							
22	backe		27			-	-	-					-	-							
23	"		38			-	-	-					-	-							
24	äng		70			400	200	200					140	-							
25	åker		13			500	400	100					13	-							
26	"		12			"	"	"					12	-							
27	"		17			"	"	"					17	-							
28	"		21			"	"	"					21	-							
29	"		24			"	"	"					24	-							
30	"		22			"	"	"					22	-							
31	"		23			550	400	150					34	50							
32	"		24			"	"	"					36	-							
33	"		22			"	"	"					33	-							
34	"		23			"	"	"					34	50							
35	"		20			"	"	"					30	-							
36	"		21			"	"	"					31	50							
37	"		19			"	"	"					28	50							
38	"		18			"	"	"					27	-							
39	"		17			"	"	"					25	50							
40	"		11			"	"	"					16	50							
41	"		11			600	400	200					22	-							
42	"		13			"	"	"					26	-							
43	"		15			"	"	"					30	-							
44	"		13			"	"	"					26	-							
45	"		13			"	"	"					26	-							
46	"		13			"	"	"					26	-							
47	"		18			"	"	"					36	-							
47a	äng		11			200	200	-					-	-							
47b	"		14			"	"	-					-	-							
48	åker		38			600	300	300					114	-							
	Transp.	9	21										1154	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	21										1154	-							
49	åker		15			600	300	300					45	-							
50	"		15			"	"	"					45	-							
51	"		18			"	"	"					54	-							
52	"		19			"	"	"					57	-							
53	"		32			"	"	"					96	-							
54	"		25			"	"	"					75	-							
55	"		19			"	"	"					57	-							
56	"		45			500	300	200					90	-							
57	"		36			600	300	300					108	-							
58	"		36			"	"	"					108	-							
59	"		67			"	"	"					201	-							
60	"		80			"	"	"					240	-							
61	"		08			"	"	"					24	-							
62	"		13			"	"	"					39	-							
63	"		16			"	"	"					48	-							
64	"		20			"	"	"					60	-							
65	"		21			"	"	"					63	-							
66	"		18			"	"	"					54	-							
67	"		20			"	"	"					60	-							
68	"		19			"	"	"					57	-							
69	"		18			"	"	"					54	-							
70	"		19			"	"	"					57	-							
71	"		17			"	"	"					51	-							
72	"		15			"	"	"					45	-							
73	"		16			"	"	"					48	-							
74	"		20			500	200	300					60	-							
75	"		20			"	"	"					60	-							
76	"		47			"	"	"					141	-							
77	"		26			"	"	"					78	-							
78	"		30			"	"	"					90	-							
79	"		31			"	"	"					93	-							
80	"		23			"	"	"					69	-							
	Transp.	17	45										3581	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	17	45										3581	-							
81	åker		41			500	200	300					123	-							
82	"		17			"	"	"					51	-							
83	"		35			"	"	"					105	-							
84	"		11			"	"	"					33	-							
85	"		23			400	400	-					-	-							
86	"		15			"	"	-					-	-							
87	"		18			"	"	-					-	-							
88	"		14			"	"	-					-	-							
89	"		100			"	"	-					-	-							
90	äng		24	20	43	200	200	-					-	-	9204	50	5311	50	3893	-	48,05
	Storegården Albert Åberg																				
92	äng		170			400	200	200					340	-							
93	"		87			300	"	100					87	-							
94	"		52	3	09	250	"	50					26	-	1071	-	618	-	453	-	5,59
	Storgård Elas Gustafsson																				
91	äng		39			400	200	200					78	-							
95	"		91			350	200	150					136	50							
96	åker		24			500	200	300					72	-							
97	"		23			"	"	"					69	-							
98	"		23	2	00	"	"	"					69	-	824	50	400	-	424	50	5,24
	Bachgården 1/4 ondl. Elas Johansson																				
99	åker		25			500	200	300					75	-							
100	"		19			"	"	"					57	-							
101	"		20			"	"	"					60	-							
102	"		17			"	"	"					51	-							
103	"		19			"	"	"					57	-							
104	"		20			"	"	"					60	-							
105	"		18			"	"	"					54	-							
	Transp.	1	38	25	52								414	-	11100	-	6329	50	4770	50	58,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Framsp.	1	38	25	52								414	-	11100	-	6329	50	4770	50	58,88
106	åker		22			450	200	250					55	-							
107	"		17			"	"	"					42	50							
108	"		20			"	"	"					50	-							
109	"		18			"	"	"					45	-							
110	"		21			"	"	"					52	50							
111	"		18			"	"	"					45	-							
112	"		24			"	"	"					60	-							
113	"	1	30	4	08	400	200	250					325	-	1905	-	816	-	1089	-	13,44
	Hängsdala Prestboställe																				
114	äng	2	50			500	200	300					750	-							
114a	"		90			300	150	150					135	-							
115	"		20			500	200	300					60	-							
116	"		49			"	"	"					147	-							
117	"		12			"	"	"					36	-							
118	"		07			150	150	-					-	-							
119	"		29			200	150	50					14	50							
120	"		16			"	"	"					8	-							
121	"		04	4	77	150	150	-					-	-	2015	-	864	50	1150	50	14,20
	Stallagården Carl Dahlén																				
122	äng		16			150	150	-					-	-							
123	"		10			400	200	200					20	-							
124	åker		06			600	400	200					12	-							
125	"		24			"	"	"					48	-							
126	"		22			"	"	"					44	-							
127	"		17			"	"	"					34	-							
128	"		16			"	"	"					32	-							
129	"		14			"	"	"					28	-							
130	"		13			"	"	"					26	-							
131	"		11			"	"	"					22	-							
132	"		99	2	48	"	"	"					198	-	1372	-	908	-	464	-	5,73
	Framsp.			36	85										16392	-	8918	-	7474	-	92,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			36	85										16892	-	8918	-	7474	-	9225
	Gårdagården																				
	Sten Hemmerbug																				
133	äng		12			200	150	50					6	-							
134	"		99			500	200	300					297	-							
135	"		35			"	"	"					105	-							
136	"		12			200	150	50					6	-							
137	åker		40			600	500	100					40	-							
138	"		20			600	300	300					60	-							
139	"		25	2	43	"	"	"					75	-	1228	-	639	-	589	-	727
	Carlotta Tidaholms																				
	Järnväg																				
140	åker		19			400	400	-					-	-							
141	"		17			"	"	-					-	-							
142	"		13			600	300	300					39	-							
143	järnväg		22			-	-	-					-	-							
144	"		28			-	-	-					-	-							
145	"		35			-	-	-					-	-							
146	"		49			-	-	-					-	-							
147	åker		28			400	400	-					-	-							
148	"		08			"	"	-					-	-							
149	"		28			"	"	-					-	-							
150	"		17			"	"	-					-	-							
151	"		33			"	"	-					-	-							
152	"		43			"	"	-					-	-							
153	"		48			"	"	-					-	-							
154	"		30			"	"	-					-	-							
155	bond		06			"	"	-					-	-							
156	äng		14			200	200	-					-	-							
157	"		20			"	"	-					-	-							
158	"		06			"	"	-					-	-							
159	järnväg		15	4	79	-	-	-					-	-	78	-	39	-	39	-	0,48
160	väg		15		15	-	-	-					-	-							
	Summa			44	22										17698	-	9596	-	8102	-	100

Gärdagården den 9 maj 1914.

Gustaf Sjöberg

H. Klingberg Fredrik Olander.

Jordsättningslängd.

öfver den jord som åtgår för uppgrāfning af Hvalstads-bäcken i ändamål att bortlägga vattenskadade mackar tillhörande Gārdagården, Backgården m.fl. hemman uti Hvalstads och Hängsdala socknar af Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913-14

Hemmanets namn.	Jordegarens namn m. m.	Jord som åtgår	Jordvärdet per ar	Ersättningen utgör		Samma	
			Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Alternativ I utgår.						
	Alternativ II						
	Kanalen A-B-C-D-E.						
	Kanalsträckan A-B.						
Hvalstad	Prästbostället	8,00	8-	64	-	64	-
	Kanalsträckan B-C-D-E.						
Gerdagl.	Sten Hammerberg	2,2	8-	17	60		
Hängsdala		1,5	5-	7	50		
Hvalstad	Prästbostället	3,6	8-	28	80		
		1,5	5-	7	50		
	Prästbostället	4,7	8-	37	60		
	Elas Johansson	1,5	"	12	-		
Storegl.	Elas Gustafsson	0,6	"	4	80		
"	Alb. Åsberg	1,1	"	8	80	124	60
	Samma Alt. II					188	60

Gārdagården den 9 maj 1914

Gustaf Björberg

H. Klingberg Fredrik Olander.

Kostnadsberäkning

för upprensning af Hvabsladsbäcken i ändamål att torrlägga vattensjuka mackar tillhörande Gårdagården Backgården m.fl. hemman uti Hvabslads och Hångsdala socknar af Carlsfors härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913-1914.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Alternativ I utgår.						
		Alternativ II						
		Kanalen A-B-C-D-E.						
		Kanalsträckan A-B.						
+40-1	60							
1-2	100	Sprängning o schaktning af berg och sten	35	10	350	-		
2-3	100	Schaktning af dy o stenbn. lera	240	0,80	192	-		
3-4	100	" " " "	140	"	112	-		
4-5	100	" " " "	80	"	64	-		
5-6	100	" " " "	90	"	72	-		
6-+60	60	" " " "	60	"	48			
		Fördjupning af landsvägsbro	6,35		100	-		
		Byggnad af en egovägsbro vid 6 enl. ritning			75	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillbyn, extra stensprängning m. m. tillägges c:a 15% af föregående summa			153	-		
		Fordersättningar enl. jordersättningslängden			64	-	1230	-
		Kanalsträckan B-C-D-E.						
6+60-7	40	Schaktning af dy o lera m. ngt. sten	85	0,80	68	-		
7-8	100	" " "	235	"	188	-		
		Transp.			256	-	1230	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tramp.	965 720		256	-	1230	
	960							
8-9	100	Schaktning af dyö lera m. ngt. sten	250	0,80	200	-		
9-10	100	" " "	210	"	168	-		
10-11	100	" " "	190	"	152	-		
11-+33	33	" " "	75	"	60	-		
+33-+80	47	" " "	180	"	144	-		
+80-12	20	" " "	40	"	32	-		
12-+90	90	" " "	145	"	116	-		
+90-13	10	Schaktning af dyö lera med mycket sten	30	1,00	30	-		
13-+50	50	" "	200	"	200	-		
+50-+65	15	" "	70	"	70	-		
+65-14	35	Schaktning af dyö lera m. ngt. sten	60	0,80	48	-		
14-15	100	" " "	160	"	128	-		
15-+20	20	" " "	30	"	24	-		
	1500	För oförutsedda fall arbetets tillsyn, extra stensprängning m.m. tillägges ca 15% af föregående summa	1660 ~~1670~~ 2605		247	50		
		Jordsättning av enl. jordsättningslängden			124	60	2000	-
				Summa Akt. II			3230	-

Gårdagården den 9 maj 1914.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

H. Klingberg Fredrik Olander.

Kostnadsfördelningslängd.
Alternativ I utgår
Alternativ II

Hemmanets och jordegarens namn.	Deltagningsskyldighet i gräfningskost. för kanalsk. Ö-L-D-E. Uppskattad jord förbättringsområde kr.	med kr.	Ö-B. Uppskattad jord förbättringsområde kr.	med kr.	Summa %	Summa kr.	Summa öre	Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna %	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.
Stallagl. Carl Dahlén	464-	250-	—	—	7,74	250	-	5,73	19	32
Gerdagl. Sten Hammarberg	589-	353-	—	—	10,93	353	-	7,27	24	50
Hångsdala prestboställe	1121-	440-	191-	60-	15,48	500	-	14,20	47	87
Hvalstads do.	903-	297-	3293-	1030-	41,08	1327	-	48,05	161	99
Olas Johansson	1089-	358-	243-	75-	13,41	433	-	13,44	45	30
Stugl. Olas Gustafsson	425-	140-	95-	30-	5,26	170	-	5,24	17	67
" Alb. Åsberg	453-	149-	101-	32-	5,60	181	-	5,59	18	85
Järnvägen	39-	13-	9-	3-	0,50	16	-	0,48	1	62
Summa Alt II	5083-	2000-	3932-	1230-	100-	3230	-	100-	337	12

Gärdagården den 9 maj 1914

Gustaf Sjöberg

H. Klingberg Fredrik Olanders.

Gräfningslista.

för upprensning af Hvalstads bäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Gärdagården, Backgården m.fl. hemman uti Hvalstads och Långsdala socknar af Vartofta härad och Skaraborgs län. upprättad vid laga syneförrättning åren 1913-1914.

Stationen.	Vid afsägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående punkt.	Djup i meter	Botenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B.		Alternativ II				
	0+40	—	0	0,5	—	Sidolutning 1:1,25
	1	60	1,0	"	3-	
	2	100	1,4	"	4-	Fördjupning af landsvägs-
	3	100	1,6	"	4,50	bron.
	4	100	1,3	"	3,75	Ombyggnad af en egovägs-
	5	100	1,3	"	3,75	bro vid 6 ent. sitning
	6	100	1,5	"	4,25	
	+60	60	1,5	"	4,25	
B - C - D - E.						
	6+60	—	1,5	0,5	4,25	Sidolutning 1:1,25
	7	40	1,5	"	4,25	
	8	100	1,35	"	3,88	
	9	100	1,3	"	3,75	
	10	100	1,2	"	3,50	
	11	100	1,35	"	3,88	
	+33	33	1,5	"	4,25	
	+80	47	1,6	"	4,50	
	12	20	1,7	"	4,75	
	+90	90	1,4	"	4-	
	13	10	1,4	"	4-	
	+50	50	1,8	"	5-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	+65	15	1,5	0,5	4,25	Sidolutning 1:1,25
	14	35	1,4	"	4 -	
	15	100	1,4	"	4 -	
	+20	20	1,4	"	4 -	

Gustaf Sjöberg
Statens Landbruksingenjör

272
23

DIARIE N:r 5252
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MRS. 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Anmält
KH

Angående Valstabäckens dikningsföretag

Såsom jag nu avflyttar från Valstads Kyrkoherdeboställe så övergår alla mina skyldigheter för Gården till Efterträdaren Edvin Gustafsson enligt Kontrakt
Dikningshandlingarna äv överlemnade till Gottfrid Nyman Folkabo Gård Folkabo

Prästbolet Folkabo den 13 Mars 1940
Sampr. Gustafsson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i det företag som avser uppgrävning av den s. k. Valstadsbäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker i Valstads och Långsvala socknar

---

12 §

Till arbetsdirektionen utsågos Sten Bommenberg, Elas Johansson och Sanfrid Gustafsson samt såsom suppleant Albert Åsberg

---

Gärdagården den 9 maj 1914

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Ulf Ulingberg Fredrik Olander

---

§ 4

Sedan fäste ägaren av Tallkabo nolgården Sten Bommenberg genom egendomens försäljning upphört att vara intressent i fö-

dikningsföretaget och den nye ägaren av egendomen Gottfrid Nyman i hans ställe inträtt, förklaras val av ledamot i arbetsdirektionen efter bemälde Kommerberg och utsägs härtill enhälligt hemmansägaren Gottfrid Nyman i Forsnäs nolsk.

Forsnäs den 27 juni 1924

Gunfrid Gustafsson
ordf. i arbetsdirektionen

Ulas Johansson

Albert Åsberg

Rätt utdraget bestyrkes
Emil Ekstedt
stationsinspektor

Utdrag ur Förening ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Sten Hofmenberg Gärdagården Falsvabo angående uppgrävning av den s.k. Hvalstadsbäcken i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande Gärdagården, Backgården m.fl. belägna uti Hvalstad och Långsdala socknar. Den 9 maj 1914"

Mellan undertecknade intressenter etc har följande överenskommelser träffats

1:o ——— ——— ——— ~~att vidare~~

Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

——— ——— ——— att, sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för detsamma erhållande nödiga Kontrakt och förbindelser att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer. ——— ——— ———

Sam Melin, ombud för ovkl. beställarna
K A O Dahlgren, innehavare av Hvalstads prästg
Sten O Hofmenberg Gärdagården
Albert Åsberg Stårgården
Clas Johansson Backg:n

Förestående förening är i vår när-

vara frivilligt ingången och egenhändigt
undertecknad samt varod av oss vitsordad
intygas

Gustaf Björk
C Lindberg Prof Alander

Rätt utdraget, betygar
Knut Ahlqvist
Stationsinspektör

Att arbetet med utgrävning av den s.k. Valstadsbäcken för tarrläggning av marker tillhöriga vissa lemmar i Valstads och Hängsdals byalag påbörjades redan under föregående år ihktygas. Valstad pr Falkaberg 7 s 1924.

David Karlsson Knut Olsson
Kommunalnämnd. ordf. Statsingenjör

Godkänt den 4 nov 1925

279/23

16724

D.-M:
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 28 OKT. 1925

Bevis.

över verkställd avsyning av vattenavlednings och avdikningsarbeten enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 maj 1925 angående det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gärdagården, och Valstads kyrkoherdeboställe i Valstads socken samt Backgården, Storegården, Hångsdala kyrkoherdeboställe och Kullagården i Hångsdala socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 20 okt. 1923.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 940:- kr.
Lån från odlingslånefonden 2830:- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 28 oktober 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid av Ingeniör C. Lundin den 29 september verkställd undersökning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 20 oktober 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN
