



Akt nr:
R-E1a-0850

AU\$R-E1a-0850

vil. korter
42

82
43 42

DIARIET. 20597
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1943

R 2*0850

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 november 1942 till
Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940 i Skövde stad av
SKARABORGS LÄN

H. Handl.
E. L. L.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med tvåtusensexhundrafemtio (2.650)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm
år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknade ^{ende} ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ ~~för egen del~~ samt ~~å~~
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1946 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att, när någon av företagets delägare det påkallar och genom intyg av vederbörlig förrättningsman styrker behovet därav, verkställa erforderligt arbete för företagets underhåll, samt

att vid arbetets utförande underkasta ^{oss}~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen, överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hasselum Nolgården den 21/10 1943.

Orel Kjellgren

Evert Kjellgren

Att Orel och Evert Kjellgren, Hasselum Nolgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl-Erik Aronsson

Adress

Skörse

Per Kjellgren

Adress

Skörse

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Nolgården Hasslum den 3/2 1943.

Statens e. Lantbruksingenjör
Herr Ernst Överholm,
Skara.

Som Stor brist på arbetskraft för närvarande råder och som följd derav även högre löner, jämte dyrtidstillägg, är jag ej hågad igångsätta torrlägningsarbetet detta år, förutom möjligen sträckan M-V , enär det skiftet infaller till träda i år.

De sträckor som nu äro färdiga är följande: Sträckan G-E-H E-B. samt systemet T-P R-P-O S-O O-N.

Rörande sträckan D-C K-C C-A är jag mycket tveksam att lägga, enär vi då torrlägger den bäck som förser betesdjuren med vatten under betesgången.

Täckdikes-ögat å sistnämnda system önskar jag flyttat ca 90 m. åt väster enär jag då erhåller ett vattningsställe vid det öppna diket och samtidigt slipper gräva och underhålla det öppna diket å annans mark.

Högaktningsfullt

Axel Kjellegren

Lantbruksingenjör E. Överholm, Skara.

Får härmed meddela att vi ej medhinna att göra dikningsföretaget färdigt för avsyning före den 1 september 1946, dels på grund av brist på arbetare, dels på grund av att vi har måst bygga ny ladugård med tillhörande gödselvårdsanläggning, dels på grund av att arbetslönerna för dikning för närvarande ställer sig onormalt höga,

De sträckor som nu är färdiga äro: sträckan BE, E-H, E-F, F-G, F-I N-O, O-P, P-R, P-Y och O-S. De som ännu ej är färdiga äro följande sträckor: A-B, B-C, C-D, C-K samt sträckan L-M.

Vi får väl taga en respit tid på ett par tre år till kanske vi kan komma till normalare tider både vad angår arbete som material.

Högaktningsfullt

Arvid Kjellgren

*Stolgården Hasskum
den 26/8 1946.*

82/42

BEVIS
RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: "Hasslum-Nolgårdens dikningsföretag av år 1940" i Skövde stad
(namn, socken och län)

av Skaraborgs län

~~Ordförande~~ } Lantbrukaren Axel Kjellgren
Förtroendeman: }
~~Intressent~~ } Hasslum Nolgården, S k ö v d e



Arbetsplanen fastställd den 24 november 1942

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.650:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond --- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1943

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1943

Förlängning medgiven av ~~Lantbruksstyrelsen~~ till 1 september 1949
~~Vattningsstyrelsen~~

Vid förrättningen, som verkställts av Assistent Axel Kedefält
den 21 september 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Öppna diket A - A^I jämte rördikena B - C - D samt C - K äro icke utförda.
Vederbörande intressenter anholder att de skola få utgå ur arbetsplanen.

Sträckan A^I - B har utförts grundare än vad förslaget utvisar samt med
öppet dike fram till punkt 4 för erhållande av vattningsställena vid betesfällorna.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande minskas härigenom med
kronor 2.360:- och den uppskattade båtnaden med 2.278:- kronor. (del av fig. 1 och
2 samt fig. 4 - 8 utgår.)

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan-
och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 3.824:57 kronor varav räntor
under arbetstiden 250:- kronor.

Skara den 21 september 1949

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län



Handlingarna införade från Hallin 7/10 49

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, samtliga delägare i "Hasslum-Nolgårdens dikningsföretag av år 1940" i Skövde stad av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 21 september 1949

Hasslum Nolgården pr Skövde den

oktober 1949

Axel Kjellgren
.....
(Axel Kjellgren)

Evert Kjellgren
.....
(Evert Kjellgren)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Folke Lvanholm
.....

Astrid Wigholm
.....

Avskrift.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Angående Hasslum-Nolgårdens dikningsföretag av år 1940.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för rubricerade företag får jag härmed anhålla, att Ni ville ombestyra, att till företaget hörande handlingar insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Stockholm den 18 oktober 1949.

Enligt uppdrag

W. Gripenberg.

Införskott d. 20/10 49.

Rem.

Lantbrukaren Axel Kjellgren,
Hasslum Nolgården,
S k ö v d e.

1949

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 oktober/i samband med företagets godkännande medgivit vissa ändringar i den fastställda arbetsplanen för Hasslum Nolgårdens dikningsföretag år 1940 i Skövde stad, blev genom felexpediering härifrån intressenterna tillhöriga 2 häften handlingar med inneiggande 2 ritningar återställda till Eder, innan däri blivit införda dessa ändringar och därav föranledda påskrifter.

Lantbruksstyrelsen anhåller att Ni ville, på det att handlingarna och ritningarna må befinna sig i komplett skick, hit återsända desamma för komplettering med dessa ändringar och påskrifter och för kopiering därav på Lantbruksstyrelsens exemplar, varefter de komma att omedelbart återställas till Eder.

Stockholm den 10 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

[Signature]

42/ Bida
/42

R 2:0850

DIARIET

2751

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 FEB. 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

749 10
42 9

Handlingar angående
Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940
i Skövde stad, Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1940 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

U P P G I F T
=====

över verkliga kostnader vid "Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940" i Skövde stad av Skaraborgs län, grundad på av företagets förtroendeman lämnade uppgifter.

	OMRÅDET			
	Norra	Mellersta	Södra	Summa kronor
Syneförrättningen	206:26	18:36	26:27	250:89
Betänkande	36:09	3:21	4:60	43:90
Arbets- och material- kostnad	2.011:51	653:27	550:--	3.214:78
Extra arbeten	15:--			15:--
Diverse omkostnader	45:--	5:--		50:--
Räntor under arbets- tiden	250:--			250:--
Summa Kronor	2.563:86	679:84	580:87	3.824:57
Beräknad kostnad	2.202:35	406:57	580:87	3.189:79
Båtnad	2.315:--	410:--	1.134:--	3.859:--
		Skara den	1949	

/

1940

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark till-
hörande Hasslum Nolgården i Skövde stad,
Skaraborgs län.

Den 6 september 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att verkställa
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9 hos Axel Kjellgren, Hasslum
Nolgården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna
utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

Vid sammanträdet inställde sig:

Lantbrukaren Axel Kjellgren, Hasslum Nolgården, och
Kronoarrendator Carl Johansson, Hasslum Sörgården, såsom ombud
för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. fullm. /Bil. 5/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav medde-
lade förordnandet för undertecknad att handlägga ifrågavarande
förrättning upplästes.

§ 2.

Av förrättningsmannen hade erforderliga markundersökningar
och fältarbeten samt approximativ uppskattning av genom torrlägg-
ningen uppkommande båtnad blivit verkställda. Sökanden hade där-
vid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta
torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torr-
läggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu
framlades.

§ 3.

För torrläggning av Norra och Södra områdena vore erforder-
ligt att fortsätta dikningsarbetet å kortare sträckor inom
nedanför områdena belägna kronoegendomen Hasslum Sörgården. Arren-
datorn av kronoegendomen hade genom skrivelse lämnat medgivande
till företagets utförande i denna del. /Bil. 4/. Skrivelsen ifråga
undertecknades nu av Kronans ombud.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och

avgav sitt utlåtande /Bil. E/. Härefter lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna.


§ 5.

Sökanden förklarade att han hade för avsikt att söka statsbidrag till kostnaderna för företagets genomförande och uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta för statsbidrags sökande erforderliga handlingar och ritningar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hasslum Nolgården den 6 september 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras:

.....*Carl Gustav Andersson*.....


.....*Arvid Hjellgren*.....

.....

K. S. 78. N^o 12 - 92
1929

3

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Nolgården Hasslunda Skövde ^{stad} ~~socken~~
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skövde

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress

pr

Telefon:


Sten Hjellegren
Nolgården Hasslunda
Skövde
154

Skövde den 16/3 1939.

Sten Hjellegren

Värd. p. f. f. f.

4



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Sörgården Hasslum

Ägarens namn:

*Kungl. Länstypören
Ärendator
Karl. Johansson.*

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 12 - 92
1939

5
Sköde

[Handwritten signature]

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 juni 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature] Eli Anders

Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G


över underrättelser angående sammanträde hos Axel Kjellgren, Nolgården, Hasslum, Skövde, fredagen den 6 september 1940 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Hasslum Nolgården i Skövde stad av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 20 augusti 1940 till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, beträffande
Hasslum Sörgården.

Axel Kjellgren, Nolgården, Hasslum, Skövde.

Arrendator Carl Johansson, Sörgården, Hasslum, Skövde.

Skara den 20 augusti 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Undertecknade medgiva härigenom delägarna i "Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940" i Skövde stad av Skaraborgs län att i enlighet med av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm för nämnda företag upprättat förslag utföra dikningsarbete å kronoegendomen Hasslum Sörgården, och fränsäga vi oss varje anspråk på ersättning för skada och intrång, som därigenom kan komma att förorsakas egendomen.

Hasslum Sörgården den 6 Sep. 1940.

Erik Jönasson
Arrendator av Hasslum Sörgården

Bevittnats

Egenhändiga namnteckningar ^{-en} ~~arna~~ intyga:

..... Josel Bimberg Justa Jönberg

Hasslum Nolgården den 6 september 1940.

Erik Jönasson
Ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. fullm. /Bil. 5/.

Bevittnas:

Anders Jönberg Fredriksson

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Carl Johansson, Hasslum Sörgården, Skövde,
att vid det sammanträde för handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande
Hasslum Nolgården i Skövde stad, som är utsatt att hållas
hos Axel Kjellgren, Hasslum Nolgården, fredagen den 6. september
1940 kl. 9, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 1. september 1940.

P. R. R. R. R.
Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Johansson *J. Kjellgren*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Stöcke stad</u>		
			<u>Norra området</u>		
			Haulum Kolgården	<u>Axel och Ernst Kjellgren</u>	
				permanent betesvall	1
				" "	2
				" "	3
				äker	4
				"	5
				"	6
				permanent betesvall	7
				" "	8
				äker	9
				"	10
				"	11
				väg	12
				"	13
				tröt	14
				väg	15
				järnväg	16
				väg	17
				<u>Summa:</u>	
			<u>Södra området</u>		
			Haulum Kolgården	<u>Axel och Ernst Kjellgren</u>	
				äker	18
				"	19
				"	20
				väg	21
				<u>Summa:</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Södra området</u> Hanslun Holgården	<u>Axel och Ernst Kjellgren</u> äker	22
				"	23
				"	24
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag:</u> Norra området Nelleröta området Södra området		
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 65														300	495	-
1 64														300	492	-
49														300	147	-
3 78															1134	-
6 65						2 37									4593	-
86						21									410	-
3 78															1134	-
11 29						2 58									6137	-

Hasslum Nollgården den 6 september 1940
 Ernst Österholm
 Statens e. Gutbeksutredning

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Norra området</u>								
+140 +35 1 -5 +40 +90 1 -2	395	<u>Sträckan A-B</u> <i>utgår</i>								
	150	Grävning för öppet dike, lera med enst. sten - m ³	195	0.90			175	50	✓	
+90 +35 2 -5	245	12" betongrör - m	245	3.10			759	50	✓	
		Grävning, rörens läggning, jordens återfyllning - m	245	0.70			171	50	✓	
+90 2		Kringgjutning av rörutlopp					35	-		
+44+80+35 3 ,4 ,5		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-			135	-	✓	~~1276 50~~
		Tillägges c:a 10 %								~~128 50~~
							Summa:	1405	-	
+35 5 -8 +19 +25 8 -10 +35 +21 5 -6 +21 6 -8 +19 +50 8 -9 +50 +25 9 -10 +35 +27 5 -6	471	<u>Sträckan B-C-D</u> <i>utgår</i>							✓	
	86	10" betongrör - m	86	2.20	189	20	✓			
	310	9" " - m	310	1.90	589	-	✓			
	75	8" tegelrör - m	75	1.75	131	25	✓	909	45	✓
	92	Grävning, läggning och återfyllning - m	92	1:-	92	-	✓			
+27-86 6	59	D:o d:o - "	59	0.55	32	45	✓			
+86 6 -8	114	D:o d:o - "	114	0.45	51	30	✓			
+19 +50 8 -9	131	D:o d:o - "	131	0.35	45	85	✓			
+50 +25 9 -10	75	D:o d:o - "	75	0.65	48	75	✓	270	35	✓
+86 +50 6 ,9 +21 6 ,8 +25 10 +19 8		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
		Brunn med 9" intag, d=0.60 m	2	45:-	90	-				
		Brunn med 9" intag, d=0.45 m			35	-				
		Brunn med 9" avlopp, d= 0.60 m			45	-	260	-	✓	~~1439 80~~
		Tillägges c:a 10 %								~~145 20~~
							Summa:	1585	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
⁺² 20-21	102	<u>Sträckan C-K</u> <i>utgår</i>								
		5" tegelrör - m	102	0.80			81	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	102	0.20			20	40		
⁺² 21		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	137	-
		Tillägges c:a 10 %							13	--
							Summa:		150	-
⁺¹⁰ 30-34	410	<u>Sträckan B-E-F-G</u>								✓
⁺⁶⁰ 30-32	260	8" tegelrör - m	260	1.75	455	-				
⁺⁶⁰ 32-34	150	4" " - m	150	0.60	90	-	545	-		
		Grävning, läggning och återfyllning - m	260	0.45	117	-				
		D:o d:o -"	150	0.25	37	50	154	50		
⁺⁵⁰ 30,32,34		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	804	50
		Tillägges c:a 10 %							80	50
							Summa:		885	-
⁺⁶⁰ 40-41	160	<u>Sträckan E-H</u>								✓
		4" tegelrör - m	160	0.60			96	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	160	0.30			48	-		
⁺⁶⁰ 41		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	179	-
		Tillägges c:a 10 %							16	-
							Summa:		195	-
⁺⁷⁴ 50-50	74	<u>Sträckan F-J</u>								✓
		3" tegelrör - m	74	0.40			29	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	74	0.35			25	90		
⁺⁷⁴ 50		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	90	50
		Tillägges c:a 10 %							9	50
							Summa:		100	-
		<u>Sammandrag för Norra området</u>								✓
	395	Sträckan A-B							780	-
	471	" B-C-D <i>utgår</i>							1405	-
	866	Överföres:							1585	-
									780	-
									2990	-
										✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	866	Överfört:							288	
	102	Sträckan C-K <i>utgår</i>							~~2990~~	
	410	" B-E-F-G							150	
	160	" E-H							885	
	74	" F-J							195	
									100	
	1612	<u>Summa:</u>							1960	
									~~4320~~	
		<u>Mellersta området</u>								
+61										
90-92	261	Sträckan L-M								
+10										
90-90	10	Grävning för öppet dike,								
		lera m ³	15	0.80			12	-		
+10 +47										
90 -90	37	4" tegelrör	37	0.60	22	20				
+47 +91										
90 -90	44	5" "	44	0.80	35	20				
+91 +61										
90 -92	170	3" "	170	0.40	68	-	125	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	37	0.50	18	50				
		D:o d:o	44	0.60	26	40				
		D:o d:o	170	0.30	51	-	95	90		
+47+91+61										
90,90,92		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-		
+10										
90		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong					10	-	348	30
		Tillägges c:a 10 %							36	70
							<u>Summa:</u>		385	-
		<u>Södra området</u>								
+30 +66										
60 -62	236	Sträckan N-O-P-R								
+30 +64										
60 -60	34	Grävning för öppet dike,								
		lera m ³	25	0.80			20	-		
+64 +27										
60 -61	63	5" tegelrör	63	0.80	50	40				
+27 +66										
61 -62	139	4" "	139	0.60	83	40	133	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	63	0.35	22	05				
		D:o d:o	139	0.30	41	70	63	75		
60 +64										
		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong					10	-		
+66										
62		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	262	55
		Överföres:							262	55

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							262	55
		Tillägges c:a 10 %							27	45
							Summa:		290	-
+24 70-71	124	Sträckan O-S								
		4" tegelrör	m	124	0.60		74	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	124	0.40		49	60		
+24 71		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	159	-
		Tillägges c:a 10 %							16	-
							Summa:		175	-
+86 80-80	86	Sträckan P-T								
		2" tegelrör	m	86	0.20		17	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	86	0.30		25	80		
+86 80		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	78	-
		Tillägges c:a 10 %							7	-
							Summa:		85	-
		<u>Sammandrag för Södra området</u>								
	236	Sträckan N-O-P-R							290	-
	124	" O-S							175	-
	86	" P-T							85	-
	446	Summa:							550	-
		<u>Sammandrag för hela företaget</u>								
	1612	Norra området							1960	-
	261	Mellersta området							385	-
	446	Södra området							550	-
	2319	Summa:							2.895	-
									5255	-

Hasslum Nolgården den 6 september 1940.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1.

varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,


att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar harvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

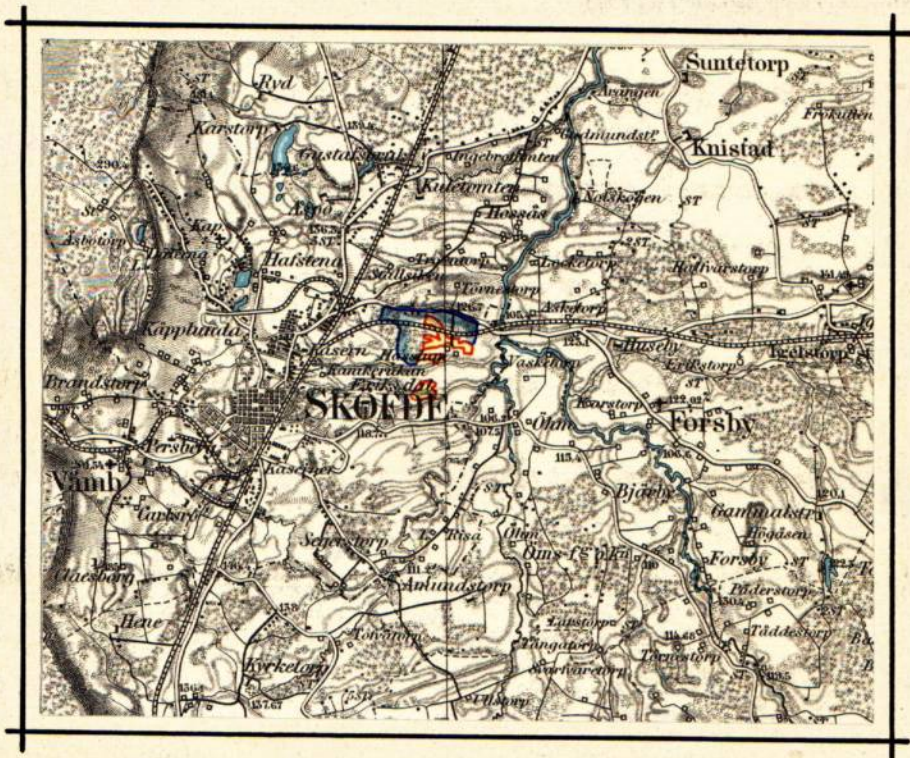
att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att markägaren under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Hasslum Nolgården den 6 september 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
marker, tillhörande Hasslum Nolgården i
Skövde stad, Skaraborgs län.

1. Syneförrättningens omfattning, avdikningsområdenas läge, företags beskaffenhet.

I enlighet med sökandens yrkanden omfattar syneförrättningen
tre avdikningsområden:

Norra området: sträckorna A-B-C-D, C-K, B-E-F-G, E-H och F-J,

Mellersta området: sträckan L-M,

Södra området: sträckorna N-O-P-R, O-S och P-T.

Avdikningsområdena äro belägna cirka 2 km nordöst om Skövde
järnvägsstation inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140.
Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där områdena ut-
märkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörled-
ningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till
"dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Läns-
styrelsens i Skaraborgs län förordnande den 5 juni 1939, har något
laga hinder icke funnits föreligga. Förrättningsmannen finner icke
heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdena har genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	3+44	56 hektar,	vid punkt	H	4.5 hektar
	4+80	48 "		J	0.7 "
	B	4.7 "		K	4.1 "
	6+21	32 "		90+47	2.7 "
	6+86	25 "		90+91	2.1 "
	8+19	21.5 "		M	1.0 "
	C	16.4 "		O	9.0 "
	D	11.6 "		P	4.6 "
	30+50	13.6 "		R	3.8 "
	E	11.5 "		S	3.1 "
	F	4.3 "		T	0.3 "
	G	3.7 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av

Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under anta-

gande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8" rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för 9" rör och större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Företaget omfattar inga bro- eller trumbyggnader.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5255 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningens avslutande.

Vattendomstolsavgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej erläggas.

9. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas, att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1943 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola bestridas av ägaren till Hasslum Nolgården.


11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940".

12. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väs-
terbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I be-
svären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför
och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa
till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exem-
plar.

Hasslum Nolgården den 6 september 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hasslens Nolgårdens Läkingsföretag*
 år 1940 i *Skövde stad*

~~soeken~~ och *Skaraborgs*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	3	0,50			1	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Kopiering tre konceptkontor § 40, skala 1:2000</i>						
				st. 24	0,16		3	84
				har 13,87	0,16		2	22
				Tillägg 25%			1	51
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot-~~ bladet					7	-
		övriga regalark blad	st.					14 57
		Överföres						16 07

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 07
1940 17-18/5		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		24 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 58 ar,	24	0.11	2 64	
		har	13.87	0.12	1 66	4 30
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min. avv.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			X -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	17	0,06	1 02	5 02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.685	3:00	2 05	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.808	3:50	6 33	8 38
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0.12	- 12	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	11	0.25	2 75	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		2 87
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			X -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
20/5		20/5 dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. avv.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " min. avv.		10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	116	0,03	3 48	4 48
		Överföres				95 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				95 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.570	2,50	1 42	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.749	4,00	6 99	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 25	13 66
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	225	0,01		2 25
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	— 90	2 90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
1940	9/9	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	10 —
		slanficka		12,00		
		Beskrivning och inrättning av legionsinrättning	1/2	12,00		6 —
		Lösen för:				
		Summa kronor				162 93
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarkeblad			7 —	
		övriga regalarkeblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: ²⁰⁰⁰ ~~4000~~ , medelareal 58 ar ägofigurer st.	24	0,16	3 84	
		har	13.87	0,16	2 22	
		Överföres			13 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	225	0,02	4 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	116	0,05	5 80	25 11
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,115	2,50	0 28	
		befintligt vattendrag ell. vall "	0,059	3,00	0 17	
		nytt avlopp eller vall "	0,570	5,00	2 85	
		ändring av befintligt avlopp "	1,749	6,00	10 49	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 87	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					19 66	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 91	14 75
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	10/12	12,00	10 -	
						10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						65 96
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphistring av ritningar			3 -	4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar.	3	6,00		18 -
						22 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				162 93
		Lösen för kopior och avskrifter				65 96
		Övriga förrättningskostnader				22 -
						250 89
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till redovisande häradsrätt.

Hasslum den 6 september 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

82/42 *beslag*

GET

D. N. 15 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN FÖREDRAGET

DEN 15 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB. 1949

DIARIE Nr J 855

SAK Nr

cy bek
Undertecknad, ordförande i "Hasslum Nolgårdens df av år 1940" i Skövde stad i Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1949.

Förseeningen har orsakats av brist på arbetskraft.

1/ Utförda äro följande: Hela södra området, och av norra området sträckorna B - E , E - H , E - F , F - I och F - G.

2/ Icke färdiga äro följande: Hela mellersta området och av norra området sträckorna A - B , B - c , C - D och C - K .

Hasslum Nolgården pr Skövde den 10 jan. 1949.

Axel Kjellgren
/Axel Kjellgren/

Ordf.

örning:

*varför ej varför vördsamt för lantbrukare kända
till omf. av begäran om förändring.*

42 / Bida
42

20597

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 OKT. 1943

R 2*0850

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till

Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940

i Skövde stad av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

dag dels medgivit, att sträckorna A-2⁺⁸², B-6-D
och 6-H må utgå ur den fastställda arbetsplanen,
sträckan 2⁺⁸²-4 utföras som öppet arlopp med minskade
dimensioner samt sträckan 4-5⁺³⁵ utföras med minskat
bottendjup, allt på sätt å de fastställda ritningarna
angivits med grön beteckning, dels och föreskriver, att
det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas
från 2.650 kronor till 1.480 kronor.

Stockholm den 28 oktober 1949.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

Avskrift.

Avskrift

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till eftermättnas och arbetets utförande med tillägg, att vid arbetens utförande skall iakttagas vad Kungl. Jämningsstyrelsen i skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 oktober 1942 föreskrivit.

Stockholm den 24 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Ljungh

Bestyrkes: Ljungh

[Signature]

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940" i Skövde stad av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdena äro belägna cirka 2 km nordöst om Skövde järnvägsstation. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 6 september 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna
(Följande följande text)

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i förrättningsmannens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1943.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 6 september 1940 /se synehandlingarna/, har sökanden till företaget förklarat sig vilja ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Tabellen /Bil. IV/ utvisar varje samfällighets andel i företaget ävensom i statsbidraget.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga IV utvisar, statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med 2650 kronor.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Tabell, utvisande varje samfällighets andel i företaget ävensom i statsbidraget.

Avskrift.

Avskrift. Dnr. 19785/42

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ang. Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 september 1942 rörande Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940 får järnvägsstyrelsen meddela, att intet synes vara att för statens järnvägars vidkommande erinra mot företaget. Vid anläggningens utförande bör dock baningenjören i Falköping lämna sitt medgivande, innan några arbeten igångsätts inom statens järnvägars område.

Hit remitterade handlingar återgå härjämte. Stockholm den 7 oktober 1942.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.


Jakob Lundberg.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

I Kungl. Lantbruksstyrelsen

L. Bisther.

Bestyrkes i tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

3

Bilaga V. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakter, bestående av 1 häfte
handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 15 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnader

289:-
5255:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen

250:89

Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd

43:90

294:79

Summa kronor:

3.189:79
5549:79

Skara den 15 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Rosberg E.

Vid arbetsplanens föreställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.549:79 kronor.

Stockholm den 24 november 1942

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Alber E. Smith

Bestyrkas i tjänsten
Sten E. Öfverholm

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 3.189 kronor 79 öre.

Stockholm den 28 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

REDOGÖRELSE

för Hasslum Nolgårdens diknings- företag av år 1940
i Skövde stad sock
av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Mellersta området

Åker 0.86 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 0.86 har

Markens blivande värde i medeltal kronor pr har

" " " högst " " "

Båtnaden har uppskattats till 410:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 385:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 6 sept. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Kjellgren

Adress: Hasslum Nolgården, Skövde

Anm.:

.....
.....
.....
.....
.....

Skara den 25 oktober 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

REDOGÖRELSE

för Hasslum Nolgårdens diknings- företag av år 19 40
 i Skövde stad ~~mark~~
 av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Norra området

Åker 6.65 har
 Äng och odlingsmark "
 Annan duglig mark "
 Tillsammans 6.65 har

Markens blivande värde i medeltal kronor pr har

" " " högst " " "

Båtnaden har uppskattats till 4593:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 4320:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 6 sept. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Kjellgren

Adress: Hasslum Nolgården, Skövde

Anm.:

Skara den 25 oktober 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

REDOGÖRELSE

för Hasslum Nolgårdens diknings- företag av år 1940
 i Skövde stad ~~XXXX~~
 av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Södra området

Åker 3.78 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 3.78 har

Markens blivande värde i medeltal kronor pr har

" " " högst " " "

Båtnaden har uppskattats till 1134:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 550:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 6 sept. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Kjellgren

Adress: Hasslum Nolgården, Skövde

Anm.:

.....

Skara den 25 oktober 1940

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

8

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 6 september 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Nolgården Hasslum i Skövde stad /Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 19 november 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Skövde stad</u>							
			Hasslum Nolgården	Axel och Evert Kjellgren						
				Norra området	6	65				
				Mellersta området		86				
				Södra området	3	78				
				<u>Summa:</u>	11	29				

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Hasslum Nolgårdens dikningsföretag av år 1940" i Skövde stad av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sidor à 3:- kr	12:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	10:65
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödet storlek	2:-
Tabell, utvisande varje samfällighets andel	3:20
Avskrift av betänkandet med bilagor, 11 sidor à 0:55 kr	6:05
Inhäftning, två band	2:-
Ansökningshandling och expedition	<u>5:-</u>
Summa kronor:	<u>43:90</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande rätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 15 november 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

