



Akt nr:
R-E1a-1121

AU\$R-E1a-1121

R 2-1121

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1947

till

Dykärns dikningsföretag av år 1945 i Habo socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag med sjuhundranittio (790)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt

en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning

år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha

undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman

för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950, 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

K. W. —

Dykninggårdskälen den 14 Augusti 1948
Knut Wangsten

Att Lantbrukaren Knut Wangsten,
Dykninggård, Flabo,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Vakka d Karlson
Adress Dykning Flabo

Ingemar Klang
Adress Dykning Flabo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 juni 1951.





På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund


Dykärrens dikningsföretag av år 1945

i Håbo socken av Skaraborgs län
Förslaget upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av

Statens a. lantbruksingenjör

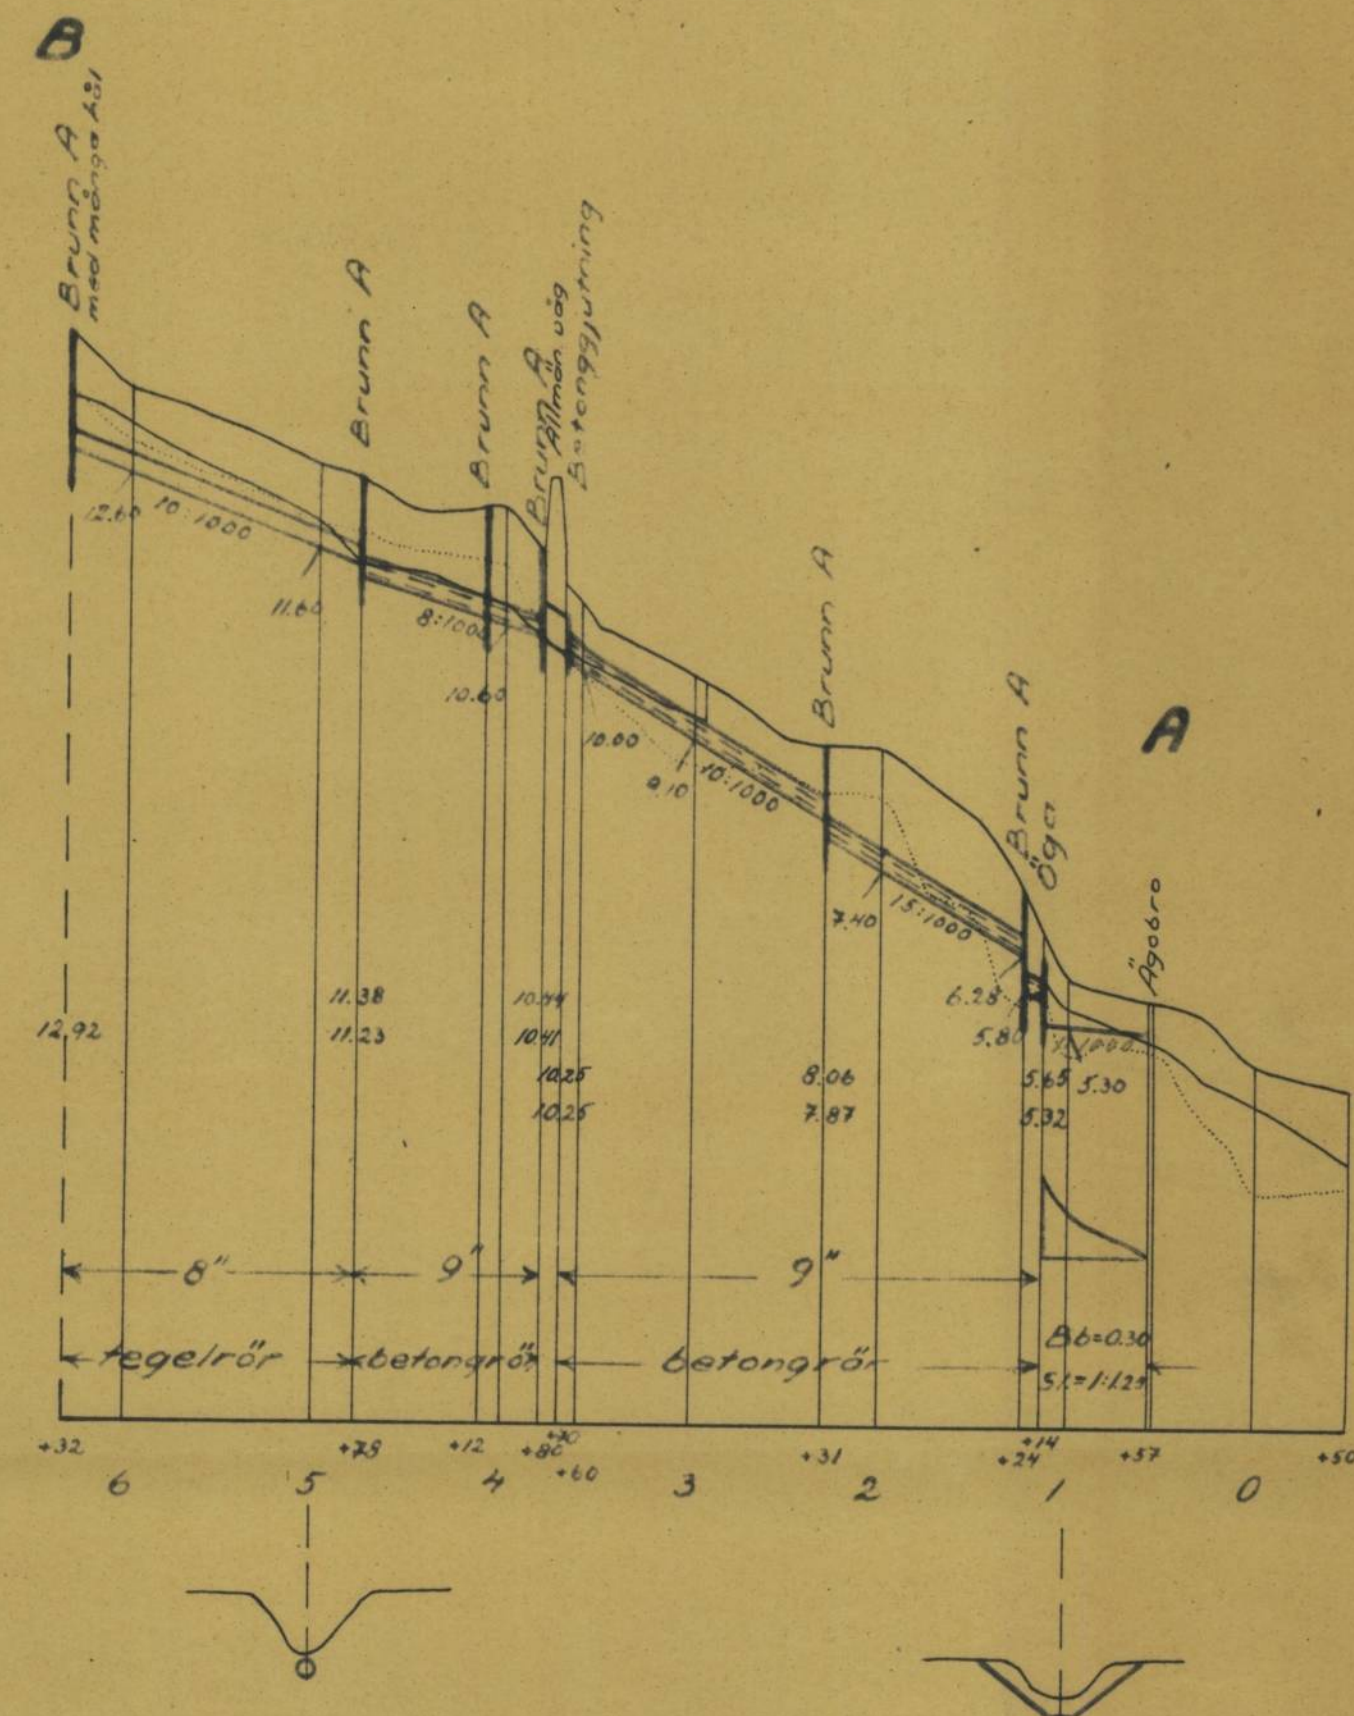
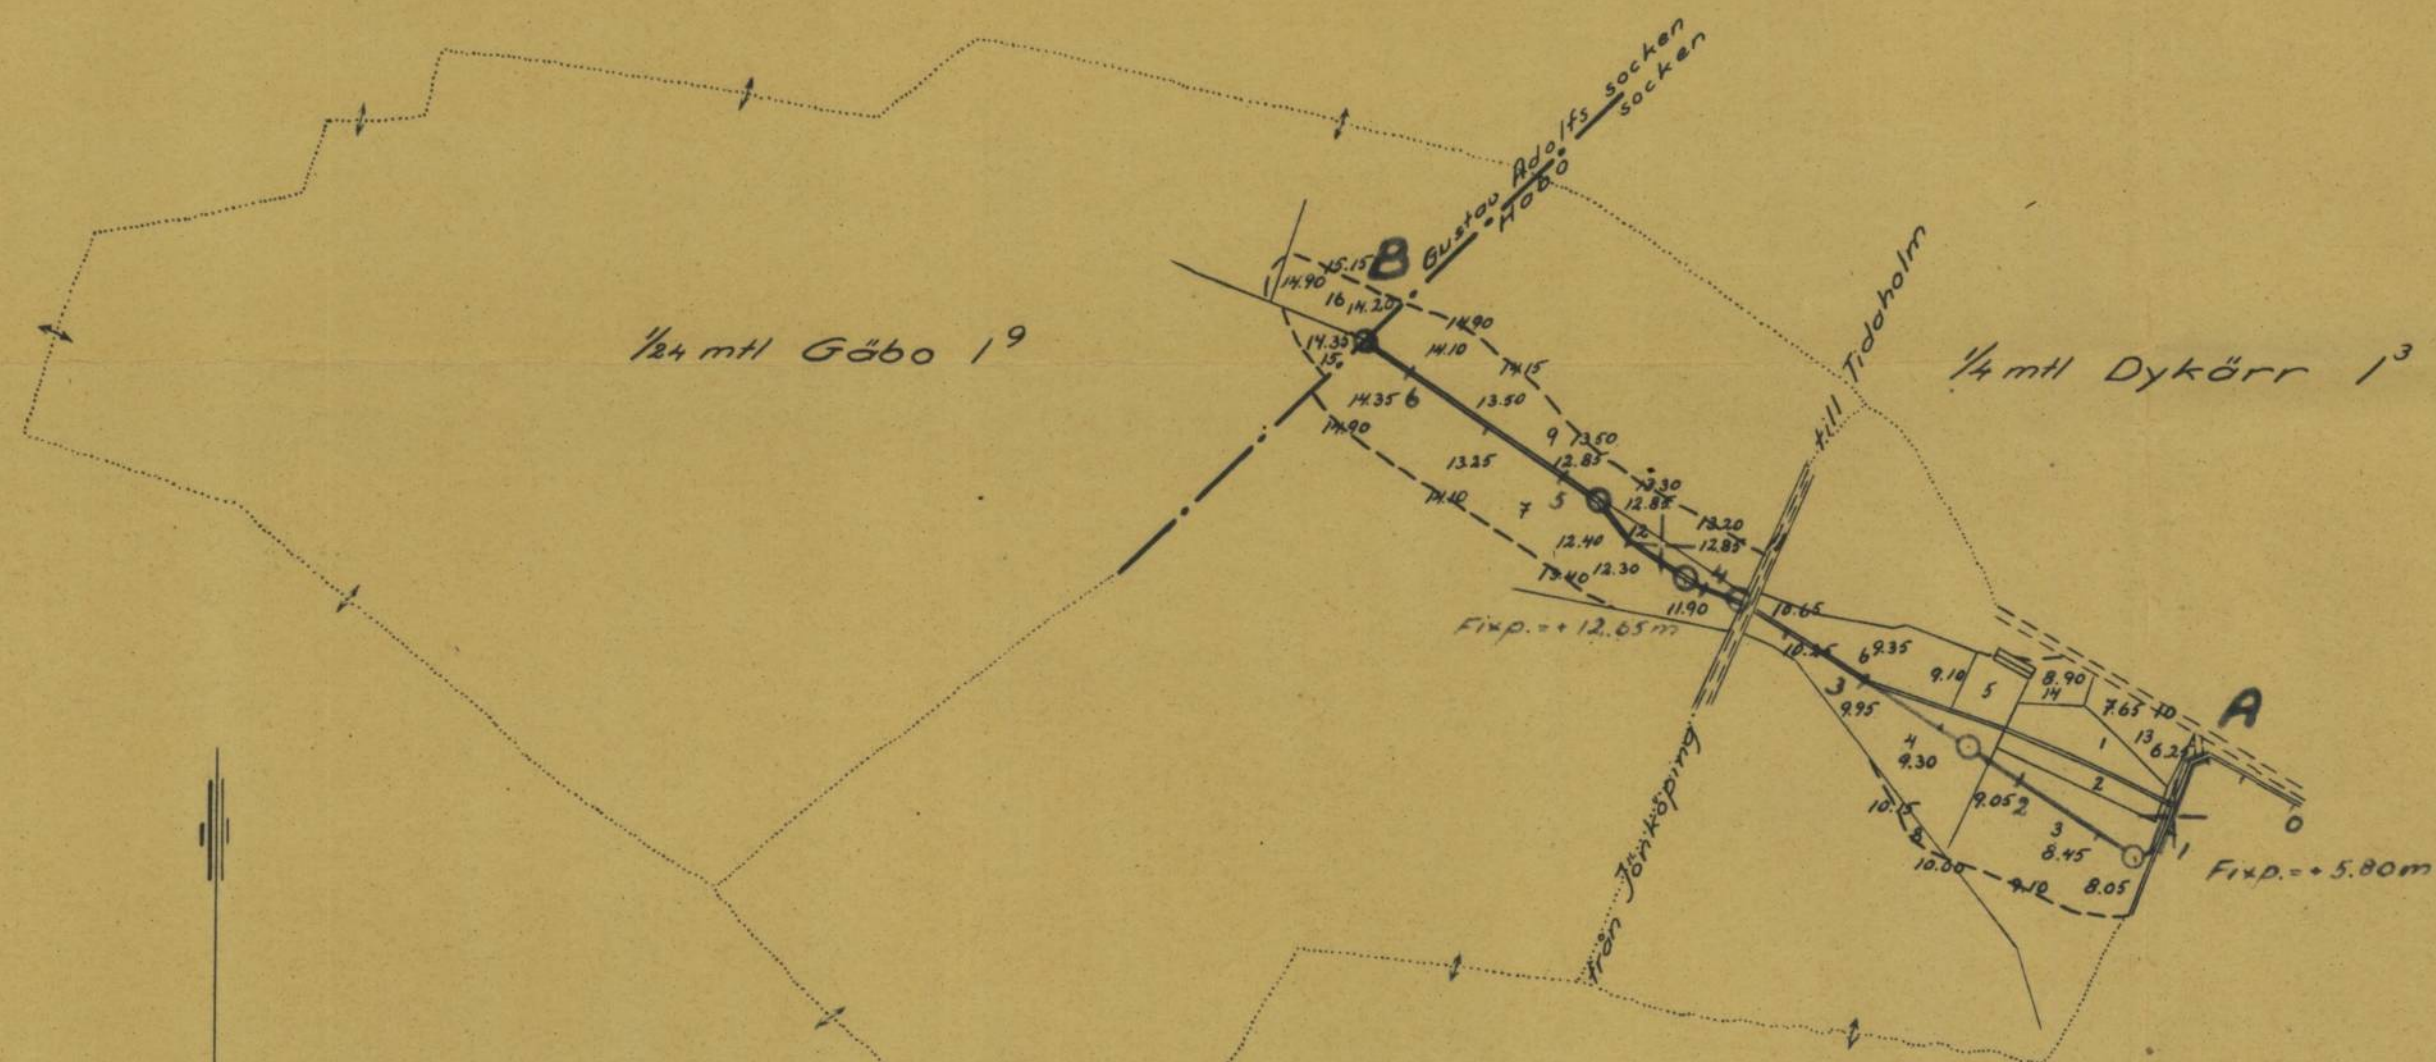


Typritningar
Skala 1:50



Betonggjutning vid 3⁺⁷⁰

Brunn typ A

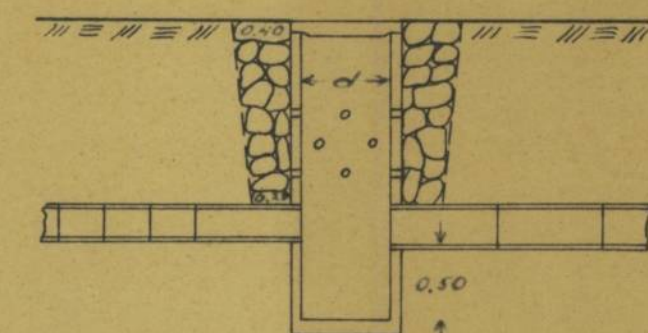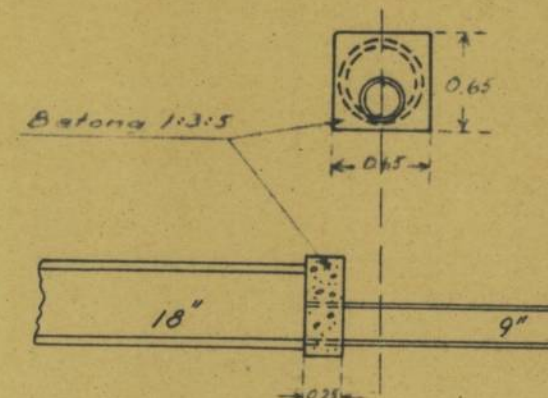

Lock och botten av betong

R-E 7a-1121 (1)

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>"Dykärrs dikningsföretag av år 1945".</u>				
		<u>Sträckan 0+60 - 2+23 .</u>				
		<u>Ändringsförslaget .</u>				
1+40-2+23	83	Schaktning av sandjord m ³	80	1:50	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			20:--	140:--
		<u>Ursprungliga förslaget.</u>				
0+60-1+14	54	Schaktning av dy och sand m ³	25	1:20	30:--	
1+14-2+23	109	9" betongrör	109	2:65	288:85	
1+14-1+24	10	Grävning, läggning och återfyllning m	10	0:75	7:50	
1+24-2+23	99	- " - "	99	0:90	89:10	415:45
		Arbetsledning och oförutsett				44:55
						460:--
Enligt vid ursprungliga förslagets upprättande använda Å-priser skulle						
Ändringsförslaget bli 320:-- kr billigare.						
Skara den 1 juni 1951.						
(Sven Hallin)						
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.						

V

Beträffande Dykärs dikningsföreläggningen år 1945.
i Håbo socken av Skaraborgs län

Beräknade kostnader enligt förelagt.

Sträckan 0+50 - 2+23

0+50 - 1+14 Inaktning för öppet dike av:

54m

dyjord sand m³ 25 à 1,20 30:-

1+14 - 2+23 9" betongrör

109m

m¹ 109 à 2,65 288:85

1+14 - 1+24 Grävning, lägg öksfylln m¹ 10 à 0,75

10m

7:50

1+24 - 2+23 Dito

m¹ 99 à 0,90

89:10

Σ 415:45

Sträckan 1+50 - 2+23

1+50 - 2+23 = 73

$$\frac{2,16 + 0}{2} \times 73 = 78.84 \approx 80 \text{ m}^2$$

$$80 \times 1.5 = 120 \text{ kronor.}$$

415:45

120: —

295:45 kronor.

Alltså skulle ändringen förbättra företaget
 med 295:45 kronor, räknat efter förelagda priserna.
 Hirs förksamhet råder dock huruvida jag vill rätta
 m³ pris för sträckan 1+50 - 2+23; 1,5 kr/m³ har jag erhållit
 genom att jämföra pris för dyjord sand 1,2 kr/m³ med grävning, lägg öksfyll
 à 0,75 kr/m¹ samt gräv. lägg öksfyll à 0,90 kr/m¹.

Värje i april 1945 A. J.

Deris ✓
RAPPORT

Koncept.

över verkställd

ansynning

Företag:

Dykärs dikningsföretag av år 1945
i Höbo socken ^(namn, socken och län) av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

Lantbr. Knut Wangström, Dykärsgård,
Höbo

Arbetsplanen fastställd den

29 december 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

790:-

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

1 september 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

" - 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av

ass Eskil Olsson

den

3 nov 1950

, har befunnits att

företaget utförts

enl. den fastställda arbetsplanen med undantag
för sträckare medströms sekt 3, som ^{för} mark-
ägaren begärts anslutad i plan och sprösk. Kustlinjen
är med grön färg införd i ritningen. Skapats
brunnar vid sekt 4+12 har ^{för markägarens förmåga} ~~brunnar~~ byggts
Beräknad betruad ^{med 60:- kr.} ~~minskar härigenom~~
Företaget förordas till godkännande i
befindligt skick.

De verkliga kostnaderna ha över-
stigit de beräknade.

Skara den 9/1 1951
E. Hjertqvist
[Signature]

R 2*1121

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L. Brattin

Avskrift.

37-47 Bidrag

Betänkande

ifråga om statsbidrag till
Dykärns dikningsföretag av år 1945
i Habo socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1945 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

dels medgivit, att företaget må utföras med den ändring,
som angivits i en av lantbruksingenjören T. Hallin den
9 januari 1951 utfärdad ansyningsrapport på sätt, å den fastställda
ritningen angivits med grön biterkning, dels också förskrivit,
att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från
790 kronor till 650 kronor.

Stockholm den 22 juni 1951.

Enligt uppdrag
H. Forsman.

Avskrift.

Anskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid allmogets utförande.

Stockholm den 29 december 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Puga Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsbidrag från statens avdikningsanslag till "Dykärns
dikningsföretag av år 1945" i Habo socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget inom sektion Vättern av nederbörds-
området 67. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande
översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd
av avloppets alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt
grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet
till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 8 juni 1945 avslutad syneförrättning enligt vatten-
lagen. Besvär mot syneförrättningen hava icke anförts /Bil. II/.
Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget
lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från näm-
den.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
(Forts. se följande sid.)

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m. äro närmare angivna i förrättningsmannens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Aktförvarare: Knut Wangström, Dykärr, Habo.

Beslut angående ansökning om statsbidrag.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 8 juni 1945 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med 1.180:- kronor.

Täckdikning av de i företaget ingående markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Söderbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande beslut angående ansökning om statsbidrag.

" V. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget och i statsbidrag.

" VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakten, vilken består av 1 häfte handlingar samt antingen 2 blad originalritningar eller också 1 blad kopia av ritningarna.

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A GTorrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

1.820:-

~~2.240:-~~

Ersättningar

1.820:-

~~2.240:-~~Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

155:06

" " utredning angående statsunderstöd

34:30

189:36

Summa kronor:

2.009:36

~~2.429:36~~

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Auskuift

Tid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.429 kronor 36 öre.

Stockholm den 29 december 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören

i Skaraborgs län

Kjell Johansson

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 2.009 kronor 36 öre.

Stockholm den 22 juni 1951

Enligt uppdrag
G. Forsman

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 juni
1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dykärns
dikningsföretag av år 1945" till Dykärns gård, Habo socken, Skara-
borgs län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 17 november 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov gm stpl 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor: 2:-

e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.p.b.

REDOGÖRELSE

för Dykärns diknings- företag av år 1945
 i Habo socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	0.89	har
Äng och odlingsmark	2.46	"
Annan duglig mark	0.20	"
Tillsammans	3.55	har

Markens blivande värde i medeltal 1100 kronor pr har
 " " " högst 1600 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2515:60 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 2240:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av dyjord på sand och grus

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 8 juni 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Knut Wangström

Adress: Dykärn, Habo.

Anm.:

Skara den 27 juni 1945

Ernst Öfverholm.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Dykärrs dikningsföretag av år 1945 i Habo socken av Skaraborgs län.

Närvarande; undertecknad och

Knut Wangström, Dykärr,

Emil Johansson, Gäbo.

§ 1.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 2.

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 1 omförmälda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras, att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat, att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå till företagets genomförande samt att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 3.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Dykärr den 8 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1/4	1 ³		<u>Habo socken.</u>							
			Dykärr	Knut Wangström	- 70		2 59		3 29	
1/24	1 ⁹		<u>Gustav Adolfs socken.</u>							
			Gäbo	Emil Johansson	- 19		- 07		- 26	
				<u>Summa:</u>	- 89		2 66		3 55	

företaget ävensom beräknade bidrags- ~~och låne~~ belopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2.405	-	2.141	44	148	24	32	79	2.322	47	0.97	48.95	1.128	08	-	-
110	60	98	56	6	82	1	51	106	89			51	92	-	-
2.515	60	2.240	-	155	06	34	30	2.429	36			1.180	-	-	-

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande angående statsbidrag till "Dykärns dikningsföretag av år 1945" i Habo socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sidor à 3:- kr	9:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande beslut angående ansökning om statsbidrag		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel		2:80
Avskrift av betänkandet med bilagor	9 sidor à 0:55 kr	4:95
Inhäftning, 2 band		2:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>
Summa kronor:		<u>34:30</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



31052

R 2-1121

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturskolebyrås arkiv

37-47 Bidrag
Handlingar angående

Dykärres dikningsföretag av år 1945

i Habo socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1945 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark till-
hörande Dykärrs gård i Habo socken av
Skaraborgs län.

Den 8 juni 1945.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 16 hos Knut Wangström, Dykärrs
gård, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända.

Till sammanträdet hade tillstädeskommit:

Knut Wangström, Dykärr,

Emil Johansson, Gäbo.

§ 1.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade för-
slaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna
samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 2.

Sakägarna undertecknade föreningsskrivelse /Bil. 3/.

§ 3.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och
utlåtandet /Bil. E/.

§ 4.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas
fördelning.


§ 5.

Till företagets förtroendeman utsågs lantbrukaren Knut Wang-
ström, Dykärrs gård, Habo, vilken även fick i uppdrag att mottaga
och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.



§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Dykärrs gård den 8 juni 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras:

PD. 63-152
1943



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... få 8 härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dykåns gård i Åbo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Åbo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Arnt Wangström
adress Dykåns
pr Åbo
Telefon: Åbo 17 a.

Åbo den 30/7 19 43
Arnt Wangström

Jag förklarar vördsamt att i fråga om förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör B. Överholm, Åbo.

Åbo den 3 aug. 1943

B. Överholm

Stats lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Låbo Östergård, S. Rödskocken
Dykarn

Emil Johansson
Rune Wangeborn

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


D.D. n:r 63 - 152
1943

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införfäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 augusti 1943.


Carl Mannerfelt.


Leo Wohlstein

Utan avgift.

F Ö R E N I N G

Undertecknade, delägare i det företag, som avser förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Dykärr 1³ i Habo socken och Gäbo 1⁹ i Gustav Adolfs socken av Skaraborgs län, hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1./ Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av ifrågavarande marker i full överensstämmelse med den plan och det förslag, som upprättats av lantbruksingenjör E. Öfverholm.

2./ Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3./ Kostnaderna för företagets utförande ävensom underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som angivits i kolumn 16 i kostnadsfördelningslängden /Bil. D/.

Efter samma grunder skall ock fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4./ Ingen ersättning för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skall utgå.

5./ Arbetena skola vara fullbordade senast den 1 september 1950.

Sålunda överenskommet försäkras.

Dykärr den 8 juni 1945.

Thut Wangström
.....

Leone Johansson
.....

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig, intygas å tjänstens vägnar.

[Signature]
.....
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga A.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{4}$	13		<u>Habo socken</u> Lykärn	<u>Knut Wangström</u> skog " odlingsmark, dyjord på sand " " " " " äker, dyjord på sand o. gräs " " någ " impediment odlingsmark, förb ij " " <u>Summa:</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
$\frac{1}{24}$	19		<u>Gustav Skalls socken</u> Gäbo	<u>Emil Johansson</u> skog äker, dyjord på sand o. gräs <u>Summa:</u>	15 16
$\frac{1}{4}$	13		<u>Sammandrag</u> Lykärn	<u>Knut Wangström</u>	
$\frac{1}{24}$	19		Gäbo	<u>Emil Johansson</u> <u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						07		100	7	-	200	14	-	100	7	-
						06		"	6	-	"	12	-	"	6	-
		60						220	132	-	1000	600	-	780	468	-
		50						310	155	-	"	500	-	690	345	-
		10						160	16	-	"	100	-	840	84	-
		29						"	46	40	"	290	-	"	243	60
		97						380	368	60	"	970	-	620	601	40
04								1520	60	80	1600	64	-	80	3	20
66								620	409	20	"	1056	-	980	646	80
						08										
						10										
						07										
						15										
						08										
70	2	46		13		48		1201	-		3606	-		2405	-	
						07		240	16	80	300	21	-	60	4	20
19								1040	197	60	1600	304	-	560	106	40
19						07			214	40		325	-		110	60
70	2	46		13		48		1201	-		3606	-		2405	-	
19						07			214	40		325	-		110	60
89	2	46		20		48		1.415	40		3931	-		2515	60	

Dykare den 8 juni 1945
 Statens e. lantbruksingenjör

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+69 +32 0 - 6 +60 +14 0 - 1	572	<u>Sträckan A-B.</u>								
	54	Schaktning för öppet dike								
		av: dyjord och sand m ³	25	1.20			30	-		
+78 - 4		9" betongrör m	354	2.65			938	10		
+32 - 6		8" tegelrör "	154	2.30			354	20		
+14 +24 1 - 1		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	10	0.75	7	50				
+31 - 2		D:o "	107	0.90	96	30				
+95 - 2		D:o "	64	0.65	41	60				
+70 - 3		D:o "	75	0.40	30	-				
+80 +78 3 - 4		D:o "	98	0.60	58	80				
+32 - 6		D:o "	154	0.70	107	80	342	-		
+14 1		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong					20	-		
+24 +31 +80 1, 2, 3		Brunn typ A, d=0.60 m	5	50:-	250	-				
+78 +12 4, 4		" " A, d=0.45 m	1		40	-	290	-		
+32 6		Betonggjutning enligt ritning					20	-	1994	30
+70 3		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges								
									245	70
							Summa:		2240	-
									420	-
									1820	-

Dykärr den 8 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

H. Le lantbruksingenjör's Hallens bestandsförslag av den 1 juni 1951,
med tillägg att brunnarna vid 4^{1/2} och 1^{1/2} kostnad 100 kr. även
skola utgå ur arbetsplanen.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i ^{förrättnings-}mannens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företags utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att betongrören till företags rörledning godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningen skall kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i ledningen utan endast i brunnarna.

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företags brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full


överensstämmelse med till förslaget hörande ritning,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimi-
storleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaf-
fas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild
överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fix-
punkter:

Fixp. = + 5.80 m, såsom ring i block 4 m höger 0+91

Fixp. = + 12.65 m, såsom ring i jordfast sten 7 m vänster 4+32.

Dykärr den 8 juni 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Flabo socken</u>				
$\frac{1}{4}$	1 ³		Lykäv				
			Knut Wangshäm sök.				
			<u>Gustav Adalfo socken</u>				
$\frac{1}{24}$	1 ⁹		Gäbo				
			Emil Johansson				
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.405:-						2.141.44	95.60	148.21			
110:60						98:56	4.40	6:82			
2.515:60						2.240:-	100.00	155:06			
Dyckär den 8 juni 1945 Karl Erik Eriksson Statens e. kontrolleringsgrupp											

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Dykärr i Habo socken av Skaraborgs län.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget inom sektion Vättern av nederbördsområdet nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av den på ritningarna med bokstäverna A - B betecknade rörledningen, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Vattensamlingsområdet utgöres

vid punkt	1+24	av	41.2	hektar,
	2+31	av	38.8	"
	3+80	av	34.8	"
	4+78	av	30.6	"
	B	av	19.8	"

Rörledningens dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har uppskattats med hänsyn till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning. Dessa värden hava angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna samt ägofigurernas nuvarande och blivande värden.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift varom förmä-

les i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppets färdigställande till 2.240 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget. Några ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola icke utgivas.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger deltagningsskyldigheten såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättnings avslutande, men fördelas på delägarna i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

Några allmänna intressen synes ej komma att beröras av företaget.

Något laga hinder mot förrättnings handläggning eller företagets utförande hava ej anförts eller kunnat utrönas.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget,

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med dikningsförslaget,

att till rörledning och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.


Företagets namn skall vara "Dykärns dikningsföretag av år 1945".

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Dykärn den 8 juni 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Dykårens dikeuing*
förestag år *1945*
i *Habo* socken av *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 2		0,50			1	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 0.4		3,00	1	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje " 0.8		6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.30 ha st 3		0.24		72		
		ha 0.89		0.78		69		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.49 ha st 5		0.18		90		
		ha 2.46		0.58		142		
		annan mark och impediment, medelareal 0.08 ha st 8		0.05		40		
		ha 0.68		0.78		53		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					14	66
		Överföres					15	66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				15 66
		Avvägning.				
1944	12 sept	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr ha	3.55	0.50	1 74	
		avvägda punkter	37	0.03	1 11	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.8	2,00	1 60	
		i annan mark		5,00		10 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.25 ha, ...	16	0.05	80	
		ha	4.03	0.10	40	1 20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	23	0,06	1 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	11	0,12	1 32	6 64
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.2	3:-	60	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.5	3.50	1 75	2 35
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	3	0.25	50	
		"				
		"				50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1944	13 sept	dagar	1/4	12,00		3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	14	0,03	42	1 42
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				60 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 75
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. arr "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 24	6 24
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	37	0,01		37
		Översiktskarta, § 41				4 06
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	2	0,30	- 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
		Utlåtande, § 45 sid	3	3,00		9 -
1945 8 juni		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
1945 6 april		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 1 typ "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning behållningsutrustning "	1/3	12,00	4 -	
		slamficka "		12,00		
						7 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				101 02
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.25 ha, ägofigurer st	16	0.07	1 12	
		ha	403	0.14	56	
		Överföres			8 68	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	37	0,02	74	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	14	0,05	70	11 87
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall	0.10	3:-	30	
		nytt avlopp eller vall	0.18	5:-	90	
		ändring av befintligt avlopp	0.34	6:-	2 04	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					3 74	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			93	2 81
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slanficka <i>betonggjutning</i> "	7 1/2	12,00	7 -	
						7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	16	0,55		8 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 06
		Summa kronor				34 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		^{3.50} Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 50	4 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. <i>Dagar 1 1/4</i>			15 -	
						15 -
		Sammandrag.				
						19 50
		Förrättningsmannens arvode				101 02
		Lösen för kopior och avskrifter				34 54
		Övriga förrättningskostnader				19 50
		Summa kronor				155 06

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Vartofta* häradsrätt.

Dykens gård den *8 juni* 19*45*

[Signature]
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras :


den 19.....

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'

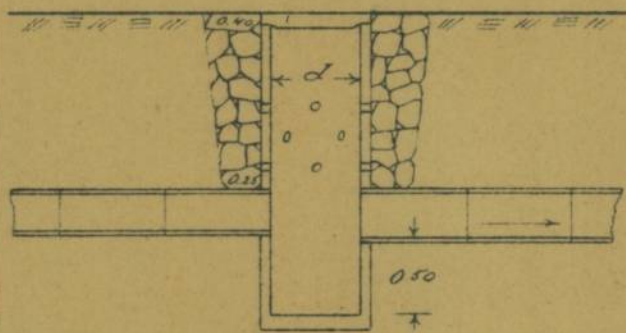

Lock och botten av betong


Brunn typ B

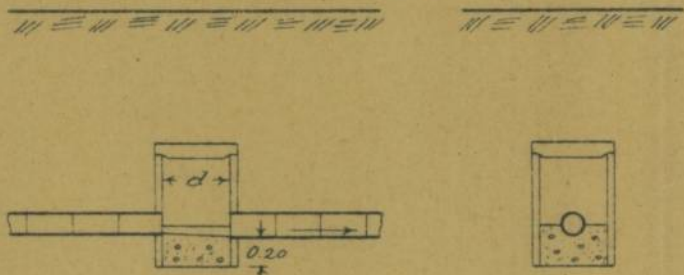

Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varin en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag

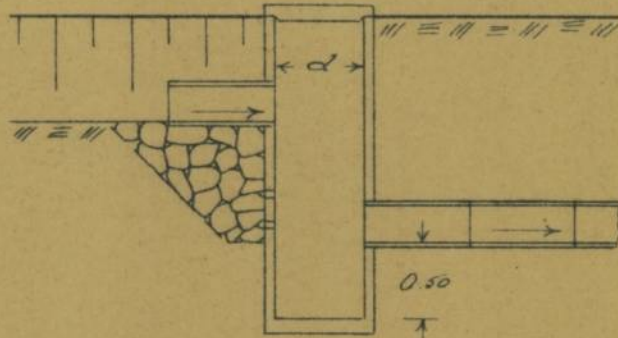


Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp

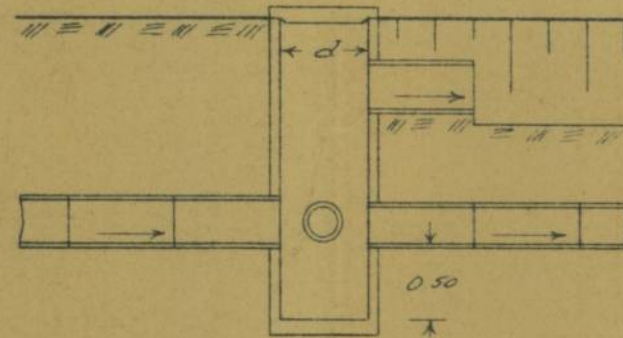


Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'

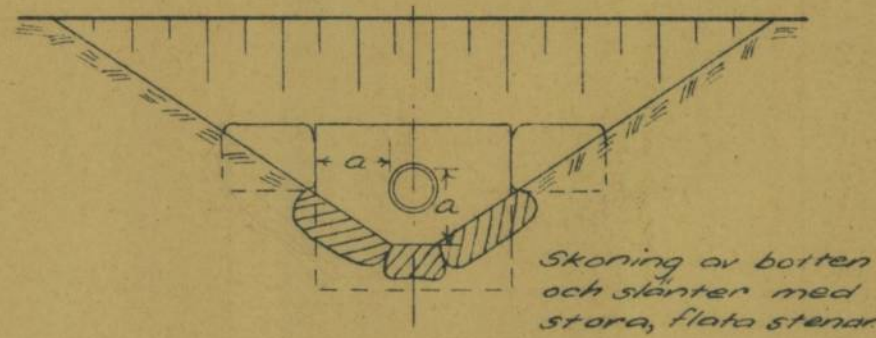


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'

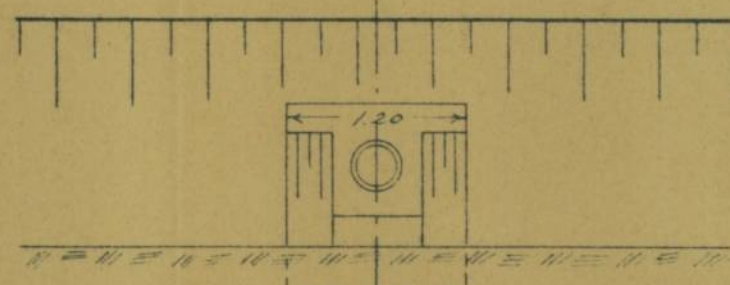


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

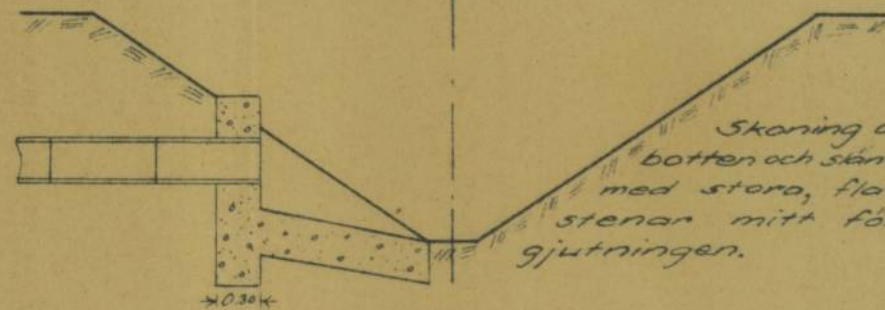


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A²

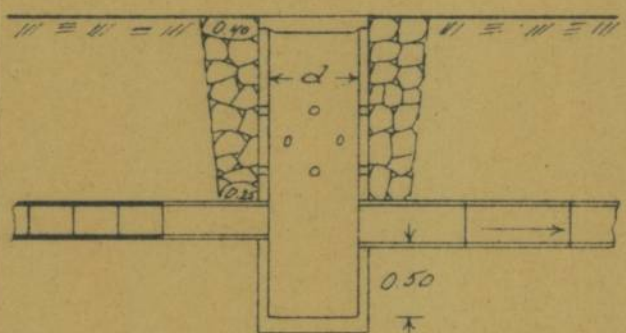


Lock och botten av betong

Brunn typ C

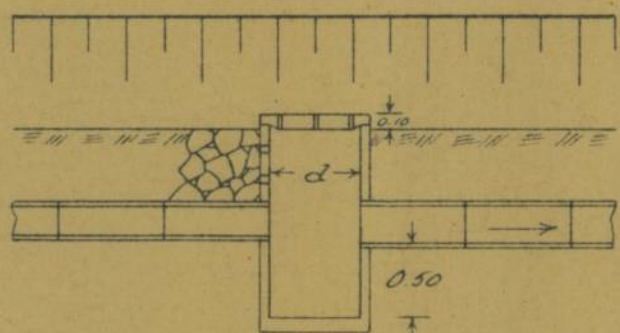


Lock och botten av betong. 13 st 30 m/m hål eller ett stälträdssnät i locket.

Betonggjutning typ A²

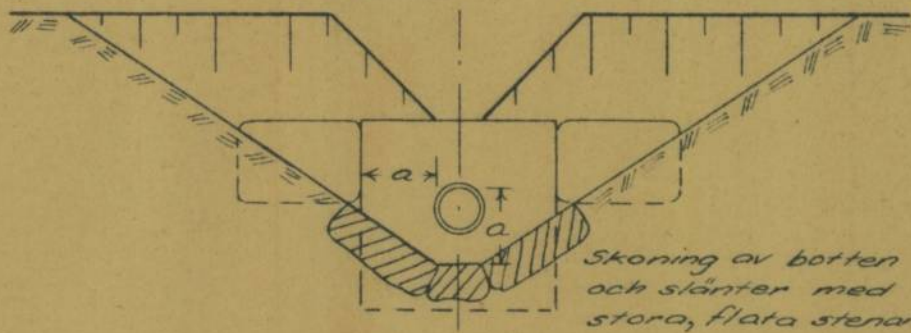


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²

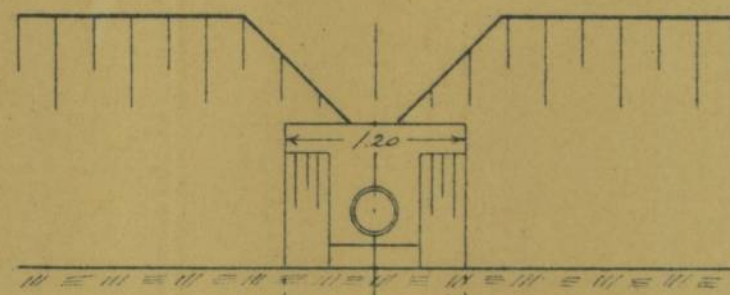


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

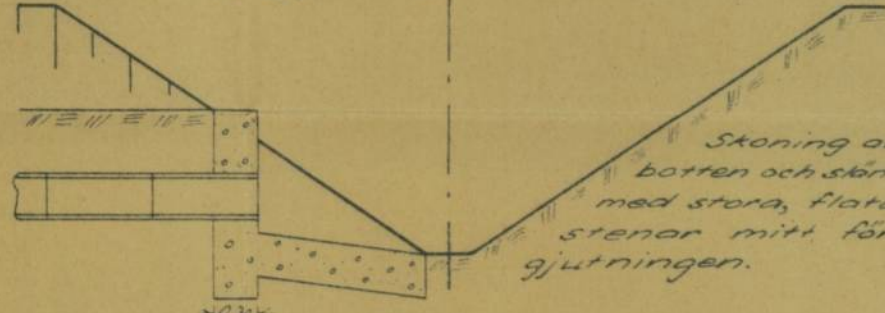


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A³

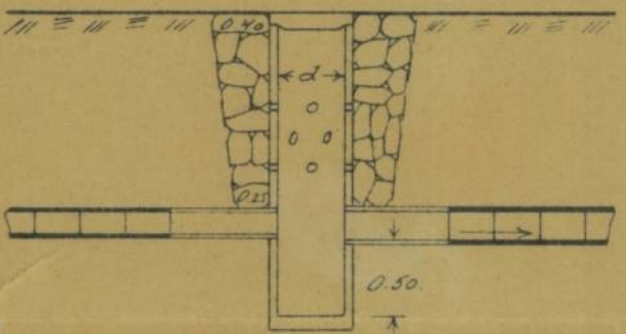


Lock och botten av betong

Brunn typ D

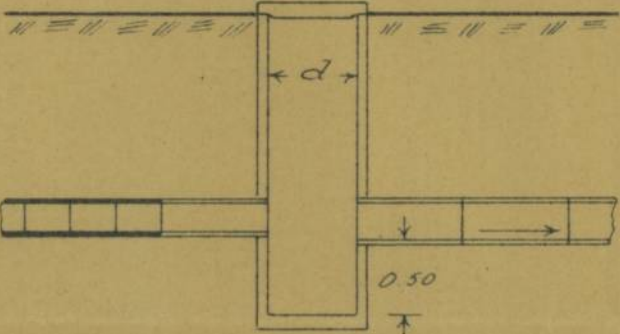


Lock och botten av betong


Rörtrumma typ A'

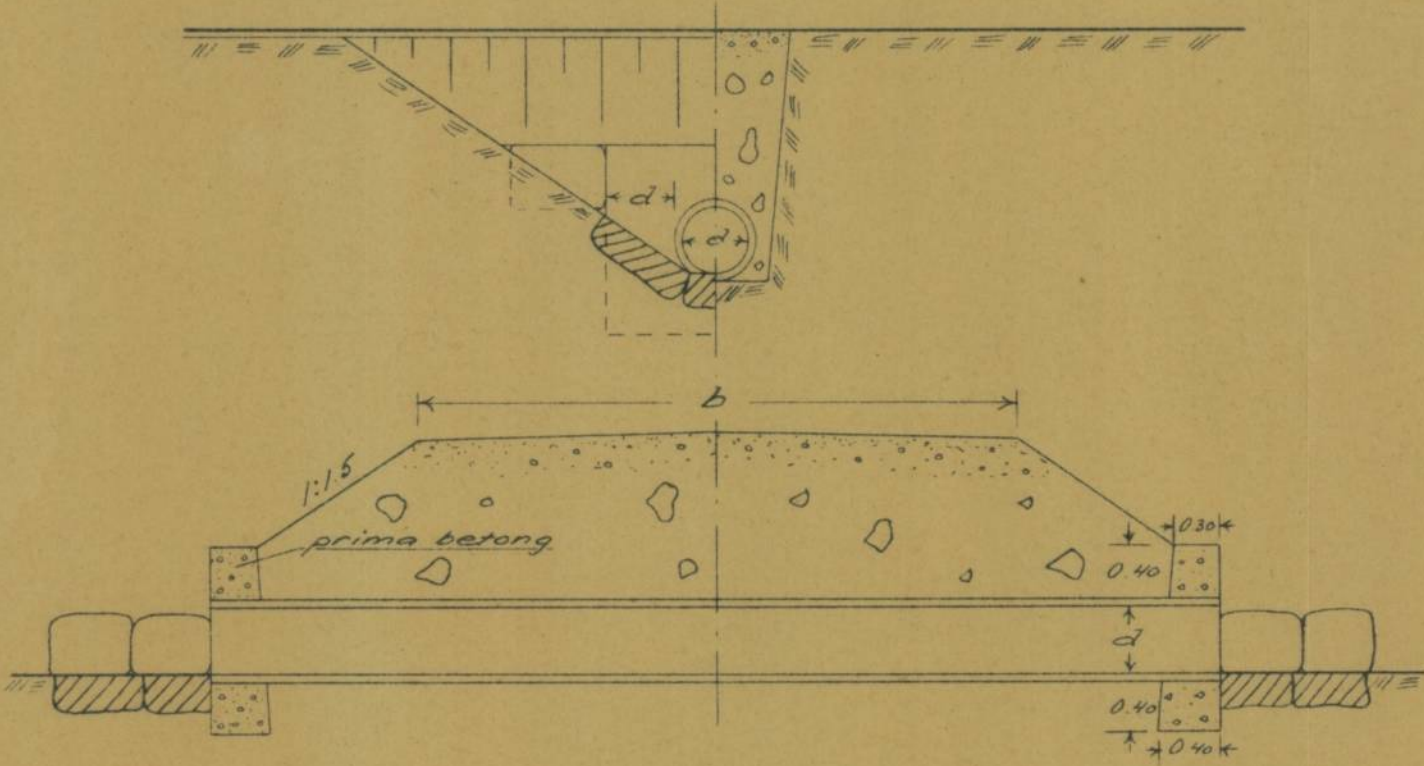


Rörtrumma typ B

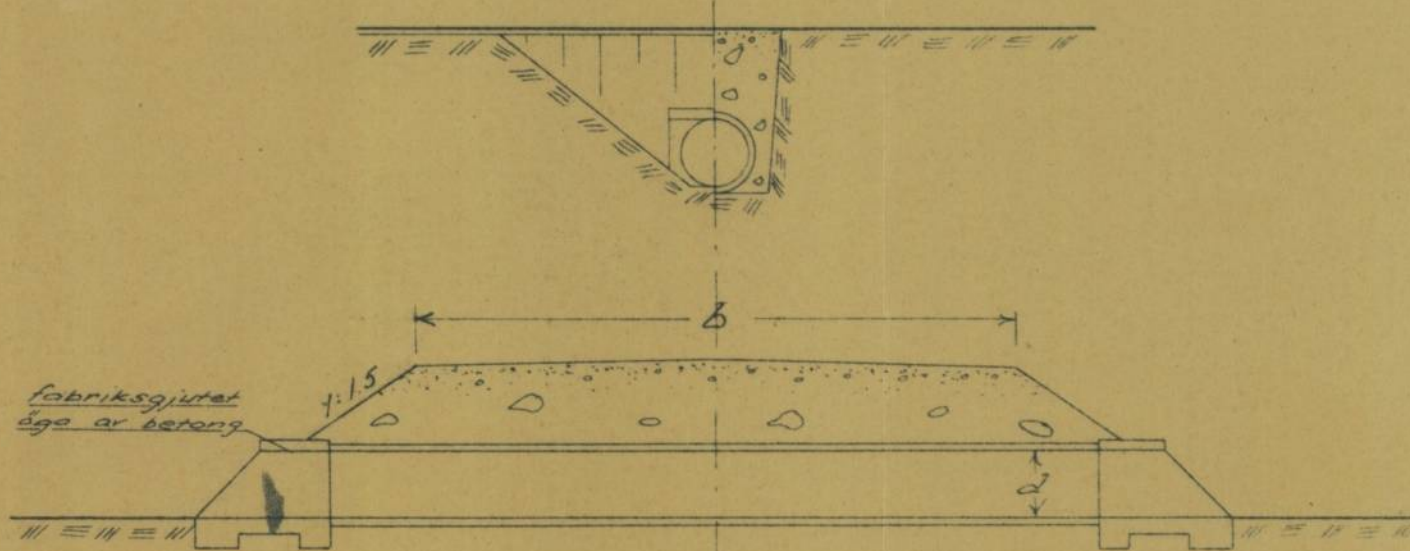

Rörtrumma typ A²

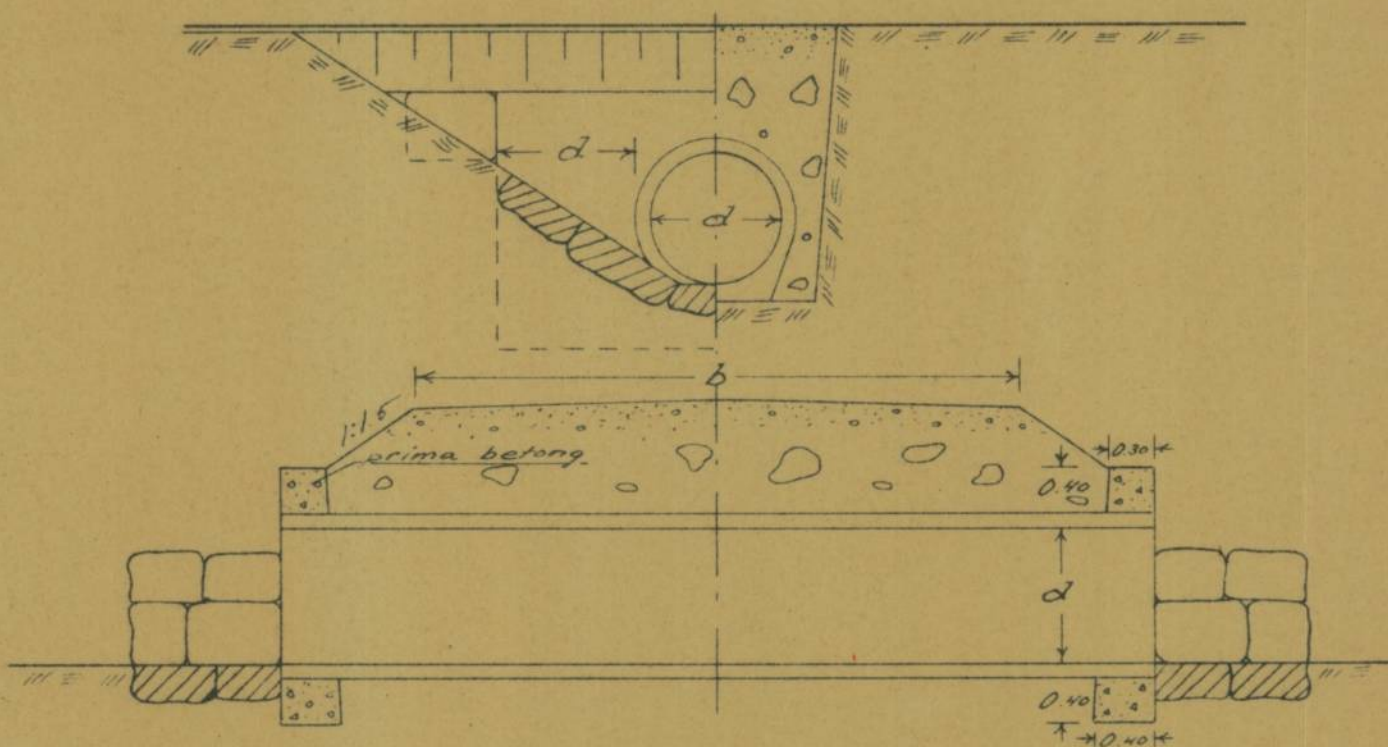

Rörtrumma typ C

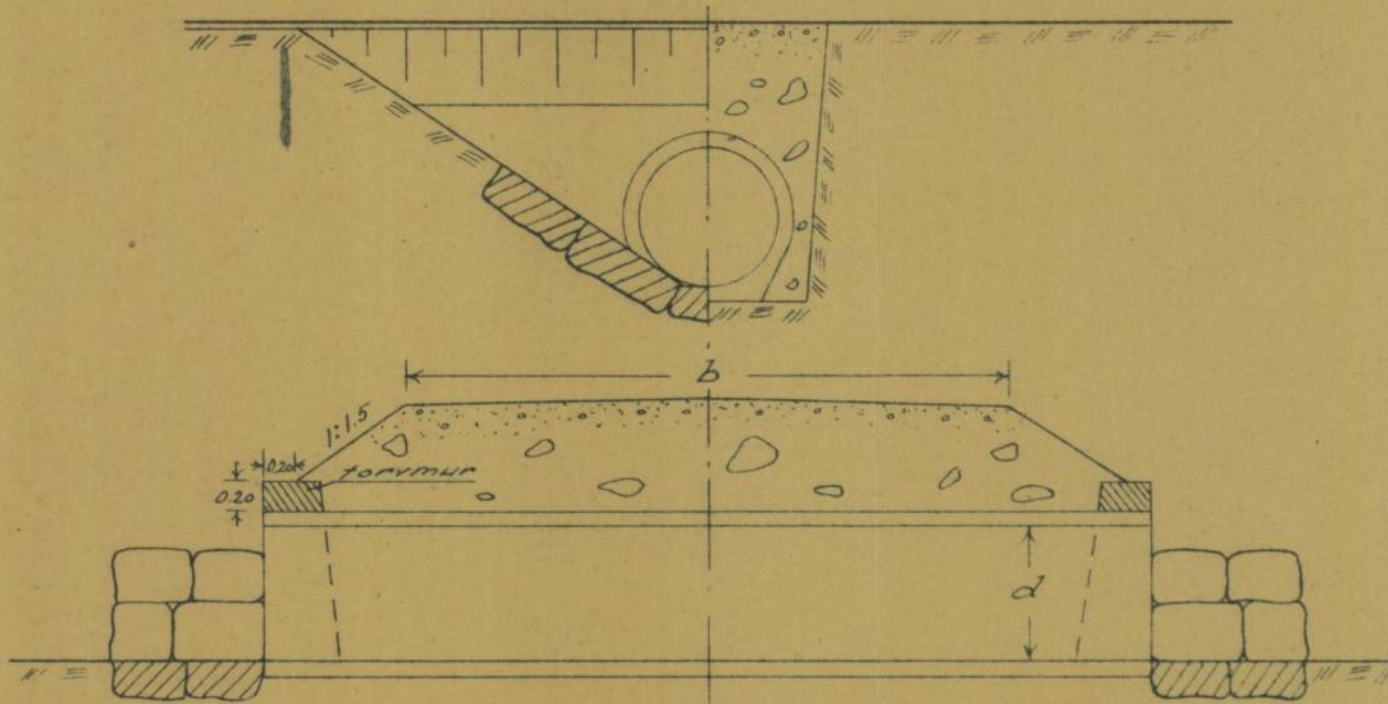

KH/MG

Lantbrukaren Knut Wangström,
Dykärrs gård,
H a b o.

Ang. DYKÄRRS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1945 i Habo socken, Skaraborgs län.

Med anledning av Eder skrivelse den 15 oktober 1953 får Lantbruksstyrelsen meddela, att 650 kronor utbetalades till Eder den 26 juni 1951, vilket belopp Lantbruksstyrelsen efter ändring av tidigare uppgjord plan beslutat tilldela rubricerade företag såsom statsbidrag.

Stockholm den 23 oktober 1953.

Enligt uppdrag

KH
K. Högvall

77
47
Dykärs jord köbt 15/10 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm 16.

Dnr. 04223/48, 7340/51, 74/51.

Ang. Dykärs diknings-
färetag 1945.


Har mycket utbetad-
des i statsbidrag i verkligt
vilken dag och år. och vilken
summa avsändes det?

Bögarakt rings ju
Kent Wangh

Gark.

⁷²⁴⁷
BESLUT BEVIS
RAPPORT

DEN 22 JUN 1951



LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning

Företag: Dykärrs dikningsföretag av år 1945 i Habo socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län

Gårdsstyrelsen: } Lantbr. Knut Wangström, Dykärrsgård,
Förtroendeman: }
Förordningskont: } Habo

Arbetsplanen fastställd den 29 december 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 790:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen " 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställdes av ass. Eskil Olsson
den 3 nov. 1950, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda
arbetsplanen med undantag för sträckan nedströms sekt. 3, som på markägarens önskan
givits ur torrläggningssynpunkt förmånligare sträckning och höjdläge. Ändringen är
med grön färg införd å ritningen. Brunnen vid sekt. 4+12 har på markägarens begäran
slopats. Beräknad kostnad minskas härigenom med 60:- kr.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

De verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 9 jan. 1951.


Sven Hallin
(Sven Hallin)

Statens Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



*1 h. handf.
1 mbr (Hallin) (i akt)*

RAPPORT



över verkställd avsyning

Företag: Dylkärrs dikningsföretag av år 1945 i Habo socken av

(namn, socken och län)

Skaraborgs län

Ordföranden: } Lantbr. Knut Wangström, Dylkärrsgård,
Förtroendeman: }
Endastintressent: } Habo

Arbetsplanen fastställd den 29 december 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 790:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen " 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av ass. Eskil Olsson


den 3 nov. 1950, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda
arbetsplanen med undantag för sträckan nedströms sekt. 3, som på markägarens önskan
givits ur torrläggningssynpunkt förmånligare sträckning och höjdläge. Ändringen är
med grön färg införd å ritningen. Brunnen vid sekt. 4+12 har på markägarens begäran
slopats. Beräknad kostnad minskas härigenom med 60:- kr.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

De verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 9 jan. 1951.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Dykärns dikningsföretag av år 1945".				
		Sträckan 0+60 - 2+23.				
		Ändringsförslaget . . .				
1+40-2+23	83	Schaktning av sandjord m ³	80	1:50	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			20:--	140:-- ✓
		Ursprungliga förslaget.				
0+60-1+14	54 ✓	Schaktning av dy och sand m ³	25	1:20	30:-- ✓	
1+14-2+23	109 ✓	9" betongrör	109 ✓	2:65	288:85 ✓	
1+14-1+24	10 ✓	Grävning, läggning och återfyllning m	10 ✓	0:75	7:50 ✓	
1+24-2+23	99 ✓	- " - "	99 ✓	0:90	89:10 ✓	415:45 ✓
		Arbetsledning och oförutsett				44:55 ✓
						460:-- ✓
Enligt vid ursprungliga förslagets upprättande använda å-priser skulle						
ändringsförslaget bli 320:-- kr billigare. + de utskutna brunnarna vid						
4+12 och 1+24 = 420 kr.						
Skara den 1 juni 1951.						
						
(Sven Hallin)						
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.						

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr
Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

MG

77/47
Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Angående Dykärrs dikningsföretag av år 1945.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för
rubricerade företag får jag härmed anhålla, att Ni ville ombe-
styra, att över de önskade ändringarna detaljerad kostnadsberäk-
ning med vid företagets upprättande gällande priser insändes
till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.


./.

En ritning bifogas.

Stockholm den 2 april 1951.

Enligt uppdrag

H. Sjöberg



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I förestående skrivelse begärt detaljerat kostnadsförslag översändes
härmed vördsamt.

Bekommen ritning återgår.

Skara den 9 juni 1951.

Sven Hallin
Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län
