



Akt nr:


R-E1a-1168

AU\$R-E1a-1168

Skuldförbindelse överlämnad
till *Konstner Träby*
den 24/8 1949.
godkänd den 5/9 1949.

365/49 226/49

R 4*1168



FÖRETAG: Hallansberg.

lantbrukskonsulenten
Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ Erik Almlöf
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 mars 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 13.490-

» en första rensning » - kr. 13.490-

Lån till företagets utförande kr. 27.040-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 18 mars 1949 till
Hallansbergs dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med trettontusenfyrahundra-
nittio (13.490) kronor, varav till företagets
~~utförande~~ kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugosjutusenfyrtio (27.040)
kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets ~~delägare genom dess styrelse~~ befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1954 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Halland den 2. 7

19 49

Carl O. J. Hammar

Att

Greve Carl Wilhelm Hamilton

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Maistad

Adress

Maistad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 september 1949.

Lars Wennerberg

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

175-5
Ser. F XIII Komb
175

5547
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 4*1168

DIARIE Nr 014044
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1948

lev 18
349

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Hallansbergs dikningsföretag av år 1946
i Trästena socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Jordbr.kons. Erik Almlöf

Statsbidrag: 13.530 kr.
Statslån: 27.070 kr.

DIARIENr 5547
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ende intressent i "Hallansbergs dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Hallansberg, Moholm den 30 nov. 1946


.....
Carl Wilhelm Hamilton

Genom beslut den 18 mars 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 40.606:88 kr., till företaget beviljat bidrag med 13.490 kr. och lån med 27.040 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslänfond till

Hallansbergs dikningsföretag av år 1946

(företagets namn samt socken och län)

Trästena socken, Skaraborgs län

Godsägare
Förordnanden
Ende intressent:

Godsägare greve Carl Wilhelm Hamilton, Hallansberg, Trästena, Moholm.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29 juni 1946

Förrättningen avslutad den 12 juli 1946

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med rensningssyn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar.

förrättningen bestämd arbetstid 31 dec. 1956 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1956

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 47.577:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 40.669:47 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

3"-rör à 0:50 kr/m, 4"-rör à 0:80 kr/m, 5"-rör à 1:10 kr/m, 6"-rör à 1:50 kr/m, 9"-rör à 2:60 kr/m, 10"-rör à 3:- kr/m, 12"-rör à 4:25 kr/m, 15"-rör à 6:-kr/m. Bergsprängning 13-18 kr/m och 60 cm djupt. Grävning, läggning och återfyllning varierar mellan 0:40-2:- kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensnings	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A - K	16.120	-	-	-	649	21	16.769	21	40:-	16.809	21
Ä - Öc	1.460	-	-	-	83	85	1.543	85	-	1.543	85
X - Å	1.980	-	-	-	113	11	2.093	11	20:-	2.113	11
L - M	800	-	-	-	53	45	853	45	-	853	45
N ₁ - V ₁₃	14.860	-	-	-	596	91	15.456	91	60:-	15.516	91
E - E ₁₃	3.695	-	-	-	137	94	3.832	94	-	3.832	94
Summa	38.915	-	-	-	1.634	47	40.549	47	120:-	40.669	47

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - K	42	-			42	-	18.900	-	0	16.809	21	400:22	1/3	5.600:-
Ä - Öc	6	10			6	10	2.440	-	0	1.543	85	253:09	"	510:-
X - Å	9	14			9	14	3.290	40	0	2.113	11	231:19	"	700:-
L - M	4	32			4	32	1.555	20	0	853	45	197:56	"	280:-
N ¹ - V ¹³	31	59			31	59	17.374	50	0	15.516	91	491:20	"	5.170:-
E ¹ - E ¹³	3	79			3	79	4.017	40	0	3.832	94	1011:33	"	1.270:-
Summa	96	94			96	94	47.577	50		40.669	47			13.530:-

Av bidraget belöper omkring 13.490:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
A - K	18.900	-	100,000	16.809	21	2/3	11.200:-
Ä - Öc	2.440	-	100,000	1.543	85	"	1.020:-
X - Å	3.290	40	100,000	2.113	11	"	1.400:-
L - M	1.555	20	100,000	853	45	"	560:-
N ¹ - V ¹³	17.374	50	100,000	15.516	91	"	10.340:-
E ¹ - E ¹³	4.017	40	100,000	3.832	94	"	2.550:-
Summa	47.577	50		40.669	47		27.070:-

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid synförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av redan odlad åkerjord. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna. Kostnaden för samfälligheten E - E¹³ ställer sig mycket hög (1011:33 pr ha) framför allt beroende på att den areal som berörs av dikningen är relativt liten men även beroende på de svårartade grävningsförhållandena. Berörda åkerareal kommer att utläggas till permanent betesvall. Med hänsyn till områdets centrala läge samt att intilliggande hagmark delvis även utnyttjas som bete anser nämnden att även denna del av företaget är värd att understödjas.

Större delen av egendomen har täckdikats för ett 20-tal år sedan. På grund av att avloppsförhållandena ej varit tillfredsställande lösta har denna täckdikning ej fungerat. Den utförda täckdikningen har dock visat sig vara av fullgod beskaffenhet sedan avloppen reglerats. Företaget är utfört till omkring hälften.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden är motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 13.530:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 27.070:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts
" 2, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.
" 3, fastighetsförteckning

Skara den 20/12 1946
På Torrlägningsnämndens vägnar
E. Enderstein
Ordförande.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf
handlagd, den 12 juli 1946 avslutad syneförrättning rörande
"Hallansbergs dikningsföretag av år 1946" inom Trästena socken
av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendom-
stols kansli den 2 oktober 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

STÄMPEL

PAPPER

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Hallansbergs dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken av Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Trästena socken.

Hallansberg 2¹, 2² och 2³ 1 mtl..... Greve Carl Wilhelm Hamilton

Skara den 20/12 1946

Erik Almlöf.

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

226/49
Book FÖREDRAGET
DEN 24 NOV. 1950

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP. 1950
DIARIE Nr J1618
SÄK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd slutavsyning

Företag: Hallansbergs dikningsföretag av år 1946 i
(namn, socken och län)

Trästena socken av Skarabergs län ✓

~~Gårdsstyrelsen~~ Greve Karl Vilhelm Hamilton

~~Förbrukningsstyrelsen~~

Ende intressent: Hallansberg, Mohelm, tel. Mohelm 43.

Arbetsplanen fastställd den 18 mars 1949 ✓

Ändring medgiven den sökes samtidigt härmed

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.490:-- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 27.040:-- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 31 dec. 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 september 1956 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till ---
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

den 13 september 1950, har befunnits att företaget utförts i sin helhet i enlighet med förslaget med undantag av att diket N-0 å sträckan 41-41+42 utförts som halvtäcktt dike med 375 mm. rör och bräddavloppsbrunn nedanför vägen samt att övre delen av diket T³-T⁵ på grund av hård pinne och berg utförts c:a 20 cm. grundare än förslaget, vilket dock ej inverkar på detaljdikningens djup. Undertecknad tillstyrker nämnda ändringar.

Arbetet har dels utförts av gårdens arbetsstyrka och dels av lejd arbetskraft på ackord, och har kostnaden hållit sig i enlighet med förslaget, och sålunda uppgått till 40.753:88 kronor.

13.490	27.040
10.800	21.600
2.690	5.440

Skara den 13 september 1950.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

3 (värdering. separat)

*Godkännande med de ändringar
ändringarna införda i arkivriten.*
Y. G.




UPPGIFT

Över verkliga kostnader vid Hallansbergs dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken av Skarabergs län, grundad på av företagets intressent lämnade uppgifter.

	Samfällighet	Summa kroner
Syneförrättningen		1.634:47
Vattendomstolsavgift		54:41
Arbets- och materialkostnad		38.915:--
Extra arbeten Diket N-0		100:--
Diverse omkostnader avsyning, pålningar & besiktning		50:--
	Summa kronor	40.753:88
Beräknad kostnad		40.606:88 40.669:47
Båtnad		47.577:50

Skara den 13 september 1950.


Erik Almlöf
Förrättningsman.

J 1618/50

MS

Greve Carl Wilhelm Hamilton,
Hallansberg,
M o h o l m.

För utbekommande av innestående del av det statsbidrag
och lån, som beviljats till Hallansbergs dikningsföretag av år
1946 i Trästena socken, Skaraborgs län, skola här bifogade
.//. rekvisitioner underskrivas av Eder samt återställas till Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 20 oktober 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman



LANTBRUKSSTYRELSEN

16 SEP. 1950

DIARIE Nr J 1618

SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Hallandsberg²

Hallandsberg

Undertecknad, ende sakägare i Moholms dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbrukskonsulent Erik Almlöfs avsyningsbevis av den 13 september 1950.

Hallandsberg, Moholm den 13 september 1950.

Carl Wilhelm Hammar
.....

Bevittnas:

H. Lundeblad
.....
.....

Erik Almlöf
.....
Shana
.....

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Härmed översändes avsyningsbevis, uppgift å verkliga kostnader samt ansökan om ändring i arbetsplanen för "Hallansbergs dikningsföretag av år 1946" i Trästena socken av Skaraborgs län.

Kartorna, varå ändringarna inritats med grön färg, följer separat.

Skara den 14 september 1950.

Enligt uppdrag:

Märta Ellnefjård
Märta Ellnefjård

3 *in*

226/49
FÖRFÖRAGET
RAPPORT
DEN 4 OKT. 1949
BEVIS
LANTBRUKSSTYRELSEN
översiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP 1949
DIARIE Nr J 3236
SAK Nr

Företag: Hallansbergs dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken
(namn, socken och län)
Skaraborgs län

~~Ördföranden:~~ } Greve Carl Vilhelm Hamilton, Hallansberg, Moholm
~~Kassabestånd:~~ }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 18 mars 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.490:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 27.040:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 december 1956

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1956

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
 { Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av lantbruksinstruktör Paul Svantesson
den 1 juli 1949, har befunnits att företaget var utfört, förutom samfällig-
heten E¹ - E¹³. Den utförda delen av företaget motsvarar om samtliga kostnader, inbe-
räknade syneförrättning och betänkande, medräknas en summa av c:a 37.000:- kronor eller
omkring 90 % av det till 40.606:88 kronor fastställda beloppet.

Skara den 22 september 1949

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP 1949
DIARIENR. 3236

SAK Nr

B E V I S

över verkställd besiktning

Företag: Hallansbergs dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken
(namn, socken och län)
Skaraborgs län

~~Övervakare~~ } Greve Carl Vilhelm Hamilton, Hallansberg, Moholm
~~Förtroendeman~~ }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 18 mars 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.490:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 27.040:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 december 1956

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1956

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksinstruktör Paul Svantesson

den 1 juli 1949, har befunnits att företaget var utfört, förutom samfällig-
heten E¹ - E¹³. Den utförda delen av företaget motsvarar om samtliga kostnader, inbe-
räknade syneförrättning och betänkande, medräknas en summa av c:a 37.000:- kronor eller
omkring 90 % av det till 40.606:88 kronor fastställda beloppet.

Skara den 22 september 1949

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

LANTBRUKSNÄMNDEN
~~EGNAHEMSNÄMNDEN~~

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 852
13140

Till


Kungl. lantbruksstyrelsen
Box 16307
Stockholm 16.



Härmed översändes bevis över verkställd besiktning av Hallansbergs
dikningsföretag av år 1946, Trästena socken, Skaraborgs län.

Rekvisition av statsunderstöden har tidigare insänts. Skara den 23
september 1949.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

1949 den 4 oktober.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hallansbergs dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken, Skaraborgs län.

Lån 27.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 mars 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Trästena socken</u>			
Hallansberg	1	¹ 2 ² och 2 ³	Greve Carl Wilhelm Hamilton

Stockholm den 4 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

8
114

Lantbruksnämnden

~~ECNAHEMSNÄMNDEN~~

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

13140
Tel. 352

A-f/P

Rek.

FÖREDRAGET

DEN 13 SEP. 1949

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 AUG 1949

DIARIE Nr

J2778

SAK Nr


Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Härmed översändes kontrakt m.m. rörande Hallansbergs
dikningsföretag av år 1946 i Trästena socken. Skara den 11
augusti 1949.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Lands. (2)
Skuld/förbind.
det. (8)
rekr. (2)
Sakerh. förbind.

Ser. E XIII *komb*
175


Knutz. Lantbruksskatteskatt
Knutz. Lantbruksskatteskatt

DIARIE Nr 5567
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

R 4*1168

DIARIE Nr 4044
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1948

*bev 18
349*



1
Protokoll vid synfirättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark, tillhörande Hallandsbys
egendom i Tröstena socken av
Tharabrys län.

Den 12 juni 1946.

Närvarande: länstieknad, jordbruks-
konsulent Erik Bendz och firättningsman
samt sökanden greve Carl Wilhelm Hamilton
och som ombud för vägfirättningen ml.
fullmakt bil. B vägmästaren H. Ekblad.

§ 1.

Upplästes det för firättningsmannen
utfärdade förordnandet, som båda lydelse
enligt bil A.

§ 2.

Förklades den vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det vatten-
bärande området samt profilen över
sölgrens höjfrån.

§ 3.

Sökanden yrkade på ifrågakommande
sölgrens fördjupning och igentäggning
med rör, så att hans därav berörda
marker må kunna torrläggas enligt
upprättad täckvattensplan och på
sedanmöjligaste sätt.

Sökanden framställde vidare att egen-
domen täckvattens enligt upprättad plan
öven 1920 - 30. Framlades med denna täck-

ditning förjupades de öppna vattenmassorna, men
någon rationell lösning, av vattenmassornas för-
togs ej då. Vidare hade ej representativt antal
ytvattenbrunnar inlagt i samband med den
tidigare utförda tätningsarbetet, vilket för-
orsakade att ditningen ej fungerade till-
fredsställande. Lösningen gik ut på
att långa tagar bortled vid vattenmass-
förätningens planering.

§ 4.

Vägnarverken under allmänna
landsvägar Båre - Sjöberg vid punkt-
na 115 och 116 hade ej representativt djup för
den förslagna ditningen. Vägnarverken
hade utlyppts efter år 1880. Området för
Vägnarverken gik ut på att vägnarverken
ska bibehållas och att särskilda tätnings-
arbeten utföras till representativt djup
vid sidan av vägnarverken. Vägnarverken
hade inget att erinra annat än att detta
arbetet beaktas av Vägnarverken,
men gik ut på att arbetet utföras av
sällskapet i samband med den föregående
tätningsarbetet, varvid anmärks om ar-
betet i god tid skall kunna till Vägnar-
verken.

Den vägnarverken på sträckan N. O
vid punkt 115 hade förslagsvis att vatten
massor från c:a 20 ha skogsmark, som till-
digen vatten sådana ut till annat om-
läggs. Den befintliga vägnarverken, 18° i, an-
sågs tillräckligt över för detta vatten, men
gik ut på vägnarverken omhändertaga
i den befintliga vägnarverken skulle vara sig

stillsänkt till denna målighet med
större rörelser och på jorden och be-
hövet.

§ 5.

Som intet vidare var att till för-
tollat uttöken, förklarades som-
mantraktat upplöst med tillkännagivande
de att, sedan utredningen komplette-
rats, nytt sammantagna kommissionen att
bådas i samma ställe som dagens
fredagen den 12 juli 1946 kl 10 och kom-
missionen ytterligare undersökta även
att tillställas sakägarna.

Ort och tid som som
Stjärten
Sivertsen

Den 12 juli 1946.

Närvarande: Underseende jordbruks-
kommisarie Erik Skuldf, förordningsman,
samt gode männen Carl Adolfsson, Kälsta-
berg, Pöys och Vils Dimberg, Pöys-
stad, Noholm ävensom sakägarna
grev Carl Wilhelm Kamilton, ågarna av
Kallandsberg, 1 mtl. 2, 2²: 2³ m. fl.

§ 6.

Uppläses det för förordningsmannen
utfördade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. k.

§ 7.

Något för mot syftningen kunde
ej utlösas.

§ 8.

Förklarades det sedan föra samman-
trädets uppmättade förslag till de
oattnuberrörade markernas bättnes tro-
löghet och bekänning med därtill
hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synvårnämns utlåtanden,
som hade lydelse mil. bil. 9.

§ 10.

Het mottaga och förvara till förslaget
hörande handlingar och ritningar.
Förslaget synvårnämnen gavs Carl Wilhelm
Hamilton, Lilla Landsberg, Molebun.

§ 11.

I fråga om förädlingsbortuade-
na hänvisades till oroadsriktningen,
därav att exemplen kommer att för-
lämnas till förhållanden.

§ 12.

Som inläst vidrör James att till
protokollat antagna, förklarades för-
rättningen avslutat och sammans-
trädets avslutat.

Och all tid som som

Förjämst

Elitstämning.

Biträda med gode män:
Nilsdimberg Carl Ryssén

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 67-49
1946


Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och inföväntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.


Carl Mannerfelt.


Leo Wohlstein.

Utan avgift.

E. D. 6-49
1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallansberg i Fröstena sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Udholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undertecknad
adress Hallansberg
pr Udholm
Telefon: 73 a

Hallansberg den 8 12 19 45
Karl-Erik Hammar

Föresl. plan finns.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 8 januari 1945.

Erik Palm
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

7

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Björkedal
Fredriksberg

Ägarens namn:

Einar Andersson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~Distriktslantmätaren~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9/1 1945

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Elias Brandel


F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas vägmästare K. Eklind, Ullervad, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
Hallansbergs
hörande ~~Nickolms~~ Egendom m.fl. hemman inom Trästena socken föra vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mariestad den 5 juni 1946.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Erik Liljekvist.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde hos greve C. W. Hamilton,
Hallansbergs egendom, Moholm.

1. Greve C. W. Hamilton, Hallansbergs egendom 1 mtl 2¹, ^{2² + 2³} Moholm
2. Vägförvaltningen, Mariestad
3. Skiftesgodemannen Carl Adolfsson, Valstaberg, Fägre
(Kallad till sista sammanträdet)
4. Skiftesgodemannen Nils Dimberg, Säckestad, Moholm
(Kallad till sista sammanträdet)

Skara den 31 maj 1946

S. H. H. H.
Förrättningsmannen.

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

S o c k e n, b y o c h h e m m a n	L i t e r a	M a n t a l	R e g i s t . n u m m e r	Ä g a r e s n a m n, ä g o s l a g m. m.	A r e a l			N u v a r a n d e v ä r d e			B l i v a n d e v ä r d e			B å t n a d s v ä r d e		
					Å k e r		A n n a n m a r k	h a r	ä g o f i g u r		h a r	ä g o f i g u r		h a r	ä g o f i g u r	
					h a r	a r			K r.	ö r e		K r.	ö r e		K r.	ö r e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Trästena socken																
Hallansberg	1	1	1	✓	Åker, mullhaltig styv lera; alv mkt styv lera.	6 10	70262 70262 536,6-137,4	1000	6100	-	1400	8540	-	400	2440	-
				✓	I 13 Åker, mullrik lättlera; E-E alv mellanlera och delv. morän	3 79		340 400	1288 1516	60	1400	5306	-	1060	4017	40
				✓	Åker o. kulturbete, Mullrik lättlera; alv mellanl. o. delvis morän	9 14		540 600	4935 5484	60	900	8226	-	360	3290	40
				✓	Kulturbete; mullhaltig mellanlera; alv styv lera och delvis morän	4 32		540 600	2332 2592	80	900	3888	-	360	1555	20
				✓	Åker och kulturbete, mullhaltig mkt styv lera; alv mkt styv lera och delvis hård sand	42 00		1050 1300	44100 54600		1500	63000	-	450	18900	-
				✓	N-V D;o	31 59		950 1300	30010 41067	50	1500	47385	-	550	17374	50
					Summa	96 94			88767	50		136345	-		47577	50
					Hallansberg, Moholm / 2 juli 1946											
					I tjänsten											
					Biträdnare gode män:											
					Biträdnare Carl Högstam											

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom

hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad,

såvida densamma utföres av annan än hushållningssällska-

pets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att där risk för slamning eller igenväxning av rörledning före-

finnes, rör skarvarna cementeras och rören även täckas med grus, sågspån eller dylikt,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten Ä - Öc ett kors i jordfast sten å höjden +2,27 c:a 2 m väster om punkt Ä.

För samfälligheten A - K ett kors i jordfast sten å höjden +2,30 c:a 8 m väster om punkten B.

För samfälligheten X - Å ett kors i jordfast sten å höjden +6,11 c:a 135 m väster om punkt Å.

För samfälligheten L - M ett kors i jordfast sten å höjden +9,60 c:a 100 m sydost om punkt M.

För samfälligheten N - V ett kors i berg å höjden +9,60 c:a 225 m väster om punkt R¹ mitt i ägovägens körbana.

För samfälligheten E¹ - E¹³ ett kors i jordfast sten å höjden +12,82 c:a 42 m sydväst om punkt E⁴.

att där rörledning framdrages i annan jordart än lera, grusning skall utföras med ett 5 centimeter tjockt jordlager såväl under rören som kring skarvarna; där sådan ledning framdrages i lera, men de övre jordlagren innehålla finsand, skall grusning utföras endast över rörskarvarna.

Hallansberg, Moholm 12 juli 1946

I tjänsten
Erik P. ...

Kostnadsförslag.

Bil. F

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - K</u>								
	1498	<u>Dikēt A - B - C - D - E - F - G - H - I - K</u>								
0-0+75		Justering av botten och slänter m	75	0:40	30	-	✓			
0+75-4+22, 4+44-7+17		375 mm rör med frakt "	620	6:-	3720	-	✓			
7+17-8+31		300 - " - "	114	4:25	484	50	✓			
8+31- -11+68		250 - " - "	337	3:-	1011	-	✓			
11+68- -12+73		225 - " - "	105	2:60	273	-	✓			
12+73- -15+20		150 - " - "	247	2:-	494	-	✓			
0+75-4+22, 4+44-7+17		Grävning, läggning och återfyllning "	620	1:50	930	-	✓			
7+17-8+31		- " - "	114	1:30	148	20	✓			
8+31- -11+68		- " - "	337	1:50	505	50	✓			
11+68- -12+73		- " - "	105	1:40	147	-	✓			
12+73- -15+20		- " - "	247	1:30	321	10	✓			
5+93		Rörbro st	1	70:-	70	-	✓			
10+68		Rörets framdragning genom väg "	3	5:-	15	-	✓			
0+75		Rörutlopp typ A "	1	50:-	50	-	✓			
1+10, 1+34		Brunn typ C d=525 "	2	40:-	80	-	✓			
3+31, 5+7, 5+88, 10+68, 11+68, 12+73		" " A d=525 "	6	50:-	300	-	✓			
4+22, 4+44, 5+93, 7+17, 8+31, 9+54		" " A d=600 "	6	60:-	360	-	✓			
	1498	Överföres			8939	30	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1498	Överfört			8939	30	✓	8939 30		
6+94		Brunn typ C d=600 st	1	45:-	45	-	✓			
13+98, 15+20		" " A d=450 "	2	45:-	90	-	✓	9074 30	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						905 70	9980	✓
	173	<u>Diket A - A</u>								
300- -300+49		100 mm rör med frakt m	49	0:80	39	20	✓			
300+49- -301+73		75 - " - "	124	0:50	62	-	✓			
300+ -300+49		Grävning, läggning och återfyllning "	49	1:-	49	-	✓			
300+49- 301+73		- " - "	124	0:60	74	40	✓			
300		Täckdikesöga st	1	15:-	15	-	✓			
300+49, 301+73		Brunn typ A d=375 "	2	25:-	50	-	✓	289 60	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						25 40	315	✓
	110	<u>Diket C - C</u>								
295- -296+10		75 mm rör med frakt m	110	0:50	55	-	✓			
295- -296+10		Grävning, läggning och återfyllning "	110	0:60	66	-	✓			
296+10		Brunn typ A-d=375 st	1	25:-	25	-	✓	146 -	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						14 -	160	✓
	110	<u>Diket D - D</u>								
290- -291+10		100 mm rör med frakt m	110	0:80	88	-	✓			
290- -291+10		Grävning, läggning och återfyllning "	110	1:-	110	-	✓			
291+10		Brunn typ A d=450 st	1	30:-	30	-	✓	228 -	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						22 -	250	✓
	263	<u>Diket F - F - F</u>								
20-21+4		150 mm rör med frakt m	104	1:50	156	-	✓			
21+4- 22+63		125 - " - "	159	1:10	174	90	✓			
20-21+4		Grävning, läggning och återfyllning "	104	1:25	130	-	✓			
21+4- -22+63		- " - "	159	1:-	159	-	✓			
	2154	Överföres			619	90	✓		10705	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-	2154	Överfört			619	90			10705	- ✓
20+74, 22, 22+63		Brunn typ A d=450 st	3	35:-	105	-	✓			
21+4		" " C d=450 "	1	25:-	25	-	✓	749 90	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett 1 3						75 10	✓	825 - ✓
	104	<u>Diket F - F</u>								
280- -281+4		75 mm rör med frakt m	104	0:50	52	-	✓			
280- -281+4		Grävning, läggning och återfyllning "	104	0:75	78	-	✓			
281+4		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	155 -	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett 4						15 -	✓	170 - ✓
	109	<u>Diket F - F</u>								
285- 286+9		75 mm rör med frakt m	109	0:50	54	50	✓			
285- 286+9		Grävning, läggning och återfyllning "	109	0:60	65	40	✓			
286+9		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	144 90	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett 1 2						15 10	✓	160 - ✓
	304	<u>Diket G - G - - G -</u>								
25-26+93		125 mm rör med frakt m	193	1:10	212	30	✓			
26+93- -28+4		75 - " - "	111	0:50	55	50	✓			
25-26+93		Grävning, läggning och återfyllning "	193	1:50	289	50	✓			
26+93- -28+4		- " - "	111	0:70	77	70	✓			
26+93		Rörets framdragnings genom väg st	3	5:-	15	-	✓			
26+6, 26+93		Brunn typ A d=450 "	2	35:-	70	-	✓			
28+4		" " A d=375 "	1	25:-	25	-	✓	745 -	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett 1 3						75 -	✓	820 - ✓
	126	<u>Diket G - G</u>								
330- -330+59		100 mm rör med frakt m	59	0:80	47	20	✓			
330+59- 331+26		75 - " - "	67	0:50	33	50	✓			
330- -330+59		Grävning, läggning och återfyllning "	59	0:80	47	20	✓			
	2797	Överföres			127	90	✓			12680 - ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2797	Överfört			127	90			12680	-
330+59- -331+26		Grävning, läggning och återfyllning m	67	0:70	46	90	✓			
330+59		Brunn typ A d=450 st	1	30:-	30	-	✓			
331+26		" " A d=375 "	1	25:-	25	-	✓	229 80	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						20 20	✓	250 - ✓
	517	1 3 5 6 8 Diket H - H - H - H - H - H								
30-32+15		200 mm rör med frakt m	215	2:40	516	-	✓			
32+33- -32+87		150 - " - "	54	1:50	81	-	✓			
32+87- -34+29		125 - " - "	142	1:10	156	20	✓			
34+29- -34+79		100 - " - "	50	0:80	40	-	✓			
34+79- -35+35		75 - " - "	56	0:50	28	-	✓			
30-31+77		Grävning, läggning och återfyllning "	177	0:90	159	30	✓			
31+77- -32+15		38 - " - "	38	1:50	57	-	✓			
32+33- -32+87		- " - "	54	1:-	54	-	✓			
32+87- -34+29		- " - "	142	0:80	113	60	✓			
34+29- -34+79		- " - "	50	0:80	40	-	✓			
34+79- -35+35		- " - "	56	0:70	39	20	✓			
35+35		Rörets främragning genom väg st	3	5:-	15	-	✓			
31+27, 32+87, 34+29		Brunn typ A d=450 "	3	40:-	120	-	✓			
32+15, 32+33		" " A d=525 "	2	50	100	-	✓			
35+35		" " A d=375 "	1	30:-	30	-	✓			
31+77		" " C d=525 "	1	25:-	25	-	✓	1574 30	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						155 70	✓	1730 - ✓
	3314	Överföres							14660	- ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	3314	Överfört							14660	--
	49	¹ ² Diket H - H								
305- 305+49		75 mm rör med frakt m	49	0:50	24	50	✓			
305- -305+49		Grävning, läggning och återfyllning "	49	0:40	19	60	✓			
30+49		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	69 10	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						10 90	✓	80
	55	³ ⁴ Diket H - H								
310- -310+55		100 mm rör med frakt m	55	0:80	44	-	✓			
310- 310+55		Grävning, läggning och återfyllning "	55	1:20	66	-	✓			
310+55		Brunn typ A d=525 st	1	50:-	50	-	✓	160 -	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						15 -	✓	175
	94	⁶ ⁷ Diket H - H								
270- -270+94		125 mm rör med frakt m	94	1:10	103	40	✓			
270- -270+94		Grävning, läggning och återfyllning "	94	1:-	94	-	✓			
270+94		Brunn typ A d=450 st	1	35:-	35	-	✓	232 40	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						22 60	✓	255
	139	⁹ Diket H - H								
320- -321+39		150 mm rör med frakt m	139	1:50	208	50	✓			
320- -321+39		Grävning, läggning och återfyllning "	139	1:40	194	60	✓			
321+39		Brunn typ A d=450 st	1	35:-	35	-	✓	438 10	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						46 90	✓	485
	86	¹ Diket E - E								
170- -170+86		225 mm rör med frakt m	86	2:60	223	60	✓			
170- -170+86		Grävning, läggning och återfyllning "	86	1:-	86	-	✓			
170+86		Rörbro st	1	60:-	60	-	✓			
	3737	Överföres			369	60	✓		15655	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
---	3737	Överfört			369	60	✓		15655	- ✓
170+86		Brunn typ A d=525 st	1	50:-	50	-	✓	419 60	✓	
		Arbetsledning o. oförutsett						45 40	✓	465 - ✓
	3737	Samfälligheten A - K summa kronor							16120	-- ✓
		<u>Samfälligheten Ä - Öc</u>								
	312	<u>Diket Ä - Ö - Öb - Öc</u>								
200- 201+86		125 mm rör med frakt m	186	1:10	204	60	✓			
201+86- -203+12		75 - " - "	126	0:50	63	-	✓			
200- -201+86		Grävning, läggning och återfyllning "	186	1:25	232	50	✓			
201+86- -203+12		- " - "	126	0:80	100	80	✓			
202+94		Rörets framdragning genom väg st	4	5:-	20	-	✓			
200		Rörutlopp typ A "	1	50:-	50	-	✓			
201+31, 201+86, 202+67, 202+94		Brunn typ A d=450 "	4	35:-	140	-	✓			
203+12		å " " A d=375 "	1	25:-	25	-	✓			
201+58		" " C d=450 "	1	20:-	20	-	✓	855 90	✓	
		Arbetsledning o. oförutsett						84 10	✓	940 - ✓
	152	<u>Diket Ö - Öa</u>								
210- 211+34		100 mm rör med frakt m	134	0:80	107	20	✓			
211+34- -211+52		75 - " - "	18	0:50	9	-	✓			
210- -211+34		Grävning, läggning och återfyllning "	134	1:-	134	-	✓			
211+34- -211+52		- " - "	18	0:40	7	20	✓			
211+34		Rörets framdragning genom väg st	4	5:-	20	-	✓			
210+96, 211+34, 211+38, 211+52		Brunn typ A d=450 "	2	35:-	70	-	✓			
		" " A d=375 "	2	25:-	50	-	✓	397 40	✓	
		Arbetsledning o. oförutsett						37 60	✓	435 - ✓
	464	Överföres							1375	- ✓

1	2	3	4	5	6	7	8
	464	Överfört					1375 - ✓
	47	<u>Diket Öb - Öd</u>					
220- -220+47		75 mm rör med frakt m	47	0:50	23 50	✓	
220- 220+47		Grävning, läggning och återfyllning "	47	0:60	28 20	✓	
220+47		Brunn typ A d=375 st 1	25:-		25 -	✓	76 70 ✓
		Arbetsledning o.oförutsett				8 30	✓ 85 - ✓
	511	Samfälligheten A - Öc summa kronor					1460 - ✓
		<u>Samfälligheten X - Å</u> 1					
	498	<u>Diket X - Z - Y - Y</u>					
150- 150+50		Justering av botten och slänter m	50	0:40	20 -	✓	
150+50- 151+15		150 mm rör med frakt "	65	1:50	97 50	✓	
151+15- -153+22		125 - " - "	207	1:10	227 70	✓	
153+22- -153+74		150 - " - "	52	1:50	78 -	✓	
153+74- -154+45		125 - " - "	71	1:10	78 10	✓	
154+45- -154+98		75 - " - "	53	0:50	26 50	✓	
150+50- -151+15		Grävning, läggning och återfyllning "	65	0:60	39 -	✓	
151+15- -151+80		- " - "	65	1:-	65 -	✓	
151+80- -153+22		- " - "	142	0:50	71 -	✓	
153+22- -153+74		- " - "	52	0:80	41 60	✓	
153+74- -154+45		- " - "	71	0:80	56 80	✓	
154+45- -154+92		- " - "	47	0:50	23 50	✓	
154+92- -154+98		- " - "	6	5:-	30 -	✓	
150+50		Täckdikesöga st 1	15:-		15 -	✓	
	498	Överföres			869 70	✓	

1	2	3	4	5	6	7	8
-	498	Överfört			869	70	✓
151+15, 151+80, 153+22, 153+74, 154+45		Brunn typ A d=450 st	5	30:-	150	-	✓
154+98		Brunn typ A d=375 "	1	25:-	25	-	✓
		Arbetsledning o.oförutsett				1044 70	✓
	170	Diket Y - Å				105 30	✓ 1150 -
160- 160+50		125 mm rör med frakt m	50	1:10	55	-	✓
160+50- -160+93		100 - " - "	43	0:80	34	40	✓
160+93- -161+70		75 - " - "	77	0:50	38	50	✓
160- 160+50		Grävning, läggning och återfyllning "	50	0:80	40	-	✓
160+50- -160+93		- " - "	43	1:-	43	-	✓
160+93- -161+70		- " - "	77	0:70	53	90	✓
160+50		Brunn typ A d=450 st	1	30:-	30	-	✓
160+93, 161+70		" " A d=375 "	2	25:-	50	-	✓
		Arbetsledning o.oförutsett				344 80	✓
		1				35 20	✓ 380 -
	212	Diket Z - Z					
170- 172+12		100 mm rör med frakt m	212	0:80	169	60	✓
170- 170+50		Grävning, läggning och återfyllning "	50	0:70	35	-	✓
170+50- -170+82		- " - "	32	0:50	16	-	✓
170+82- -172+12		- " - "	130	0:80	104	-	✓
171+22		Brunn typ A d=450 st	1	30:-	30	-	✓
171+55, 172+12		" " A d=375 "	2	25:-	50	-	✓
		Arbetsledning o.oförutsett				404 60	✓
						45 40	✓ 450 -
	880	Samfälligheten X - Å summa kronor					1980 -
		Samfälligheten L - M					
	316	Diket L - M					
250+59- -251+16		125 mm rör med frakt m	57	1:10	62	70	✓
	316	Överföres			62	70	✓

1	2	3	4	5	6	7	8
	316	Överfört			62 70	✓	
251+16- -253+75		100 mm rör med frakt m	259	0:80	207 20	✓	
250+59- -251+16		Grävning, läggning och återfyllning "	57	2:-	114 -	✓	
251+16- -252+26		- " - "	110	1:-	110 -	✓	
252+26- -253+75		- " - "	149	0:80	119 20	✓	
250+59		Täckdikessöga st	1	15:-	15 -	✓	
250+59		Rörets framdragning genom väg "	3	5:-	15 -	✓	
251+16		Brunn typ A d=450 "	1	30:-	30 -	✓	
253+25, 253+75		" " A d=375 "	2	25:-	50 -	✓	723 10
		Arbetsledning o.oförutsett					76 90 800 -
	316	Samfälligheten L - M summa kronor					800 -
		<u>Samfälligheten N - V</u>					
	1071	<u>Diket N - O - P - Q - R - S - T - U - V</u>					
40+10- -40+87		Justering av botten och slänter m	77	1:-	77 -	✓	
40+87- -41+32		Berg, - " - "	45	13:-	585 -	✓	
41+32- -41+42		Justering av botten och slänter "	10	0:60	6 -	✓	
41+56- -45+20		375 mm rör med frakt "	364	6:-	2184 -	✓	
45+20- -47+69		300 - " - "	249	4:25	1058 25	✓	
47+69- -50+95		225 - " - "	326	2:60	847 60	✓	
41+56- 43+32		Grävning, läggning och återfyllning "	176	1:-	176 -	✓	
43+32- -44+8		Berg, - " - "	76	18:-	1368 -	✓	
44+8- -47+69		- " - "	361	1:-	361 -	✓	
47+69- -49+24		- " - "	155	2:-	310 -	✓	
49+24- -50+56		- " - "	132	0:90	118 80	✓	
50+56- -50+95		- " - "	39	2:-	78 -	✓	
	1071	Överföres			7169 65	✓	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1071	Överfört			7169 65	✓	
41+56, 42+4, 42+98, 44+30, 45+20, 46+39, 47+69		Brunn typ A d=600 st	7	60:-	420 -	✓	
49+77		" " A d=525 "	1	40:-	40 -	✓	
50+56, 50+95		" " A d=450 "	2	35:-	70 -	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett				7699 65	✓
	48	<u>Diket 0 - 0</u>				765 35	✓ 8465
105- -105+48		75 mm rör med frakt m	48	0:50	24 -	✓	
105- 105+48		Grävning, läggning och återfyllning "	48	0:60	28 80	✓	
105+48		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25 -	✓	77 80
		Arbetsledning o.oförutsett				7 20	✓ 85
	110	<u>Diket 0 - 0</u>					
110- -111+10		125 mm rör med frakt m	110	1:10	121 -	✓	
110- -110+25		Grävning, läggning och återfyllning "	25	1:20	30 -	✓	
110+25- -110+80		- " - "	55	0:80	44 -	✓	
110+80- -111+10		- " - "	30	1:20	36 -	✓	
111+10		Brunn typ A d=450 st	1	35:-	35 -	✓	266 -
		Arbetsledning o.oförutsett				24 -	✓ 290
	98	<u>Diket P - P</u>					
120- 120+50		100 mm rör med frakt m	50	0:80	40 -	✓	
120+50- -120+98		75 - " - "	48	0:50	24 -	✓	
120- 120+12, 120+70- 120+98		Grävning, läggning och återfyllning "	40	0:70	28 -	✓	
120+12- -120+70		- " - "	58	0:50	29 -	✓	
120+70, 120+98		Brunn typ A d=375 st	2	25:-	50 -	✓	171 -
		Arbetsledning o.oförutsett				19 -	✓ 190
	1327	Överföres					9030

1	2	3	4	5	6	7	8
	1327	Överföres					9030 - ✓
	240	² <u>Diket P - P</u>					
140+ 141+16		125 mm rör med frakt m	116	1:10	127 60	✓	
141+16- -142+40		75 - " - "	124	0:50	62 -	✓	
140- 141+16, 141+16- -142+40		Grävning, läggning och återfyllning "	240	0:80	192 -	✓	
141+16		Brunn typ A d=450 st	1	35:-	35 -	✓	
142+40		" " A d=375 "	1	25:-	25 -	✓	441 60 ✓
		Arbetsledning o.oförutsett 1 2					43 40 ✓ 485 - ✓
	513	<u>Diket Q - Q - Q</u>					
55- 58+96		150 mm rör med frakt m	396	1:50	594 -	✓	
58+96- -59+94, 60+10- 60+29		125 - " - "	117	1:10	128 70	✓	
55- 57+56		Grävning, läggning och återfyllning "	256	1:60	409 60	✓	
57+56- -58+96		- " - "	140	0:90	126 -	✓	
58+96- -59+94, 60+10- 60+29		- " - "	117	1:60	187 20	✓	
56+89, 59+49		Rörets framdragning genom väg st	6	5:-	30 -	✓	
55+90, 56+89, 57+94, 58+96, 59+49, 60+29		Brunn typ A d=450 "	6	35:-	210 -	✓	
59+94, 60+10		" " A d=525 "	2	40:-	80 -	✓	1765 50 ✓
		Arbetsledning o.oförutsett 1					174 50 ✓ 1940 - ✓
	185	<u>Diket R - R</u>					
70-70+83		100 mm rör med frakt m	83	0:80	66 40	✓	
70+83- -71+85		75 - " - "	102	0:50	51 -	✓	
70+71+85		Grävning, läggning och återfyllning "	185	1:10	203 50	✓	
70+83		Brunn typ A d=450 st	1	35:-	35 -	✓	
	2265	Överföres			355 90	✓	11455 - - ✓

1	2	3	4	5	6	7	8
	2265	Överfört			355 90	✓	11455 ✓
71+85		Brunn typ A d=375 st 1	25:-	25 -	✓ 380 90	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett			39 10	✓	420 ✓
	207	<u>Diket S - S - S - S</u>					
90-90+86		100 mm rör med frakt m	186	0:80	148 80	✓	
91+86- -92+7		75 - " - "	21	0:50	10 50	✓	
90-90+86		Grävning, läggning och återfyllning "	86	0:80	68 80	✓	
90+86- -91+26		- " - "	40	1:-	40 -	✓	
91+26- -92+7		Sprängning - " - "	81	0:80	64 80	✓	
90+86, 91+86		Brunn typ A d=450 st 2	35:-	70 -	✓		
92+7		" " A d=375 " 1	25:-	25 -	✓ 427 90	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett			42 10	✓	470 ✓
	167	<u>Diket S - S</u>					
235- -235+41		100 mm rör med frakt m	41	0:80	32 80	✓	
235+41- 236+67		75 - " - "	126	0:50	63 -	✓	
235- -236+17		Grävning, läggning och återfyllning "	117	0:50	58 50	✓	
236+17- -236+67		- " - "	50	0:80	40 -	✓	
236+17, 236+67		Brunn typ A d=375 st 2	25:-	50 -	✓ 244 30	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett			25 70	✓	270 ✓
	18	<u>Diket S - S</u>					
230- -230+18		75 mm rör med frakt m	18	0:50	9 -	✓	
230- 230+18		Grävning, läggning och återfyllning "	18	0:70	12 60	✓	
230+18		Brunn typ A d=375 st 1	25:-	25 -	✓ 46 60	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett			8 40	✓	55 ✓
	2657	Överföres					12670 ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-	3165	Överfört							14510	-
	20	^{3 4} Diket T - T								
250- -250+20		75 mm rör med frakt m	20	0:50	10	-	✓			
250- 250+20		Grävning, läggning och återfyllning "	20	0:70	14	-	✓			
25+20		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	49	-	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						5	-	✓ 54 -
	80	¹ Diket U - U								
85-85+80		100 mm rör med frakt m	80	0:80	64	-	✓			
85-85+80		Grävning, läggning och återfyllning "	80	0:70	56	-	✓			
85+49, 85+80		Brunn typ A d=375 st	2	25:-	50	-	✓	170	-	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						16	-	✓ 186 -
	62	² Diket U - U								
240- -240+62		75 mm rör med frakt m	62	0:50	31	-	✓			
240- -240+62		Grävning, läggning och återfyllning "	62	0:70	43	40	✓			
240+62		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	99	40	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						10	60	✓ 110 -
	3327	Samfälligheten N - V summa kronor								✓ 14860 -
		^{1 13} Samfälligheten E - E								
	587	^{1 2 4 8 10 12 13} Diket E -E -E -E -E -E -E								
170+86- 172+66		³ Morän m	70	5:-	350	-	✓			
170+86- -172+66		150 mm rör med frakt m	180	1:50	270	-	✓			
172+66- 173+76		225 - " - "	110	2:60	286	-	✓			
173+76- -174+41		125 - " - "	65	1:10	71	50	✓			
174+41- 176+3		150 - " - "	162	1:50	243	-	✓			
176+3- -176+73		100 - " - "	70	0:80	56	-	✓			
170+86- -172+66		Grävning, läggning och återfyllning "	180	2:50	450	-	✓			
172+66- -174+24		- " - "	158	1:50	237	-	✓			
174+24- -174+41		Berg, - " - "	17	6:-	102	-	✓			
174+41- -176+73		- " - "	232	1:30	301	60	✓			
	587	Överföres			2367	10	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-	587	Överfört			2367	10	✓			
172+66		Brunn typ D d=450 st	1	35:-	35	-	✓			
173+31,										
173+76,										
174+80,		" " A d=450 "	4	35:-	140	-	✓			
175+43,		" " A d=375 "	2	25:-	50	-	✓	2592	10	✓
176+3,										
176+73										
-		Arbetsledning o.oförutsett						257	90	✓ 2850 -
-	587	Överföres								2367 -
		2 3								
230-	110	Diket E -cE								
-231+10		75 mm rör med frakt m	110	0:50	55	-	✓			
230-		Grävning, läggning								
-231+10		och återfyllning "	110	0:60	66	-	✓			
231+10		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	146	-	✓
-		Arbetsledning o.oförutsett						14	-	✓ 160 -
-		4 5 6								
180-	128	Diket E - E - E								
-180+39		150 mm rör med frakt m	39	1:50	58	50	✓			
180+39-		100 " - " - "	89	0:80	71	20	✓			
-181+28		Grävning, läggning								
180-		och återfyllning "	39	1:-	39	-	✓			
-180+39		- " - "	89	0:90	80	10	✓			
180+39-										
-181+28		Brunn typ A d=450 st	1	35:-	35	-	✓			
180+39		" " A d=375 "	1	25:-	25	-	✓	308	80	✓
181+28										
-		Arbetsledning o.oförutsett						31	20	✓ 340 -
-		5 7								
190-	68	Diket E - E								
190+68		75 mm rör med frakt m	68	0:50	34	-	✓			
190+		Grävning, läggning								
-190+68		och återfyllning "	68	0:80	54	40	✓			
190+26,		Brunn typ A d=375 st	2	25:-	50	-	✓	138	40	✓
190+68										
-		Arbetsledning o.oförutsett						11	60	✓ 150 -
-		8 9								
235-	32	Diket E - E								
235+32		75 mm rör med frakt m	32	0:50	16	-	✓			
235-		Grävning, läggning								
235+32		och återfyllning "	32	0:80	25	60	✓			
235+32		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	66	60	✓
-		Arbetsledning o.oförutsett						8	40	✓ 75 -
-	925	Överföres								3575 -


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	925	Överfört							3575	✓
		10 11								
	18	Diket E - E								
240-										
-240+18		75 mm rör med frakt m	18	0:50	9	-	✓			
240-		Grävning, läggning					✓			
-240+18		och återfyllning "	18	0:80	14	40				
240+18		Brunn antyp A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	48 40	✓	
-		Arbetsledning o.oförutsett						6 60	✓	55
		12 14								
	26	Diket E - E								
245-										
-245+26		75 mm rör med frakt m'	26	0:50	13	-	✓			
245-		Grävning, läggning					✓			
-245+26		och återfyllning "	26	0:80	20	80				
245+26		Brunn typ A d=375 st	1	25:-	25	-	✓	58 80	✓	
-		Arbetsledning o.oförutsett						6 20	✓	65
		1 13								
	969	Samfälligheten E - E summa kronor							3695	✓
	3737	Samfälligheten A - K summa kronor							16120	✓
	511	- " - Ä - Öc " "							1460	✓
	880	- " - X - Å " "							1980	✓
	316	- " - L - M " "							800	✓
	3327	- " - N - V " "							14860	✓
		1 13								
	969	- " - E - E " "							3695	✓
Summa	9740								38915	✓

Hallansberg, Moholm /2 juli 1946

I tjänsten

Erik Sundberg.

Översiktskarta

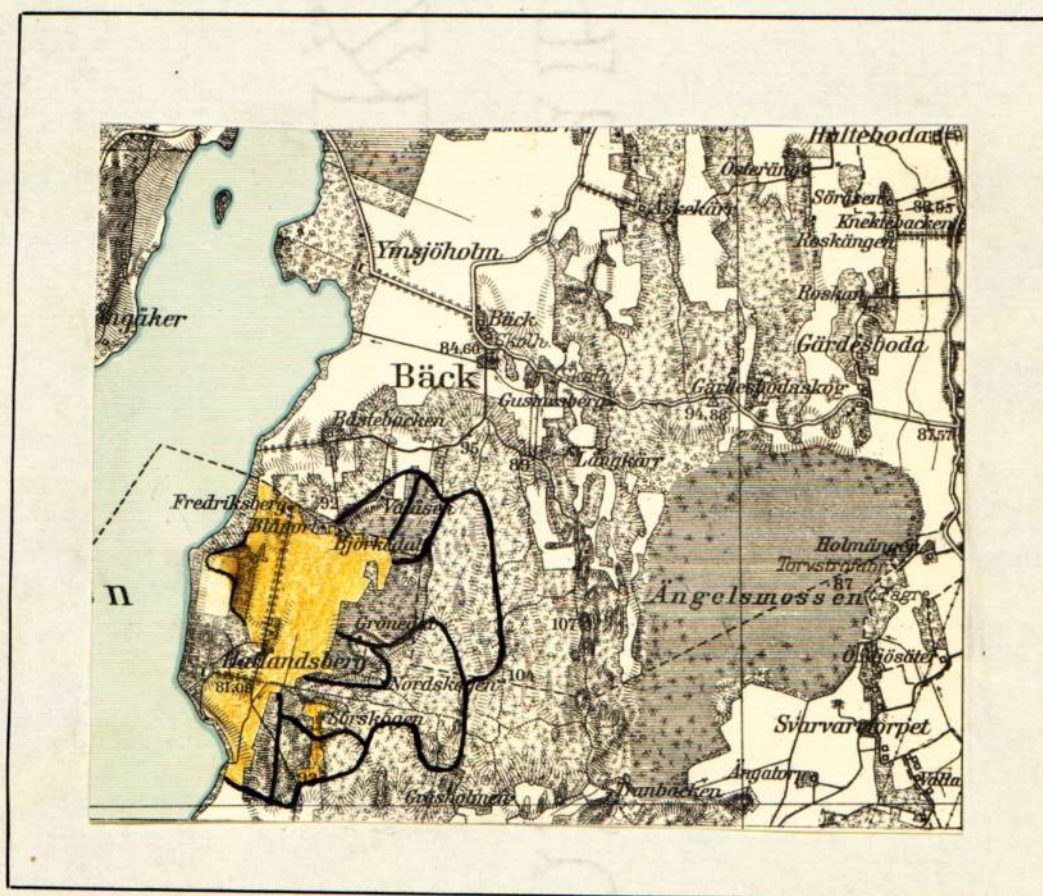

Skala 1 : 50.000

Bil. G

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallånsbergs egendom i Trästena socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och delvis igenläggning med rör av flertalet avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km från Bäcks kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 140, 1 och för ernående av bättre möjlighet till torrläggning och brukning av redan odlad jord, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där området i fråga utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende delvis vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, L-M, N-O-P-Q-R-S-T-U-V, X-Z-Y och Ä-Ö för de

1 1 1 1 2 1 3
olika huvudavlopp en samt A-A, C-C, D-D, F-F-F, F-F,

4 1 2 1 3 1 3 5 6 8 1 2 3 4
F-F, G-G-G, G-G, H-H-H-H-H-H, H-H, H-H,

6 7 9 1 1 2 4 8 10 12 13 2 3 4 5 6
H-H, H-H, E-E, E-E-E-E-E-E-E, E-E, E-E-E,

5 7 8 9 10 11 12 14
E-E, E-E, E-E, E-E, Ö-Öb-Öc, Ö-Öa, Öc-Öd, Y-Y¹

¹ ¹ ² ¹ ² ¹ ² ¹ ¹ ² ⁴
Y-Å, Z-Z, O-O, O-O, P-P, P-P, Q-Q, Q, R-R, S-S -S -S,

¹ ⁶ ² ³ ² ⁵ ⁷ ¹ ² ¹ ³ ⁵ ³ ⁴ ¹
S -S, S -S, S -S, S-S, T-T -T, T -T -T, T -T, U-U,

²
U-U för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna

härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och

enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd

linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning

för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Av-

loppens blivande dimensioner hava å profil- och sektions-

ritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna

har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts

å marken. Storleken har med blått angivits å profilritning-

arna. Samtliga vattensamlingsområden äro tydligt begrän-

sade och finnas angivna å den upprättade nivåkartan, samt

å översiktskartan. Den största till avrinning kommande

vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits

komma att uppgå till 1,5-2,0 liter pr sekund och hektar.

och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3

liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under

vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr

sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna

har avloppet E -E dimensionerats så att översvämning vid

flöden ej skall inträffa och övriga avlopp för möjliggö-

rande dessutom av torrläggning till i allmänhet 1,2 meters

djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, har å nivåkartan färglagts.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattelagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden. Därvid är att märka att genom huvudavloppens igenläggning med rör, skiftesindelingen mera rationellt kan genomföras och ett oerhört underlättande av brukningen åstadkommas. Därför måste även den s.k. brukningsbåtnaden här anses få komma i första hand när det gäller att bedöma företagets lönsamhet.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-K, ^{1 13} E -E , Å-Öc, X-Å, L-M och N-V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och deras kostnad. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Företaget berör allmän väg så till vida att genomloppen vid H ⁵ och Q ¹ är för grunda och därför måste kompletteras med djupare liggande rörledning vid sidan. ^{av upp. trumma} Då de befintliga genomloppen tillkommit efter år 1880 och kompletteringen erfordras för ovanför liggande åkers torrläggning

till 1,2 meters djup, skall det åligga vägförvaltningen att bekosta detta arbete. På grund av yrkandet i syneprotokollens § 4 skall arbetet ombetsyras av dikningsföretaget, som härför äger uppbära ersättning av vägförvaltningen, motsvarande verkliga kostnaderna för arbete och material, inbegripet även kostnaderna för dagvattenbrunnar ~~ned~~ströms vägen. Vid arbetets utförande skall av vederbörande vägdirektör lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Jämlikt yrkande av vägförvaltningens ombud §4 andra stycket skall vägtrumman på sträckan N-0 vid punkt 1+56 i det fall den visar sig otillräcklig för ifrågakommande vattenflöden omläggas med större rördimensioner på jordägarens bekostnad.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av egna vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 54 kronor 41 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, komma på sökanden, och förskjutes nu av denne.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma; att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar; att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår; att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas; att arbetena för företagets utförande kan genom entreprenad överlätas på härför skickad person; att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956; att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör

eller jordbrukskonsulent, som förklarats behörig att

handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen

samt

att det skall benämnas "Hallansbergs dikningsföretag av

år 1946"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras

vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till

vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11

kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio da-

gar från nedanstående datum.

Hallansberg, Moholm den 12 juli 1946

I tjänsten

Antony

Biträdande gode män:

Nils Jönberg
Erik Jönsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hallansbergs egendom
i Trästena socken av Skaraborgs län

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	70 [✓] ha	530:- [✓]	
	$\frac{27}{97}$ " däröver à 6:-	162:- [✓]	
Tillägg 1,8 % [✓] av kostnaden 38.915:- [✓]		700:47 [✓]	1392:47 [✓]

Övriga förrättningskostnader

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	220:-		
Ersättning till gode män	22:-	242:- [✓]	
Summa kronor		1634:47 [✓]	

Hallansberg, Moholm 12 juli 1946

Erik Munk
Jordbrukskonsulent

530,-

RÖRPROVNINGSRESULTAT.

Företag: . . . "Hallånsbergs dikningsföretag av år 1946"

Tillverkare: Carl Johansson, Bäckershoda cementvarufabrik, Lyrestad

Provnings utförd av: . . . Agronom A. Emil Nyberg

Dim.	Tillv. dag år	Provn. dag år	Rörens längd m.	Partiets storlek m.	Antal prova- de rör st.	Ford- ring- ar kg tryck x/	Höll vid ett tryck ett tryck av kg.	Brast vid ett tryck av kg.
6"	april 1946	12/7 1946	0,70	250	1	1050	1160	---
"	"	"	"	"	"	"	1233	---
"	"	"	"	"	"	"	1740	---
9"	"	"	"	1060	"	"	1320	---
"	"	"	"	"	"	"	1334	---
"	"	"	"	"	"	"	1305	---
15"	maj 1945	"	0,80	984	"	1496	1740	---
"	"	"	"	"	"	"	1798	---
"	"	"	"	"	"	"	1885	---
"	"	"	"	"	"	"	1972	---
"	"	"	"	"	"	"	1943	---
"	"	"	"	"	"	"	1972	---
"	"	"	"	"	"	"	2030	---
"	"	"	"	"	"	"	2320	---

De ... provade rörpartierna uppfyllde ... ifråga om hållfastheten för statsunderstödda torrlägningsföretag gällande föreskrifter och få ... således användas till i företaget ingående rörledning ...^{ar}

x/ Enl. kommunaltekniska
föreningens bestämmelser.

Skara den ... 13 juli 1946

I tjänsten
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

38

LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN

SKARA

TELEFON 38

POSTGIROKONTO 3 51 12

Bil J

ANALYSBEVIS

N:o 3018, 3019.

Å LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN, SKARA

har på anmodan av Hushållningssällskapet, Täckdikningsavd. Skara

undersökts prov av Vatten

inkommet den 10/12 -45

, förvarat i

förseglat

märkt

Undersökningen har givit följande resultat:

1. Från Hallansberg

Aggressiv kolsyra = 18 mg/l

Temporär hårdhet = 2,2 gr.

Angreppsförmåga obetydlig

2. Från Mellomgården, N.Lundby

Aggressiv kolsyra = 2 mg/l

Temporär hårdhet = 10,6 gr.

Angreppsförmåga praktiskt taget ingen

Skara den 12 december

19 45

Avgift enligt taxa Kr. 8:—


Föreståndare.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 2376/46-43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Hallandsbergs dikningsföretag av år 1946.

I anledning av Eder skrivelse av den 5 augusti 1946 rörande rubr. dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela, att intet är att erinra mot Edert förslag.

Vägförvaltningen förutsätter, att vederbörligt tillstånd från länsstyrelsen inhämtas, innan arbete med genomgrävning av allmän väg påbörjas, ävensom att dikningsföretaget noga iakttaga av vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetets utförande.

En ritningskopia bilägges.



Mariestad den 3 september 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Nils G. Lenas.

87 87 1046.

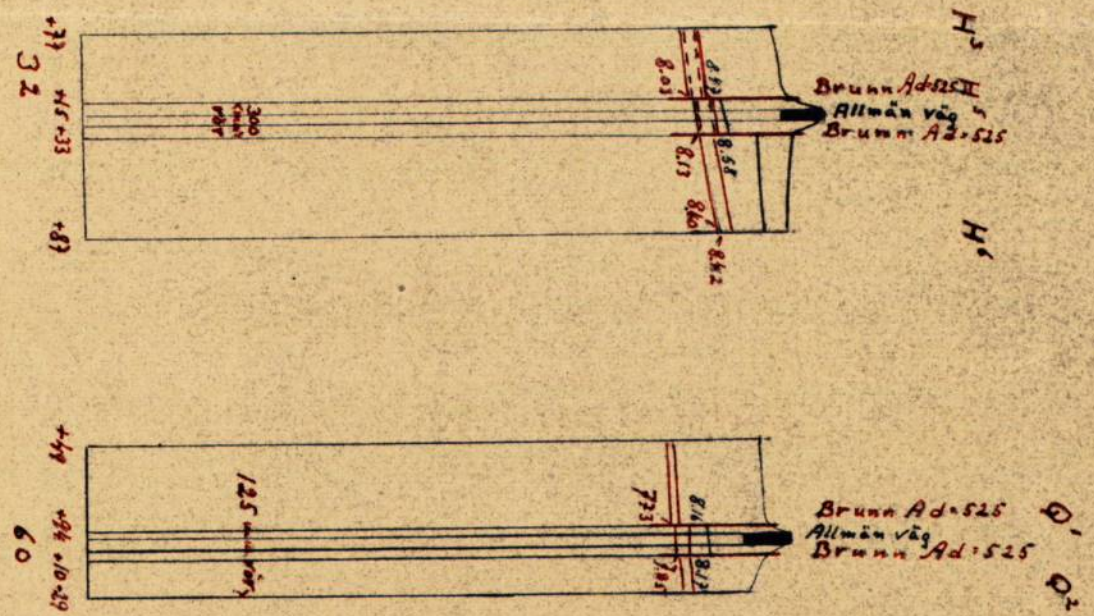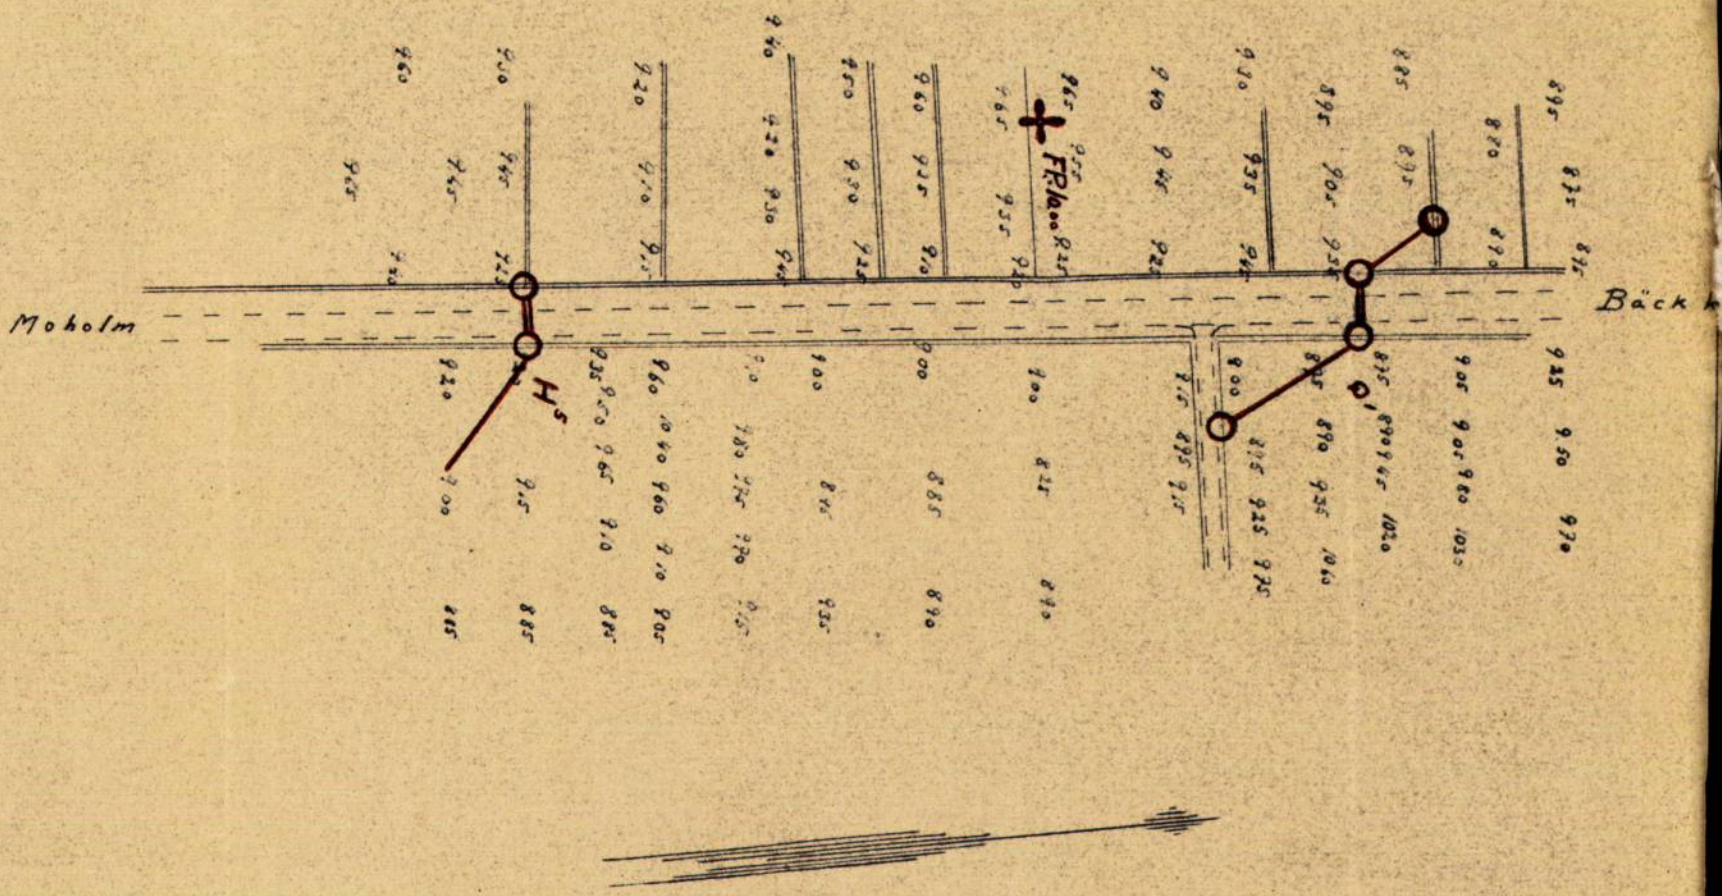


The distance between the
Tombstones of Mrs. A. B. C.


Evidence of

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

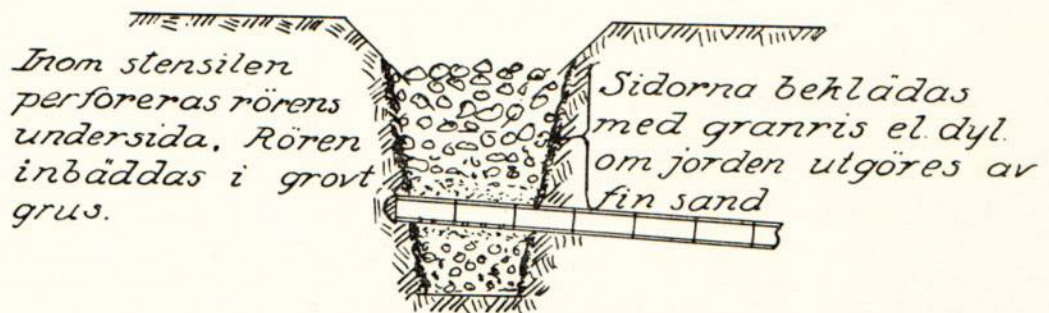

Grusfilter.

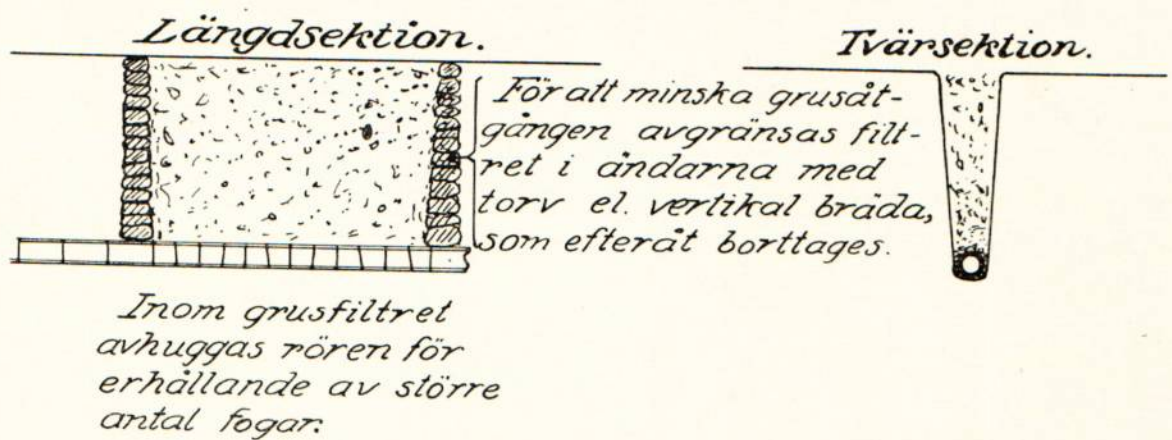







Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svår genomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rorfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.




Återfyll aldrig diken med sur, genomlättad lera.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

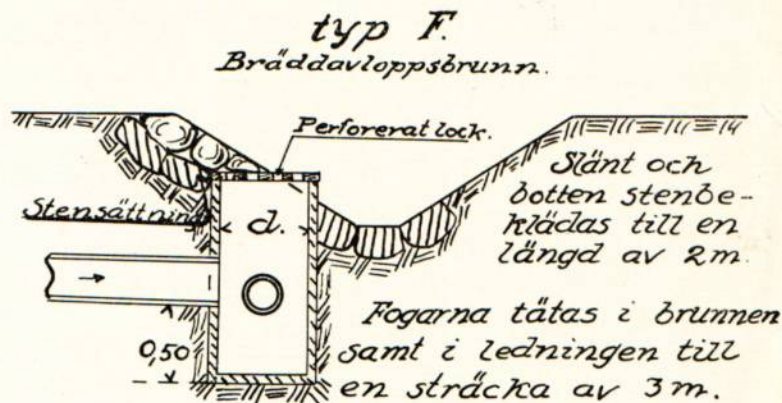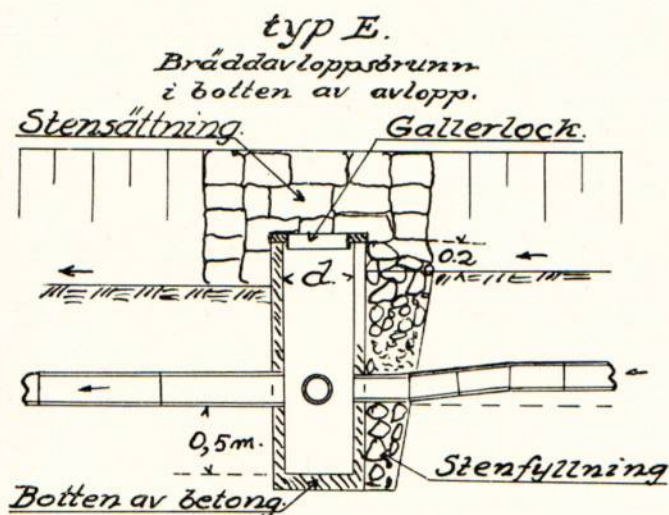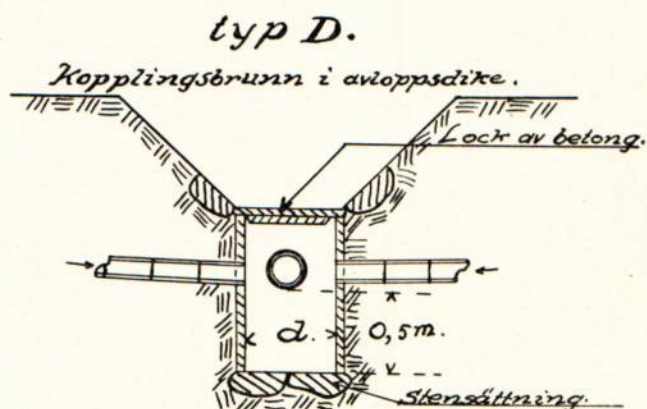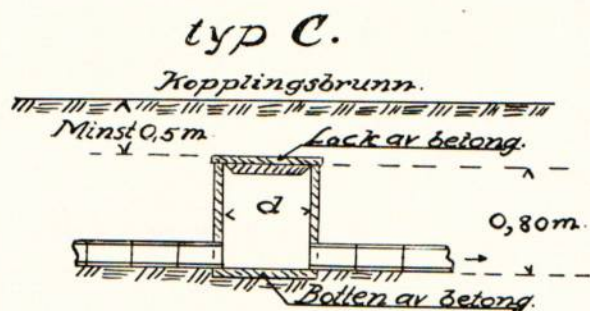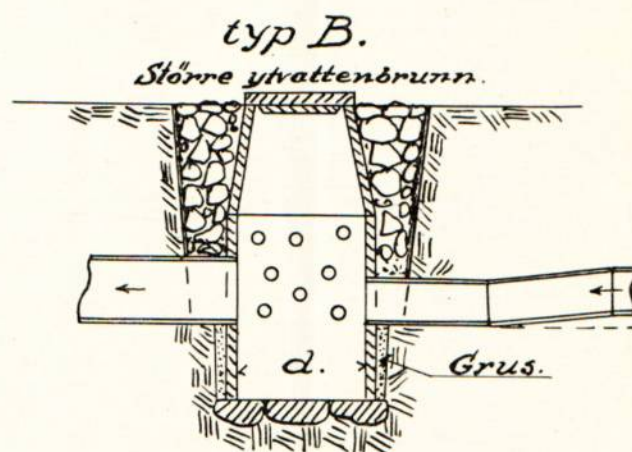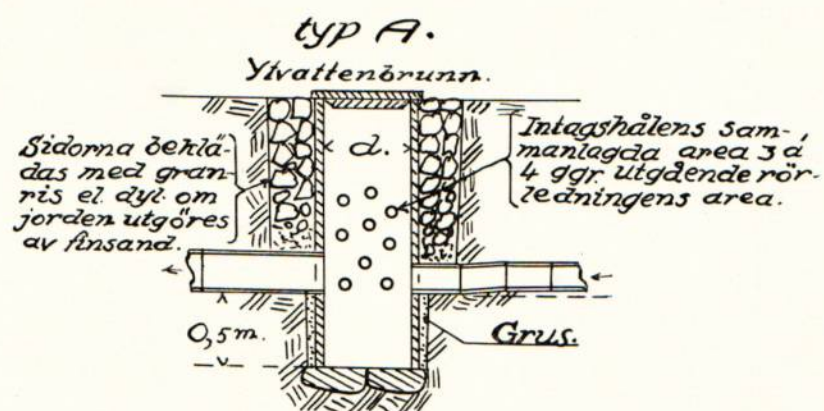

Detalj i plan.

Detaljritning av lock med hål.

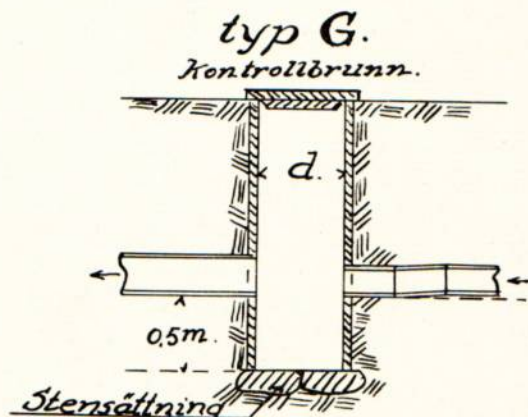

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.


Täckdikningsavdelningen.

Skara.

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikesöga.

typ A.

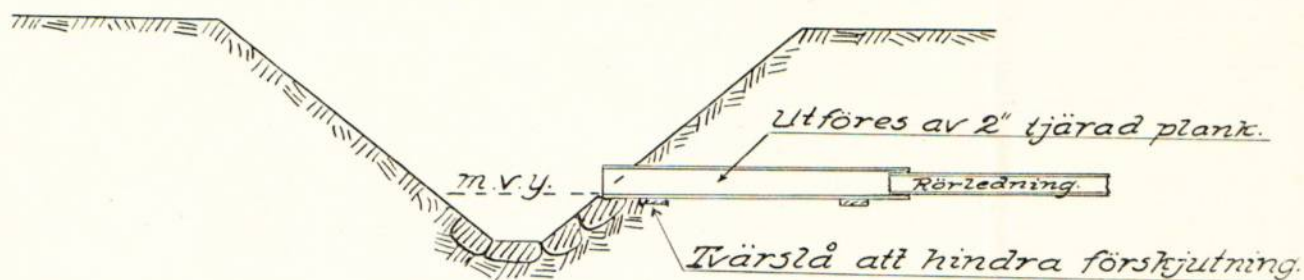

Rörutlopp.


typ B.

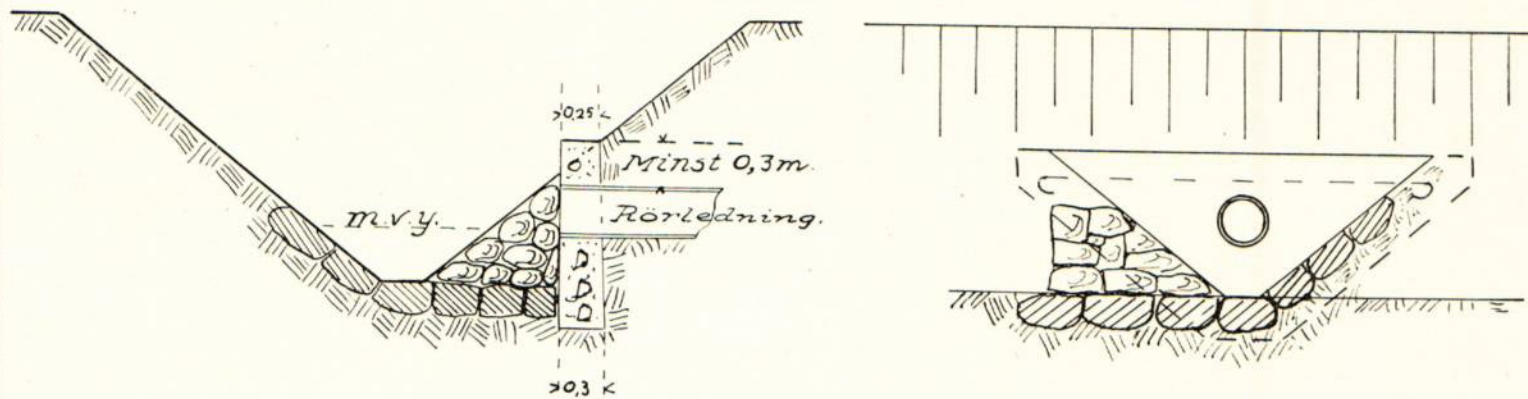

typ C.



typ D.

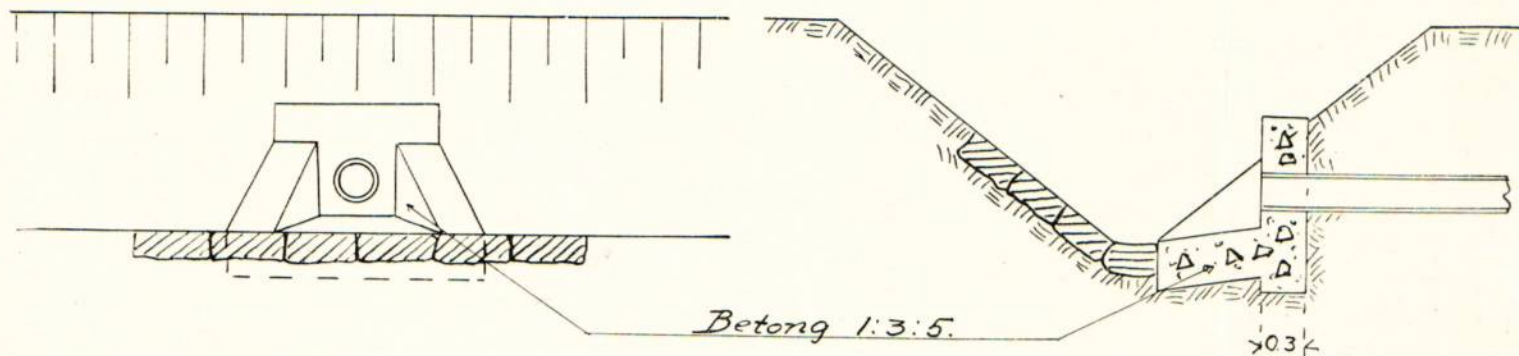

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.

Rörlöpp typ A

