



Akt nr:

R-E1a-1287

AU\$R-E1a-1287

Godk
Ändringsplan

268/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1950
DIARIUM Nr 782
SAK Nr

FÖRETAG: Moholms säteri.

Skuldförbindelse överlämnad
till *Revisor Fickberg*
den 19/5 1950
godkänd den 20/5 1950

-konsulenten
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Almlöf
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 33.970
» en första rensning » kr. 33.970
Lån till företagets utförande kr. 58.890

670

R 14*1287
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 mars 1950 till
Moholms säteri dikningsföretag av år 1948 i Mo och Bellefors
socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med trettiotretusenniohund-
rasjuttio (33.970) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med femtioåttatusenåttahundra-
nittio (58.890) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ båda intressenter ~~ende~~
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950;

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

Stockholm den 5 maj 1950

Att

Godsäg. Nils Tönqvist
Mokohuut

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hilmer Johansson

Friesla Ritt karshi

Adress

Måns Långg; Öttern

Adress

Mofolms säteri Mofolm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 maj 1950.

Lars Westin

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*
2170

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1949
DIARIE Nr 076
SÄK Nr

R 14*1287

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Moholms säteri dikningsföretag av år 1948

i Mo och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent E. Almlöf.

Statsbidrag: 28.990:- kronor.

Statslån: 57.800:- kronor.

Genom beslut den 4 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~täggning~~ kostnad av 102.036:10 kr., till företaget beviljat bidrag med 33.970:- kr. och lån
med 58.890:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Moholms säteri, dikningsföretag av år 1948 i Mo och Bellefors socknar av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

~~Ördsbetsman~~
Förtroendeman: Godsägare Nils Törnqvist, Moholm.
(titel, namn och adress)
~~Förordningsman~~
Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.
(titel och namn)



Förrättningsmannen förordnad den 24/10 1947. Förrättningen avslutad den 26/7 1948
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 14 blad-ritningar. Vid
~~i samband med förenklad syn~~
~~i samband med syn~~
förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1955 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1955

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 102.721:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 87.113:51 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Grävning, läggning och åter-
fyllning kr/m 0:65.- 15:-- , rörpriser kr/m, 375 mm 6:-- , 300 mm 4:-- , 250 mm 3:-- , 225 mm
2:55, 200 mm 2:40, 150 mm 1:67, 125 mm 1:18, 100 mm 0:90, 75 mm 0:58.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A - T	71.627	14	402	86	2.013	22	74.043	22		74.043	22
Z - Ö	1.649	20	25	80	62	46	1.737	46		1.737	46
d - f	1.660	--			165	48	1.825	48		1.825	48
g - h	890	--			81	66	971	66		971	66
i - j	590	--			56	07	646	07		646	07
k - n	1.850	--			136	88	1.986	88		1.986	88
o - p	900	--			95	90	995	90		995	90
q - t	2.010	--			164	60	2.174	60		2.174	60
å - ä	650	--			87	93	737	93		737	93
a - c	1.940	--			54	31	1.994	31		1.994	31
Summa	83.766	34	428	66	2.918	51	87.113	51		87.113	51

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor				
A - T	95	25			95	25	70.858	—	0	74.043	22	770	1/3	24.680
Z - Ö	5	06			5	06	2.198	30	0	1.737	46	340	1/3	570
d - f ₁	6	24			6	24	5.824	30	0	1.825	48	290	1/3	600
g - h ₁	2	33			2	33	2.874	40	0	971	66	410	1/3	320
i - j	2	74			2	74	1.972	80	0	646	07	230	1/3	210
k - n	5	66			5	66	4.818	10	0	1.986	88	350	1/3	660
o - p	3	84			3	84	3.375	20	0	995	90	250	1/3	330
q - t	6	84			6	84	5.793	40	0	2.174	60	310	1/3	720
å - ä	4	28			4	28	3.094	90	0	737	93	170	1/3	240
a - c ^r	2	24			2	24	1.911	80	1	1.994	31	890	1/3	660
Summa	134	48			134	48	102.721	20		87.113	51			28.990

~~och~~ bidraget belöper ~~enbart~~ sig ~~enbart~~ på företagets utförande ~~och kostnaderna för första rensning~~. Till första rensning har ej beräknats bidrag när kostnaden är jämförelsevis obetydlig.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
A - T	70.858	--	100.000	74.043	22	2/3	49.360
Z - Ö	2.198	30	"	1.737	46	2/3	1.140
d - f ₁	5.824	30	"	1.825	48	2/3	1.200
g - h ₁	2.874	40	"	971	66	2/3	640
i - j	1.972	80	"	646	07	2/3	420
k - n	4.818	10	"	1.986	88	2/3	1.320
o - p	3.375	20	"	995	90	2/3	660
q - t	5.793	40	"	2.174	60	2/3	1.440
å - ä ₁	3.094	90	"	737	93	2/3	480
a - c ₁	1.639	80	85.773	1.710	58	2/3	1.140
Summa	102.449	20		86.829	78		57.800

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av såväl bruksnings- som alstringsbåtnad.

Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastighet.

Arbetet är till största delen utfört.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatta bidrag och lån av statsmedel.

Kostnaden för företagets utförande överstiger för samf. A - T och a - c¹ jordförbättringen. Enligt nämndens mening är dock bruksningsbåtnaden genom företaget lågt uppskattad. Statsbidrag har ~~dock~~ ^{därför} tillstyrkts ~~enär~~ ^{synnerligast som} dikningen ifråga är en oundgänglig förutsättning för att Moholms egendom med dess mycket omfattande byggnadsbestånd skall kunna brukas rationellt och driften bli ekonomiskt lönande.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

Ingen av de två berörda fastigheternas åkerareal understiger 10 ha.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 23.990 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 57.800 kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~läggnings~~ kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån
med kr. samt fastställt arbetsplanen | i oförändrat skick.
| ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

KOMPLETTERING TILL **BETÄNKANDE**
rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Moholms säteri dikningsföretag av år 1948 i Mo och Bellefors socknar av Skaraborgs län
(företagets namn samt socken och län)

~~Ördbok~~ ~~Styrelsen~~
Förtroendeman: **Godsägare Nils Törnqvist, Moholm** (titel, namn och adress)
~~Ägare~~
Förrättningsman: **Lantbrukskonsulent Erik Almlöf** (titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den **24/10 1947** Förrättningen avslutad den **26/7 1948**
Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
| ~~samband med förenkade syn~~ och omfattar **1** häfte..... handlingar och **14** blad ritningar. Vid
| ~~samband med förenkade syn~~
förrättningen bestämd arbetstid **31/12 1955** I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den **1/9 1955**

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN 1950
DIARIUM NR 076/49
SAK

Båtnad (social båtnad ej inräknad) **102.721:20** kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) (beräknad) **87.113:51** kronor.
(verklig) **102.036:10**
För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag. (verkliga kostnaderna)

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - T	85.299	10	402	86	2.046	19	87.743	15		87.743	15
Z - Ö	1.814	02	25	80	60	18	1.900	-		1.900	-
d - f ₁	1.939	83			159	45	2.099	28		2.099	28
g - h ₁	1.038	74			73	69	1.117	43		1.117	43
i - j	736	50			54	02	790	52		790	52
k - n	1.914	60			131	89	2.046	49		2.046	49
o - p	1.023	-			92	41	1.115	41		1.115	41
q - t	2.255	19			158	61	2.413	80		2.413	80
Å - ä ₁	725	98			84	73	810	71		810	71
a - c	1.941	97			52	34	1.994	31		1.994	31
Summa	98.688	93	428	66	2.918	51	102.036	10		102.036	10

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre			
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - T	95	25			95	25	70.858	-	0	87.748	15	921	1/3	29.240
Z - Ö	5	06			5	06	2.198	30	0	1.900	-	375	"	630
d - f ₁	6	24			6	24	5.824	30	0	2.099	28	336	"	690
g - h ₁	2	33			2	33	2.874	40	0	1.117	43	480	"	370
i - j	2	74			2	74	1.972	80	0	790	52	289	"	260
k - n	5	66			5	66	4.818	10	0	2.046	49	362	"	680
o - p	3	84			3	84	3.375	20	0	1.115	41	290	"	370
q - t	6	84			6	84	5.793	40	0	2.413	80	353	"	800
Å - Ä ₁	4	28			4	28	3.094	90	0	810	71	189	"	270
a - c	2	24			2	24	1.911	80	1	1.994	31	890	"	660
Summa	134	48			134	48	102.721	20		102.036	10			33.970

Bidraget belöper sig på företagets utförande och omräknat på en första rensning. Låneberäkning. har bidrag ej beräknats, enär kostnaden är jämförelsevis obetydlig.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
A - T	70.858	-	100,000	87.748	15	2/3	49.600
Z - Ö	2.198	30	"	1.900	-	"	1.260
d - f ₁	5.824	30	"	2.099	28	"	1.380
g - h	2.874	40	"	1.117	43	"	740
i - j	1.972	80	"	790	52	"	520
k - n	4.818	10	"	2.046	49	"	1.360
o - p	3.375	20	"	1.115	41	"	740
q - t	5.793	40	"	2.413	80	"	1.600
Å - Ä ₁	3.094	90	"	810	71	"	540
a - c	1.639	80	85.773	1.710	58	"	1.140
Summa	102.449	20		101.752	37		58.880

x/ Lånet begränsat till 70 % av jordförbättringen.

Den 18 maj 1949 avgav lantbruksnämndens i Skaraborgs län delegation för inre rationalisering betänkande rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företaget.

Sedan betänkandet avgivits har företaget i det närmaste slutförts, varför de verkliga kostnaderna i huvudsak är kända och uppgå till ovan redovisade belopp, vilka grunda sig på bilagda preliminära uppgift över verkliga kostnaderna. Med hänsyn till de redovisade kostnaderna får nämnden föreslå att statsbidrag och lån beviljas med de belopp, som här ovan angivas för varje samfällighet.

För samfälligheten A - T har förhållandet mellan den beräknade jordförbättringen och kostnaden blivit ännu ogynnsammare än vad tidigare beräknats. Nämnden får ändock tillstyrka att statsbidrag utgår, enär det är angeläget och försvarbart att dikningen kommer till utförande, då den samma är en oundgänglig förutsättning för att Moholms egendom med dess mycket omfattande byggnadsbestånd skall kunna brukas rationellt och driften bli ekonomiskt lönande.

Enligt nämndens mening är dessutom bruksbåtnaden, som för samfälligheten A - T uppskattats till 200:- kr pr ha, eller 18.536, mycket lågt beräknad. Med hänsyn till den mekanisering av jordbruksdriften, som efter dikningens genomförande sker på en egendom av denna storleksordning, kan den mycket väl beräknas till det dubbla.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 33.970 kr. och dels lån från statens avdikningslånefond med 58.880 kr.

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende har delegationens samtliga ledamöter deltagit nämligen; ordf. sekreteraren Elis Enderstein, godsägaren Rolf Eliasson och lantbrukaren Arvid Andersson, samt som föredragande lantbrukskonsulenten Erik Almlöf. Skara den 10 januari 1950.

På lantbruksnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor

Elis Enderstein

Erik Almlöf

PRELIMINÄR UPPGIFT

Över verkliga kostnader vid Moholms säteri, dikningsföretag av år 1948 i Mo och Bellefors socken av Skaraborgs län, grundad på av företags förtroendeman lämnade uppgifter.

	Santfällighet										Summa		Anmärkning
	A-T	Z-Ö	a-c ¹	d-f	g-h ¹	i-j	k-n	o-p	q-t	Å-Ä	Kr.	Öre	
Syreförrättningen	1.939:90	60:18	52:34	159:45	78:69	54:02	131:89	92:41	158:61	84:73	2.812	22	
Vattendomstolsavgift	106:29										106	29	
Betänkanden m.m.											--	--	
Jordersättning	402:86	25:80									428	66	
Arbetskostnad	56.420:75	986:88	954:66	755:83	509:31	407:55	742:03	373:41	866:07	241:--	62.257	49	
Materialkostnad	23.739:49	698:74	875:65	843:80	361:54	213:70	891:17	452:43	1.050:72	304:20	29.431	44	
Extra arbeten (berg+slamrensning)	1.034:72	32:10	27:92	85:05	41:97	28:81	70:35	49:29	84:60	45:19	1.500	--	
Diverse omkostnader	1.000:--										1.000	--	
Räntor under arbetstiden	2.897:20	89:88	78:16	238:14	117:52	80:68	196:98	138:01	236:88	126:55	4.200	--	
Kostnad för avsyning, debiteringslängd, utredning ang. ytterligare statsbidrag m.m. oförutsett	206:94	6:42	5:58	17:01	8:40	5:76	14:07	9:86	16:92	9:04	300	--	
Summa kronor	87.748:15	1.900:--	1.994:31	2.099:28	1.117:43	790:52	2.046:49	1.115:41	2.413:80	810:71	102.036	10	
Beräknad kostnad	74.043:22	1.737:46	1.994:31	1.825:48	971:66	646:07	1.986:88	995:90	2.174:60	737:93	87.113	51	
Båtnad	70.858:--	2.198:30	1.911:80	5.824:30	2.874:40	1.972:80	4.818:10	3.375:20	5.793:40	3.094:90	102.721	20	

Moholms säteri, Moholm den 21 december 1949

Nils Törnqvist

Nils Törnqvist
Företagets förtroendeman

Undertecknad har tagit del av företagets räkenskaper, vilka godkännas:

Skara den 3 januari 1950.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

" 3. Fastighetsförteckning.


" 4. Sammanställning av förrättningskostnader och dylikt.


I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit samtliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbrukskonsulanten E. Almlöf.

Skara den 18 maj 1949.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering.


Elis Enderstein


Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av lantbrukskonsulenten Erik
Almlöf handlagd, den 26 juli 1948 avslutad syneförrättning
rörande Moholms säteris dikningsföretag av år 1948 i Mo och
Bellefors socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomsstols kansli den 31 januari 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i Moholms säteri dikningsföretag av år
1948, Mo och Bellefors socknar, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Nils Törnqvist,
Moholms säteri och Karl Andersson, Armeneby, Moholm.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Karl Andersson.

§ 2

Till företagets förtroendeman utsågs Nils Törnqvist.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nils Törnqvist förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

§ 4

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras,
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat samt
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyf-

tande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Moholm den 26 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Justerat:

Karl Andersson

Karl Andersson

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i Moholms Säteri dikningsföretag av år 1948, Mo och Bellefors socknar, Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Mo socken.

Moholm, del av 1¹ ✓

Mobotorp eller Kroken 19¹

Mobotorp 13¹

Mobotorp 14¹

Mo Söderkvarn 4¹
(ett vattenfall)

Mo 18¹³

Torp under 1¹

Torpslund

Kärret

Nygårdet

Stenstorp

Godsägare Nils Thörnkvist

Skara den 14 maj 1949.


I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

strykn. med blått vitt. i bröstet.

Moholms säteri, dikningsföretag av år 1948 i Mo och Bellefors socknar av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrätningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ersättning enl. arvodesräkning i synehandlingarna						2.777	72
		Vattendomstolsavgift						106	29
		Lagakraftsbevis				3	50		
		Inbindning av handlingarna				4	--		
		Kartornas uppklistring på väv				27	--		
						34	50	2.884	01
								34	50
						<u>Summa utgifter</u>		2.918	51
		Skara den 16 maj 1949.							
		I tjänsten:							
									
		Erik Almlöf							

FÖREDRAGET

DEN 23 MAJ 1950

BEVIS
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

over verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MAJ 1950

DIARIE NR 782

SAK Nr

Företag: Moholms säteri dikningsföretag av år 1948

(namn, socken och län)

Godsägare Nils Törnqvist, Moholms säteri, Moholm.
 Förtroendeman:
 Entreprenör:

Arbetsplanen fastställd den 4 mars 1950

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 33.970:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 58.890:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

den 12 maj 1950, har befunnits att företaget utförts i sin helhet enligt förslaget med nedanstående avvikelser från detsamma:

Diket Ä-Ö, dikets läge ändrat på grund av pinnmo och berg.Diket Ä-Ä¹, brunnen vid 156+53 slopad. I stället satt en brunn vid 156+35.Öppna avloppen nyslammade i vår (1950) samt jordbankarna utspridda. Samtliga täckta avlopp och därtill hörande brunnar utförda av lantbruksnämndens täckdikningsförmän.

Förslagets slutliga kostnader 102.036:10 kr., varav räntor under arbetstiden 4.200:- kr., framgår av den komplettering till betänkande, som avgivits av lantbruksnämnden den 3 januari 1950.

Med anledning av ovanstående får undertecknad förorda att företaget godkännes för utbetalande av beviljat statsbidrag och lån.

Skara den 12 maj 1950.

I tjänsten:


*Erik Almlöf*Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.*Godkännande med de ändringar
Ändringarna införda i arbetsplanen.*

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m .

✓ 24x ✓
Härmed översändes kontrakt, skuldförbindelse och rekvisition rörande Moholms säteri dikningsföretag av årl 1948 i Mo och Bellefors socknar av Skaraborgs län, jämte bevis om verkställd avsyning samt utdrag ur debetsedlar å fastighetsskatt enligt 1948 års taxering. ✓

Enär företaget i sin helhet är utfört, är sökanden angelägen att erhålla hela det beviljade bidraget och lånet. Skara den 16 maj 1950.

Enligt uppdrag:

Martha Ellnäs-Jord

1950 den 23 maj.

MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 4 mars 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 58.890 kronor till utförande av Moholms säteri dikningsföretag av år 1948 i Mo och Bellefors socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Mo socken</u> Moholm	av 1 ¹	Nils Törnqvist

Stockholm den 23 maj 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

M. H.

4

Moholms söter² of 1948:

Skarb-l.

Fortioemmen:

Gosag. M² Torngvint

Moholms söter²:

Moholms

Skuldf.

2 reho.

Levis + ands. i plen

(Gosag. Torngvint har vid present
levert: Lästn. d. 22/5 färdig till
rätt för mig. Gripenberg, samt med-
delat. (Bev.)

24

~~afford~~

Ser. E XIII *komb*

2170

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JULI 1948

STAMP Nr.

R 14*1287

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2170-14

Handlingar angående

Moholms säteri dikningsföretag av år 1948

i Mo och Bellefors socknar av Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen
av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

H
350

komb

Protokoll för vid sammankommande enligt vattenlagen för tilläggning av mark tillhörande Moholms Låteri m. fl. fastigheter i Mo socken av Skaraborgs län.

Den 28 november 1947, i Moholms gård, Moholm

Närvarande: Andatskнад, jordbruksnämndens Erik Ahlström, försättningsman samt skiftesgodsmännen Josef Johansson Ponten Mo, Moholm och Eric Adolfsen Klabbängen, Moholm, Örnens följande sakägare:

Säkrarna:

Godsägare Nils Törngvist äg.

Moholm, del av 1'

Mobtorps l. Krokem 19'

Mobtorps 13'

Mobtorps 14'

Mo Långskogen 4'

(ett vattenfall)

Mo 18¹³

Torp under 1'

Torpslund

Kärrst

Nygårdst

Stenstorp

Tot. värde 184.200.-kr.

Jordk. värde 170.300.-

Skogsvärde 13.900.-

Av övriga sakägare:

Karl Andersson äg. 1/5 del. Arvsmästy 1⁸ - 1⁹

Böllerfors socken.

31

Upplästes det för försättningsmannen utförda förordnandet, som hade lydelse ned. bil. A.

§ 2

Köpet för mot förädlingsmannen eller
skiftesgodsmannen anmålades ej.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen uppgif-
tade nivåkartan öfver det rättshä-
nsäade området samt profiler öfver öfver-
floden härifrån.

Äganderättsförhållandena och fastighe-
ternas registerbeteckningar kontrollerades.

§ 4.

Löshandeln yrkade på, att så stor del av öf-
verfloden som möjligt medtages i synskrift-
ningen och att de i största möjliga ut-
sträckning utföres täckta, så att egendoms-
mannens åsigt på täckningens enligt den
uppgiftade täckningsplanen och be-
hövs på ändamålsenligast sätt.

§ 5.

Synsammannen förtogs därefter syn-
gång för åsättande av markvidden och
fästning av förlaget.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet antas förklarades sammantidigt
enligt vad tillkännagivande att nytt sam-
mantidigt komma att utlysas sedan för-
sättningen kompletterats.

Öfver all tid som öfver
Öfverfloden
Beträffande.

~~Att~~ Tillägg till förordningen
beträffande gods m.m.

Den 26 juli 1948, i Moholms gård, Moholm.

Närvarande: länsteknisk jordbrukskonsulent Erik Skulaf, förättningsman samt skiftesgodsmännen Josef Johansson, Tomte Moholm och Eric Adolfsson, Krabbångan, Moholm äro utse-
da båda sakägarna godsägaren Nils Torng-
qvist, Moholms gård och Karl Andersson, Åmums-
by, Moholm.

§ 7.

Förklarades den redan föregående sammankom-
stadens gälligt ställda nivåkartan över det villan
begränsade området med tillhörande planer,
konstruktionsplan, värderingsplan och bostads-
fördelningsplan m. m. Förättningsmannen
redogjorde för det upprättade förslaget med
tillhörande handlingar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som
hade lydelse m. m. vil. 7

§ 9.

Att mottaga förvar till förslaget rörande
sitningar och handlingar och att sammankalla
delägarna för val av styrelse utsågo
synemännens godsägaren Nils Torngqvist,
Moholms säteri, Moholm.

§ 10.

Samt intet vidare fanns att till protokollet
anteckna, förklarades förättningen
avslutad och sammankommit upplöst.

Beträffande goda män. Det var till som ovan

Erik Skulaf i tjänsten
Karl Andersson biträde.

E. D. 82-49
1947

Bilaga A



Till/

Länsstyrelsen, Mariestad.

./. Med överlämnande av bifogade ansökan, avseende syneförrätt-
ning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Moholms
säteri i Mo socken, får torrlägningsnämnden härmed vördsamt före-
slå, att jordbrukskonsulent E. Almlöf, Skara, måtte förordnas att
handlägga syneförrättningen i fråga.

Skara den 23 oktober 1947.

På torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

~~XXXXXXXXXX~~ Jordbrukskonsulen-

ten E. Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasattas förordning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 24/10 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Elias Brandel

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 29/9 1942 Dnr. 107
Exp. den 23/10 1942 nr. 41

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
socken(-nar) av Skaraborgs
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser Torrläggning för

dränering
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
cirka 140 ha, cirka 8000 mt.
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Mölholm

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Mölholms Säteri
Godsägare Nils Törngren Mölholms Säteri Mölholm
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.
tel. 24

Mölholm den 12 juli 1946.
för Mölholms Säteri Nils Törngren

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Kramareby Sällfars

Karl Andersson

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:


F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträden hos godsägare Nils Törnqvist, Moholms gård, Moholm den 28 november 1947 och 26 juli 1948.

Nils Törnqvist	Moholms gård	Moholm
Karl Andersson	Armeneby	"
Skiftesgodemannen Josef Johansson	Tomten	"
"	Eric Adolfsson	Krabbängen

Skara den 12 juli 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Skara den 8/6 1948

Till Västerbygdens vattendomstol

Vänersborg.


Åberopande telefonsamtal med herr Vattenrättsdomare N. Lindberg får jag härmed vördsamt anhålla om yttrande beträffande en avloppsförrättning, som handlägges i samband med laga syneförrättning och till vilken undertecknad förordnats som förrättningsman.

Å bilagda ljuskopia har inritats de områden som beröras. Tacksam för yttrande dels beträffande eventuell ändring av vattenståndsförhållandena i Tidan mellan fallen vid Sträte och Moholms gård, som kan komma att uppstå i samband med utslag rörande dämmningsrätten vid Tidan och dels huruvida vattendomstolen känner till förhållandena som i framtiden kunna tänkas ändra vattenytan i Tidan ovanför fallet vid Moholm.

Jag ber att få påpeka, att en vall finnes upplagd i gränsen mellan Moholms gård och Backen samt Ameneby. Denna vall är upplagd för flera år sedan och är avsikten med densamma att hindra översvämning inom Moholms gårds ägor vid högvatten i Tidan. Vallen är tillräckligt hög för berörda ändamål i nuvarande vattenlägen, varför avsikten är att i detta avseende ej föreslå några kompletterande åtgärder i samband med den pågående förrättningen.

Tacksam för yttrande huruvida det kan vara lämpligt avsluta ifrågavarande förrättning innan Vattendomstolens utslag föreligger.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Västerbygdens vattendomstol

Herr Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf,
Skaraborgs läns hushållningssällskap,

Skara.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 dennes får jag anföra följande.

Genom dom i mål A.M. 42/1941 den 10 maj 1946, som vunnit laga kraft, har Västerbygdens vattendomstol medgivit Kraftaktiebolaget Nykvarn-Tidan att bibehålla och begagna Lunne kraftanläggning i Tidan inom Vads och Götlunda socknar av Skaraborgs län sådan densamma befunnes, under förutsättning att viss ändring verkställdes, vilket villkor emellertid i detta sammanhang saknar intresse. Dämning vid Lunnedammen fick enligt domen ske till höjden + 14,00 m i visst höjdsystem.

Vid vattendomstolen finnas nu anhängiga mål angående ansökningar av bolaget om tillstånd till dels tillfällig vattenreglering vid Lunne kraftanläggning (A.M. 50/1946), dels ock ökad dämning därstädes (A.M. 68/1947).

I målet A.M. 50/1946 har bolaget genom deldom den 31 juli 1947, som vunnit laga kraft, erhållit tillstånd jämlikt 1939 års lag om tillfällig vattenreglering att vid Lunnedammen medelst påsadling av skiborden där uppdämma vattnet till höjden + 14,57 m, vilken höjd motsvarar den nivå, vartill dämning där tillämpats alltsedan år 1932. Tillståndet gäller till den 29 augusti 1949.

I målet A.M. 68/1947 har bolaget begärt rätt enligt vattenlagen att genom höjning av påsadlingen på skiborden öka dämningen vid Lunnedammen till höjden + 14,90 m.

Toppen av dubben på högra stranden vid Strätefallet ligger enligt utredning i målet A.M. 42/1941 på höjden ungefär + 15,00 m i förevarande höjdsystem. Enligt i samma mål åberopade handlingar har Vadsbo södra häradsrätt genom utslag den 13 september 1894, fastställt av Göta hovrätt genom dom den 22 februari 1895, medgivit Jonas Jakobsson i Sträte att medelst en delvis redan uppförd damm vid fallet uppdämma vattnet till visst vattenmärke, som blev utsatt av häradsrätten, i det att "uti den stora i åkanten omedelbart norr om vägen från Jakobssons boningshus till dammbyggnaden belägna jordfasta sten inslogs på dess mot ån vettande flata sida en järndubb; och utmärker borrhålets nedre kant den tillåtna vattenhöjden". Nämda vattenmärke torde vara den fixpunkt, som å den av Eder översända kartkopian angivits hava höjdläget + 6,07 m i där använt höjdsystem. Emellertid skall ju dämningshöjden motsvara borrhålets nedre kant. Dubben höjer sig, enligt vad som antecknats vid vattendomstolens syn den 27 maj 1943 i målet A.M. 42/1941, 6,5 cm över stenens yta. Dämningssgränsen skulle då motsvara ungefär höjden + 14,95 m i det uti sagda liksom uti de nu anhängiga, ovan nämnda målen antagna höjdsystemet.

I en av vattenrättsingenjören Harald Larsson i sistnämnda mål avgiven promemoria har Larsson - vars antagande om höjden + 15,00 m, i stället för kanske rätteligen ett 5-tal cm lägre höjd, såsom tidigare fastställd dämningshöjd icke torde spela större roll i sammanhanget - uttalat följande angående inverkan på Sträte vattenfall och vattenstånden därovanför av dämningshöjningen till + 14,90 m vid Lunnedammen: "Vid Sträte vattenfall föreligger rätt att dämna till en viss järndubb, vars höjd enligt vad tidigare anförts är lägst 15,00 m men troligen en eller annan cm högre. För låga vattenföringar upp till åtminstone vegetationsmedelvattenföringen

Lunne
1490

Sträte 1495

F.P. = 14.95 (6.02)

11

5,9 m³/s kan med visshet sägas, att vid dämning i nuvarande dammen vid Lilla Lunne till 14,90 m, vattenståndet nedom Sträte vattenfall blir praktiskt taget detsamma. Areal i nedre delen av fallet, i sektion 2613, är enligt Håårds diagram vid vattenståndet 14,90 m 43 m² och hastigheten vid en vattenföring av 5,9 m³/s således 0,14 m/s. För att bilda denna hastighet erfordras en tryckhöjd av endast 0,06 x $\frac{2}{0,14}$ eller 1,2 mm. Då dämningshöjden ligger minst 10 cm högre, är det uppenbart, att någon uppdamning utöver den befintliga dämningrätten icke kan ske vid nämnda vattenföring eller vattenföringar därunder. För att åstadkomma en dämning i sektionen av 10 cm vid vattenståndet 14,90 m erfordras en hastighet av 1,29 m/s, motsvarande en vattenmängd av 55 m³/s eller således mera än normal flod. Det naturliga vattenståndet är emellertid då avsevärt högre och dämningshöjden alltså i samma grad mindre, säkerligen endast ett fåtal cm och givetvis endast en bråkdel av den dämningssverkan, den lagliga dammen i Sträte skulle hava åstadkommit vid samma vattenföring.

I tidigare utredning är visat, att dämningssverkan vid exceptionella högvattenföringar upphör redan långt nedom avledningsstället vid sektion 1650 och således icke alls når Strätefallet.

Som slutresultat framstår, att Strätefallet vid låga vattenföringar blir praktiskt taget utplånat men däremot fullständigt oberört vid de allra högsta vattenföringarna. Något värde i fallet ur vattenkraftsynpunkt kan emellertid icke anses kvarstå. Vattenstånden ovanför Strätefallet, med den förefintliga dämningrätten där utövad, bliva opåverkade vid samtliga förekommande vattenföringar.

Av förefintlig utredning i samtliga ovannämnda mål (vatten-domstolen företog vid syn den 21 april 1948 i de nu anhängiga

målen avvägningar av vissa täckdikesögon å Moholms mark uppströms Strätefallet) samt av den av Eder översända kartkopian torde framgå, att de flesta täckdikesögonen vid Tidans högra strand mellan fallen vid Sträte och Moholms gård ligga eller föreslagits ligga under det ovan omtalade dämmningsvattenståndet vid Sträte å något över höjden + 6,00 m i det å kartkopian angivna höjdsystemet. Jag förutsätter nu, att nämnda dämmningsrätt vid Sträte fortfarande äger giltighet. För genomförandet av dikningsföretaget å Moholms gård kan man väl sålunda säga den förutsättningen måste antagas vara gjord, att Strätefallet icke utnyttjas mer än nu är händelsen vid dämning till + 14,57 m vid Lunne, under det att för bolagets vattenkraftföretag med ökad dämning till + 14,90 m förutsättes att hela Strätefallet utnyttjas genom dämningen vid Lunne. Man kan sålunda betrakta företagen såsom konkurrerande i fråga om Strätefallet. Dikningsföretaget bör väl nämligen antagas ev. genom ersättningar till ägarna till dämmningsrätten vid Sträte skaffa sig garanti för att dämmningsrätten ej kommer att i framtiden utnyttjas. Mig förefaller det sålunda som om bestämmelserna i 10 kap. 55 § vattenlagen här äro tillämpliga. I sådant fall må vid syneförrättningen angående dikningsföretaget slutligt utlåtande ej meddelas, innan vattendomstolen i samband med prövningen av ansökningsmålet A.M. 68/1947 meddelat besked om dikningsföretagets och dämmningsföretagets förhållande till varandra. För detta ändamål bör då Ni såsom förrättningsman översända handlingarna i ärendet till vattendomstolen för erhållande av dylikt besked.


Skulle Ni vara av annan mening än här framförts och vilja avsluta förrättningen nu, torde Ni väl ändock böra lämna såväl ägaren av Strätefallets högra sida som också kraftbolaget tillfälle att yttra sig i ärendet.

~~yttra sig i ärendet.~~

Beträffande Eder fråga om vattenståndsförhållandena i Tidan ovanför fallet vid Moholm får jag meddela följande:

Såvitt rör vattenståndsförhållandena vid Moholms gård torde vattendomstolen icke haft till behandling annat mål eller ärende därom än vad angår den s.k. Hedvigströmmen som synes vara identisk med den å den av Eder översända kartkopian angivna översta forsen. Genom dom den 8 mars 1946 har vattendomstolen medgivit samma bolag som ovan nämnts att verkställa rensningar nedströms den bolaget tillhöriga Armeneby kraftanläggning, omfattande jämväl rensningar i Hedvigströmmen. I detta företag har jämväl ägaren till Moholms gård förpliktats deltaga med 1,33 %, dock högst till båtnadsvärdet för gården eller 1.730 kr. Däremot skulle sagda ägare ersättas för sin andel i vattenkraften i strömfallet med 2.000 kr. Arbetena skola vara utförda före utgången av år 1955.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juni 1948.



Nils Lindberg.
Vattenrättsdomare.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Mo socken										
2	<u>Samfälligheten q - t</u>										
3	Moholm del av 1 ¹										
4	Nils Törnqvist										
5	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
6	åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	1	2	45			900	1800	900	2.205	- ✓
7	"	2	2	03			1170	"	630	1.278	90 ✓
8	"	3	1	70			1080	"	720	1.224	- ✓
9	"	4	0	35			900	"	900	315	- ✓
10	"	5	0	31			900	"	900	279	- ✓
11		A-summa	6	84	✓					5.301	90 ✓
12	2. <u>Brukningbåtnad</u>										
13	ägofig. 1-5		6	84	✓				50	342	- ✓
14	endast brukn.båtn. fig. 6-7		2	99			(1750	1800)	50	149	50 ✓
15		B-summa	9	83	✓					491	50 ✓
16	<u>Samfälligheten q-t totalsumma</u>									5.793	40 ✓
17											
18	<u>Samfälligheten o - p</u>										
19	Moholm del av 1 ¹										
20	Nils Törnqvist										
21	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
22	åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	8	2	16			1080	1800	720	1.555	20 ✓
23	"	9	1	68			900	"	900	1.512	- ✓
24		A-summa	3	84	✓					3.067	20 ✓
25	2. <u>Brukningbåtnad</u>										
26	ägofig. 8-9		3	84	✓				50	192	- ✓
27	endast brukn.båtn. fig. 10-11		2	32			(1750	1800)	50	116	- ✓
28		B-summa	6	16	✓					308	- ✓
29	<u>Samfälligheten o - p totalsumma</u>									3.375	20 ✓
30											
31											
32											
33											

L N W B V 1 2

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
<u>Samfälligheten k - n</u>										
Moholm del av l ¹										1
Nils Törnqvist										2
1. <u>Alstringsbåtnad</u>										3
Åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	12	2	75			990	1800	810	✓ 2.227 50	4
"	13	1	25			1080	"	720	✓ 900 -	5
"	14	0	55			810	"	990	✓ 544 50	6
"	15	0	15			990	"	810	✓ 121 50	7
"	16	0	39			1080	"	720	✓ 280 80	8
"	17	0	38			900	"	900	✓ 342 -	9
"	18	0	19			1080	"	720	✓ 136 80	10
A-summa		5	66	✓					✓ 4.553 10	11
2. <u>Brukningsbåtnad</u>										12
ägofig. 12-13		4	00	✓				50	200 -	13
endast bruken. båtn. fig. 19-20		1	30			(1750	1800)	50	65 -	14
B-summa		5	30	✓					265 -	15
Samfälligheten k - n totalsumma									✓ 4.818 10	16
<u>Samfälligheten i - j</u>										
Moholm del av l ¹										17
Nils Törnqvist										18
1. <u>Alstringsbåtnad</u>										19
Åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	21	2	24			1080	1800	720	✓ 1.612 80	20
"	22	0	50			1080	"	720	✓ 360 -	21
Samfälligheten i - j	A-summa	2	74						✓ 1.972 80	22
<u>Samfälligheten g - h^I</u>										
Moholm del av l ^I										23
Nils Törnqvist										24
1. <u>Alstringsbåtnad</u>										25
Åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	25	0	08			720	1800	1080	✓ 86 40	26
"	26	1	80			720	"	1080	✓ 1.944 -	27
"	27	0	45			720	"	1080	✓ 486 -	28
A-summa		2	33	✓					✓ 2.516 40	29

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad											
ägofig. 18,21-22, 25-27			5	26					50	263	- ✓
endast bruken.båtn. fig. 23-24			1	90			(1750	1800)	50	95	- ✓
B-somma			7	16	✓					358	- ✓
Samfälligheten g - h ¹ total-somma										2.874	40 ✓
Samfälligheten å - ä											
Moholm del av l ¹											
Nils Törnqvist											
åker, mullhaltig styv lera på ler- botten		28	0	60			630	1800	1170	702	- ✓
"		29	1	55			1170	"	630	976	50 ✓
"		30	0	58			1170	"	630	365	40 ✓
"		31	1	55			1260	"	540	837	- ✓
A-somma			4	28	✓					2.880	90 ✓
2. Brukningsbåtnad											
fig. 28-31			4	28					50	214	- ✓
Samfälligheten å - ä totalsomma										3.094	90 ✓
Samfälligheten d - f											
Moholm del av l ¹											
Nils Törnqvist											
1. Alstringsbåtnad											
åker, mullhaltig styv lera på lera botten		32	0	77			900	1800	900	693	- ✓
"		33	1	05			1080	"	720	756	- ✓
"		34	0	70			990	"	810	567	- ✓
"		35	1	13			900	"	900	1.017	- ✓
"		36	1	22			900	"	900	1.098	- ✓
"		37	1	37			810	"	990	1.356	30 ✓
A-somma			6	24	✓					5.487	30 ✓
2. Brukningsbåtnad											
ägofig. 32-37			6	24	✓				50	312	- ✓
endast bruken.båtn. fig. 38			0	50	✓		1750	1800	50	25	- ✓
B-somma			6	74	✓					337	- ✓
Samfälligheten d - f totalsomma										5.824	30 ✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
1											
2											
3											
4											
5											
Åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	39	1	80			1260	1800	540	972	✓	5
"	40	0	19			720	1200	480	✓ 91	20	6
"	41	0	38			660	"	540	✓ 205	20	7
"	42	0	36			960	"	240	✓ 86	40	8
"	43	1	80			880	1600	720	✓ 1.296	-	9
"	44	0	50			800	"	800	✓ 400	-	10
"	45	1	30			800	"	800	✓ 1.040	-	11
"	46	1	65			720	"	880	✓ 1.452	-	12
"	47	1	58			800	"	800	✓ 1.264	-	13
"	48	0	70			900	1500	600	✓ 420	-	14
"	49	1	08			970	"	530	✓ 572	40	15
"	50	1	05			830	"	670	✓ 703	50	16
"	51	0	44			670	"	830	✓ 365	20	17
"	52	0	44			720	1300	580	✓ 255	20	18
"	53	0	45			390	"	910	✓ 409	50	19
"	54	0	58			720	"	580	✓ 336	40	20
"	55	0	15			520	"	780	✓ 117	-	21
"	56	0	69			580	"	720	✓ 496	80	22
"	57	0	20			580	"	720	✓ 144	-	23
"	58	0	51			390	"	910	✓ 464	10	24
"	59	0	80			390	"	910	✓ 728	-	25
"	60	0	45			600	1500	900	✓ 405	-	26
"	61	0	55			750	"	750	✓ 412	50	27
"	62	0	65			720	1300	580	✓ 377	-	28
"	63	0	80			580	"	720	✓ 576	-	29
"	64	1	65			970	1500	530	✓ 874	50	30
"	65	0	44			900	"	600	✓ 264	-	31
"	66	0	98			1020	1700	680	✓ 666	40	32
"	67	0	81			1190	"	510	✓ 413	10	33
Överföres		22 98		✓					✓ 15.807 40		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		22	98	✓					✓15.807	40
2	Åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	68	1	45			940	1700	760	✓1.102	-
3	"	69	1	12			680	"	1020	✓1.142	40
4	"	70	1	95			850	"	850	✓1.657	50
5	"	71	0	39			1190	"	510	✓198	90
6	"	72	0	78			1100	"	600	✓468	-
7	"	73	1	12			1190	"	510	✓571	20
8	"	74	2	85			1280	"	420	✓1.197	-
9	"	75	2	10			850	"	850	✓1.785	-
10	"	76	1	08			1360	"	340	✓367	20
11	"	77	0	98			1190	"	510	✓499	80
12	"	78	1	58			1020	"	680	✓1.074	40
13	"	79	0	50			1120	1500	380	✓190	-
14	"	80	2	34			940	1700	760	✓1.778	40
15	"	81	1	83			1190	"	510	✓933	30
16	"	82	0	60			1050	1500	450	✓270	-
17	"	83	0	90			1050	"	450	✓405	-
18	"	84	1	70			1450	1700	250	✓425	-
19	"	85	1	77			1530	"	170	✓300	90
20	"	86	1	15			1360	"	340	✓391	-
21	"	87	1	30			1020	"	680	✓884	-
22	"	88	0	68			900	1500	600	✓408	-
23	"	89	1	02			970	"	530	✓540	60
24	"	90	0	17			1050	"	450	✓76	50
25	"	91	0	74			530	"	970	✓717	80
26	"	92	0	24			600	"	900	✓216	-
27	"	93	0	49			900	"	600	✓294	-
28	"	94	0	55			830	"	670	✓368	50
29	"	95	0	40			1200	"	300	✓120	-
30	"	96	0	60			750	"	750	✓450	-
31	"	97	0	25			1200	"	300	✓75	-
32	"	98	6	24			1450	1700	250	✓1.560	-
33	Överföres		61	85	✓					✓36.274	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		61	85	✓					✓36.274	80
Åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	99	1	28			1280	1700	420	✓537	60
"	100	1	80			1190	"	510	✓918	-
"	101	0	92			680	"	1020	✓938	40
"	102	1	20			850	"	850	✓1.020	-
"	103	2	10			940	"	760	✓1.596	-
"	104	0	80			850	"	850	✓680	-
"	105	2	50			1520	1600	80	✓200	-
"	106	1	30			1120	"	480	✓624	-
"	107	0	44			1520	"	80	✓35	20
"	108	1	00			1200	"	400	✓400	-
"	109	0	15			1270	1300	30	✓4	50
"	110	0	25			960	1600	640	✓160	-
"	111	0	85			1440	"	160	✓136	-
"	112	0	38			800	"	800	✓304	-
"	113	0	35			1280	"	320	✓112	-
"	114	1	08			1200	"	400	✓432	-
"	115	0	25			1360	1700	340	✓85	-
"	116	1	80			1530	"	170	✓306	-
"	117	0	86			940	"	760	✓653	60
"	118	1	88			940	"	760	✓1.428	80
"	119	0	72			1020	"	680	✓489	60
bete, mullrik lera på lerbotten	120	1	00			780	1200	420	✓420	-
Åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	121	3	06			1280	1700	420	✓1.285	20
"	122	1	12			1360	"	340	✓380	80
"	123	2	30			1020	"	680	✓1.564	-
"	124	0	50			1170	1300	130	✓65	-
"	125	0	20			840	"	460	✓92	-
"	126	0	93			990	"	310	✓288	30
"	127	0	31			460	"	840	✓260	40
"	128	0	11			580	"	720	✓79	20
"	129	0	17			910	"	390	✓66	30
Överföres		93	46	✓					✓51.836	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			93	46	✓					✓51.836	70
1											
2	Åker, mullhaltig styv lera på ler- botten	130	0	38			1230	1300	70	26	60✓
3	bete, mullrik lera på lerbotten	131	0	25			1190	1200	10	2	50✓
4	"	132	0	35			780	"	420	147	-✓
5	"	133	0	34			910	"	290	98	60✓
6	"	134	0	20			840	"	360	72	-✓
7	"	135	0	22			720	"	480	105	60✓
8	"	136	0	05			540	"	660	33	-✓
9		A-summa	95	25	✓					52.322	-✓
10	2. Brukningsbåtnad.										
11	Ägofig. 39-58,60-96,98-108,110-119,										
12	121-123,126-130		90	94	✓				200	18.188	-✓
13	endast brukn.båtn. fig. 137		0	27			(1000	1200)	200	54	-✓
14	" " " 144-146		0	37			(1100	1300)	200	74	-✓
15	" " " 139-140		0	29			(1300	1500)	200	58	-✓
16	" " " 138,142,143		0	51			(1400	1600)	200	102	-✓
17	" " " 140a, 141		0	30			(1500	1700)	200	60	-✓
18		B-summa	92	68	✓					18.536	-✓
19	Samfälligheten A - T totalsumma									70.858	-✓
20											
21	<u>Samfälligheten Z - Ö</u>										
22	<u>Moholm del av 1¹</u>										
23	Nils Törnqvist										
24	1. Alstringsbåtnad										
25	bete, mullrik lera på lerbotten	147	1	00			840	1200	360	360	-✓
26	"	148	1	30			840	"	360	468	-✓
27	"	149	0	86			840	"	360	309	60✓
28	"	150	0	65			480	"	720	468	-✓
29	"	151	0	36			660	"	540	194	40✓
30	"	152	0	36			540	"	660	237	60✓
31	"	153	0	25			960	"	240	60	-✓
32	"	154	0	15			780	"	420	63	-✓
33	"	155	0	13			910	"	290	37	70✓
	Samfälligheten Z - Ö	A-summa	5	06	✓					2.198	30✓

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag										
Moholm del av 1 ¹										
Nils Törnqvist										
Samfälligheten q - t	1 - 5 ✓	6	84	✓		11900:60	17694		✓ 5.793	40
Samfälligheten o - p	8 - 9	3	84	✓		7712:80	11088		✓ 3.375	20
Samfälligheten k - n	12-18	5	66	✓		7709:90	12528		✓ 4.818	10
Samfälligheten i - j	21-22	2	74	✓		2959:20	4932		✓ 1.972	80
Samfälligheten g - h ¹	25-27	2	33	✓		4739:60	7614		✓ 2.874	40
Samfälligheten å - ä	28-31	4	28	✓		4609:10	7704		✓ 3.094	90
Samfälligheten d - f	32-37	6	24	✓		6307:70	12132		✓ 5.824	30
Samfälligheten A - T	39-136	95	25	✓		84737:-	155595		✓ 70.858	-
Samfälligheten Z - Ö	147-155	5	06	✓		3873:70	6072		✓ 2.198	30
Samfälligheten a - c ¹	156-160	2	24	✓		1720:20	3360		✓ 1639	80
Bellefors socken										
Armeneby 1 ⁸ , 1 ⁹										
Karl Andersson	161-162					2788:-	3060		272 -	✓
Summa		134	48	✓		139057:80	241779		102.721	20
								Summa alstringsbåtnad	81.760	50
								Summa brukningsbåtnad	20.960	70
Moholm den 26 juli 1948										
I tjänsten:										
Erik Almlöf										
Jordbrukskonsulent										
Eric Adolfsson										
Josef Johansson										
Biträdande gode män:										

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
		Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
		m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1	<u>Mo socken</u>										
2	<u>Moholm av 1¹</u>										
3	Nils Törnqvist										
4	<u>Samfälligheten A - T</u>										
5	<u>Sträckan Q - T</u>										
6	32+12 - 38+37					750	17	127	50	127	50
7	38+50 - 40+6	352	17	59	84	924	17	157	08	216	92
8	40+60 - 41+27	80	13	10	40	268	13	34	84	45	24
9	44 - 45+10					110	12	13	20	13	20
10											
11	<u>Samfälligheten Z - Ö</u>										
12	<u>Sträckan Å - Z</u>										
13	46+70 - 48+16	48	12	5	76	167	12	20	04	25	80
14											
15	Summa			76	00			352	66	428	66
16	Skara den 19 juli 1948										
17	I tjänsten										
18	<i>Erik Almlöf</i>										
19	Erik Almlöf										
20	Lantbrukskonsulent										
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - T</u>								
2	586	<u>Sträckan A - B - C</u>								
3	0-5+86	375 mm rör med frakt m.	586	6:-	3.516	- ✓				
4	0-2+28	Grävn.lägg. o återfylln. "	228	3:60	820	80 ✓				
5	2+28-3+16	Grävn.spräng.lägg. " "	88	53:-	4.664	- ✓				
6	3+16-3+26	Grävn.lägg. o återfylln. "	10	10:-	100	- ✓				
7	3+26-3+92	Grävn.sprängn.lägg. " "	66	53:-	3.498	-				
8	3+92-5+86	Grävn.lägg. o återfylln. "	194	7:-	1.358	- ✓				
9	0	Rörutlopp B st	1	40:-	40	-				
10	0+90	Brunn G d=900 "	1	75:-	75	-				
11	2+28,3+5									
12	4+38,5+86	" B d=900 "	4	100:-	400	- ✓				
13	4+96	" C d=900 "	1	40:-	40	-				
14	0+90,2+64	Rivning av broar "	2	20:-	40	-	14.551	80 ✓		
15		Arbetsledning och oförutsett					1.398	20	15.950	- ✓
16										
17	511	<u>Sträckan C - D - E - F - G</u>								
18	5+86-8+2	375 mm rör med frakt m	216	6:-	1.296	- ✓				
19	8+2-10+97	300 " " " " "	295	4:-	1.180	- ✓				
20	5+86-7+10	Grävn.lägg. o återfylln. "	124	8:-	992	- ✓				
21	7+10-9+27	" " " " "	217	15:-	3.255	- ✓				
22	9+27-10+62	Grävn.spräng.lägg. " "	135	53:-	7.155	- ✓				
23	10+62-10+97	Grävn.lägg. o återfylln. "	35	6:-	210	- ✓				
24	7+10,8+2	Brunn B d=900 st	2	100:-	200	- ✓				
25	8+91,10+97	Brunn B d=800 "	2	95:-	190	- ✓	14.478	- ✓		
26		Arbetsledning och oförutsett					1.412	-	15.890	- ✓
27										
28	957	<u>Sträckan G - H - I - K - L - M - N</u>								
29	10+97=11+30-12+53	300 mm rör med frakt m	123	4:-	492	- ✓				
30										
31	12+53-15+34	375 " " " " "	281	6:-	1.686	- ✓				
32	15+34-16+62	300 " " " " "	128	4:-	512	- ✓				
33	16+62-19+82	250 " " " " "	320	3:-	960	- ✓				
34	19+82-20+87	200 " " " " "	105	2:40	252	- ✓				
35		Överföres			3.902	- ✓			31.840	- ✓

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört							46.880	-
2		331	<u>Diket B - B¹ - B²</u>								
3	135-135+50		200 mm rör med frakt m.	50	2:40	120	- ✓				
4	135+50-										
5	136+38		150 " " " "	88	1:67	146	96 ✓				
6	136+38-										
7	136+68		125 " " " "	30	1:18	35	40 ✓				
8	136+68-										
9	138+31		75 " " " "	163	0:58	94	54 ✓				
10	135-135+50		Grävn.lägg. o återfylln.	50	1:85	92	50 ✓				
11	135+50-										
12	136+68		" " " "	118	1:60	188	80 ✓				
13	136+68-										
14	138+31		" " " "	163	0:75	122	25 ✓				
15	136+78-										
16	136+90,										
17	137+52-										
18	137+64		Sprängning av sten			100	-				
19	136+68,										
20	138+31		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	- ✓	990	45 ✓		
21			Arbetsledning och oförutsett					109	55 ✓	1.100	- ✓
22											
23		134	<u>Diket B¹ - B³</u>								
24	133-134+34		75 mm rör med frakt m	134	0:58	77	72 ✓				
25	133-134+34		Grävn.lägg. o återfylln.	134	1:20	160	80 ✓				
26	134+34		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	- ✓	273	52 ✓		
27			Arbetsledning och oförutsett					26	48 ✓	300	- ✓
28											
29		150	<u>Diket C - C¹ - C²</u>								
30	148-149+30		150 mm rör med frakt m	130	1:67	217	10 ✓				
31	149+30-										
32	149+50		100 " " " "	20	0:90	18	- ✓				
33	148-149+30		Grävn.lägg. o återfylln.	130	1:00	130	- ✓				
34	149+30-										
35	149+50		" " " "	20	0:60	12	- ✓				
36	149+50		Brunn A d=375 obs! st	1	35:-	35	-				
37	149+40-										
38	149+44		Rivning av bro "	1	20:-	20	-	432	10 ✓		
39			Arbetsledning och oförutsett					67	90	500	- ✓
40			Överföres							48.780	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							✓ 48.780	-	1
	212	<u>Diket C¹ - C³</u>									2
145-146+50		125 mm rör med frakt m.	150	1:18	177	- ✓					3
146+50- 147+12		100 " " " "	62	0:90	55	80 ✓					4
145-146+50		Grävn.lägg. o återfylln.	150	1:15	172	50 ✓					5
146+50- 147+12		" " " "	62	0:90	55	80 ✓					6
146+50 147+12		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	- ✓	551	10	✓		7
		Arbetsledning och oförutsett					58	90	✓	610 -	8
	390	<u>Diket E - E¹ - E²</u>									9
125-125+35		200 mm rör med frakt m	35	2:40	84	- ✓					10
125+35- 128+1		150 " " " "	266	1:67	444	22 ✓					11
⁺¹ 128-128+90		100 " " " "	89	0:90	80	10 ✓					12
125-125+35		Grävn.lägg. o återfylln.	35	1:45	50	75 ✓					13
125+35- 128+1		" " " "	266	1:25	332	50 ✓					14
128+1- 128+90		" " " "	89	1:10	97	90 ✓					15
125+35 126+19 126+94 128+1 128+90		Brunn A d=450 st	5	45:-	225	- ✓					16
126+15- 126+19		Rivning av bro "	1	20:-	20	- ✓	1.334	47	✓		17
		Arbetsledning och oförutsett					135	53	✓	1.470 -	18
	86	<u>Diket E¹ - E³</u>									19
130-130+86		75 mm rör med frakt m	86	0:58	49	88 ✓					20
130-130+86		Grävn.lägg. o återfylln.	86	1:10	94	60 ✓					21
130+86		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	- ✓	189	48	✓		22
		Arbetsledning och oförutsett					20	52	✓	210 -	23
		Överföres							✓	51.070 -	24

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							51.070	- ✓
2	180	<u>Diket F - F¹</u>								
3	120-120+50	125 mm rör med frakt m.	50	1:18	59	- ✓				
4	120+50- 121+80	100 " " " "	130	0:90	117	- ✓				
5	120-120+50	Grävn.lägg. o återfylln.	50	1:15	57	50 ✓				
6	120+50- 121+50	" " " "	100	0:90	90	- ✓				
7	121+50- 121+80	" " " "	30	1:25	37	50 ✓				
8	121+80	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	- ✓	406	- ✓		
9		Arbetsledning och oförutsett					44	-	450	- ✓
10										
11										
12										
13	224	<u>Diket G - G¹</u>								
14	200-201+39	125 mm rör med frakt m	139	1:18	164	02 ✓				
15	201+39- 202+24	100 " " " "	85	0:90	76	50 ✓				
16	200-201+39	Grävn.lägg. o återfylln.	139	1:-	139	- ✓				
17	201+39- 202+24	" " " "	85	1:40	119	- ✓				
18	201+39 202+24	Brunn A d=450 st	2	45:-	90	- ✓	588	52 ✓		
19		Arbetsledning och oförutsett					61	48	650	- ✓
20										
21										
22										
23	72	<u>Diket H - H¹</u>								
24	210-210+72	100 mm rör med frakt m	72	0:90	64	80 ✓				
25	210-210+72	Grävn.lägg. o återfylln.	72	0:90	64	80 ✓				
26	210+72	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	- ✓	164	60 ✓		
27		Arbetsledning och oförutsett					15	40	180	- ✓
28										
29	110	<u>Diket J - J¹</u>								
30	212-213+10	100 mm rör med frakt m	110	0:90	99	- ✓				
31	212-213+10	Grävn. lägg. o återfylln.	110	0:90	99	- ✓				
32	213+10	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	- ✓	243	- ✓		
33		Arbetsledning och oförutsett					27	-	270	- ✓
34		Överföres							52.620	- ✓
35										

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	-		Överfört							55.240	-
2		150	<u>Diket L - L¹</u>								
3	215-215+80		100 mm rör med frakt m.	80	0:90	72	- ✓				
4	215+80-		75 " " " "	"	0:58	40	60 ✓				
5	216+50			70							
6	215-216		Grävn.lägg. o återfylln.	"	0:90	90	- ✓				
7	216-216+50		" " " "	"	1:20	60	- ✓				
8	216+50		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	- ✓	297	60 ✓		
9			Arbetsledning och oförutsett					32	40	330	- ✓
10											
11		180	<u>Diket M - M¹</u>								
12	220-220+36		100 mm rör med frakt m	36	0:90	32	40 ✓				
13	220+36-		75 " " " "	"	0:58	83	52 ✓				
14	221+80			144							
15	220-221+80		Grävn.lägg. o återfylln.	"	1:20	216	- ✓				
16	221+80		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	- ✓	366	92 ✓		
17			Arbetsledning och oförutsett					43	08	410	- ✓
18											
19		160	<u>Diket M - M²</u>								
20	218-219		125 mm rör med frakt m	100	1:18	118	- ✓				
21	219-219+60		100 " " " "	"	0:90	54	- ✓				
22	218-219		Grävn.lägg. o återfylln.	"	1:15	115	- ✓				
23	219-219+60		" " " "	"	1:30	78	- ✓				
24	219+60		Brunn A d=375 <i>obesepat</i> st	1	35:-	35	- ✓	400	- ✓		
25			Arbetsledning och oförutsett					40	-	440	- ✓
26											
27		240	<u>Diket M - M³</u>								
28	223-224+64		100 mm rör med frakt m	164	0:90	147	60 ✓				
29	224+64-		75 " " " "	"	0:58	44	08 ✓				
30	225+40			76							
31	223-225+40		Grävn.lägg. o återfylln.	"	1:20	288	- ✓				
32	224+64		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	- ✓				
33	225+40		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	- ✓	559	68 ✓		
34			Arbetsledning och oförutsett					60	32	620	- ✓
35			Överföres							57.040	- ✓

DAJNUTER: 17000

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							✓57.040	-
	230	<u>Diket P - P¹</u>								
67-68+2		150 mm rör med frakt m.	102	1:67	170	34	✓			
68+2-69+30		100 " " " "	128	0:90	115	20	✓			
67-68+2		Grävn.lägg. o återfylln.	102	1:-	102	-	✓			
68+2-68+88		" " " "	86	0:75	64	50	✓			
68+88-69+30		" " " "	42	1:30	54	60	✓			
68+2,69+30		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-	✓	596	64	✓
		Arbetsledning och oförutsett						63	36	✓660 -
	437	<u>Diket R - R¹ - R² - R³ - R⁴</u>								
60-60+70		225 mm rör med frakt m	70	2:55	178	50	✓			
60+70-61+54		200 " " " "	84	2:40	201	60	✓			
61+54-62+34		125 " " " "	80	1:18	94	40	✓			
62+34-63+82		100 " " " "	148	0:90	133	20	✓			
63+82-64+37		75 " " " "	55	0:58	31	90	✓			
60-60+70		Grävn.lägg. o återfylln.	70	1:80	126	-	✓			
60+70-61+54		" " " "	84	1:60	134	40	✓			
61+54-62+34		" " " "	80	1:40	112	-	✓			
62+34-63+82		" " " "	148	1:30	192	40	✓			
63+82-64+37		" " " "	55	1:20	66	-	✓			
60+70		Brunn A d=525 st	1	55:-	55	-	✓			
61+54,62+34 63+14,63+82		Brunn A d=450 "	4	45:-	180	-	✓			
64+37		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	✓	1.540	40	✓
		Arbetsledning och oförutsett						159	60	✓1.700 -
	176	<u>Diket R¹ - R⁵</u>								
320-320+50		100 mm rör med frakt m	50	0:90	45	-	✓			
320+50 321+76		75 " " " "	126	0:58	73	08	✓			
320-320+50		Grävn.lägg. o återfylln.	50	0:90	45	-	✓			
320+50-321+76		" " " "	126	0:75	94	50	✓			
321+76		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	✓	292	58	✓
		Arbetsledning och oförutsett						27	42	✓320 -
		Överföres							✓59.720 -	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							59.720	-
2	110	<u>Diket R² - R⁷</u>								
3	325-326+10	100 mm rör med frakt m.	110	0:90	99	- ✓				
4	325-326+10	Grävn.lägg. o återfylln. Ø	110	0:90	99	- ✓				
5	326+10	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	- ✓	243	- ✓		
6		Arbetsledning och oförutsett					27	-	✓270	-
7										
8	103	<u>Diket R³ - R⁶</u>								
9	65-66+3	75 mm rör med frakt m	103	0:58	59	74 ✓				
10	65-66+3	Grävn.lägg. o återfylln. m	103	0:75	77	25 ✓				
11	66+3	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	- ✓	171	99 ✓		
12		Arbetsledning och oförutsett					18	01	✓190	-
13										
14	1268	<u>Sträckan Q - T</u>								
15	32+12-38+37	Schaktning av lera m ³	192	2:40	460	80 ✓				
16		Jordersättning			127	50 ✓				
17	38+37-41+27	Schaktning av lera "	670	2:15	1.440	50 ✓				
18		Jordersättning			262	16 ✓				
19	41+27-44+50	Schaktning av stenbunden lera och mo m ³	273	6:-	1.638	- ✓				
20	41+45-41+55	Sprängning av berg "	10	25:-	250	- ✓				
21	44+50-45+10	Schaktning av lera "	15	2:50	37	50 ✓				
22		Jordersättning			13	20 ✓				
23	38+37-38+42	Rörbro E d=525 st	1	160:-	160	-				
24	40+10-40+16									
25	44+76-44+80	Träbro "	2	80:-	160	- ✓	4.549	66		
26		Arbetsledning och oförutsett					570	34	5.120	-
27										
28										
29	405	<u>Diket U - U¹</u>								
30	140-141+11	200 mm rör med frakt m	111	2:40	266	40 ✓				
31	141+11-142+98	150 " " " "	187	1:67	312	29 ✓				
32	142+98-144+5	100 " " " "	107	0:90	96	30 ✓				
33	140-141+11	Grävn.lägg. o återfylln. "	111	1:45	160	95 ✓				
34		Överföres			835	94 ✓			✓65.300	-
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
-		Överfört			835	94 ✓			✓65.300	-	1
141+11- 141+99	141+11	Grävn.lägg. o återfylln. m.	88	1:20	105	60 ✓					2
141+99- 143+11		" " " " "	112	1:70	190	40 ✓					3
143+11- 144+5		" " " " "	94	0:90	84	60 ✓					4
141+99- 142+4		Rörens framdrag. genom väg			10	-					5
140		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	- ✓					6
141+11, 142+4 142+98 144+5		Brunn A d=450 "	4	45:-	180	- ✓					7
141+99		Stensil "	1	10:-	10	- ✓	1.431	54	✓		8
		Arbetsledning och oförutsett					148	46	✓1.580	-	9
	288	Diket V - V ¹									10
70-70+87		150 mm rör med frakt m	87	1:67	145	29 ✓					11
70+87-71+78		125 " " " " "	91	1:18	107	38 ✓					12
71+78-72+88		100 " " " " "	110	0:90	99	- ✓					13
70-70+87		Grävn.lägg. o återfylln. "	87	2:10	182	70 ✓					14
70+87-71+78		" " " " "	91	1:95	177	45 ✓					15
71+78-72+88		" " " " "	110	1:30	143	- ✓					16
70		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	- ✓					17
70+87, 71+78 72+88		Brunn A d=450 "	3	45:-	135	- ✓	1.004	82	✓		18
		Arbetsledning och oförutsett					105	18	✓1.110	-	19
	526	Diket Y - Y ¹ - Y ²									20
75-77+42		200 mm rör med frakt m	242	2:40	580	80 ✓					21
77+42-78+6		150 " " " " "	64	1:67	106	88 ✓					22
78+6-79+7		125 " " " " "	101	1:18	119	18 ✓					23
79+7-79+73		100 " " " " "	66	0:90	59	40 ✓					24
79+73-80+26		75 " " " " "	53	0:58	30	74 ✓					25
75-77+42		Grävn.lägg. o återfylln. "	242	2:-	484	- ✓					26
77+42-79+7		" " " " "	165	1:50	247	50 ✓					27
79+7-80+26		" " " " "	119	1:25	148	75 ✓					28
		Överföres			1.777	25 ✓			✓67.990	-	29

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			1.777	25			67.990	-
2	75	Täckdikesöga A st.	1	15:-	15	-	✓			
3	76+5, 77+42									
4	78+6, 79+7									
5	79+73, 80+26	Brunn A d=450 "	6	45:-	270	-	✓	2.062	25	✓
6		Arbetsledning och oförutsett						207	75	
7										
8	90	<u>Diket Y¹ - Y³</u>								
9	99-99+90	75 mm rör med frakt m	90	0:58	52	20	✓			
10	99-99+90	Grävn.lägg. o återfylln. "	90	0:75	67	50	✓			
11	99+90	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	✓	154	70	✓
12		Arbetsledning och oförutsett						15	30	
13										
14	419	<u>Diket X - X¹</u>								
15	480-482+34	200 mm rör med frakt m	234	2:40	561	60	✓			
16	482+34-483	125 " " " "	66	1:18	77	88	✓			
17	483-484+19	100 " " " "	119	0:90	107	10	✓			
18	480-482+34	Grävn.lägg. o återfylln. "	234	1:95	456	30	✓			
19	482+34-484+19	" " " "	185	0:80	148	-	✓			
20	480	Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-	✓			
21	483, 484+19	Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-	✓	1.455	88	
22		Arbetsledning och oförutsett						144	12	
23	10051	<u>Samfälligheten A - T summa</u>								
24									72.030	-
25										
26		<u>Samfälligheten Z - Ö</u>								
27	146	<u>Sträckan Å - Z</u>								
28	46+70-48+16	Schaktning av lera m ³	41	2:15	88	15	✓			
29		Jordersättning			25	80	✓			
30	47+96-48	För försvårad överfart			60	-		173	95	✓
31		Arbetsledning och oförutsett						16	05	
32		Överföres								
33									190	-
34										
35										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten a - c¹</u>								
2	405	<u>Sträckan a - b - c - c¹</u>								
3	110-111+53	225 mm rör med frakt m.	153	2:55	390	15 ✓				
4	111+53-									
5	111+80	150 " " " "	27	1:90	51	30 ✓				
6	111+80-113+ 14	100 " " " "	134	0:90	120	60 ✓				
7	113+14-									
8	114+5	75 " " " "	91	0:58	52	78 ✓				
9	110-111+53	Grävn.lägg. o återfylln.	153	1:60	244	80 ✓				
10	111+53-									
11	111+80	" " " "	27	1:60	43	20 ✓				
12	111+80-									
13	113+14	" " " "	134	1:30	174	20 ✓				
14	113+14-									
15	114+5	" " " "	91	1:20	109	20 ✓				
16	110	Täckdikesöga A st	1	15:-	15	- ✓				
17	111+53	Brunn A d=525 "	1	55:-	55	- ✓				
18	114+5	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	- ✓	1.291	23 ✓		
19		Arbetsledning och oförutsett					128	77	✓1.420	-
20	123	<u>Diket b - b¹</u>								
21	115-116	100 mm rör med frakt m	100	0:90	90	- ✓				
22	116-116+23	75 " " " "	23	0:58	13	34 ✓				
23	115-116+23	Grävn.lägg. o återfylln.	123	1:25	153	75 ✓				
24	116	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	- ✓				
25	116+23	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	- ✓	337	09 ✓		
26		Arbetsledning och oförutsett					32	91	370	- ✓
27										
28	56	<u>Diket c - c²</u>								
29	119-119+56	75 mm rör med frakt m	56	0:58	32	48 ✓				
30	119-119+56	Grävn.lägg. o återfylln.	56	1:20	67	20 ✓				
31	119+56	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	- ✓	134	68 ✓		
32		Arbetsledning och oförutsett					15	32	150	- ✓
33	584	<u>Samfälligheten a - c¹ summa</u>							1.940	- ✓
34										
35										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten g - h¹</u>								
2	205	<u>Sträckan g - h - h¹</u>								
3	190-191+68	100 mm rör med frakt m.	168	0:90	151	20	✓			
4	191+68-									
5	192+5	75 " " " " "	37	0:58	21	46	✓			
6	190-190+70	Grävn.lägg. o återfylln. "	70	1:30	91	-	✓			
7	190+70-	" " " " "	98	0:90	88	20	✓			
8	191+68-									
9	192+5	" " " " "	37	0:65	24	05	✓			
10	190	Täckdikesöga A st	1	10:-	10	-	✓			
11	190+74	Brunn G d=450 "	1	40:-	40	-	✓			
12	191+22									
13	192+5	Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-	✓	515	91	✓
14		Arbetsledning och oförutsett						54	09	570 - ✓
15										
16	136	<u>Diket h - h²</u>								
17	193-194+36	75 mm rör med frakt m	136	0:58	78	88	✓			
18	193-194+36	Grävn.lägg. o återfylln. "	136	1:20	163	20	✓			
19	194+36	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	✓	287	08	✓
20		Arbetsledning och oförutsett						32	92	320 - ✓
21	341	<u>Samfälligheten g - h¹ summa</u>								890 - ✓
22										
23		<u>Samfälligheten i - j</u>								
24	243	<u>Sträckan i - j</u>								
25	185-186+18	100 mm rör med frakt m	118	0:90	106	20	✓			
26	186+18-									
27	187+43	75 " " " " "	125	0:58	72	50	✓			
28	185-187+43	Grävn.lägg. o återfylln. "	243	1:20	291	60	✓			
29	185	Täckdikesöga A st	1	10:-	10	-	✓			
30	187+43	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-	✓	525	30	✓
31		Arbetsledning och oförutsett						64	70	590 - ✓
32	243	<u>Samfälligheten i - j summa</u>								590 - ✓
33										
34										
35										

SVENSKA VATTENVERKET


Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Samfälligheten k - n</u>								
	353	<u>Sträckan k - l - m - n</u>								
175-175+98		200 mm rör med frakt m.	98	2:40	235	20 ✓				
175+98- 177+17		150 " " " "	119	1:67	198	73 ✓				
177+17- 177+72		125 " " " "	55	1:18	64	90 ✓				
177+72- 178+7		100 " " " "	35	0:90	31	50 ✓				
178+7- 178+53		75 " " " "	46	0:58	26	68 ✓				
175-175+98		Grävn.lägg. o återfylln.	98	1:30	127	40 ✓				
175+98- 177+17		" " " "	119	1:15	136	85 ✓				
177+17- 178+7		" " " "	90	1:-	90	- ✓				
178+7- 178+53		" " " "	46	0:75	34	50 ✓				
175		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	- ✓				
175+98 177+17 177+72		Brunn A d=450 "	3	45:-	135	- ✓				
178+7 178+53		Brunn A d=375 "	2	35:-	70	- ✓				
177+67- 177+72		Rörens framdrag. genom väg			5	-	1.170	76 ✓		
		Arbetsledning och oförutsett					119	24	✓1.290	-
	140	<u>Diket l - l¹</u>								
180-180+78		100 mm rör med frakt m	78	0:90	70	20 ✓				
180+78- 181+40		75 " " " "	62	0:58	35	96 ✓				
180-180+78		Grävn.lägg. o återfylln.	78	0:90	70	20 ✓				
180+78- 181+40		" " " "	62	1:-	62	- ✓				
180+78		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	- ✓				
181+40		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	- ✓	318	36 ✓		
		Arbetsledning och oförutsett					31	64	✓350	-
		Överföres							✓1.640	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							1.640	-
2	100	<u>Diket m - m¹</u>								
3	183-184	75 mm rör med frakt m.	100	0:58	58	- ✓				
4	183-184	Grävn.lägg. o återfylln. "	100	1:-	100	- ✓				
5	184	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	- ✓	193	- ✓		
6		Arbetsledning och oförutsett					17	-	210	- ✓
7	593	<u>Samfälligheten k - n summa</u>							1.850	- ✓
8		<u>Samfälligheten o - p</u>								
9		<u>Sträckan o - p</u>								
10	300									
11										
12	170-171+59	150 mm rör med frakt m	159	1:67	265	53 ✓				
13	171+59-173	100 " " " "	141	0:90	126	90 ✓				
14	170-171+59	Grävn.lägg. o återfylln. "	159	1:20	190	80 ✓				
15	171+59-173	" " " "	141	0:90	126	90 ✓				
16	170	Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
17	171+59,173	Brunn A d=450 "	2	45:-	90	- ✓	815	13 ✓		
18		Arbetsledning och oförutsett					84	87	900	- ✓
19	300	<u>Samfälligheten o - p summa</u>							900	- ✓
20		<u>Samfälligheten q - t</u>								
21		<u>Sträckan q - r - s - t</u>								
22	316									
23	160-161+40	200 mm rör med frakt m	140	2:40	336	- ✓				
24	161+40-									
25	163+16	150 " " " "	176	1:67	293	92 ✓				
26	160-161+40	Grävn.lägg. o återfylln. "	140	1:85	259	- ✓				
27	161+40-									
28	163+16	" " " "	176	1:20	211	20 ✓				
29	160+76	Brunn C d=525 st	1	30:-	30	- ✓				
30	161+40	Brunn A d=600 "	1	65:-	65	- ✓				
31	162+74									
32	163+16	Brunn A d=525 "	2	55:-	110	- ✓				
33	160	Täckdikesöga A "	1	15:-	15	-	1.320	12 ✓		
34		Arbetsledning och oförutsett					129	88	1.450	- ✓
35		Överföres							1.450	- ✓

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Sammandrag</u>								
3	10051	Samfälligheten A - T ✓							72.030	- ✓
4	584	" Z - Ö ✓							1.675	- ✓
5	584	" a - c ¹ ✓							1.940	- ✓
6	568	" d - f ✓							1.660	- ✓
7	341	" g - h ¹ ✓							890	- ✓
8	243	" i - j ✓							590	- ✓
9	593	" k - n ✓							1.850	- ✓
10	300	" o - p ✓							900	- ✓
11	516	" q - t ✓							2.010	- ✓
12	260	" å - ä ✓							650	- ✓
13										
14	14040	<u>Totalsumma</u>							84.195	- ✓
15		Skara den 19 juli 1948								
16										
17		Erik Almlöf								
18		Jordbrukskonsulent								
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


Arbetsbeskrivning.


Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,
att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-
rätas eller avrundas,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida
icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit
utsatta,
att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra
kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar ar-
betet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdik-
ningsplan finnes upprättad,
att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,
att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig,
att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens
dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lant-
bruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är f.p +13.00 kors i stor sten mitt för
påle 41+27, diket T-U-V.

Skara den 26 juli 1948

I tjänsten:


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

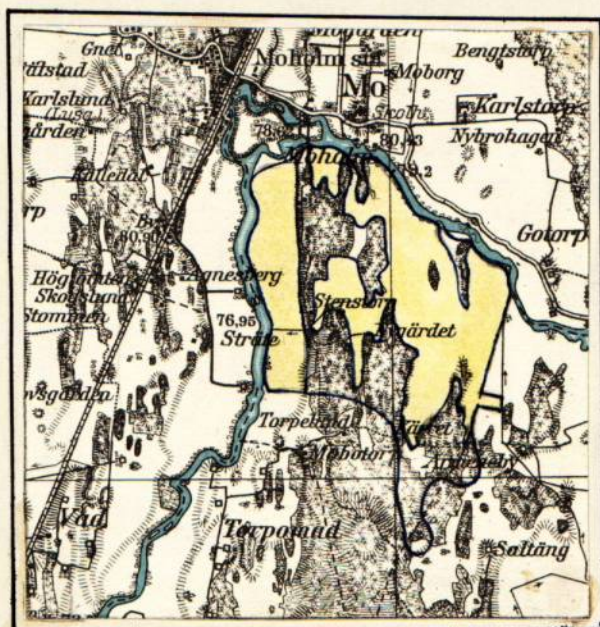Översiktskarta

Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Möholms säteri m.fl. hemman i Mo och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning, utvidgning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km söder Mo kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N, H - P - Q, T - U - V - X - Y - Q, Z - Å - Ä - Ö, a - b - c - c¹, d - e - f, g - h - h¹, i - j, k - l - m - n, o - p, q - r - s - t och å - ä för huvudavlopp samt B - B¹ - B², B¹ - B³, C - C¹ - C², C¹ - C³ E¹ - E², E¹ - E³, F - F¹, G - G¹, H - H¹, J - J¹, K - K¹ - K², K¹ - K³, L - L¹, M - M¹, M - M², M - M³, P - P¹, Q - R - S, R - R¹ - R² - R³ - R⁴, R¹ - R⁵, R², R⁷, R³ - R⁶, U - U¹, V - V¹, X - X¹, Y - Y¹ - Y², Y¹ - Y³, Å - Å¹, b - b¹, c - c², e - e¹, h - h², m - m¹, l - l¹, r - r¹ och s - s¹ för sidodiker härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Synemännen ha genom besök å platsen konstaterat, att arbetet utförts beträffande samfälligheterna, som utmytna väster ut i $\frac{1}{2}$ nedanför fallet vid Moholms gård. Under förutsättning att den begärda påsadlingen på skiborden vid Lunnedammen kommer att vinna laga kraft (målet A.M. 68/1947 vid Västerbygdens vattendomstol, se bil. D) komma utloppen vid d, å, A och g att ligga c:a 30 cm för lågt. Detta har ej ansetts utgöra någon större olägenhet, men har vissa kontrollbrunnar föreslagits i de stammar, som beröras därav, varigenom slamning lätt kan företagas, om så skulle erfordras.

I sydvästra gränsen av det berörda området finnes sedan gammalt en vall upplagd för att förhindra att flöden från Tidan vid Exeptionella högvattenförhållanden tager sig väg in över Åkerjorden till Moholms säteri. Som framgår av skrivelsen från Västerbygdens vattendomstol äro vissa rensningar i den s.k. Hedvigströmmen planerade, vilket kommer att sänka vattenytan ovanför försen. Med hänsyn därtill ha några åtgärder i form av förstärkning l. påbyggnad av vallen ej ansetts erforderligt, utan torde vallen sedan nämnda rensningar verkställt ej erfordras.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,35 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all där utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å karta avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 10 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda

A - T, Z - Ö, a - c¹, d - f, g - h¹, i - j, k - n, o - p, q - t och å - ä.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheten a - c¹ fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. I övrigt komma alla kostnaderna på sökandens fastighet Moholm l¹. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden, bil. F.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, för samfälligheten A - T erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 106 kronor och 29 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställd.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma,

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut för utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Moholms säteri dikningsföretag av år 1948".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Moholm den 26 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Josef Johansson

Josef Johansson




Eric Adolfsson

Eric Adolfsson

Biträdande gode män:




KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensam- ma kost- nader
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	procent	
1	2	3		4		5		6	7	
Mo socken										
<u>Moholm av 1¹</u>										
Nils Törnqvist	S									
<u>Samfälligheten A - T</u>										
ägofig. 39-436 (39-58, 60-96, 98-108, 110-119, 121- 123, 126-130, 137-144, 146)		70.858	- ✓			72.030	- ✓	100,00	68,981 ✓	
<u>Samfälligheten Z - Ö</u>										
ägofig. 147-155		2.198	30 ✓			1.675	- ✓	100,00	2,140 ✓	
<u>Samfälligheten d - f</u>										
ägofig. 32-37 (32-38)		5.824	30 ✓			1.660	- ✓	100,00	5.670 ✓	
<u>Samfälligheten g - h¹</u>										
ägofig. 25-27 (18, 21-27)		2.874	40 ✓			890	- ✓	100,00	2,798 ✓	
<u>Samfälligheten i - j</u>										
ägofig. 21-22		1.972	80 ✓			590	- ✓	100,00	1,921 ✓	
<u>Samfälligheten k - n</u>										
ägofig. 12-18 (12-13, 19-20)		4.818	10 ✓			1.850	- ✓	100,00	4,690 ✓	
<u>Samfälligheten o - p</u>										
ägofig. 8-9 (8-11)		3.375	20 ✓			900	- ✓	100,00	3.286 ✓	
<u>Samfälligheten q - t</u>										
ägofig. 1-5 (1-7)		5.793	40 ✓			2.010	- ✓	100,00	5.640 ✓	
<u>Samfälligheten å - ä</u>										
fig 28-31 (28-31)		3.094	90 ✓			650	- ✓	100,00	3.013 ✓	
Överföres									98,139	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lkst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i				Andel i gemensam- ma kost- nader	
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad			verklig kostnad
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		
1	2	3	4	5	6	7			
Överfört						98,139	1		
<u>Samfälligheten a - c¹</u>			<u>Areal</u>				2		
			<u>Total</u>	<u>Åker</u>			3		
Mo socken							4		
Moholm av l ¹			350	158			5		
Nils Törnqvist	S						6		
ägofig. 156-160 (156-160)		1.639 80	✓		1.664 -	85,773 ✓	7		
Bellefors socken							8		
Armeneby l ⁸ , l ⁹			50	14			9		
Karl Andersson							10		
ägofig. (161-162)		272 -	✓		276 -	14,227	11		
Summa		1.911 80	✓		1.940 -	100,000 ✓	12		
Totalsumma		102.721 20	✓		84.195 -	✓ 100,000	13		
Moholm den 26 juli 1948								14	
I tjänsten:								15	
								16	
Erik Almlöf								17	
Jordbrukskonsulent								18	
								19	
Josef Johansson								20	
								21	
Eric Adolfsson								22	
								23	
								24	
								25	
								26	
								27	
								28	
								29	
								30	
								31	
								32	
								33	

Moholm den 26 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent
Josef Johansson
Eric Adolfsson

Arvodesräkning

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Moholms säteri m.fl. i
Mo och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	100 ha	710:-	
	35 ha däröver à 5:-	175:-	
Tillägg 1,6 % av kostnaden 84.195:- kronor		<u>1.347:12</u>	2.232:12 ✓

Övriga förrättningskostnader:


Kostnader för häntlangning, materialier o.dyl.	500:-		
Ersättning till gode män:			
Eric Adolfsson	22:80		
Josef Johansson	<u>22:80</u>	<u>545:60</u>	✓
Summa kronor		<u>2.777:72</u>	✓

Skara den 26 juli 1948


Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

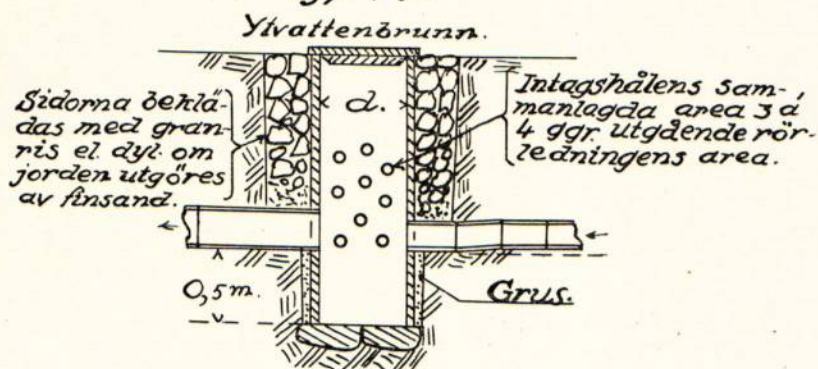


typ B.

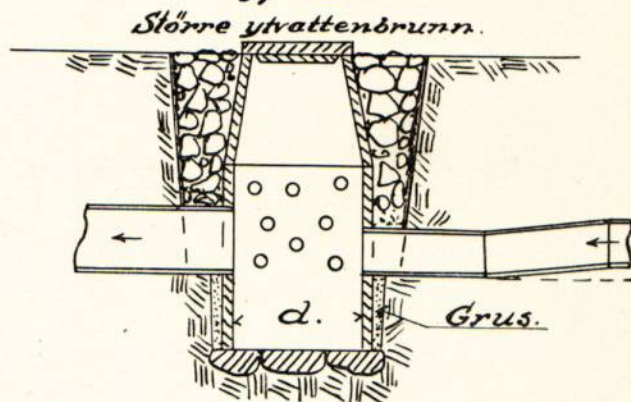


typ C.

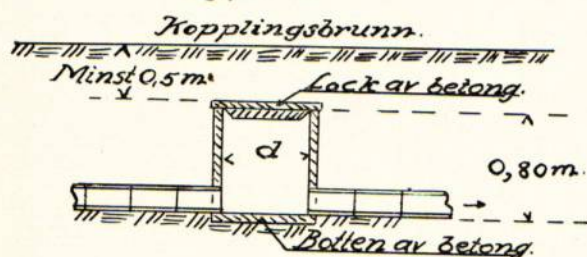


typ D.

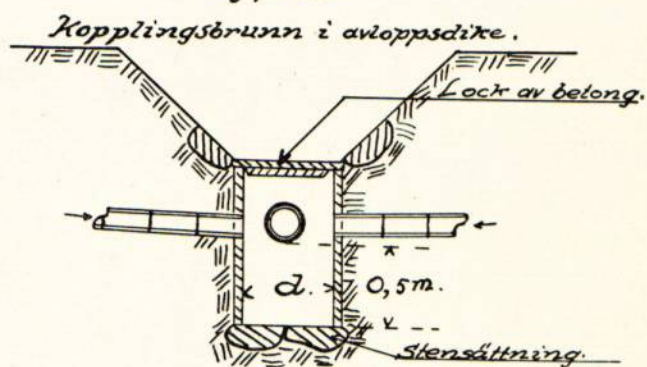

typ E.

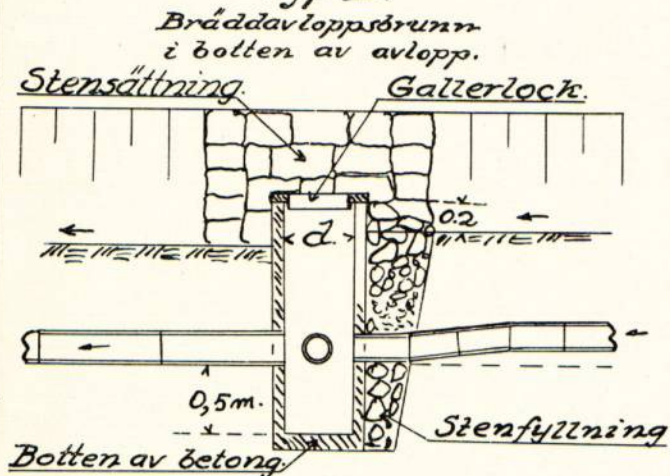


typ F.

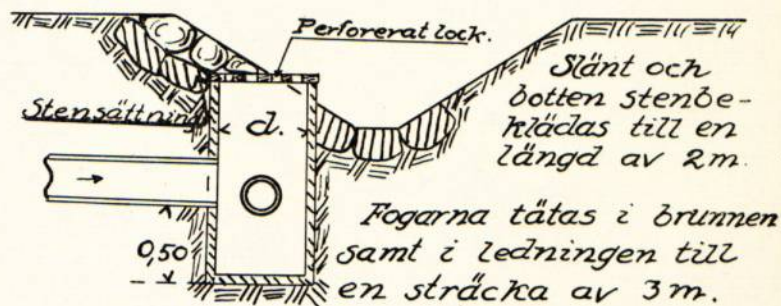


Detalj i plan.



Detaljritning av lock med hål.




typ G.

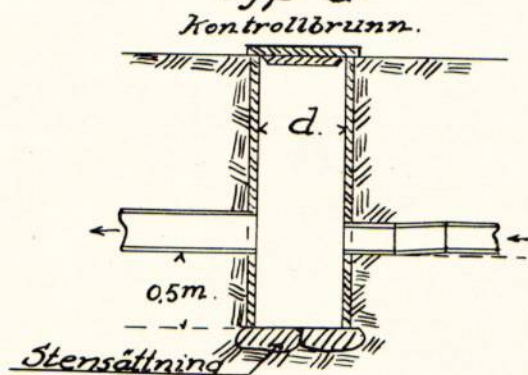


TÄCKDIKESÖGON

*Täckdikeshöga.
typ A.*

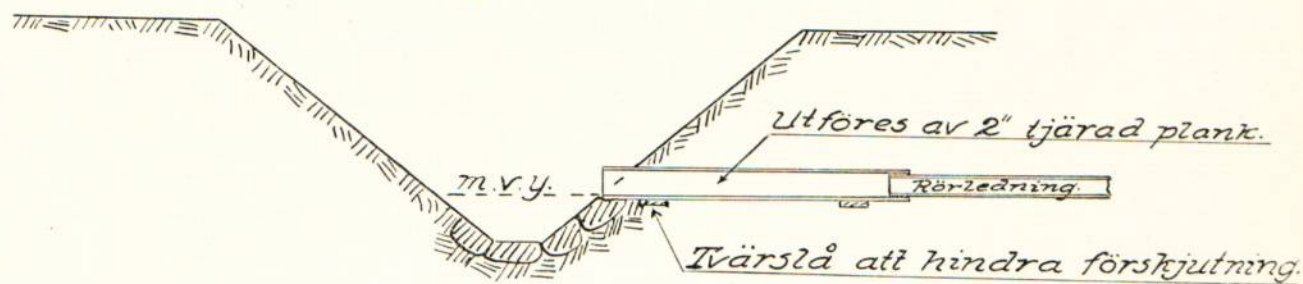


*Rörlutlopp.
typ B.*

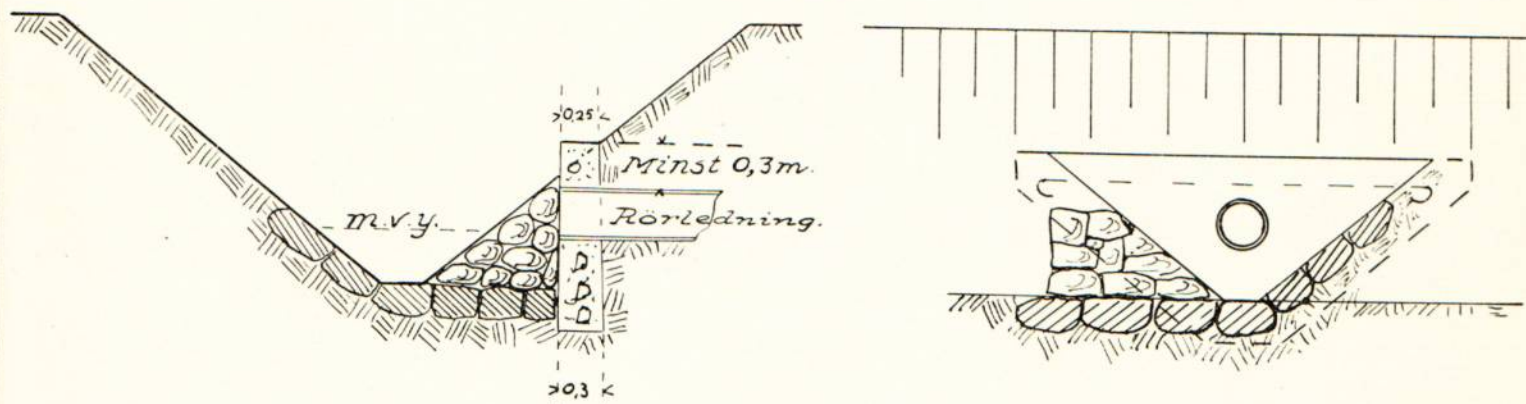

typ C.




typ D.

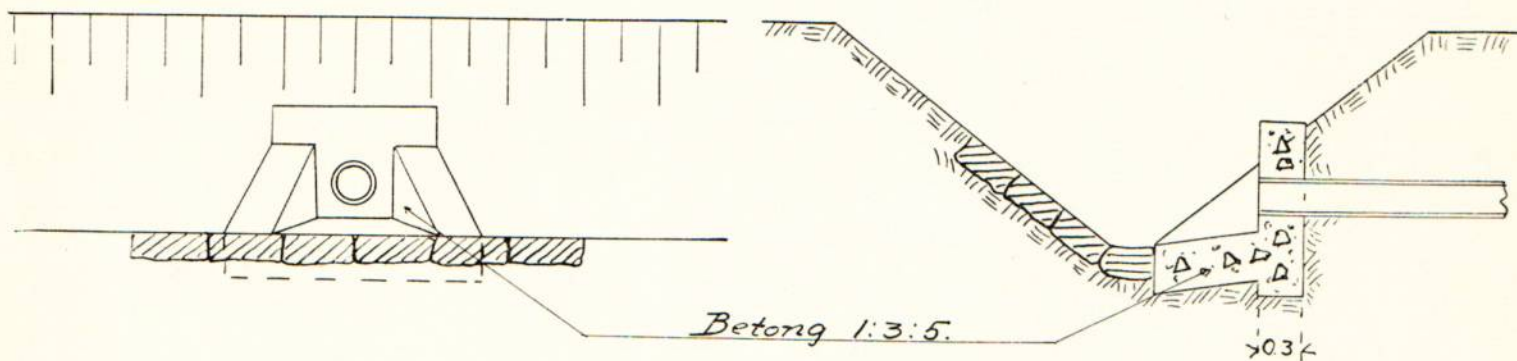


STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

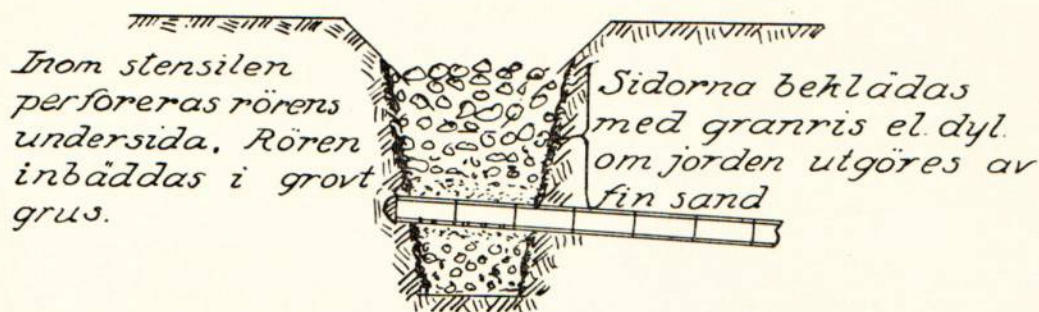

Grusfilter.

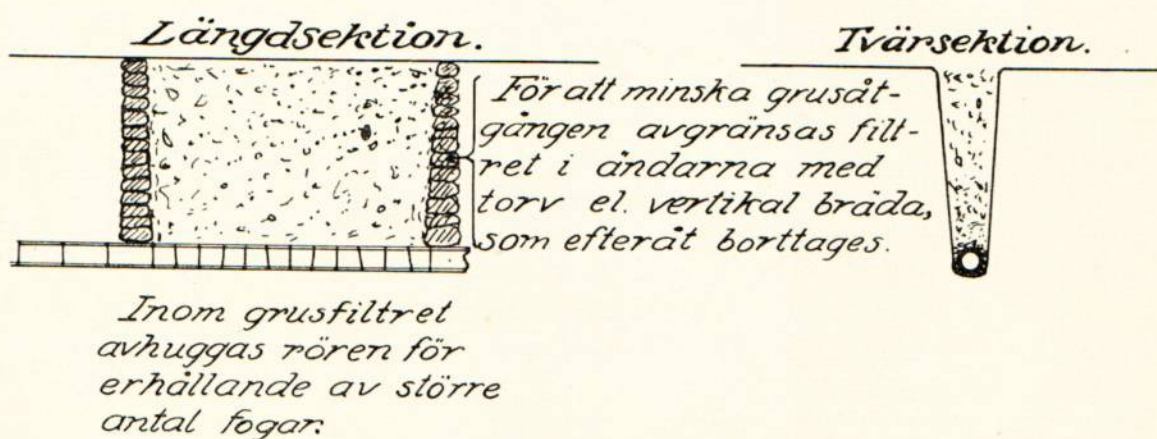

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomlättad lera.

Rörtrumma E

