



Akt nr:
R-E1a-1289

AU\$R-E1a-1289

264/50
FÖRETAG: Närefors.

R 8*1289

lantbrukskonsulenten
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Almlöf

i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 20 februari 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 10.090

» en första rensning » - kr. 10.090

Lån till företagets utförande kr. 20.160

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JAN 1952

DIARIE NR

SAK NR

8

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

20 februari 1950

till

Närefors torrlägningsföretag av år 1946 i Uvereds socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tiotusennittio (10.090)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor.

Lånet önskas ej.
och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugotusen och hundra sextio

(20.160)

med vissa tillägg kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Näprens Järpås den *2/1*
Ingemar Seltzer

19*52*

Att

Godsäg. Ingemar Lebergren
Närfors, Umed, Järpås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lebergren

Mårten Elmfrid

Adress

Skov.

Adress

Skov.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 augusti 1953.

Uno Wernberg

R. B. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkivD. nr 5549
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

Obs! Se särskilda aum. av Lindh o. Götling
(Lindhs pän ang. aum. i Petenlande).

R 8*1289

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Närefors torrlägningsföretag av år 1946

i Uvereds socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Jordbr.kons. Erik Almlöf

Statsbidrag: 10.270 kr.

Statslån: 20.520 kr.

5549
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, förtroendeman för "Närefors torrlägningsföretag av år 1946"
i Uvereds socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till torrlägnings-
företaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag
och lån från statens avdikningslånefond.

Närefors, Uvered den 4 okt. 1946

Jingemar Settergren
Jingemar Settergren

Genom beslut den 20 febr. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 30.443:92 kr., till företaget beviljat bidrag med 10.090:- kr. och lån med 20.160:- kr. samt fastställt arbetsplanen ~~med förändrat skick.~~ med tillägg, att diket K-I - K-II - K-III vid punkt K-III = 94+70 skall fräses med bunnstyp B, d = 450 mm, och diket R - R-I vid punkt 66+94 skall fräses med bunnstyp A, diameter = 450 mm. Vidare skall i arbetsplanen icke ingå nytagandet av sträckan L-I av diket X-Y-Z-A samt diken Z-Z-II och Z-I - Z-IV.

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

5549

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Närefors torrlägningsföretag av år 1946 17.FEB.1947
(företagets namn samt socken och län)

Uvereds socken, Skaraborgs län.

Ordföranden: Godtsägare Ingemar Settergren, Närefors, Uvered, Järnås.
Förtroendeman: (titel, namn och adress)

Ende intressent: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf
Förrättningsman: (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 17 april 1946 Förrättningen avslutad den 2 juli 1946
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 8 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med förenklad syn utan samband med syn
förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1956 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1956

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 46.081:- kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 30.961:80 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
3"-rör å 0:50 kr/m, 4"-rör å 0:80 kr/m, 5"-rör å 1:10 kr/m, 6"-rör å 1:50 kr/m, 8"-rör å 2:25 kr/m, 9"-rör å 2:50 kr/m, 10"-rör å 3:15 kr/m, 12"-rör å 4:- kr/m.
Grävning, läggning och återfyllning varierar mellan 0:40-1:65 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A - F	9.240	-	-	-	483	25	9.723	25	-	9.723	25
G - H	460	-	-	-	17	88	477	88	-	477	88
J - L	2.160	-	-	-	150	03	2.310	03	-	2.310	03
M - S	8.410	-	-	-	497	11	8.907	11	-	8.907	11
T - V	700	-	-	-	30	-	730	-	-	730	-
X - Å	2.500	-	-	-	105	03	2.605	03	-	2.605	03
Ä - Ö	1.740	-	-	-	98	08	1.838	08	-	1.838	08
Aa- Ad	3.270	-	-	-	212	34	3.482	34	-	3.482	34
Aj- Ak	490	-	-	-	48	47	538	47	-	538	47
Ag- Ah	330	-	-	-	19	61	349	61	-	349	61
Summa	29.300	-	-	-	1.661	80	30.961	80	-	30.961	80

Beträffande ändring i arbetsplanen se sid 3.

2
Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		
A - F	33	50			33	50	13.400	-	0	9.723	25	290:25	1/3	3.240:-
G - H	1	24			1	24	496	-	0	477	88	385:40	"	150:-
J - L	10	40			10	40	4.160	-	0	2.310	03	222:12	"	770:-
M - S	23	80			23	80	13.785	-	0	8.907	11	374:25	"	2.960:-
T - V	2	08			2	08	832	-	0	730	-	350:96	"	240:-
X - Å	7	28			7	28	2.912	-	0	2.605	03	357:83	"	860:-
Ä - Ö	6	80			6	80	2.720	-	0	1.838	08	270:30	"	610:-
Aa- Ad	14	72			14	72	5.888	-	0	3.482	34	236:57	"	1.160:-
Aj- Ak	3	36			3	36	1.344	-	0	538	47	160:26	"	170:-
Ag- Ah	1	36			1	36	544	-	0	349	61	257:07	"	110:-
Summa	104	54			104	54	46.081	-		30.961	80			10.270:-

Av bidraget belöper omkring 10.270:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
A - F	13.400	-	100,000	9.723	25	2/3	6.480:-
G - H	496	-	100,000	477	88	"	310:-
J - L	4.160	-	100,000	2.310	03	"	1.540:-
M - S	13.765	-	98,803	8.800	49	"	5.860:-
T - V	832	-	100,000	730	-	"	480:-
X - Å	2.912	-	100,000	2.605	03	"	1.750:-
Ä - Ö	2.720	-	100,000	1.838	08	"	1.220:-
Aa- Ad	5.888	-	100,000	3.482	34	"	2.320:-
Aj-Ak	1.344	-	100,000	538	47	"	350:-
Ag- Ah	544	-	100,000	349	61	"	250:-
Summa	46.081	-		30.855	17		20.520:-

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av redan odlad jord. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro de berörda markerna välbelägna.

Såsom framgår av värderingslängden överstiger för var och en av de berörda fastigheterna, som vinner båtnad av företaget, den totala åkerarealen 30 ha.

Företaget är icke påbörjat.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden är motiverat.

På grund av vad sålunda utretts föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 10.270;- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 20.520:- kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts

- " 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3, fastighetsförteckning
- " 4, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

Skara den 20/12 1946

På Torrläggingsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein
Ordförande.

*Lantbrukstillsynen har medgivit att
företaget må utföras med de ändringar, som framgå
av en av lantbruksskogenskonton C. Almöf, den 11 juni 1953
utfärdad avsyningsrapport samt föreskrivit, att till
företaget beviljat lån icke skall utgå.*

Stockholm den 18 augusti 1953.

*Enligt uppdrag
W. Friberg.*



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf
handlagd, den 2 juli 1946 avslutad syneförrättning rörande "Näre-
fors torrlägningsföretag av år 1946" inom Uvereds socken av
Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 2 oktober 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i "Närefors torrlägnings-
företag av år 1946".

Närvarande: undertecknad och Ingemar Settergren, Närefors egendom, Järpås,
Wilhelm Svensson, Backgården, Järpås.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Ingemar Settergren.

§ 2

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka
statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån
från statens avdikningslånefond till sin andel i företaget.

Ingemar Settergren, Närefors egendom, Järpås

§ 3

Företagets förtroendeman erhöi i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 2 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
för statsunderstödet lyftande kunna erfordras,
att uppbära och kvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget
beviljat samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga
utförande.

§ 4

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att ombestyrja för statsunder-
stödet sökande erforderliga handlingar.

§ 5

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 6

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Järpås den 4 oktober 1946

.....
Jordbrukskonsulent.

Justeras:

.....
Ingemar Settergren

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Närefors torrlägningsföretag av år 1946 i Uvereds socken av Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Uvereds socken.

Uvered Dränggården 1 ¹	1 mtl.	Ingemar Settergren	q
Uvered Fläggården 2 ⁵	9/32 "	"	"
Uvered Essbjörnsgården 3 ³	1/9 mtl.	"	"

Skara den 20/10 1946

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Närefors torrlägningsföretag av år 1946 i Uvereds socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
juli	2	Arvode för syneförrättningen enl. kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna						1.661	80 ✓
juli	2	Vattendomstolsavgift						69	12 ✓
okt.	2	Lagakraftbevis				3	-		
								1.730	92 ✓
								3	- ✓
						Summa utgifter:		1.733	92 ✓
Skara den 20/12 1946 I tjänsten: Erik Almlöf Erik Almlöf									

Skara den 20/12 1946

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Närpors

Förtreendeman:

bef.

Gödsäg. Ingemar Settergren,

Närpors,

Ulved,

Järsås ✓

2 kmtr.

1 avsigelse or lain.

BESLUT

DEN 18 AUG. 1953

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

~~Vit. kmtr.~~

~~Uti arbetet tilläts
varen 52 kan lainar-
rättern behandlas i
samfund med godk.~~

Bevis
~~RAPPORT~~

264
50

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUNI 1953
DIARIE Nr 1013
SAK Nr

över verkställd slutavsyning

Företag: Närefors torrlägningsföretag av år 1946 i Uvereds socken
(namn, socken och län)

av Skaraborgs län.

~~Öververkställande~~ } Godsäg. Ingemar Settergren, Närefors egendom, Järpås
Förtroendeman: }
~~Enda intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 20 febr. 1950

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag

10.090:-

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

(- ?) 20.160

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent John Wikström

den 9/6 1953, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda

arbetsplanen med undantag av att å sträckan Ab - 141+50 av diket Aa-Ab-Ac-Ad har lagts
150 mm rör i stället för 225 mm rör enligt förslaget. Å sträckan Ab-Ac finnes utom 150
mm rörledningar även en äldre 100 mm rörledning, som fungera tillfredställande.

Brunnarna vid 140+98, 141+50 och 142 ha ej utförts och äro ej heller nödvändiga.

Den utförda 150 mm rörledningen i förening med den gamla 100 mm rörledningen är fullt
tillfredställande för vattnets avledande. Dessutom bildar marken en naturlig svacka över
rören, vilken fungerar som flödesdike och snabbt avleder tillrinnande ytvatten.

Arbetet har utförts av gårdens eget folk och skulle enligt gällande priser ha belupit
sig till betydligt högre belopp än det beräknade, 30.443:92 kronor.

Företaget söker ej tilläggsbidrag för den uppkomna merkostnaden.

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick.


Skara den 11/6 1953.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

BEVIS
RAPPORT



över verkställd slutavsyning

Företag: Närefors torrlägningsföretag av år 1946 i Uvereds socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

~~Godsägare~~ } Godsäg. Ingemar Settergren, Närefors egendom, Järpås.
Förtroendeman: }
~~Förklaringsman~~

Arbetsplanen fastställd den 20 febr. 1950

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.090:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 20.160 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1956

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Erik Almlöf
den 29/1 1953, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda
arbetsplanen med undantag av att sträckan Ab-Ac-144+90 ej utförts, enär där befintlig
100 mm gammal avloppsledning fungerade tillfredsställande med bibehållen ränna över
ledningen för exceptionella flöden.

Arbetet har utförts av gårdens eget folk och skulle enligt gällande priser ha be-
lupit sig till betydligt högre belopp än det beräknade, 30.443,92 kronor.

Företaget kommer ej att söka tilläggsbidrag för den uppkomna merkostnaden.

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick liksom bidragets utbe-
talande oavkortat trots att ovan angivna sträcka ej utförts. Skara den 2/2 1953.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
t.f. lantbruksdirektör.

Kont. ej autogef
Ytterl. ej sabbt

Kons. Almlöf har vid besök i Sta 1 april '53 meddelat,
att även Stv Ab-Ac-144+90 kommer att utföras
enl. planen vären 1953, väntes my rapport kom-
mer att inlämnas. Årsmötet vilas t.v.
82

Inde

BESLUT
DEN 18 AUG 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN	
3 JAN 1952	
DIARIE NR	8
SAK NR	

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m .

Undertecknad ende lånesökande i "Närefors torrlägningsföretag av år 1946" får härmed vördsamt återtaga min ansökan om lån till nämnda företag, enär företaget i det närmaste utförts och ekonomiserats genom privata lån.

Närefors egendom, Järpås den 2 januari 1952.

Ingemar Ljunggren ✓
.....

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Sörenson
.....

Marta Elmquist
.....

GH


LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

BESLUT
DEN 18 AUG. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN



Till


Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Den 2 febr. 1953 översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen bevis över verkställd slutbesiktning samt rekvisition av statsbidraget rörande "Närefors torrlägningsföretag av år 1946" i Uvereds socken av Skaraborgs län. Den 30 mars 1953 översändes på lantbruksstyrelsens begäran betänkande och kartor rörande företaget.

Vid undertecknads besök i lantbruksstyrelsen den 1 april 1953 bestämdes att viss komplettering av företaget skulle verkställas.

Denna har nu utförts och översändes härmed nytt slutavsyningsbevis.

Skara den 15/6 1953.


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr

BESLUT
DEN 18 AUG 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN	
3 JAN 1952	
DIARIE Nr	8
SAK Nr	


Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m .

Härmed översändes kontrakt i två exemplar för "Närefors torrlägningsföretag av år 1946" i Uvereds socken av Skaraborgs län. Som framgår av närslutna bilaga, återtager ende lånesökanden i företaget, Ingemar Settergren, sin ansökan om lån från statens avdikningslånefond, varför skuldförbindelsen återgår makulerad. Enär arbetet i sin helhet blir klart till våren, önskas någon del av statsbidraget ej lyftas förrän arbetet är slutbesiktigat och godkänt. Säkerhetsförbindelsen återgår därför makulerad liksom även den rekvisition av penningmedel, som avser lånet. Skara den 2 januari 1952.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

WG/BE

Lantbrukskonsulenten E. V. Almlöf,
Lantbruksnämnden,
S k a r a.

Ang. NÄREFORS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Uvereds
socken, Skaraborgs län.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för
rubricerade företag får Lantbruksstyrelsen anmoda Eder
ombestyra, att till företaget hörande betänkande och rit-
ningar hit insändas.

Stockholm den 26 mars 1953.

Enligt uppdrag



W. Gripenberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Fulbr

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MRS 1953
DIARIE Nr <i>7274</i>
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Jordförbättringsbyrån

Stockholm.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 26 mars 1953 (W. Gripenberg) översändes samtidigt härmed betänkande och ^{1/2} *Set* kartor rörande "Närefors torrlägningsföretag av år 1946". Skara den 30 mars 1953.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


Ser. E XIII komb
174

STAMP Nr 5566
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

Kungälv
Kulturmuseum

R 8-1289

672



Protokoll vid synförställning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Vänerns ägor inom m. fl. i Jämsjö:s och Skaraborgs län.

Den 21 maj 1946 a' Västerås.

W. Ivarsson, Boekgärdar, Århus, Järpås. Något
 för mer skriftsgedamman Johan Albertin
 anfridos ej och ej heller mer förärbättnings-
 mannan.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen
 upprättade nivåkartan över det vatten-
 berörade området samt profiler och
 avloppens bärför.

§ 4.

Förhållandena gällande på ifrågava-
 rande avlopps fördjupning och igan-
 löppning med rör, så att ^{den} ~~den~~
 därav berörda menber med denna
 tillöppas enligt upprättad tæ-
 dikningsplan och på ändamålsen-
 ligast sätt. Förhållandena gällande
 vidare på att vattenet från en del
 av Århus städer, som nu genom
 en befintlig avloppstrumma leds
 in på Hørsfors mecher, i stället
 ledas utmed och såder om lands-
 bögar till en där befintlig bäck.

§ 5.

Johan Ivarsson förklarade sig ej
 ha något att säga mer till
 nämnda ärendet och vattenröjan.

§ 6.

Lantbrukaren W. Ivarsson Boekgärd,
 Århus, Järpås förklarade sig mer förhå-
 llana och gällande på förstörts utvidg-

ning, så att hans stävar beordras
med jämval men kunna på änd-
målsanligast sätt tillöggas och
buktas, bel. &. Förningens utsändas
av styrelsen.

§ 7.

Det upplöstes att den landsvigs-
tremmen, som omnämnts i § 4 ej
ombyggs i afton år 1880.

Ombudet för Väg förvaltningen hade
utlat att sörja med en sådan äd-
ring av vattenvägen som ykats i
§ 4 under förutgående att utloppat
utlösas tället och att Väg förvalt-
ningen beredas tillfälle genom
de ykanden om löst i plan, som
yttrelikare undersökningar kunna
föreläggas.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till
tollstätt och tullen, förklarades sam-
manträdets upplöst med tillkännagivande
att, sedan utredningen
kompletterats, nytt sammanträd
kommer att hållas på samma
ställe som dagens tisdagen den 2
juli 1946 kl. 10.00 och komma till
yttrelikare undersökningar för att
att tillställas skärgården.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
Skriftskrif.

Ritadlands gods man:
John Alkerborn

Den 2 juli 1946 å Vårefors.

Närvarande: Uudenranta husd jorbruksbörshuset
sitts klubb, förätningsman samt
gode mannen John Albinsson, Skräddare-
gården och Lemnert Johansson, Djupedal
St. Lamm. Övansson följande sakägare:
Ingemar Pettersson, Vårefors, Järpås och
W. Brunner, ^(Berggården) Uudenranta Järpås.

§ 9.

Något för mer den sedan förr. samman-
trada tillhållade godsmannen Lemnert
Johansson kunde ej uttrivas.

§ 10.

Följdes den sedan följande samman-
trada upprättade nivåkartan över det
vattenbörvade området samt profiler
över avloppens bärförhållanden samt därtill
hörande handlingar.

§ 11.

Upplästes synmännens utlåtande, om
hade lydelse enligt bil. I

§ 12.

Det mottogs och frövar till fristaget
krande ritningar och bandningar
och att sammanhålla delägarna
fråga om styrelsen utse en synman
Ingemar Pettersson Vårefors, Järpås.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet

antagna, förklarades förättningen av-
slutad och sammantaget upplöst.

Och och tid som, ovare
Stjärten
- Esbjörnsläp.

Ättäadande gode män:
Johan Alarikson Lennor Johanson

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 6/10 1945 Dnr..... 44

Exp. den 27/3 1946 nr..... 9

E. D. 15-48



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs 1946 län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nämfors egendom i Urueds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Färpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ingemar Ljunggren

adress Nämfors, Färpås

pr Färpås

Telefon: Färpås 14

Färpås

den

10 September

19

45

Ingemar Ljunggren
Ljunggren

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införförväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 april 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Bil. B.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser ang. sammanträde hos Ingemar Settergren
Närefors egendom, Järpås, tisdagen den 21 maj 1946 klockan 10, vilka
underrättelser denna dag sänts till:

1. Bröderna Settergren, Närefors, Järpås
2. J. Larsson, Uvereds säteri, Järpås
3. W. Svensson, Backgården, Järpås
4. Vägförvaltningen, Mariestad
5. Skiftesgodemannen Gustaf Lundgren, Ambjörngården, Järpås
6. " John Albertsson, Skräddaregården, Uvered
7. " Lennart Johansson, Djupedal, St. Levene
(Kallad till nästa sammanträde)

Skara den 14 maj 1946

Erik Sjöström
Förrättningsmannen.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN


Dnr 1527/46-43

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas övervägmästare S. Mattsson, Mariestad, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Närefors egendom m.fl. hemman inom Uvereds socken för vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mariestad den 16 maj 1946
Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren


/Nils G. Lenas

Undertecknad.. förenar sig med sökandena till den syneförrättning
~~före oss~~
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Värnfors egendom*

.....
 i *Järpås Åker* socken och yrkar ^{de} på företagets utsträckning så
 att jämväl ^{nu} ~~vår~~ därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
 torrläggas och brukas.

..... *Järpås* den *21 maj* 19 *46*.

För lutt. Rockgöden nr. 7' *W. Svensson*

.....

Förestående förening vätsordas

Erik Almlöf

Erik Almlöf

John Almqvist

Leona Johansson

Biträdande gode män

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Littera	Mantal	Regist. nummer	Ägofigurs nummer	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Nuvarande värde			Blivande värde			Båtnadsvärde		
						Åker		Annan mark		har		ägofigur	har		ägofigur	har		ägofigur
						har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<u>Uvereds socken</u>																		
Uvered Dränggården		1	1	1														
Fläggården		9/32	2	5														
Essbjörnsgården		1/9	3	3														
				7-9	Br. Settergren			240-198										
					Mullhaltig medelstyv lera på alv av medelstyv lera.	(26 40)				900								
						22	70			1200	20.430-		1.500	34.050 -		600	13.620	✓
Backgården		1	7	1	16-17 W. Svensson			385-295										
					Mullhaltig medelstyv lera på alv av medelstyv lera.													
						1	10			1350	1.435 -		1.500	1.650 -		150	165	✓
Uvered Dränggården		1	1	1														
Fläggården		9/32	2	5														
Essbjörnsgården		1/9	3	3	1-5, 14 Br. Settergren													
				10-13	Mullrik sand c:a 0,5 m på alv av medelstyv lerbotten. Övriga arealen mullrik medelstyv lera på alv av medelstyv lera													
				15		80	74			1200								
										1360	96.888 -		1.600	129184-		400	32.296-	✓
					Summa	104	54			118803	-			164884-			46.081-	✓

Biträdande gode män:

Närefors, Järpås 2 juli 1946
I tjänsten

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom

hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad,

såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets

täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten M - S kors i jordfast sten å höjden + 18,56

m. c:a 100 m norr om punkt R^I.

För övriga samfälligheter kors i berg å höjden +9,195 m väster

om punkt 24+87 och kors i sten till vägtrumma vid punkt 126+12

å höjden +15,44 m. samt kors i berg å höjden +19,69 m c:a 90 m väster

om punkt 146+50.

Skara den 2 juli... 1946.

I tjänsten

Erik Sundberg
Jordbrukskonsulent

Kostnadsförslag.

Bil. G

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - F.</u>								
	892	<u>Diket A - B - C - D - E - F.</u> ✓								
0+70-0+81		Lera m	11 [✓]	0,40	4	40	✓			
0+81-1+20		300 [✓] mm rör med frakt "	39 [✓]	4:-	156	-	✓			
1+20-2+46		225 [✓] - " - "	126 [✓]	2:70	340	20	✓			
2+46-2+51		300 [✓] - " - "	5 [✓]	4:-	20	-	✓			
2+51-6+50		225 [✓] - " - "	399 [✓]	2:70	1077	30	✓			
6+50-7+3		200 [✓] - " - "	53 [✓]	2:25	119	25	✓			
7+3-7+60		150 [✓] - " - "	57 [✓]	1:50	85	50	✓			
7+60-8+89		125 [✓] - " - "	129 [✓]	1:10	141	90	✓			
8+89-9+62		100 [✓] - " - "	73 [✓]	0:80	58	40	✓			
0+81-7+60		Grävning, läggning och återfyllning "	679 [✓]	0:90	611	10	✓			
7+60-9+62		- " - "	202 [✓]	0:75	151	50	✓			
0+81		Rörutlopp B st	1	45:-	45	-	✓			
1+20		Brunn typ C d=600 mm "	1	35:-	35	-	✓			
2+73		" " C d=525 " "	1	30:-	30	-	✓			
2+46, 2+51		" " A d=600 "	2	65:-	130	-	✓			
4, 5+40, 6+50, 7+3, 7+60, 8+89, 9+62 [✓]		" " A d=450 "	7	45:-	315	-	✓			
4+96, 5+2 [✓]		Stensil "	2	10:-	20	-	✓			
		Rörens framdragning genom väg m	3	5:-	15	-	✓	3355	55	✓
		Arbetsledning o. oförutsett						384	45	3740 [✓]
	491	<u>I</u> <u>Diket B - B.</u> ✓								
23-25+67		150 mm rör med frakt m	267 [✓]	1:50	400	50	✓			
25+67-27+91		100 [✓] - " - "	224 [✓]	0:80	179	20	✓			
23-24+94		Grävning, läggning och återfyllning "	194 [✓]	1:15	223	10	✓			
	1383	Överföres			802	80	✓		3740	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1383	Överfört			802	80	✓		3740	- ✓
24+94- -27+91		Grävning, läggning och återfyllning m	297	0:70	207	90	✓			
23+90 ✓ 24+94 ✓ 25+67 ✓ 26+62 ✓		Brunn typ A d=450 st	4	45:-	180	-	✓			
27+91 ✓		" " BA d=375 "	1	35:-	35	-	✓			
27+48 ✓ 27+54 ✓ 24+87 ✓		Stensil "	3	10:-	30	-	✓			
		Rörens framdragning genom väg m	2	4:-	8	-	✓	1263 70		
		Arbetsledning o.oförutsett						136 30	✓	1400
	473	<u>Diket C - C - C</u> I II ✓								
11-12+50		200 mm rör med frakt m	150	2:25	337	50	✓			
12+50- -13+54		150 - " - "	104	1:50	156	-	✓			
13+54- -14+55		100 - " - "	101	0:80	80	80	✓			
14+55- -15+73		75 - " - "	118	0:50	59	-	✓			
11-14+55		Grävning läggning och återfyllning "	355	0:85	301	75	✓			
14+55- -15+73		- " - "	118	0:80	94	40	✓			
12+50 ✓ 13+54 ✓		Brunn typ A d=450 st	2	45:-	90	-	✓			
14+55 ✓ 15+73 ✓		" " A d=375 "	2	35:-	70	-	✓	1189 45		
		Arbetsledning o.oförutsett						120 55	✓	1310
	365	<u>Diket C - C</u> I III ✓								
16-17+39		200 mm rör med frakt m	139	2:25	312	75	✓			
17+39- 18+59		125 - " - "	120	1:10	132	-	✓			
18+59- -19+65		100 - " - "	106	0:80	84	80	✓			
16-17+39		Grävning, läggning och återfyllning "	139	0:85	118	15	✓			
2221		Överföres			647	70	✓		6450	- ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2221	Överföres			647	70	✓		6450	✓
17+39- -19+65		Grävning läggning och återfyllning m	226	1:-	226	-	✓			
17+39, ✓ 18+59, ✓ 19+65 ✓		Brunn typ A d=450 st	3	45:-	135	-	✓			
17+32 ✓		Stensil "	1	10:-	10	-	✓			
23		Rörens framdragnig genom väg m	1	5:-	10	5	✓	1023	70	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						116	30	✓
	514	^{-I} Diket D - D ✓								
40-40+68		200 mm rör med frakt m	68	2:25	153	-	✓			
40+68- -44+41		150 - " - "	373	1:50	559	50	✓			
44+41- -45+14		100 - " - "	73	0:80	58	40	✓			
40-40+68		Grävning, läggning och återfyllning "	68	0:95	64	60	✓			
40+68- 45+14		- " - "	446	0:80	356	80	✓			
40+68, ✓ 43+9, ✓ 44+41 ✓		Brunn typ A d=450 st	3	45:-	135	-	✓			
45+14		" " A d=375 "	1	35:-	35	-	✓	1362	30	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						147	70	✓
	93	^I Diket E - E								
10-10+93		75 mm rör med frakt m	93	0:50	46	50	✓			
10-10+93		Grävning, läggning och återfyllning "	93	0:50	46	50	✓			
10+93 ✓		Brunn typ A d=375 st	1	35:-	35	-	✓	128	-	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						12	-	✓
	2828	Samfälligheten A - F summa kronor							9240	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-		<u>Samfälligheten G - H.</u>								
	165	<u>Diket G - H. ✓</u>								
21-21+13		Lera m	13	0:40	5	20 ✓				
21+13-22		125 mm rör med frakt "	87 ✓	1:10 ³ 1:50	95 130	70 50				
22-22+65		100 - " - "	65 ✓	0:80	52	- ✓				
21+13- -22+65		Grävning, läggning och återfyllning "	152 ✓	0:85	129	20 ✓				
21+13 ✓		Täckdikesöga typ A st	1 ✓	15:-	15	- ✓				
22 ✓		Brunn typ A d=450 "	1 ✓	45:-	45	- ✓				
22+65		" " A d=375 "	1 ✓	35:-	35	- ✓	377 10 411 90			
		Arbetsledning o.oförutsett					68 90 48 10		460	✓
	165	<u>Samfälligheten G - H summa kronor</u>							460	✓
		<u>Samfälligheten J - L.</u>								
	488	<u>Diket J - K - L. ✓</u>								
30+33- -33+47		200 mm rör med frakt m	314 ✓	2:25	706	50 ✓				
33+47- 34+21		150 - " - "	74 ✓	1:50	111	- ✓				
34+21- 34+88		100 - " - "	67 ✓	0:80	53	60 ✓				
30+33- 33+47		Grävning, läggning och återfyllning "	314 ✓	1:-	314	- ✓				
33+47- -34+88		- " - "	141 ✓	0:65	91	65 ✓				
30+33		Täckdikesöga typ A st	1	15:-	15	- ✓				
31+48, ✓ 33+47, ✓ 34+21 ✓		Brunn typ A d=450 "	3	45:-	135	- ✓				
34+88 ✓		" " A d=375 "	1	35:-	35	- ✓	1461 75			✓
		Arbetsledning o.oförutsett					158 25		1620	✓
		<u>I</u>								
	240	<u>Diket K - K ✓</u>								
36-37+62		125 mm rör med frakt m	162 ✓	1:10	178	20 ✓				
37+62- 38+40		100 - " - "	78 ✓	0:80	62	40 ✓				
	728	Överföres			240	60 ✓			1620	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
--	728	Överfört			240	60	✓		1620	✓
36-37+62		Grävning, läggning och återfyllning m	162	0:70	113	40	✓			
37+62- -38+40		- " -	78	0:65	50	70	✓			
37+62✓		Brunn typ A d=450 st	1	45:-	45	-	✓			
38+40		" " A d=375	1	35:-	35	-	✓	484 70	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						55 30	✓	540
	728	Samfälligheten J - L summa Kronor								2160
		<u>Samfälligheten M - S</u>								
	1023	Diket M - N - O - P - Q - R - S ✓								
55-55+40		Lera m	40	0:75	30	-	✓			
55+40-59		150 mm rör med frakt	360	1:50	540	-	✓			
59-59+74		250 - " -	74	3:15	233	10	✓			
59+74- -62+10		225 - " -	236	2:70	637	20	✓			
62+10- -63+32		200 - " -	122	2:25	274	50	✓			
63+32- -64+54		150 - " -	122	1:50	183	-	✓			
64+54- -65+23		100 - " -	69	0:80	55	20	✓			
55+40-59		Grävning, läggning och återfyllning	360	0:80	288	-	✓			
59-63+32		- " -	432	1:30	561	60	✓			
63+32- -65+23		- " -	191	0:80	152	80	✓			
55+40 ✓		Täckdikesöga st	1	15:-	15	-	✓			
57+60		Brunn typ E d=450	1	40:-	40	-	✓			
59		" " E d=525	1	45:-	45	-	✓			
59+74,✓ 60+97,✓ 62+10 ✓		" " A d=525	3	50:-	150	-	✓			
63+32,✓ 64+54,✓ 65+23 ✓		" " A d=450	3	45:-	135	-	✓			
		Rörets framdragnings genom väg m	1	5:-	5	-	✓	3345 40	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						354 60	✓	3700
	1023	Överföres								3700

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-	1023	Överfört							3700	--✓
		I II III IV								
	668	Diket N - N - N - N - N ✓								
90-93+28		225 mm rör med frakt m	328✓	2:70✓	885	60	✓			
93+28- -94+70		200 - " - " ✓	142✓	2:25	319	50	✓			
94+70- -96+68		150 - " - " ✓	198✓	1:50	297	-	✓			
90-93+28		Grävning, läggning och återfyllning	328✓	1:40	459	20	✓			
93+28- -96+68		- " - " ✓	340✓	0:95	323	-	✓			
91+31✓ 93+28✓		Brunn typ A d=525	st 2	50:-	100	-	✓			
91+92✓		" " C d=525	" 1	30:-	30	-	✓			
94+36✓ 96+68✓ 94+70		" " A d=450	" 2	45:-	90	-	✓			
		" " C d=450	" 1	25:-	25	-				
		Rörets framdragnings genom väg	m 2	5:-	10	-		25 39 30 2514 30		
		Arbetsledning o.oförutsett						255 70	✓ 2795 2770	✓
		I V								
	60	Diket N - N ✓								
100- -100+60		125 mm rör med frakt m	60✓	1:10	66	-	✓			
100- -100+60		Grävning, läggning och återfyllning	60✓	0:80	48	-	✓			
100+60✓		Brunn typ A d=375	st 1	35:-	35	-	✓	149	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						16	✓	165 - ✓
		III VI								
	12	Diket N - N ✓								
105- -105+12		125 mm rör med frakt m	12✓	1:10	13	20	✓			
105- -105+12		Grävning, läggning och återfyllning	12✓	0:80	9	60	✓			
105+12		Brunn typ A d=375	st 1	35:-	35	-	✓	57 80	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						7 20	✓	65 - ✓
	1763	Överföres							6725 3700	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1763	Överfört							6925 - ✓	
	198	^I Diket O - O ✓							6700 -	
80-81+98		125 mm rör med frakt m	198 ✓	1:10 ✓	217	80				
80-81+98		Grävning, läggning och återfyllning "	198 ✓	0:65 ✓	128	70				
80+55		Brunn typ A d=450 st	1	45:- ✓	45	-				
81+98		" " A d=375 "	1	35:- ✓	35	-				
		Rörens framdragning förbi trumma "	1	3:-	3	-	429	50	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett					50	50	✓	480 - ✓
	235	^I Diket P - P ✓								
70-71+35		125 mm rör med frakt m	135 ✓	1:10 ✓	148	50	✓			
71+35- -72+35		100 - " - "	100 ✓	0:80 ✓	80	-	✓			
70-72+35		Grävning, läggning och återfyllning "	235 ✓	0:65 ✓	152	75	✓			
71+35		Brunn typ A d=450 st	1	45:-	45	-	✓			
72+35		" " A d=375 "	1	35:-	35	-	✓	461	25	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						58	75	✓ 520 - ✓
	42	^I Diket Q - Q ✓								
190- -190+42		75 mm rör med frakt m	42 ✓	0:50 ✓	21	-	✓			
190- -190+42		Grävning, läggning och återfyllning "	42 ✓	0:80 ✓	33	60	✓			
190+42		Brunn typ A d=375 st	1	35:-	35	-	✓	89	60	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						10	40	✓ 100 - ✓
	235	^I Diket R - R ✓								
66-67+53		150 mm rör med frakt m	153 ✓	1:50 ✓	229	50	✓			
67+53+ -68+35		75 - " - "	82 ✓	0:50 ✓	41	-	✓			
66-67+53		Grävning läggning och återfyllning "	153 ✓	0:75 ✓	114	75	✓			
67+53- -68+35		- " - "	82 ✓	0:95 ✓	77	90	✓			
66+74 och 67+53		Brunn typ A d=450 st	2	45:-	90	-	✓			
68+35		" " A d=375 "	1	35:-	35	-	✓	588	15	
		Arbetsledning o.oförutsett						548	15	✓
								66	85	✓ 655 -
2473		Samfälligheten M - S summa kronor								8480 - ✓
										8410 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-	280	<u>Samfälligheten T - V</u>								
	280	<u>Diket T - U - V</u> ✓								
110-110+36		Lera m	36 ✓	0:30 ✓	10	80 ✓				
110+36- -112+13		100 mm rör med frakt "	177 ✓	0:80 ✓	141	60 ✓				
112+13- -112+80		75 " - " - "	67 ✓	0:50 ✓	33	50 ✓				
110+36- -112+80		Grävning, läggning och återfyllning "	244 ✓	0:90 ✓	219	60 ✓				
110+36		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	- ✓				
112+80 ✓ 111+10 ✓ 112+13 ✓		Brunn typ A d=375 "	3	35:-	105	- ✓	525	50 ✓		
		Arbetsledning o.oförutsett					64	50 ✓	590	- ✓
	78	<u>Diket U - U</u> I ✓								
120- -120+78		75 mm rör med frakt m	78 ✓	0:50 ✓	39	- ✓				
120- -120+78		Grävning, läggning och återfyllning "	78 ✓	0:60 ✓	46	80 ✓				
120+78		Stensil st	1	10:-	10	- ✓	95	80 ✓		
		Arbetsledning o.oförutsett					14	20 ✓	110	- ✓
	358	<u>Samfälligheten T - V summa kronor</u>							700	- ✓
		<u>Samfälligheten X - Å</u>								
	457	<u>Diket X - Y - Z - Å</u> ✓								
125+16- -125+38		Lera m	22 ✓	0:75 ✓	16	50 ✓				
125+38- -126+12		150 mm rör med frakt "	74 ✓	1:50 ✓	111	- ✓				
126+12- -126+17		Landsväg. Trumma tillräcklig	5							
126+17- 126+19		Rensning "	2	0:20	-	40 ✓				
126+19- 127+54		200 mm rör med frakt "	135 ✓	2:25 ✓	303	75 ✓				
	457	Överföres			431	65 ✓				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	9
		III								
	138	Diket Z - Z ✓							2090 ✓	1840 -
185- -185+77		100 mm rör med frakt m	77	0:80	61	60	✓			
185+77- -186+38		75 - " - "	61	0:50	30	50	✓			
185- 186+38		Grävning, läggning och återfyllning "	138	0:80	110	40	✓			
185+77, ✓ 186+38 ✓		Brunn typ A d=375 st 2		35:-	70	-	272 50 ✓			
		Arbetsledning o. oförutsett					37 50 ✓	210 -		
		II IV								
	44	Diket Z - Z ✓								
187- -187+44		75 mm rör med frakt m	44	0:50	22	-	✓			
187- -187+44		Grävning, läggning och återfyllning "	44	0:70	30	80	✓			
187+44		Brunn typ A d=375 st 1		35:-	35	-	87 80 ✓			
		Arbetsledning o. oförutsett					12 20 ✓	100 -		
	774 956	Samfälligheten X - Å summa kronor						1840 -		2500 -
		Samfälligheten Å - Ö								
	510	Diket Å-Ö ✓								
130+50- -130+59		Lera m	9	0:40	3	60	✓			
130+59- -130+67		Landsväg. Trumma tillräcklig "	8							
130+67- -133+32		200 mm rör med frakt "	265	2:25	596	25	✓			
133+32- 134+16		125 - " - "	84	1:10	92	40	✓			
134+16- 135+10		100 - " - "	94	0:80	75	20	✓			
130+67- -131+66		Grävning, läggning och återfyllning "	99	1:65	163	35	✓			
131+66- -132+80		- " - "	114	1:05	119	70	✓			
132+80- -134+16		- " - "	136	1:30	176	80	✓			
134+16- -135+10		- " - "	94	0:75	70	50	✓			
		Överföres			1297	80	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	510	Överföres			1297	80	✓			
130+67		Täckdikesöga A st 1	1	15:-	15	-	✓			
131+66,✓ 132+90,✓ 133+32 ✓		Brunn typ A d=450 "	3	45:-	135	-	✓			
134+16,✓ 134+72,✓ 135+10 ✓		" " A d=375 "	3	35:-	105	-	✓	1552	80	✓
		Arbetsledning o. oförutsett						187	20	✓
	510	Samfälligheten Ä - Ö summa kronor							1740	✓
		Samfälligheten Aa - Ad								
	690	Diket Aa - Ab - Ac - Ad ✓								
140+13- -140+17		Lera m	4	0:40	1	60				
140+17- 140+90		200 mm rör med frakt "	73	2:25	164	25				
140+90- -140+98		Landsväg. Trumma till- räcklig "	8							
140+98- -141+50		225 mm rör med frakt "	52	2:70	140	40				
141+50- -144+90		150 - " - "	340	1:50	510	-				
144+90- -145+74		125 - " - "	84	1:10	92	40				
145+74- -146+90		100 - " - "	116	0:80	92	80	✓			
140+17- -140+90		Grävning, läggning och återfyllning "	73	0:95	69	35	✓			
140+98- -141+50		- " - "	52	1:30	67	60	✓			
141+50- -146+90		- " - "	540	1:05	567	-				
140+98,✓ 145+74,✓ 140+90,✓ 142,✓ 143+18,✓ 144+90		Brunn typ A-d=450 st 2	2	45:-	270	-				
146+90		" " A d=375 "	1	35:-	35	-				
141+50		" " C d=450 "	1	25:-	25	-				
140+17 ✓		Täckdikesöga A "	1	15:-	15	-		2050	40	
		Arbetsledning o. oförutsett						229	60	✓
		Överföres							2280	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	690	Överfört							2280	-
	254	<u>Diket Ab - Ae</u>								
147- -148+36		125 mm rör med frakt m	136	1:10	149	60				
148+36- -149+54		100 - " -	118	0:80	94	40				
147- -147+47		Grävning, läggning och återfyllning	47	0:85	39	95				
147+47- -149+54		- " -	207	1:25	258	75				
148+36		Brunn typ A d=450	st 1	45:-	45	-				
149+54		" " A d=375	1	35:-	35	-	622	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					77	30	700	-
	124	<u>Diket Ac - Af</u>								
150- 151+24		100 mm rör med frakt m	124	0:80	99	20				
150- -151+24		Grävning, läggning och återfyllning	124	1:-	124	-				
151+24		Brunn typ A d=375	st 1	35:-	35	-	258	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					31	80	290	-
	1068	<u>Samfälligheten Aa - Ad summa kronor</u>							3270	-
		<u>Samfälligheten Ag - Ah</u>								
	133	<u>Diket Ag - Ah</u>								
170- -170+10		Lera m	10	0:40	4	-				
170+10- -170+20		125 mm rör med frakt	10	1:10	11	-				
170+20- -171+33		100 - " -	113	0:80	90	40				
170+10- -171+33		Grävning, läggning och återfyllning	123	0:90	110	70				
170+10		Täckdikesöga A	st 1	15:-	15	-				
170+82		Brunn typ A d=300	1	30:-	30	-				
171+33		" " A d=375	1	35:-	35	-	296	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					33	90	330	-
	133	<u>Samfälligheten Ag - Ah summa kronor</u>							330	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten Aj - Ak</u>								
	188	<u>Diket Aj - Ak</u>								
28-28+3		Lera m	3	0:40	1	20	✓			
28+3- -29+13		✓ 125 mm rör med frakt "	110	1:10	121	-	✓			
29+13- -29+88		75 - " - "	75	0:50	37	50	✓			
28+3- 29+88		Grävning, läggning och återfyllning "	185	1:-	185	-	✓			
28+3		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-	✓			
29+13, 29+88		Brunn typ A d=375 "	2	35:-	70	-	✓	429	70	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						60	30	✓
	188	<u>Samfälligheten Aj - Ak summa kronor</u>							490	✓
									490	✓
2828		Samfälligheten A - F summa kronor							9240	✓
165		- " - G - H "	"	"					460	✓
728		- " - J - L "	"	"					2160	✓
2473		- " - M - S "	"	"					~~8480~~ 8410	✓
358		- " - T - V "	"	"					700	✓
956		- " - X - Å "	"	"					~~1840~~ 2500	✓
510		- " - Ä - Ö "	"	"					1740	✓
1068		- " - Aa - Ad "	"	"					~~1280~~ 3270	✓
188		- " - Aj - Ak "	"	"					490	✓
133		- " - Ag - Ah "	"	"					330	✓
9407		Summa kronor:							~~28710~~ 29500	✓

Närefors, Järpås 2 juli 1946


*Emil Rindö*Blytsändr. i lbr. styr. den 14/1-50
L.S.

Kostnadsfördelningslängd.

Socken, by eller hemman	Littera	Mantal	Reg.-nr	Ä g a r e	Ägofigur	Båtnad		Delaktighetstal	Ä n d e l i k o s t n a d e n f ö r			
						Kr.	öre		dikningen		förrättningen	
									Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		
<u>Uvereds socken</u>												
Uvered Dränggården		1	1	Samfälligheten M - S								
Fläggården		9/32	5									
Essbjörnsgården		1/9	3	Br. Settergren	7-9	13.620	-	98,803 [✓]	8309	33 [✓]	491 15	
Backgården		1	1	W. Svensson	16-17	165	-	1,197 [✓]	100	67 [✓]	5 96	
				Summa		13.785	-	100 ,000	8410	-	497 11 [✓]	
<u>Övriga samfälligheter</u>												
Uvered Dränggården		1	1									
Fläggården		9/32	5									
Essbjörngården		1/9	3	Br. Settergren	1-6, 10-15	32.296	-	100,000	20.890	-	1164 69 [✓]	
						46.081	-				1661 80	
Närefors, Järpås 2 juli 1946												
I tjänsten												
Biträdande gode män:												

John Settergren *Levon Johansson*

Översiktskarta

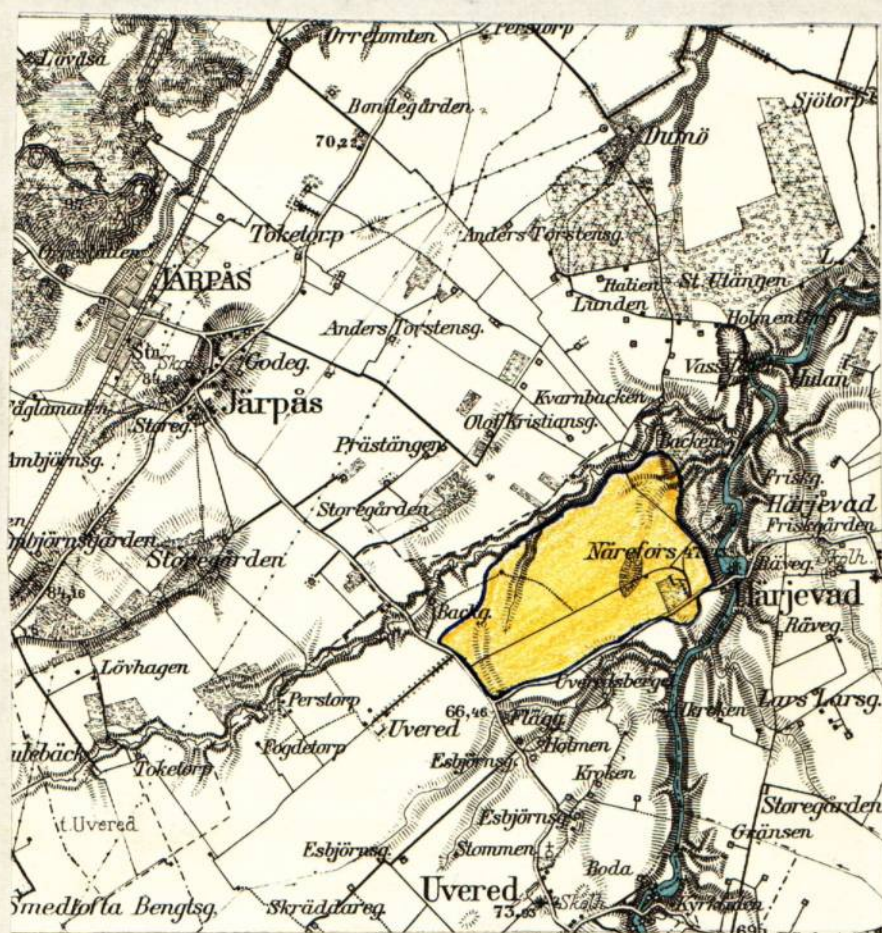

Skala 1 : 50.000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Närefors egendom
m. fl. hemman i Uvereds socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarandemföretag, som avser fördjupning och igen-
läggning med rör av samtliga avlopp å Närefors egendom utom
huvudavloppen i nordvästra och sydöstra gränsen, är beläget
c:a 2 km väster om Härjevals kyrka inom sektion nr 1 av neder-
bördsområde nr. 142, i och för ernående av bättre torrläggning
och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vatten-
lagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående
översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena
vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vatten-
skadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till
uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla
dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F,
G-H, J-K-L, M-N-O-P-Q-R-S, T-U-V, X-Y-Z-Å, Ä-Ö, Aa-Ab-Ac-Ad,
Ag-Ah, Aj-Ak. för huvudavlopp samt B-B^I, C-C^I -C^{II}, C^I -C^{III},
D-D^I, E-E^I, K-K^I, N-N^I -N^{II} -N^{III} -N^{IV}, N^I -N^V, N^I -N^{VI}, O-O^I,
P-P^I, Q-Q^I, R-R^I, U-U^I, Y-Y^I, Z-Z^I, Z-Z^{III}, Z^{II} -Z^{IV}, Ab-Ae,

Ac-Af, för sidodiken härtill. Å sträckan M-S (delsträcka M-påle 59)

utföres avloppet halvtäckt varvid en flödesränna bibehålles ovan

avloppsstammen. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet

skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall

göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar

täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden.

Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsrit-

ningarna utmärkts med rött. Vattensamlingsområdet för de olika av-

loppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis

uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilrit-

ningarna. Samtliga vattensamlingsområden äro tydligt begränsade

och finnas angivna å den upprättade nivåkartan. Den största till

avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden

antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i

fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund

och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits

vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava av-

loppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2

meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså

skall ingå i företaget, har å nivåkartan färglagts och indelats i

numrerade ägofigurer, vilka återfinnas i värderingslängden bil 8.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden

hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd för-
(i torrlägningshänseende,
 bättrade marken skall uppdelas i tio av varandra oberoende
 samfälligheter benämnda A-F, G-H, J-L, T-V, X-Å, Ä-Ö, Aa-Ad, M-S,
 Ag-Ah och Aj-Ak. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår,
 vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter,
 och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägo-
 figurer, som hava del däri. Skäletill uppdelning av någondera
 samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderha för företagets utförande skola sålunda inom
 varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av
 båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltag-
 ningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn
 8 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent
 av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 9 är det häremot
 svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter
 samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av
 företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest
 någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom
 inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall
 då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av

sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på
 åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verk-
 ställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller
 jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning
 enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall,
 så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Läns-
 styrelsen i Mariestad med 69 kronor och 12 öre, vilken kostnad
 förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd
 fördelas på delägarna med en kroha 50 öre för tusen av vars och
 ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättrings-
 värde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela före-
 taget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfällig-
 heterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden
 och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för
 grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas
 nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
 männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,

utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i

i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets
framläppande genom upplagen skola anordnas;
att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande
standardfordringar;
att under arbetstiden ej får uppdämmas eller påsläppas vatten
på sätt att skada uppstår;
att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs in-
träffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänt-
förändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
att arbetena för företagets utförande vad avser samfälligheten
M-S böra genom entreprenad överlätas på härför skickad
person.
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av
år 1956.
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör
eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga
syneförrättning enligt 7 kap vattenlagen.
att det skall benämnas "Närefors torrlägningsföretag av år
1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken
besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §

vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
stående datum. ;

Närefors, Järpås den 2 juli 1946

I tjänsten:

autrouney.

Biträdande gode män:

John Albertson *Leuno & Johansson*

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Närefors egendom i

Uvereds socken av Skaraborgs län

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	100 ha	710:- ✓
	5 " däröver à 5:-	25:- ✓
Tillägg 1,6 % av kostnaden 29.300		468:80 ✓ 1203:80 ✓


Övriga förrättningskostnader

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	420:-
Ersättning till gode män:	
Gustaf Lundgren, Ambjörngården, Järpås	
Cykel Ambjörngården-Närefors och åter 12 km à 0:20	2:40
Traktamente	10:-
John Albertsson, Skräddaregården, Uvered	
Cykel Skräddaregården-Närefors och åter 10 km à 0:20	2:-
Traktamente	10:-
Lennart Johansson, Djupedal, St. Levene	
Cykel Djupedal-Närefors och åter 15 km à 0:20	3:- 457:40
Traktamente	10:- (458:-)
	(1661:20
Summa kronor	(1661:80)


Närefors, Järpås den 2 juli 1946

Erik Andersson
Jordbrukskonsulent


*Täckdikesöga.
typ A.*

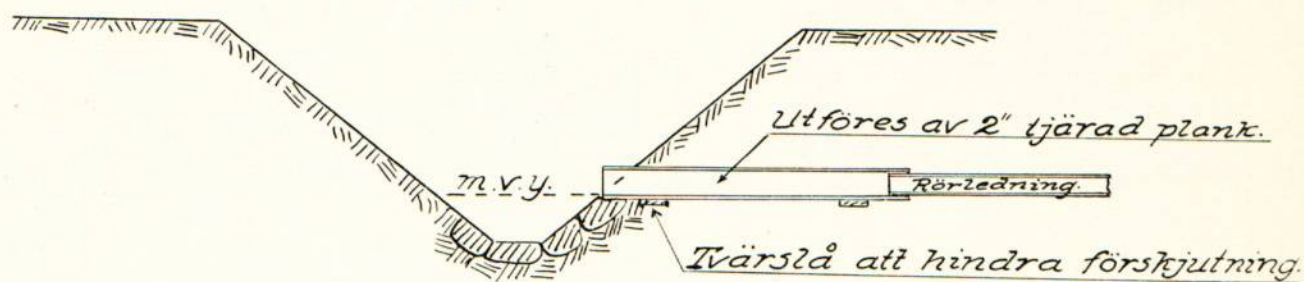


*Rörlutlopp.
typ B.*

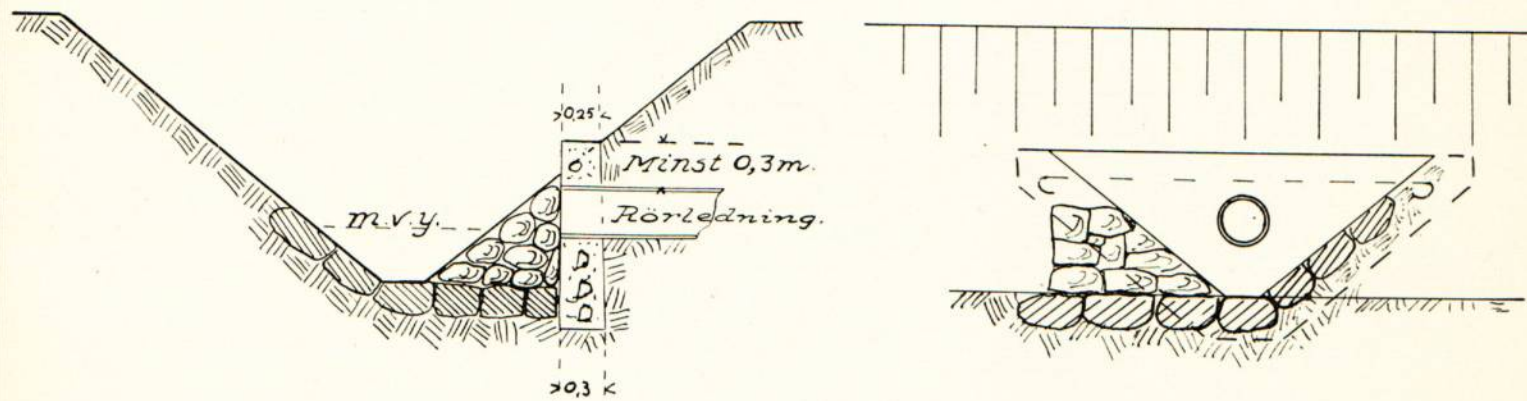








typ C.

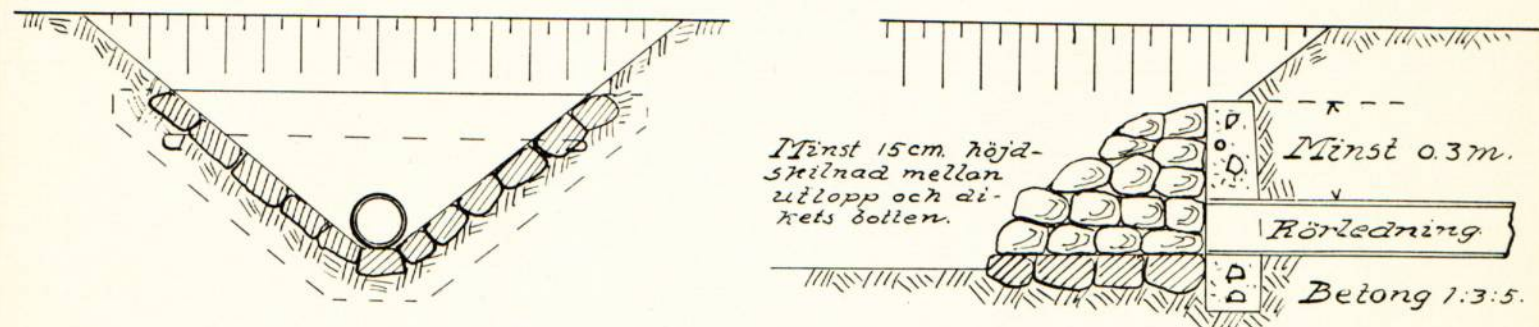



typ D.

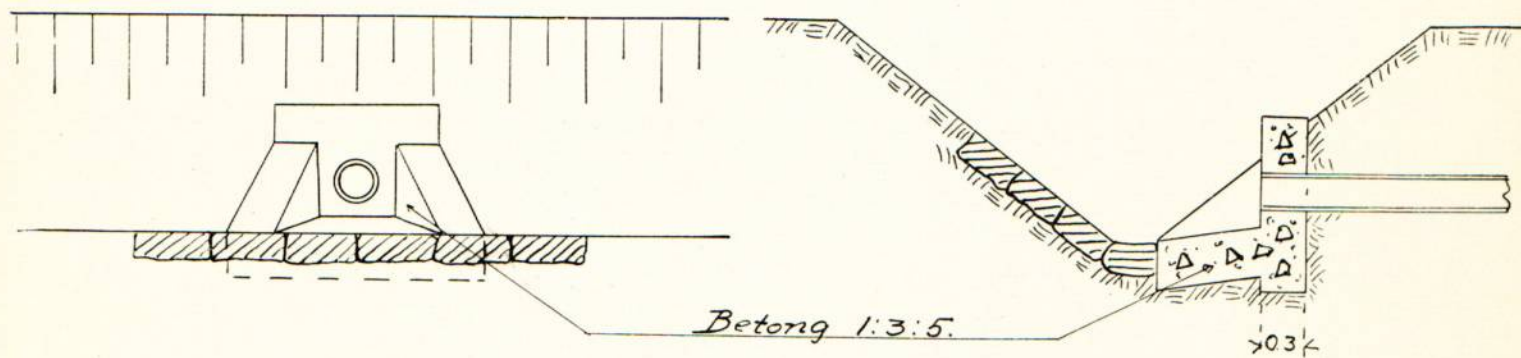

TÄCKDIKESBRUNNAR.

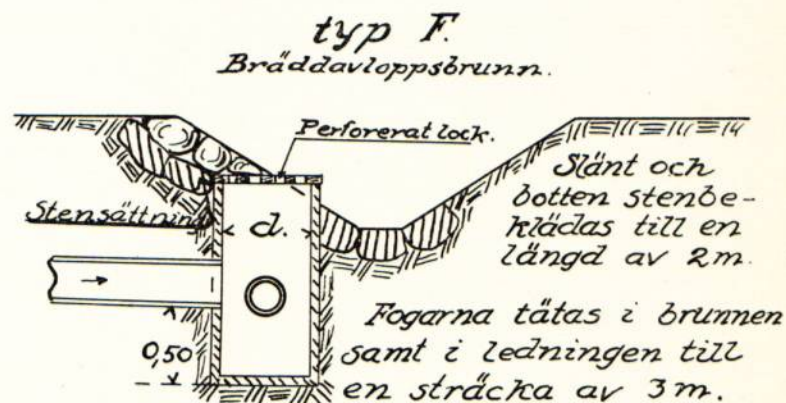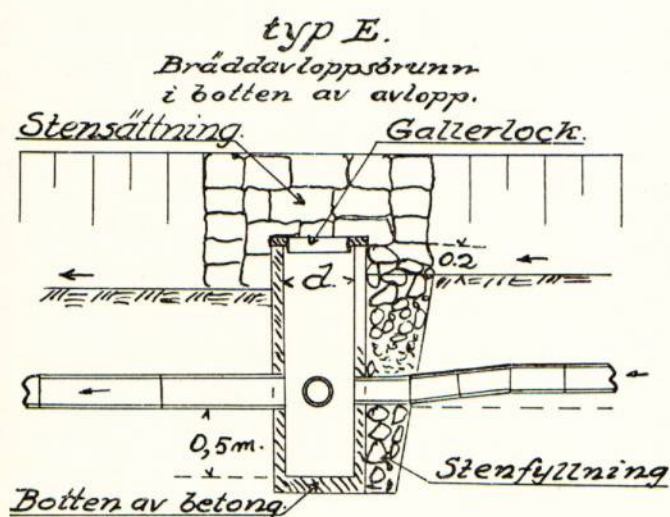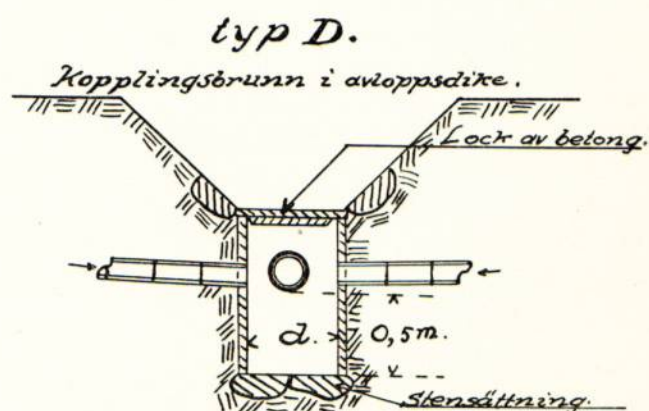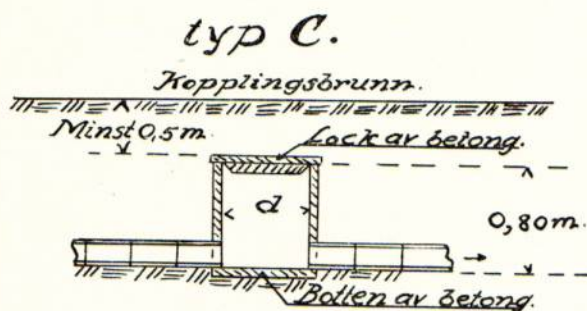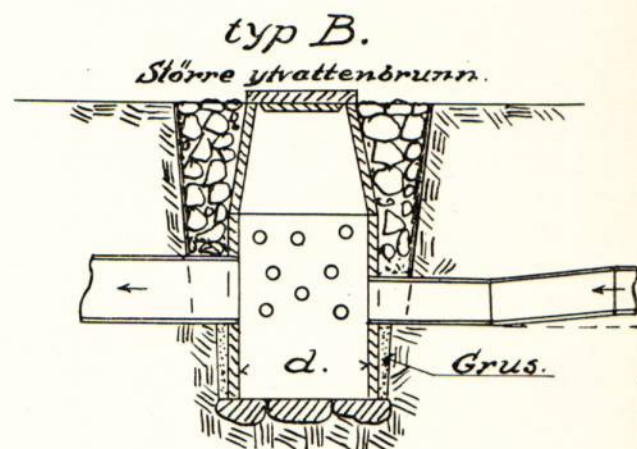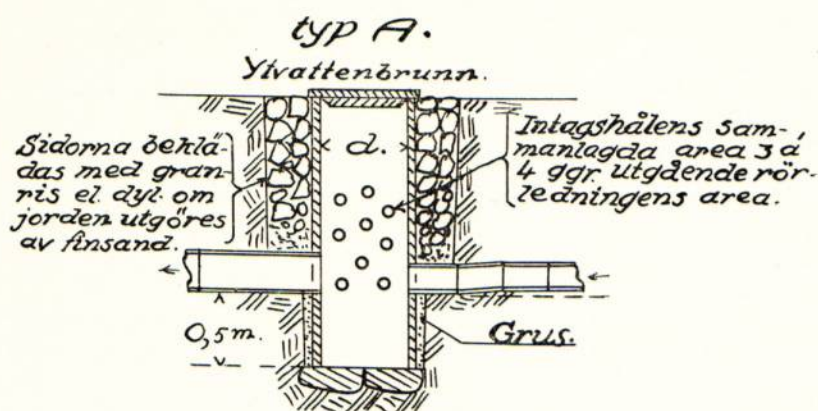

Detalj i plan.

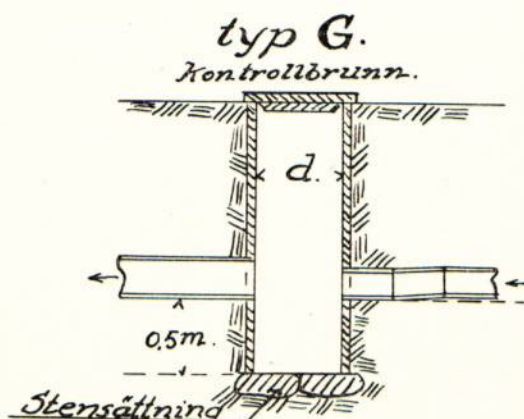


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

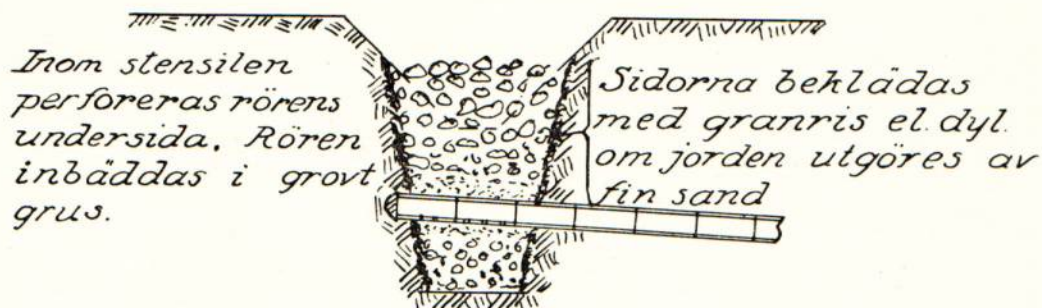

Grusfilter.

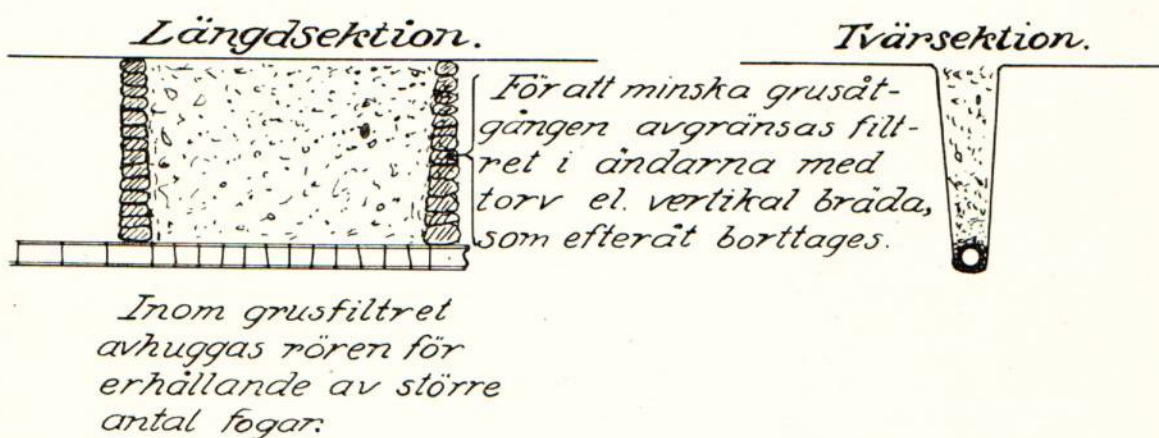

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomättad lera.
