Förslag i tre blad
till

Blad 1.

dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945

i Lövestads socken, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning åren 1944–1945 av

Erik Ahström

Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

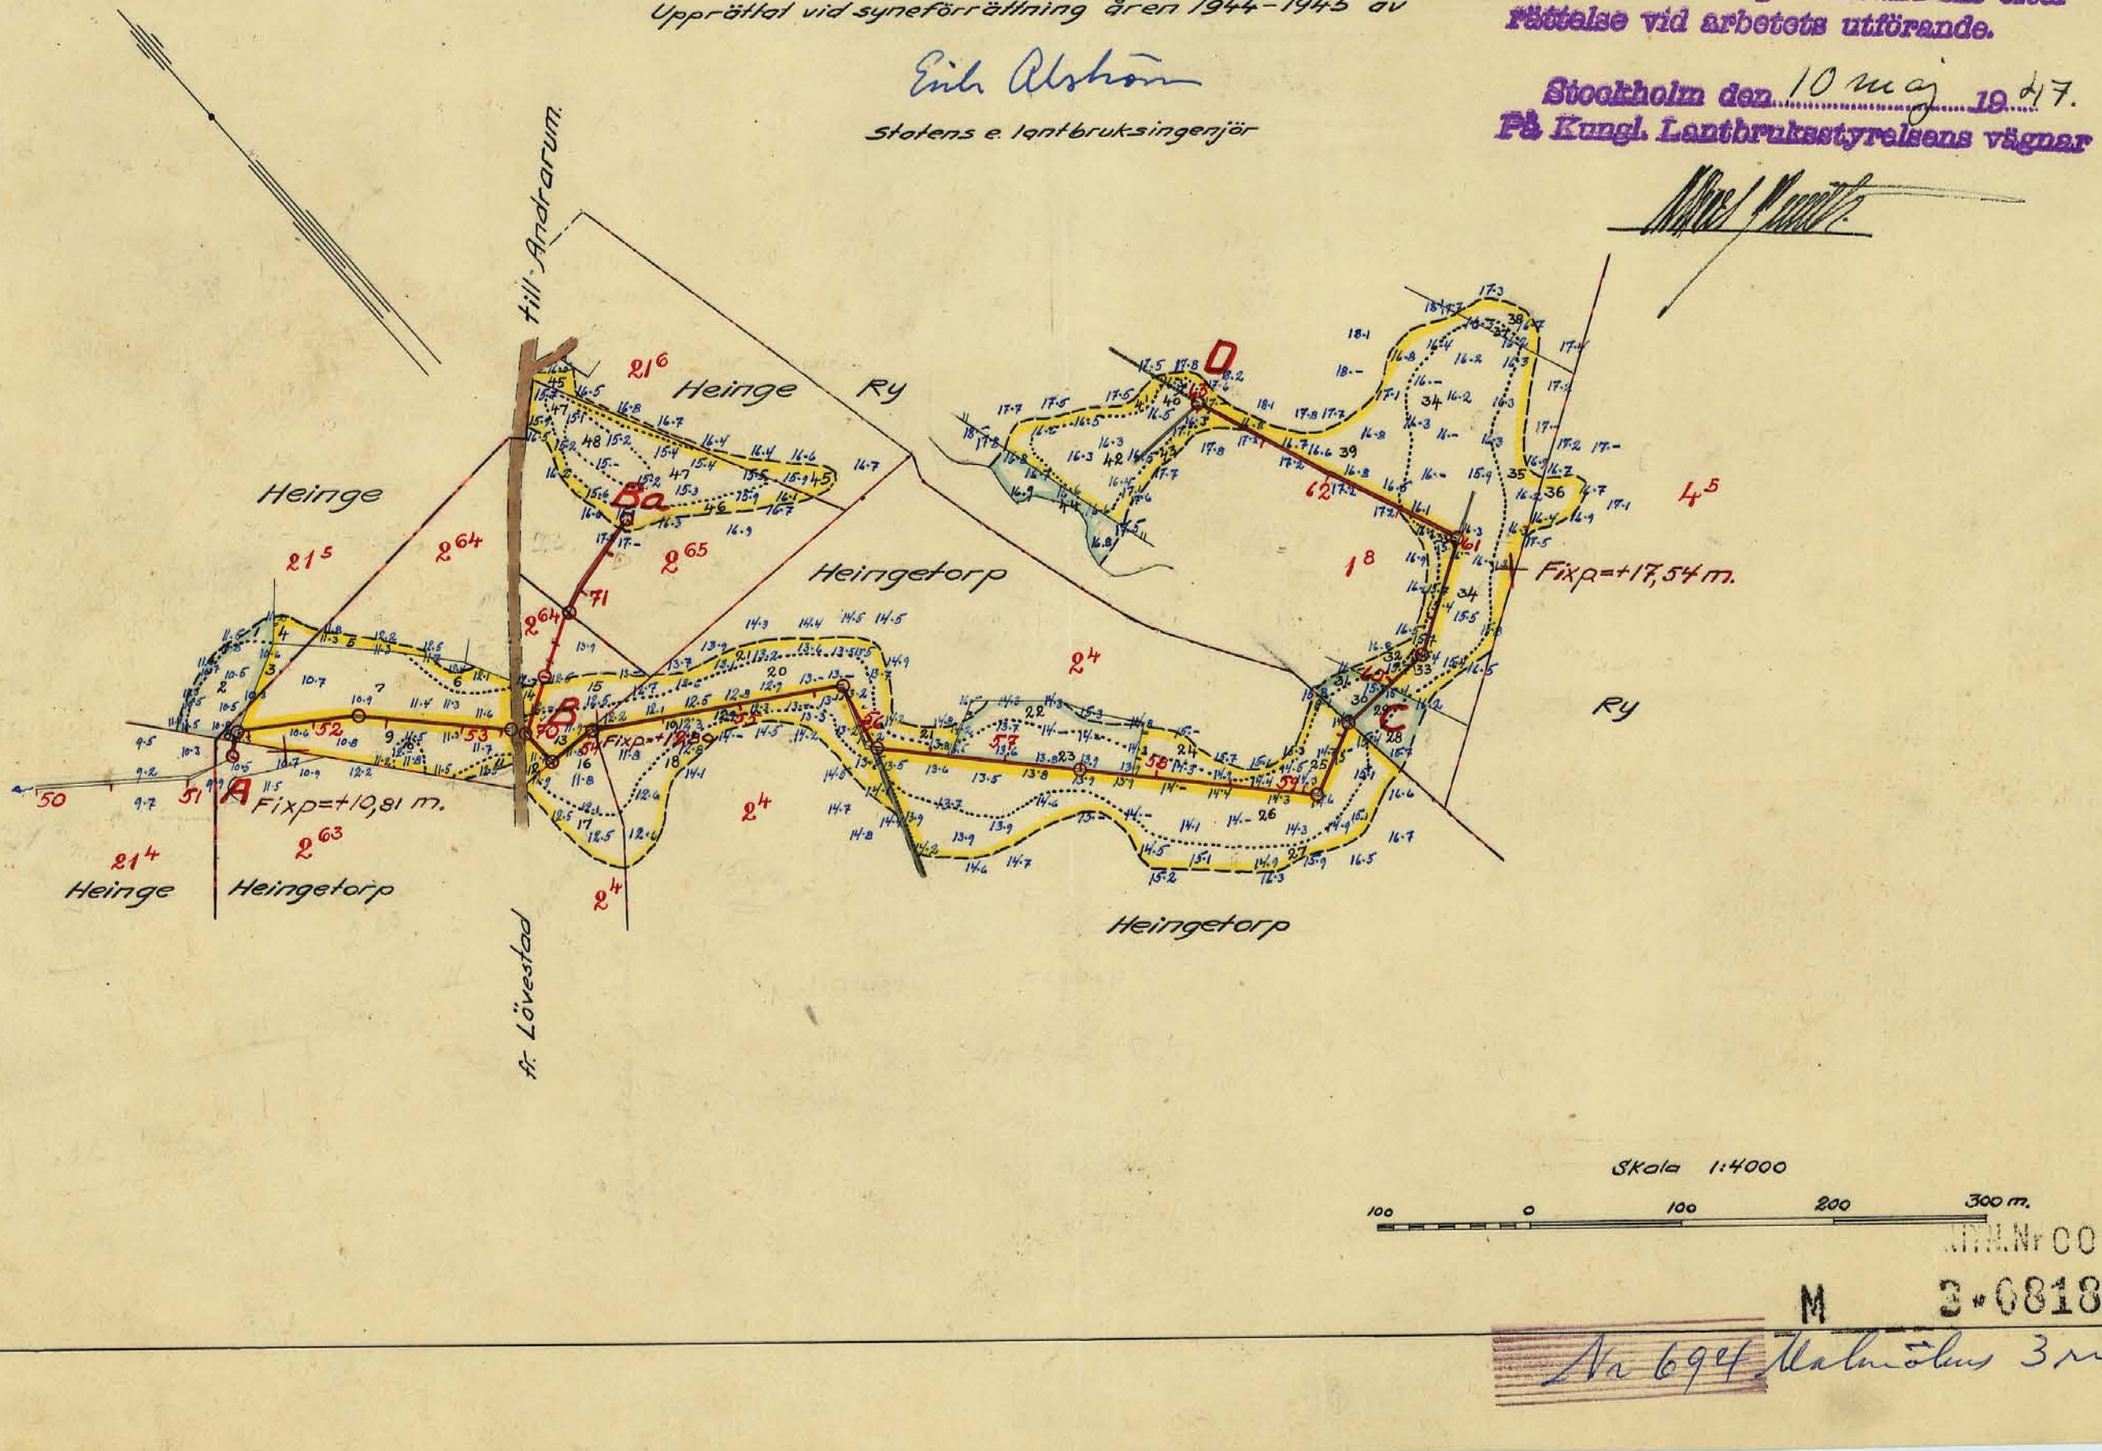

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

Arkiv Nr 001
M 3.0818
Ar 6947 Malmöhus 3 rote

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Blad 2.

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget

Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945

Erik Alsbin

A

Brunn 24" — 50 ha

Brunn 24"

B

Brunn enl. särskild ritn. — 46 ha

Brunn enl. särskild ritn.

Brunn 24" — 41 ha

Brunn 24"

C

Brunn 24" — 34 ha

Brunn 24" — 31 ha

Brunn 24"

Brunn 24" — 25 ha

Brunn 24" — 22 ha

Brunn 24"

Brunn 24" — 20 ha

D

Brunn 24" — 8 ha

B

Brunn enl. särskild ritn.

Brunn 24"

Brunn 24"

Ba

Brunn 24" — 40 ha

Förslag till brunnar vid 53+32 och 53+42
Skala 1:50
Längdsektion

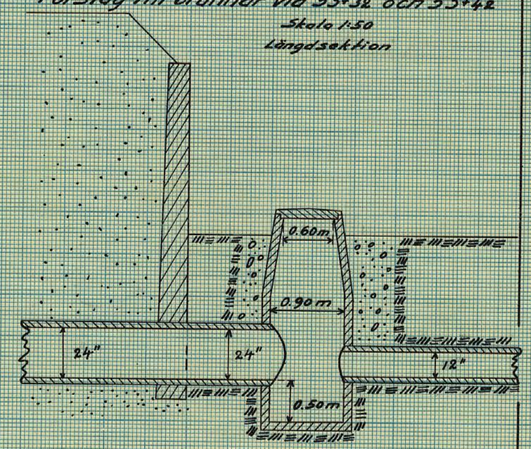

Plan



Skala för brunnar 1:50

Skala för höjd 1:100

Skala för längd 1:4000

JTN.Nr 002

M 3:0818 2

Nr 694 Malmströms Tryck

Fixp=+10.81 m.

Fixp=+10.94 m.

Fixp=+17.54 m.

Ägofurrora

Ägofurrora

Täckt ledning av cementrör

12" 12" 10" 10" 9" 8"

Täckt ledning av cementrör

5" 6"

=70

=53+42

Tillhör förslag i tre blad till dikningsföretaget

Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945

Erik Ahlén

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 19 47.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Trumma för allmän väg 53+32 53+42



























































Trumma för ägoväg 60+92 60+95











Trumma för ägoväg 62+70 62+73















Förslag till 84" brunnar
Skala 1:50





Skala för brunn 1:50

Skala för sektioner 1:100

KTIN. Nr 003

M 3*0818

Nr 694 Malmöhus 3 prh

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 11593
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1945
M 3-0818

Komb 436/1947

Handlingar

angående

dikningsföretaget Heinge, Heingetorp

och Ry av år 1945

i Lövestads socken, Malmöhus län.

Upprättade åren 1944-1945.

Handlingar

angående

dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry

av år 1945

i Lövestads socken, Malmöhus län.

Upprättade åren 1944-1945.

Till akten hör 3 blad ritningar.

Innehållsförteckning

protokoll,		sid.	1 - 7
förordnande,	bil. 1,	"	7 - 8
kungörelse,	" 2,	"	9
förteckning,	" 3,	"	9 - 10
förening,	" 4,	"	10 - 11
fullmakter,	" 5, 6 och 7,	"	11 - 12
värderingslängd och hävdeförteckning,	" A,	"	13 - 22
kostnadsförslag,	" B,	"	23 - 26
arbetsbeskrivning,	" C,	"	27 - 31
utlåtande,	" D,	"	32 - 43
kostnadsfördelningslängd,	" Da,	"	44 - 46.

Översiktskarta

Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Ry m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län.

År 1945 den 30 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Karl Månsson, Lövestad n:r 16, Lövestad, och Nils Andersson, Näsby, Klasaröd, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Ry m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län. Förrättningsmannen hade den 8 januari 1945 översänt kungörelse om förrättningens företagande till pastorsämbetet i Lövestad. Kungörelsen hade anslagits för Lövestads församling den 14 januari 1945 (Bil. 2), samt dessutom varit införd som annons i Skånska Dagbladet den 10 januari 1945. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 januari 1945 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbrukare Thor Andersson, äg. 1/8 mtl. Ry 1^{8},

Lantbrukare Karl Olsson, äg. 15/256 mtl. av Heingetorp 2^{4},

Lantbrukare Henning Henriksson, äg. 15/4096 mtl. av Ry 6^{15},

Lantbrukare Tage Persson, äg. 1/96 mtl. Ry 6^{14}, 1/96 mtl. Ry 6^{13} och 1/96 mtl. Ry 6^{19},

Lantbrukare Ivar Lundsten, Hg. 2519/115200 mtl. Heingetorp n:r 2 =

= 7557/691200 mtl. Heingetorp 2^{64} och 7557/691200 mtl. Heingetorp 2^{65}; 11/24 av gatehuset Heinge 21^{6} genom lantbrukare Carl Olsson enligt fullmakt bil. 5.

Övriga sakägare och ombud:

Fru Lovisa Nilsson, Hg. avs. Ry 3^{13} och avs. Ry 1^{3}, genom lantbrukare Magnus Andersson enligt fullmakt bil. 6.

Husägare Albert Lundberg, Hg. avs. 3^{14},

Lantbrukare Nils Persson, Hg. 3/32 mtl. Ry 3^{3} och 1/32 mtl. Ry 1^{9},

Lantbrukare Nils Andersson, Hg. 15801/691200 mtl. Heingetorp 2^{61} och 2^{62} samt 23/48 av gatehuset n:r 21 Heinge (Heinge 21^{2} och 21^{3}); Heinge 21^{4} och 2061/691200 mtl. Heingetorp 2^{63}.

Husägare Anders Larsson, Hg. 1/256 mtl. Heingetorp av 2^{4}, genom herr Nils Nilsson enligt fullmakt, bil. 7.

Lantbrukare Magnus Andersson, Hg. 3/64 mtl. Ry 4^{5}.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade

företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med förundersökningarna. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komma att framställas beträffande avloppa upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbrukare Thor Andersson med 76:- kronor, till lantbrukare Tage Persson med 38:40 kronor, till lantbrukare Henning Henriksson med 6:- kronor, till lantbrukare Karl Olsson med 26:40 kronor och till lantbrukare Ivar Lundsten med 9:60 kronor eller tillhopa 156:40 kronor.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Sakägarna yrkade, att två skilda förrättningar skulle uppgöras, så att de bägge företagen kunde handhavas av olika styrelser.

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet samt meddelades, att nytt sam-

manträdet skulle hållas torsdagen den 8 februari 1945 kl. 10.00 samt upplöstes sammanträdet.

Ry den 30 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Månsson Nils Andersson

Gode män.

År 1945 den 8 februari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Karl Månsson och Nils Andersson för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Lantbrukare Thor Andersson.

Lantbrukare Karl Olsson.

Lantbrukare Henning Henriksson.

Lantbrukare Tage Persson.

Lantbrukare Ivar Lundsten, genom lantbrukare Karl Olsson.

Fru Lovisa Nilsson, genom lantbrukare Magnus Andersson.

Lantbrukare Nils Persson.

Lantbrukare Nils Andersson.

Husägare Anders Larsson, genom herr Nils Nilsson.

Lantbrukare Magnus Andersson.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till företagens utförande, samt framlade till sakägarnas granskning de till förslagen hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna upp-

lästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängderna såsom Bil. A,

Kostnadsförslagen såsom Bil. B,

Arbetsbeskrivningarna såsom Bil. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtanden - se bil. D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandena missnöjde ägde desamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser angående bidrag och lån av statsmedel.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. För dikningsföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6 mv år 1945 uppdrogs åt lantbrukare Thor Andersson, och för dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 uppdrogs åt lantbrukare Thor Andersson

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företagen,

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från

statens avdikningsanslag.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelser för företagen, valdes för dikningsföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6 av år 1945: Lantbrukare Thor Andersson tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Tage Persson och Nils Persson, och för dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945: Lantbrukare Thor Andersson tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Karl Olsson och Ivar Lundsten.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att de till företagen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av lantbrukare Thor Andersson och inom trettio dagar alltså tillställas honom, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska handlingarna och ritningarna eller taga avskrifter och kopior.

§ 15.

Förrättningsmannen överlämnade till lantbrukare Thor Andersson ett exemplar av resp. arvodesräkning. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningarna.

§ 16.

Upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Ry den 8 februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Månsson Nils Andersson

Gode män.

Vidimeras ex officio:
Erik Alström
e.o. Lantbruksingenjör.

Bil. 1.

Ek.D. nr 8/680 1944

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin E. Wessman

Ek.D. nr 8/680 1944.

Ink.till Lantbruksingenjörskontoret den 3/2 1944.

Sägill

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 januari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin E. Wessman

8.

Ek.D. nr 8/680 år 1944.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 31 JAN. 1944.
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

M a l m ö.

Då å våra ägor en stor del består av mycket vattensjuk mark, som behöver torrläggas, få härmed undertecknade vördsamt anhålla om laga syneförrättning å den vattensjuka jorden.

Ry pr Lövestad den 29/1 1944.

Thor Andersson

Äg.t. 1/8 mtl n:r 1 Ry

Karl Olsson

Äg.t. 15/256 mtl Hoingetorp 2

Ek.D. nr 8/680 år 1944.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 31 JAN. 1944.
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

M a l m ö.

Då å våra ägor en stor del består av mycket vattensjuk mark, som behöver torrläggas, få härmed undertecknade vördsamt anhålla om laga syneförrättning å den vattensjuka jorden.

Ry per Lövestad den 29/1 1944.

Thor Andersson

Äg. 1/8 mtl. n:r 1 Ry

H. Henriksson

Äg. t. 27/6144 mtl. nr 6 Ry

Tage Persson

Äg.t. 5371/279552 mtl. nr 6 Ry

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ry m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Thor Andersson, Ry n:r 1 per Lövestad, tisdagen den 30 januari 1945 kl. 9,45, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Ry n:ris 1, 3, 4 och 6, Heinzetorp n:r 2 samt Heinge n:r 21 i Lövestads socken och dels allmänna vägen Lövestad-Andrarum.

Malmö den 8 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lövestads församling, söndagen den 14 januari 1945, betygar:

Bror Widén.

Bil. 3.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid synneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ry m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Lövestads församling (kungörelse)	Lövestad	8.1.1945.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Karl Månsson. Lövestad n:r 16.	Lövestad	8.1.1945
Skiftesgodemannen Nils Olsson. Heingetorp n:r 5.	"	"
Lantbrukaren Thor Andersson. Ry.	"	12.1.1945
Fru Lovisa Nilsson.	"	"
Husägaren Albert Lundberg.	"	"
Lantbrukaren Nils Persson.	"	"
" Henning Henriksson.	"	"
" Tage Persson.	"	"
" Nils Jönsson.	"	"
" Nils Andersson, Heingetorp.	"	"
" Ivar Lundsten.	"	"
" Carl Olsson.	"	"
Husägaren Anders Larsson.	"	"
Lantbrukaren Magnus Andersson, Ry n:r 4.	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län.	Malmö	"

Malmö den 12 januari 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Bil. 4.

F ö r e n i n g.

Sedan av markägare i Ry och Heingetorp uti Lövestads socken av Malmöhus län framställning gjorts den 29/1 1944 om syneförrättning

enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av ägor och vederbörlig länsstyrelse med anledning därav utfärdat förordnande för statens lantbruksingenjör i länet att handlägga ifrågavarande förrättning, vill undertecknad härigenom förena sig med sökandena på sätt i vattenlagen 10 kap. 58 § förmäles, under yrkande, att förrättningen även skall avse torrläggning av mig tillhörig mark inom Heinge nr 9.

Heinge den 6/11-44.

Ivar Lundsten

Vitsordas:

Erik Alström Karl Månsson Nils Andersson

Bil. 5.

Fullmakt.

Innehavaren av denna fullmakt äger rätt att föra min talan vid sammanträdet hos Tor Andersson Ry tisdagen den 30 januari 1945 angående torrläggningen av min mark m.fl. andra.

Ivar Lundsten

Heinge 21, Lövestad.

Bevittnas:

Tage Svensson
Heinge 18

Gösta Tuvesson
Heinge 18

Bil. 6.

Fullmakt.

Undertecknad överlåter härmed åt Lantbr. Magnus Andersson Ry n:r 4

Löwestad att föra min talan vid syneförrättningen hos Thor Andersson Ry n:r 1 Löwestad angående torrläggning av marker tillhörande Ry med flera hemman i Löwestad socken, Malmöhus län.

Ry den 25 januari 1945.

Lovisa Nilsson

Bevittnas:

Anders Olsson
Ry 6

Henry Lundin
Ry 5

Bil. 7.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag Herr Nils Nilsson att föra min talan å sammanträdet hos Herr Thor Andersson i Ry.

Heingetorp den 28 januari 1945.

Anders Larsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Karl Olsson
Lantbr. Heingetorp 2

Nils Olof Olsson
Lantbr. Heingetorp 2.

Vidimeras ex officio:
Erik Ahlström
t.o. lantmätningsingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Hävdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 1
Låvestads s:n Heinge	av 2/5 gatehus		11/16 delar		Ivar Lundsten
				1	Betesmark, mylla på lättlera
				2	" "
				3	Åker "
				4	" "
					Summa
Heingetorp	2/64		7557/69200		Ivar Lundsten
				5	Åker, mylla på lättlera
				6	" "
				7	" "
				8	Betesmark, "
				9	Åker, "
				10	" "
				11	" "
					Summa
					Sammanställning för avdelning 1
Låvestads s:n Heinge	av 2/5 gatehus		11/16 delar	1-4	Ivar Lundsten
Heingetorp	2/64		7557/69200	5-11	Dess.
					Summa
					Avdelning 2
Låvestads s:n Heingetorp	2/64		7557/69200		Ivar Lundsten
				12	Åker, mylla på lättlera
				13	" —"—
				14	" —"—
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			05					800	40	—	1000	50	—	200	10	—
			20					600	120	—	"	200	—	400	80	—
	05							1600	80	—	2500	125	—	900	45	—
	04							2100	84	—	"	100	—	400	16	—
	09		25						324	—		475	—		151	—
	06							2000	120	—	2500	150	—	500	30	—
	08							2000	160	—	"	200	—	500	40	—
	59							1100	649	—	"	1475	—	1400	826	—
			01					800	8	—	2000	20	—	1200	12	—
	38							1100	418	—	2500	950	—	1400	532	—
	03							2000	60	—	"	75	—	500	15	—
	03							2000	60	—	"	75	—	500	15	—
1	17		01						1475	—		2945	—		1470	—
	09		25						324	—		475	—		151	—
1	17		01						1475	—		2945	—		1470	—
1	26		26						1799	—		3420	—		1621	—
	03							1100	33	—	2500	75	—	1400	42	—
	10							1100	110	—	"	250	—	1400	140	—
	02							2000	40	—	"	50	—	500	10	—
	15								183	—		375	—		192	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, mylla på lättlera
					Summa
Heingetorp	ov 24		1/256		Anders Larsson
				16	Åker, mylla på lättlera
				17	" —"—
					Summa
—"—	ov 24		15/256		Karl Olsson
				18	Åker, mylla på lättlera
				19	" —"—
				20	" —"—
				21	" —"—
				22	Betesmark, —"—
				23	" —"—
				24	Åker, —"—
				25	" —"—
				26	" —"—
				27	" —"—
					Summa
					Sammanställning för avdelning 2
Lärkstads s:n					
Heingetorp	264		7557/69200	12-15	Ivar Lundstam
—"—	ov 24		1/256	16-17	Anders Larsson
—"—	ov 24		15/256	18-27	Karl Olsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15								183	—		375	—		192	—
	13							2000	260	—	2500	325	—	500	65	—
	28								443	—		700	—		257	—
	16							1100	176	—	2500	400	—	1400	224	—
	15							2000	300	—	"	375	—	500	75	—
	31								476	—		775	—		299	—
	34							2000	680	—	2500	850	—	500	170	—
	32							1100	352	—	"	800	—	1400	448	—
	41							1100	451	—	"	1025	—	1400	574	—
	29							2000	580	—	"	725	—	500	145	—
			17					1600	272	—	2000	340	—	400	68	—
			25					700	175	—	"	500	—	1300	325	—
	15							2000	300	—	2500	375	—	500	75	—
	21							1100	231	—	"	525	—	1400	294	—
	97							1100	1067	—	"	2425	—	1400	1358	—
	68							2000	1360	—	"	1700	—	500	340	—
3	37		42						5468	—		9265	—		3797	—
	28								443	—		700	—		257	—
	31								476	—		775	—		299	—
3	37		42						5468	—		9265	—		3797	—
3	96		42						6387	—		10740	—		4353	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 3
Råvstads s:n Ry	18		1/8		Thor Anderssan
				28	Äng, mylla på lättlera
				29	" —"—
				30	" —"—
				31	" —"—
				32	Åker, —"—
				33	" —"—
				34	" —"—
				35	" —"—
					Summa
—"—	45		3/64		Magnus Andersson
				36	Åker, mylla på lättlera
					Summa
—"—	18		1/8		Thor Andersson
				37	Åker, mylla på lättlera
				38	" —"—
				39	" —"—
				40	" —"—
				41	" —"—
				42	" —"—
				43	" —"—
				44	Äng, —"—
					Summa
					Sammanställning för avdelning 3
Råvstads s:n Ry	18		1/8	28-35, 37-44	Thor Andersson Övarfoås

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08					1600	128	—	2000	160	—	400	32	—
			05					800	40	—	"	100	—	1200	60	—
			06					800	48	—	"	120	—	1200	72	—
			03					1600	48	—	"	60	—	400	12	—
	10							2000	200	—	2500	250	—	500	50	—
	07							1100	77	—	"	175	—	1400	98	—
1	07							1100	1177	—	"	2675	—	1400	1498	—
	35							2000	700	—	"	875	—	500	175	—
1	59		22						2418	—		4415	—		1997	—
	09							2200	198	—	2500	225	—	300	27	—
	09								198	—		225	—		27	—
	02							1700	34	—	2500	50	—	800	16	—
	08							2100	168	—	"	200	—	400	32	—
	53							2100	1113	—	"	1325	—	400	212	—
	02							1100	22	—	"	50	—	1400	28	—
	13							2000	260	—	"	325	—	500	65	—
	43							1100	473	—	"	1075	—	1400	602	—
	09							2000	180	—	"	225	—	500	45	—
			16					1600	256	—	2000	320	—	400	64	—
1	30		16						2506	—		3570	—		1064	—
2	89		38						4924	—		7985	—		3061	—
2	89		38						4924	—		7985	—		3061	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
Ry	45		3/64	36	Magnus Andersson
					Summa
					Avdelning 4
Lövestads s:n					
Hunge					Ivar Lundsten
				45	Åker, mylla på lättlera
					Summa
Heingetorp	2 65		7557/69200		Ivar Lundsten
				46	Åker, mylla på lättlera
				47	" " —"—
				48	" —"—
					Summa
					Sammanställning för avdelning 4
Lövestads s:n					
Hunge					
Heingetorp					
	2 65		7557/69200	45	Ivar Lundsten
				46-48	Dens.
					Summa
					Sammanställning för hela företaget
				1-11	Avdelning 1
				12-27	" 2
				28-44	" 3
				45-48	" 4
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och ödlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	89		38						4924	—		7985	—		3061	—
	09								198	—		225	—		27	—
2	98		38						5122	—		8210	—		3088	—
	15							2000	300	—	2500	375	—	500	75	—
	15								300	—		375	—		75	—
	27							2000	540	—	2500	675	—	500	135	—
	39							1100	429	—	〃	975	—	1400	546	—
	14							500	70	—		350	—	2000	280	—
	80								1039	—		2000	—		961	—
	15								300	—		375	—		75	—
	80								1039	—		2000	—		961	—
	95								1339	—		2375	—		1036	—
1	26		26						1799	—		3420	—		1621	—
3	96		42						6387	—		10740	—		4353	—
2	98		38						5122	—		8210	—		3088	—
	95								1339	—		2375	—		1036	—
9	15	1	06						14647	—		24745	—		10098	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Ry den 8 februari 1945
Erik Ahlström
Statens k. lantbruksingenjör
Karl Mårtensson
Lars Andersson
Gode män.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Timlön 1:50 kr.						
		Dikessträckan A-B								
51+34-53+ +32	198	Inköp av 12" cementrör m	198	4:75	940	50				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	198	1:75	346	50				
53+32-53+ +42	10	Trumman under allmänna vä- gen Lövestad-Andrarum bi- behålles i bef. skick			-	-	1287	-		
Tills.	208	meter								
Brunnar m.m. vid		med 24" inre diameter, kopplingar 51+34, 51+50 och 52+28 st.	3	60:-	180	-				
Brunnar vid 53+32 och 53+42 enligt sär- skild ritning			st.	2	175:-	350	-			
Borttagning av		buskar med rötter			35	-	565	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							248	-	2100	-
		Dikessträckan B-C								
53 +42- -54+2	60	Inköp av 12" cementrör m	60	4:75	285	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	60	1:75	105	-				
54+2-55+ +70	168	Inköp av 10" cementrör m	168	3:75	630	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyll-								
Överföres	228	Överföres			1020	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört	228	Överfört			1020	-				
		ning m	168	1:75	294	-				
55+70-56++15	45	Inköp av 10" cementrör m	45	3:75	168	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	45	2:50	112	50				
56+15-59++10	295	Inköp av 10" cementrör m	295	3:75	1106	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	295	1:75	516	25				
59+10-59++60	50	Inköp av 9" cementrör m	50	3:25	162	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	1:50	75	-	3455	25		
Tills.	618	meter								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 53+68, 54+2, 55+70, 56+15, 57+50, 59+10 och 59+60		st.	7	60:-	420	-				
Borttagning av buskar med rötter					10	-	430	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							564	75	4450	-
		Dikessträckan C-D								
59+60-61++6	146	Inköp av 9" cementrör m	146	3:25	474	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll-								
Överföres	146	Överföres			474	50				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört	146	Överfört			474	50				
		ning m	146	1:25	182	50				
61+6-63	194	Inköp av 8" cementrör m	194	2:75	533	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	194	2:25	436	50	1627	-		
Tills.	340	meter								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 60+26, 61+6 och 63		st.	3	60:-	180	-				
Borttagning av träd och buskar med rötter					50	-	230	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							243	-	2100	-
		Dikessträckan B-Ba								
70-70+84	84	Inköp av 5" cementrör m	84	1:60	134	40				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	84	1:75	147	-				
70+84-71++56	72	Inköp av 6" cementrör m	72	1:80	129	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	72	3:-	216	-	627	-		
Tills.	156	meter								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 70+38, 70+84 och 71+56		st.	3	60:-	180	-	180	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		Överföres					807	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört							807	-		
tillägges c:a 15 %							143	-	950	-
		Sammanställning								
	208	Dikessträckan A-B					2100	-		
	618	" B-C					4450	-		
	340	" C-D					2100	-		
	156	" B-Ba					950	-		
Tills.	1322	meter	Summa				9600	-		

Ry den 8 februari 1945.

Erik Alstrin

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.,EFTR. SKARA

Arbetsbeskrivning Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A-B			
51+34	-	-				8.97		12" cementrör mellan 51+34 och
+50	16	1.23						53+32.
						8:1000		
52	50	1.42						Fixpkt. Järndubb i jordfast
+28	28	-				9.72		sten i rågång mellan fastighe-
+28	-	-				9.76		terna Heingetorp 2^{63} och 2^{64};
+50	22	1.59						belägen å höjden +10.81 m.
						4:1000		
53	50	1.78						
+32	32	-				10.18		
+42	10	-				10.27		
Tills.	208	meter						
					Dikessträckan B-C			
53+42	-	-				10.27		12" cementrör mellan 53+42 och
+50	8	1.53						54+2.
54	50	1.59				4:1000		
+2	2	-				10.50		
+2	-	-				10.50		10" cementrör mellan 54+2 och
+50	48	1.40						59+10.
55	50	1.82						Fixpkt. Järndubb i stenblock
						6:1000		
+50	50	1.32						strax intill rågången mellan
56	50	1.45						Anders Larsson, Karl Olsson och
+15	15	-				11.79		Ivar Lundsten; belägen å höjden
+15	-	-				11.86		+12.80 m.
+50	35	1.60						
Överf.	308	meter						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	308	meter						
57	50	1.26						–
+50	50	1.32				4:1000		
58	50	1.29						
+50	50	1.86						–
59	50	0.90						– –
+10	10	-				13.04		
+10	-	-				13.10		9" cementrör mellan 59+10 och
+50	40	1.27				10:1000		59+60.
+60	10	-				13.60		–
Tills.	618	meter						
					Dikessträckan C-D			
59+60	-	-				13.66		9" cementrör mellan 59+60 och
60	40	1.70						61+6.
+50	50	1.46				6:1000		Fixpkt. Järndubb i stenblock
61	50	1.65						strax intill rågången mellan
+6	6	-				14.54		– – Ry 1^{8} och 4^{5}; belägen å höjden
+6	-	-				14.61		+17.54 m.
+50	44	2.02						8" cementrör mellan 61+6 och
62	50	2.35				2:1000		63.
+50	50	2.43						–
63	50	1.54				15.-		–
Tills.	340	meter						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan B-Ba			
70	-	1.34				10.70		5" cementrör mellan 70 och
+38	38	-				11.31		70+84.
+38	-	-				11.44		
+50	12	1.24				47:1000		
+84	34	-				13.60		
+84	-	-				13.60		6" cementrör mellan 70+84 och
71	16	2.32				3:1000		71+56.
+50	50	2.83						
+56	6	-				13.82		
Tills.	156	meter						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5) Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6) Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8) Fyllningen får ej innehålla sten.

9) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11) Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12) Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13) I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.

15) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16) Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna ned-

426611

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

19) Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Ry den 8 februari 1945.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Heinge m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Heinge n:r 21, Heingetorp n:r 2 och Ry n:ris 1 och 4 i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92 ligger c:a 2 km NO om Lövestads järnvägsstation vid järnvägslinjen Eslöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom två floddiken, som från avvägningspunkterna 63 och 71+56 avleda vattnet i västlig riktning till ett gemensamt floddike från avvägningspunkten 53+52, varifrån vattnet avledes i nordvästlig riktning. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför

vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B--C-D och B-Ba) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A-B-C-D och B-Ba.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 9.600:- kronor. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.621:- kronor, skall kunna torrläggas, måste

dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.100:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 12-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.353:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6.550:- (2.100:- + 4.450:-) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 28-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.088:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4.100:- (2.100:- + 2.000:-) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 45-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.036:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 950:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	1.621:-	A-B	2.100:-	1.295497
2	4.353:-	B-C	4.450:-	1.022283
3	3.088:-	C-D	2.100:-	0.680052
4	1.036:-	B-Ba	950:-	0.916988

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	10.098:-	9.600:-	0.950683

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	1.621:-	2.100:-	1.295497
2	4.353:-	6.550:-	1.504709
3	3.088:-	4.100:-	1.327720
4	1.036:-	950:-	0.916988

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	5.974:-	6.550:-	1.096418
1-3	9.062:-	8.650:-	0.954535

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1-3, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 9.062:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 8.650:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.954535.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 1.036:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 950:- kronor. Denna avdelnings relati-

va kostnad belöper alltså till 0.916988.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 §§ och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närma-

re bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4) Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5) Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg samt 10", 9", 8", 6" och 5" 15 kg.

6) På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7) Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil.C).

8) Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på sam-

ma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer

försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 15:15 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-

ning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ry den 8 februari 1945.

Erik Ahström

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Månsson Nils Andersson

Gode män.

Bil. 2)

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lövestads socken.				
2. 11/24 dels	anl 5	gaflarna	Länge; Ivar Lundsten	sök.	1–4	324	475
2. 7567/69200	2 4		Längetorp; Dens.	sök.	5–15	1918	3646
1/256	anl 4		" Anders Larsson		16–17	476	775
3. 12/256	anl 4		" Karl Olsson	sök.	18–27	5468	9265
3/64	4 5		Ry; Magnus Andersson		36	198	225
1. 1/8	1 8		" Thor Andersson	sök.	28–35, 37–44	4924	7985
2. 11/24 dels	anl 6	gaflarna	Länge, Ivar Lundsten	sök.	45	300	375
2. 7567/69200	2 65		Längetorp; Dens.	sök.	46–48	1039	2000
			Summa			14647	24745

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1–3 Rel.kostn.	Avdeln. 4 Rel.kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0,954535	0,916988				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
151	144,14					144,14	l 1,501	7	81	
1727	1648,48					1648,48	l 17,172	89	34	
299	285,41					285,41	2,973	15	47	
3797	3624,37					3624,37	l 37,754	196	43	
27	25,77					25,77	0,268	1	39	
3061	2921,83					2921,83	l 30,436	158	35	
75	—	68,77				68,77	l 0,716	3	73	
961	—	881,23				881,23	l 9,180	47	76	
10098	8650:–	950:–				9600:–	100,000	520	28	

Ry den 8 februari 1945

Erik Olsson

Statens c. lantbruksingenjör.

Karl Månsson Leo Andersson

Goda män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget Fleringe, Fleringstorp och Ry av år 1945 *i* Lövestad *socken av* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	8	0,50	4	-	4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	3.8	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.21 ha st	48	0.17	8	16		
		ha	10.21	1.06	10	82		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			1	75		
		övriga regalark blad st						
		Överföres			32	13	4	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 13	4 -
	31/10, 1/11	***Avvägning.***				
1944		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr ha* ..... *ha*	10.21	0.50	5 10	
		avvägda punkter ..... *st*	325	0.03	9 75	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	3.8	2,00	7 60	
		i annan mark ..... *„*		5,00		78 58
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.21 *ha,* ..... *st*	48	0.05	2 40	
		ha	10.21	0.10	1 02	3 42
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	48	0,04	1 92	1 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	96	0,06	5 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	48	0,12	5 76	15 52
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.1	3 -	0 30	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	1.356	3.50	4 75	5 05
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	3	0.14	0 42	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	39	0.25	9 75	
		..... *„*				
		..... *„*				10 17
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	2	3,00	6 -	6 -
1944	6/11	***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ..... *dag*	1/2	12.-	2 6 —	
		Redogörelse av Nedertorneområde m. m.				
	7/11	*för vattenområdets areal* ..... *km²*		0,02		
		Uppgift av N.O. planimetrering m. m. *dag*	1/3	12.-	4 -	12 —
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen m² sektion på ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimension *„*	3	6,00	18 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... " *„*	3	10,00	30 -	48 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	32	0,03	96	1 96
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	4	2,00	8 -	11 -
		Överföres				197 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				197 62
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.1	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 1 *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	1.222	4,00	4 89	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.	1.222	0.50	0 61	
		nämligen 1 *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 60	15 35
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	325	0,01	3 25	3 25
		Översiktskarta, *§ 41*			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	3	0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		4 40
	29/1 30/1 7/2	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	12	3,00	36 —	36 —
1945	8/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
1944	4/11	Fastighets utredning ..... „	½	12,00	6 —	
		.....				6 —
1944	8/11	.....				
1945	29/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ..... „	2/3	12,00	8 —	
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				8 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				304 62
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ..., *medelareal* 0.21 *ha, ägofigurer st*	48	0.07	3 36	
		..... *ha*	10.21	0.14	1 43	
		Överföres			11 79	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	325	0,02	6 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	32	0,05	1 60	21 64
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.1	5.-	0 50	
		ändring av befintligt avlopp „	1.222	6.-	7 33	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 17	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	24 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			6 -	-6 -
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	47	0,55	25 85	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4 -	
						29 85
		Summa kronor				75 49
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden ½ × 17.95			8 97	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	14 97
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ½ × 156.40			78 20	
		Kopior av ritningar m. m.			10 -	125 20
		Summa kronor				140 17
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				304 62
		Lösen för kopior och avskrifter				75 49
		Övriga förrättningskostnader				140 17
		Summa kronor				520 28

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Falu *häradsrätt.*

78,20
942,08
97
408,08

Ry *den* 8 februari *19*45

Erik Alström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Månsson Lars Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

Räkning

Ry den 8 februari 1945

Elektriska Aktiebolaget Kringe, Kringeborg och Ry ev. år 1945 Debet

till Kassaförvaltaren Karl Månsson

1945				
jan	30	Dagsverksanmärkning ½ × 10 kr	5	—
		Färd hemmet – Ry – hemmet 7+7 = 14 km		
		à 0,50 = 7 kr. ½ × 7:– = 3,50	3	50
febr.	8	Ersättning Elsa med lön 30/1 – 45	8	50
		Summa	17	—

Kvittens:

Karl Månsson

Räkning

Ry den 8 februari 1945

Delningsföretaget Hemse, Hemsetorp och Ry av år 1945 Debet

till Styrelsens ordförande Nils Andersson

1945			
jan	30	Dagtraktamente ½ x 10 = 5:—	5 —
		Färd hemmet – Ry – hemmet 10+10=20 km	
		à 0,50 = 10:— kr. ½ x 10 = 5:—	5 —
febr.	1	Ersättning liten med kom 30/1-45	10 —
		Summa	20 —

Kvittens:

Nils Andersson

19291

M 3*0818

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Jordb 436/1947

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget Heinge, Heingetorp

och Ry av år 1945

i Lövestads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrift bekräftar i tjänsten:
Erik Abelin
e.o. kanslisekreterare.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945

i Lövestads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget Reinge, Reingetorp och Ry av år 1945 i Lövestads socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2 km N om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 8 februari 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 8 april 1955. Arbetet synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1949.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 9.600:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet

med respektive 520,28 kronor och 42:- kronor samt vattendomstolsavgiften 15,15 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 10.177,43 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 8 februari 1945 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c).

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. g).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 5.020:- kronor från statens avdikningsanslag och 4.880:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll, för vid syneförrättningssammanträde den 8 februari 1945 bil. b.

Förening bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader bil. f.

Yttrande från täckdikningsnämnden bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av ett häfte förrättningshandlingar samt tre blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 februari 1945 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 i Lövestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lantbruksingenjören E. Alström, p.b.

Lösen redov. gm stpl 1:-
Stämpel 1:-
Summa kronor 2:-

År 1945 den 8 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Karl Månsson och Nils Andersson för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen hade ----------

---

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. För dikningsföretaget Ry n:ris 1, 3 och 6 av år 1945 uppdroga åt lantbrukare Thor Andersson, och för dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 uppdrags åt lantbrukare Thor Andersson

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företagen,

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

Ry den

8 februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Månsson Nils Andersson

Gode män.

Rätt transumerat, betygar

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga c.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 inom Lövestads socken av Malmöhus län, förklara vi oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbrukare Thor Andersson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ry den 8 februari 1945.

1. Thor Andersson

2. Ivar Lundsten

3. Karl Olsson

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 i Lövestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Lövestads socken.

11/48 delar av gatehuset Heinge av 21^{5}; äg. Ivar Lundsten,

11/24 " " " " " 21^{6}; " Dens. ,

12/256 mtl. Heingetorp av 2^{4}; " Karl Olsson,

7557/691200 mtl. Heingetorp av 2^{64}; " Ivar Lundsten.

7557/691200 " " " 2^{65}; " Dens. ,

1/8 " Ry 1^{8}; " Thor Andersson.

Malmö i maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Löwestads.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Thor Andersson, Ry nr 1, Löwestad.

Aktförvarare: Lantbr. Thor Andersson, Ry nr 1, Löwestad.

Ägoslag och areal:		Hela området.	Låntagarnas andel.
Åker	har	9,15	8,75
Äng	"	1,06	1,06
Summa hektar		10,21	9,81
Båtnad	kr	10.098:-	9772:-
Kostnad	"	10.177,43	9847,58

Medelkostnad per hektar omkring 1000:- kr.

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Avdeln. 1-3.	Avdeln. 4.	Summa
Båtnad	9.062:- kr	1.036:- kr	10.098:- kr
Kostnad	9.170,27 kr	1,007,16 kr	10.177,43 kr
Relativ kostnad	1,01	0,97	
Bidrag i % av kostnaden	50 % av båtnaden	48,95	
Beräknat bidrag	4.531:- kr	493,00 kr	5.024:- kr
Bidrag utgår med	4.527,39 kr	492,61 kr	5.020:- kr

Låntagarnas andel i båtnaden	8.736:- kr	1.036:- kr	9.772:- kr
" " " kostnaden	8.840,42 kr	1,007,16 kr	9.847,58 kr
" " " bidraget	4.364,54 kr	492,61 kr	4.857,15 kr
Beräknat lånebelopp	4.371,44 kr	514,55 kr	4.885,99 kr
Lån utgår med	4.366,08 kr	513,92 kr	4.880:- kr

Malmö i maj 1945.

Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

bil. f.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	9.600:- kr	9.600:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för synеförrättningen	520,28 kr	
" " utredningen angående statsunderstöd m.m.	42:- kr	
Vattendomstolsavgiften	15,15 kr	577,43 kr
	Summa	10.177,43 kr.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10 177 kronor 43 öre, varav i länsingenjörens andel 9 847 kronor 58 öre. Stockholm den 10 maj 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Detta sammanträde bevittnar i tjänsten

Erik Alström

t.o. Lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 i Lövestads socken av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker		9,15 har
Äng och odlingsmark		1,06 "
Annan duglig mark		- "
	Tillsammans	10,21 har
Markens blivande värde i medeltal	2.420	kronor pr har
" " " högst	2.500	" " "
Båtnaden har uppskattats till		10.098 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till		9,600 "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till		"

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera

Synneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 febr. 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbr. Thor Andersson

Adress: Ry per Lövestad

Anm.:

Malmö den 5 maj 1945.

Erik Ahlström

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Heinge, Heingetorp och Ry dikningsföretag av år 1945 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 12 maj 1945.

A. Friedhoff

Thor Andersson

bil. h.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till diknings-företaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 inom Lövestads socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörs-taxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar á			
Betänkande, sid.	4 " 3	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sam-mandrag, dagar	1/2 á 12:-	6	-
Upprättande av ansökningshandlingar m.m. dagar	1/2 " 12:-	6	-
Kopia av plankartan á väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m.m. sidor	14 sid. å 0,55	7	70
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg Kommissionärsarvode		2	50
Telefon m.m.		1	80
Yttrande från täckdikningsnämnden		3	-
	Summa Kronor	42	00

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörlig häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 26 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vidimeras

Vidimeras
ex officio

Erik Ahlström

godk

253/47

DIARIE-NR 19291
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUNI 1947

26/8 47
4/9 47

436/47

M 3•0818

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1947 till dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 i Lövestads socken,

MALMÖHUS LÄN

Ith tiwell

beviljat dels *statsbidrag* med femtusentjugo (5.020) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med fyratusenåttahundraåttio (4.880) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Alström vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*f* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse*ns* ~~för trocndeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ry den 18 juli 1947.

Thorsten Andersson
Lantbrukare
äg. Ry 18 i Löversbols o:n

Att Thor Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Ahlström
Adress Malmö

Sage Persson
Adress Löversbol

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Åsgrund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

godkl 12/947 253/47

19292

KONTROLLSTYRELSEN
4 AUG 1947

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 i Lövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5020:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4880:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Thor Andersson, Ry per Lövestad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 juli 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete uppgår inklusive förrättningskostnaderna till c:a 9400:- kronor motsvarande 92 % av hela den beräknade kostnaden 10177,43 kronor.

Malmö den 31 juli 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

1947 den 12 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Heingo, Heingetorp och Ry av år 1945 i Löwestads socken, Malmöhus län.

Lån 4.800 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1947. Lånet minskat denna dag till 4.550 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Löwestads socken			
Heingo	11/48 delar av gatehuset	av 21^{5}	Ivar Lundsten
"	11/48 delar av gatehuset	av 21^{6}	Densamme
Heingetorp	12/256	av 2^{4}	Karl Olsson
"	7557/691200	av 2^{64}	Ivar Lundsten
"	7557/691200	av 2^{65}	Densamme
Ry	1/8	1^{8}	Thor Andersson

Stockholm den 12 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

10/5-47

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget Heinge, Heingetorp och Ry av år 1945 i Lövestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Lövestads socken.

11/48 delar av gatehuset Heinge av 21^{5}; äg. Ivar Lundsten,

11/24 " " " " " 21^{6}; " Den. ,

12/256 mtl. Heingetorp av 2^{4}; " Karl Olsson,

7557/691200 mtl. Heingetorp av 2^{64}; " Ivar Lundsten,

7557/691200 " " " 2^{65}; " Dens. ,

1/8 " Ry 1^{8}; " Thor Andersson.

Malmö i maj 1945.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.
